



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
07/07/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/06/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

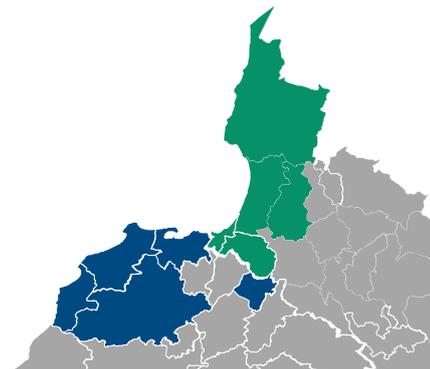
Objeto: articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre y los municipios signatarios, las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de la región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país.

Líneas Temáticas:

- Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.
- Infraestructura para la disminución de las NBI.
- Fortalecimiento y ordenamiento institucional.

TEMAS ESTRATEGICOS

- **Compromisos instancias administración:**
 - Revisión de la inclusión de la estructuración de la nueva sede del Hospital de Loricá al Plan Estratégico de Inversiones.
 - Solicitar reunión con el INVIAS para el municipio de Loricá para la vía municipal central.
 - Reunión de articulación con DIMAR, CVS, CARSU-CRE y entidades territoriales para el proyecto de erosión costera.
 - Revisión de la propuesta de creación de la RPG del Golfo de Morrosquillo.

Área de Intervención: Pacto Golfo de Morrosquillo

Departamentos:	Córdoba y Sucre
No. de Municipios en el Pacto Territorial:	Departamento de Córdoba: (5) Departamento de Sucre (5)
Fecha de suscripción:	07/02/2020
Fecha de terminación:	07/02/2025
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$1.152.523 (100%)
Nación (%)	\$1.048.440 (91%)
Territorio y otros (%)	\$104.083 (9%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$389.817 (33,8%)
Compromiso Nación	\$354.021
Compromiso Territorio	\$35.795

Proyectos en ejecución	\$389.817 (18 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****Vía Santa Lucía – Moñitos, Córdoba.**

- **Estado:** adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión de \$190.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad' para la intervención de 55 km. Vía adjudicada el 9 de abril de 2021 por \$171.472 millones por el INVIAS, el inicio de obra se estima para mayo de 2021, con un plazo de ejecución de 54 meses, este proyecto hace parte del Programa de "Vías para la Legalidad". A la fecha la ejecución de la obra no se ha iniciado por demoras en la formalización del contrato.
- **Detalle del proceso de contratación:**

Entidad responsable	No. del proceso	Objeto	Fecha apertura	Fecha adjudicación	Valor
INVIAS	LP-DT-066-2020	Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos	31/12/2020	09/04/2021	\$171.472 millones
INVIAS	CMA-DT-191-2020	Interventoría para las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales para la reactivación Santander y caribe del programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Santander, Córdoba y guajira	31/12/2020	07/04/2021	\$12.000 millones

- **Observaciones al proceso:** el 9 de febrero se publicó la adenda N°2 al proceso que realiza modificaciones al pliego de condiciones y los anexos del formulario de presupuesto oficial, anexo técnico, anexo de minuta de contrato, formato de matriz de riesgos. Los demás aspectos del Pliego de Condiciones se mantienen como se expidieron originalmente.

Vía El Delirio - Puerto Viejo.

- **Estado:** Etapa Precontractual
- **Avance:** La vía comprende el tramo entre Palmito, Coveñas y Tolú para el cual se suscribió convenio el 6 de octubre de 2020 por valor de \$37.790 millones con recursos Nación, la interventoría fue contratada por INVIAS por \$4.182 millones, para un total de 41.972 millones. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de licitación en el marco del convenio suscrito entre la Gobernación de Sucre y FINDETER, para el cual se estima como fecha probable de adjudicación el mes de julio e inicio de obra el mes de agosto de 2021.

Vía Moñitos-San Bernardo del Viento-Lorica-Chinú.

- **Estado:** Proyecto en ejecución por INVIAS que hace parte del Programa de "Concluir - Concluir".
- **Avance** Fue adjudicado en diciembre del 2020 mediante proceso licitatorio No. LP-DT-045-2020 al KMA CONSTRUCCIONES SAS contrato de Obra No. 1591 del 2020 por valor de \$ 26.678.206.634. Mediante proceso CMA-DT-172-2020 se adjudicó la interventoría al CONSORCIO SUPERVISIÓN CORREDORES VIALES contrato No. 1791 del 2020 por valor de \$ 2.249.645.855. Se comprometieron recursos por \$ 28.927.852.489 para una ejecución estimada de 60 meses, contados a partir del 2 de marzo del 2021.

Estación de Bomberos – Santiago de Tolú, Sucre.



- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Se adelanta la estructuración integral técnica, legal, financiera y social en las fases de prefactibilidad, factibilidad y acompañamiento para el proyecto de construcción y dotación de una estación de bomberos en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre. Esta estructuración está siendo desarrollada a través de contrato con Findeter por un valor de \$546.419.376 pesos, incluyendo la interventoría. La prefactibilidad, factibilidad y gestión predial se espera finalice en los últimos meses del 2021. El proyecto debe ser cargado en plataforma nuevamente para su viabilización, ya que se realizó un cambio en la fuente de financiación.

Hospital – Coveñas, Sucre

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - La adquisición del predio por parte de la Gobernación de Sucre se concretará con recursos tanto del Departamento como del municipio de Coveñas. El municipio aportará recursos propios por \$1.000 millones y la Gobernación de Sucre por \$900 millones, el trámite que se deberá adelantar es que el municipio suscriba un convenio con la Gobernación para el traslado de los recursos y sea él el que realice la compra del lote, dado que ya se cuenta con el avalúo del predio y la declaratoria de utilidad pública por parte del departamento.
 - Findeter adjudicó contrato de consultoría a CURE y CIA S.A.S. para la prefactibilidad y factibilidad de este proyecto por \$2.288.837.320 millones, con lo cual se tendrá la estructuración en diciembre de 2021.
 - Se sostuvieron mesas de trabajo presenciales con Ministerio de Salud, DNP, Findeter, Consultores del proyecto, Municipio de Coveñas y Gobernación de Sucre para el avance de la elaboración de los documentos de Capacidad Instalada y el PMA. Par esto, se realizó la visita a la sede existente donde se prestan los servicios médicos y se sostuvo mesa de trabajo en el municipio de Coveñas los días 9 y 10 de junio.

Marina - Municipio de Tolú, Sucre

- **Estado:** En estructuración
- **Avance:**
 - Se encuentra en proceso de selección por parte del municipio de Santiago de Tolú el contratista para adelantar los estudios y diseño del proyecto de la Marina, se espera que el mes de septiembre sea entregado el producto final para posteriormente proceder a la contratación para la ejecución de obras.
 - La gobernación de Sucre junto con el municipio de Tolú avanza en la estructuración de una APP con el apoyo del DNP. El Viceministerio de Turismo y el DNP han brindado asistencia técnica a ambas entidades territoriales para definiciones de la estructuración y de la ubicación, la cual podría darse en el predio de propiedad del municipio en el sector de Manhattan.

Infraestructuras de acueducto y saneamiento básico en los Municipios del PTGM

Esta iniciativa incluida en la versión No. 2 en el PEI del pacto golfo de Morrosquillo aprobado en el 2021 en el tercer Consejo Directivo plantea los siguientes proyectos: Segunda etapa del alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba, Soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas, Construcción Sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre y Acueducto de San Antero hasta el corregimiento del Porvenir. A continuación, se describe el avance:

Acueducto de San Antero hasta el corregimiento del Porvenir

- **Estado:** En Ejecución
- **Avance:** se recibió por parte del Plan Departamental de Aguas de Córdoba el convenio No 014 de 2020 entre Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. y la empresa de servicios públicos AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P. para la ejecución del proyecto. El 12 de abril se adjudicó el proceso por parte del AQUALIA el proceso No. SCO-AQLATAM-ACU-002-2021, de igual forma el 4 de mayo fue adjudicada la interventoría del proyecto. El proyecto se encuentra en ejecución desde el 25 de mayo de 2021.



Entidad responsable	No. del proceso	Objeto	Fecha apertura	Fecha adjudicación	Valor
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.	No. SCO-AQLATAM-ACU-002-2021	Optimización del acueducto de San Antero y del acueducto del corregimiento el porvenir en el municipio de San Antero	08/03/2021	12/04/ 2021	\$17.226.660.082
AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.	No. SCO-AQLATAM-ACU-004-2021	Interventoría Técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, para la ejecución del proyecto de Optimización del acueducto de San Antero y del acueducto del corregimiento el porvenir en el municipio de San Antero	07/04/2021	04/05/2021	\$618.178.635

Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba.

- **Estado:** En estructuración
- **Avance:** Teniendo en cuenta la reciente viabilidad otorgada por el MVCT para el alcantarillado de Moñitos, se confirmó por parte de la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales (GNPT) la financiación de este proyecto hasta por el 70% del Valor total. El 30% restante será aportado por la Gobernación de Córdoba. Así las cosas, el 29 de junio se dio inicio a la articulación entre el municipio y el FRPT para la revisión de la documentación necesaria y la suscripción del contrato específico para la transferencia de los recursos.

Construcción Sistema de Acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, municipio de San Onofre, Sucre

- **Estado:** En Ejecución
- **Avance:** se recibió por parte de la alcaldía de San Onofre el Contrato Estatal de Obra LP 003-2020 entre el municipio de San Onofre y Consorcio Acueducto Rincón 2020, para la ejecución del proyecto. El once (11) de febrero de 2021 se adjudicó el proceso con una inversión de Siete mil cuatrocientos dos millones ciento treinta mil quinientos veinte pesos (\$7.402.130.520). el plazo estimado para este proyecto es de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:**
 - El 31 de marzo se suscribió el acta de inicio del Contrato suscrito con FINDETER por \$4.821 millones para la estructuración de:
 1. Optimización y ampliación de las redes de acueducto del casco urbano del municipio de Coveñas y programa de reducción de pérdidas.
 2. Optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Coveñas.
 3. Drenaje pluvial del casco urbano del municipio de Coveñas.
 4. Optimización de los sistemas de abastecimiento y de las plantas de tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio de Coveñas.



Esta estructuración será entregada en octubre y ejecutado por FINDETER.

- Se sostuvo mesa de trabajo en el municipio de Coveñas, en la cual se realizó la primera mesa técnica con el departamento de Sucre, municipio de Coveñas, Findeter y los Consultores que van a realizar las cuatro consultorías contratadas. Se presentó la lista de chequeo de los documentos que necesitan los consultores de la Alcaldía para solicitar la información, lo ideal es que la información la recopilen de una vez, o que se designe un responsable por parte de la Alcaldía y SERCOV. Se estableció como compromiso la realización de meses de seguimiento para revisar los avances de estas consultorías.

Erosión Costera

- **Estado:** En estructuración.
- **Avance:**
 - Se está adelantando con FINDETER el análisis para estructurar los puntos críticos priorizados que se identificaron, así como el licenciamiento ambiental y arqueológico. El departamento de Sucre iniciará intervenciones por \$17.099 millones en Tolú y Berrugas (San Onofre) en 1.4 kms de línea costera.
 - Se adelantó mesa de trabajo con la Universidad de Córdoba y la DIMAR para la revisión de los alcances de los productos a trabajar para el perfilamiento del proyecto de erosión costera del Golfo de Morrosquillo. Se encuentra pendiente definir si el trabajo de formulación del proyecto desde lo técnico lo realizará FINDETER y lo concerniente al licenciamiento ambiental será por parte de la universidad de Córdoba.
 - Se adelanta el proceso de contratación para la estructuración de 8 puntos críticos, que terminará en julio de 2022.

Acueducto Regional Golfo de Morrosquillo

- **Estado:** En estructuración
- **Avance:** en diciembre se entregó el perfilamiento del proyecto. Se contrató con ENTerritorio la estructuración del acueducto regional que beneficiará a todos los municipios del Pacto.

Malecón Segunda Ensenada de Coveñas

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - La Gobernación de Sucre aportará los estudios y diseños de este proyecto y se podrá radicar en FONTUR para la respectiva viabilidad. FONTUR, el departamento y el municipio aportarán los recursos para el cierre financiero de esta obra.

Megacolegio Heriberto García Tolviejo, Sucre

- **Estado:** En Ejecución
- **Avance:** Se instaló la primera piedra de esta obra el 27 de abril en el marco de la visita del Señor Presidente. Esta obra contempla 18 meses para su ejecución desde el acta de inicio que suscriba el FFIE con el contratista, se espera haber terminado en 14 meses el edificio principal para inauguración del Señor Presidente. El Megacolegio Heriberto García Garrido en Tolviejo, Sucre, atenderá 2.160 estudiantes con una inversión total de \$29.365 millones.

Ampliación sede del SENA

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Para la ampliación de la sede del SENA en Tolú, esta institución ya adquirió los dos primeros lotes con un área de (1.185 m²) por \$751 millones. El tercer lote (1.200 m²) está en trámite de adquisición para junio de 2021. Los estudios y diseños serán aportados en septiembre de 2021 por el SENA y la construcción estará a cargo del departamento de Sucre, que iniciará en el cuarto trimestre de 2021.

Construcción de Centro SACUDETE



- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Actualmente están viabilizados por \$2.325.900 millones los SACUDETE Lórica (2), y por aprobación los de Coveñas, Tolú, San Onofre y Tuchín. Según conversaciones con el Ministerio del Interior, se espera que los centros SACUDETE de Lórica, viabilizados a la fecha, inicien su ejecución en el tercer trimestre de 2021.

Auditorías de cuentas de punto final Salud

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** los departamentos de Sucre y Córdoba financiarán con recursos propios las auditorías a las cuentas de salud, en el marco de la Ley de Punto Final por \$3.188 millones. En el mes de mayo fue recibida la comunicación oficial por parte de la Gobernación de Sucre del desistimiento del proyecto con recursos del DNP.

Fortalecimiento Institucional

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** en el marco de la implementación del PTGM, la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales diseñó una estrategia de capacitación dirigida a fortalecer las competencias y conocimientos del recurso humano de las 12 entidades territoriales participantes de este Pacto, con el objetivo de fortalecer los procesos de planificación territorial y del ciclo de la inversión pública, que permitan elevar la calidad y productividad de las entidades participantes.

Estrategia de Ecodesarrollo

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** se está adelantando el proceso de concertación para la financiación del proyecto con los departamentos de Córdoba y Sucre. En el desarrollo del Consejo Directivo No. 3 del Pacto Golfo de Morrosquillo desarrollado en Lórica, Córdoba el 16 de abril, el Gobernador de Sucre y el Gobernador de Córdoba manifestaron la intención de realizar los aportes económicos para el desarrollo del proceso de estructuración del proyecto.

Centro multipropósito

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - La Gobernación de Sucre presentó el estudio de mercado realizado y el cual fue revisado y ajustado en compañía del Vice Turismo y el DNP, para sustentar la presentación de este proyecto ante FONTUR. En compañía del Vice Turismo, se seleccionó el lote conocido como manhattan para el desarrollo del proyecto, este se encuentra ubicado en el casco urbano del municipio de Santiago de Tolú. La Gobernación gestiona la adquisición del predio el cual es propiedad de un privado.

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** En el año 2020 la AEROCIVIL contrató los estudios y diseños por \$1.329 millones, para la ampliación a 2.200 metros de la pista de aterrizaje. Este contrato se terminará de ejecutarse en mayo de 2021. Ya están adquiridos todos los predios necesarios para esta obra. En el mes de julio la AEROCIVIL deberá estar dando a conocer el resultado de los estudios y diseños para avanzar en el cierre financiero del proyecto. La AEROCIVIL está definiendo el monto de inversión para incluirla en el CONPES de importancia estratégica.

Conectividad – Zona digital

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** el MINTIC se encuentra desarrollando cinco proyectos en zonas rurales y urbanas: 1) Acceso Universal Sostenible - Zonas digitales rurales, 2) Centros digitales, 3) Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional, 4) Incentivos a la Oferta de Internet Fijo y 5) zonas digitales urbanas. Proyectos con año de inicio en 2019 y año de finalización en el 2031, de los cuales 15 se encuentran ejecutados, 3 en aprobación, 4 en ejecución, 10 en operación, 3 en instalación y 9 en planeación, ubicados en los municipios definidos en el Pacto del Golfo de Morrosquillo.



Vías terciarias

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:** En el marco de la visita del Señor Presidente, el 27 de abril se firmaron los convenios para las siguientes intervenciones en vías terciarias:

Departamento	Municipio	Corredor vial	Tipo de Vía	Postulado a Colombia Rural	Longitud (Km)	Inversión estimada
Sucre	Toluviejo	Palmira - Gualón	Terciaria Municipio	Si	3.95	\$ 1.265.549.461
Sucre	Coveñas	Guayabal - parcelas de Algarrobo y desvío hacia el sector represa Villeros	Terciaria Municipio	No	18,79	\$ 4.392.234.201
Sucre	Coveñas	Aserradero - Coveñas	Terciaria Municipio	No	8.40	\$ 2.693.421.595
Sucre	Santiago de Tolú	Tolú - El francés	Terciaria Municipio	No	4.70	\$ 10.000.000.000
Sucre	San Onofre	Aguas Negras - Berlín (90CS01)	Terciaria Departamental	No	5,5	\$ 13.000.000.000
Inversión red terciaria Sucre						\$ 31.351.205.257
Córdoba	Moñitos	Murcielagal - El Tigre- San Patricio- Mangle**	Terciaria Municipio	Si	5	\$ 1.603.227.140
Córdoba	San Bernardo del viento	Villa Fátima - Perpetuo Socorro	Terciaria Municipio	Si	7,7	\$ 2.468.969.796
Córdoba	San Antero	Porvenir - Peñón- Cerro Petrona- Aseerradero	Terciaria Municipio	Si	9,4	\$ 3.023.686.386
Córdoba	Lorica	Corregimiento los Gómez	Terciaria Municipio	Si	27	\$ 8.657.426.556
Inversión red terciaria Córdoba						\$ 15.753.309.878
TOTAL						\$ 47.104.515.135

Se adelantaron visitas a campo a los tramos a intervenir por parte del INVIAS en compañía de los municipios y el Departamento de Córdoba.

Construcción vía paralela al mar desde el sector la viuda hasta el sector Bucaneros en la zona turística de playa blanca, San Antero.

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Se realizó con el municipio y consultor del proyecto mesa de trabajo para conocer el avance de la estructuración del proyecto, el cual es susceptible de financiación a través de los recursos del FRPT. Se estima que el proyecto se encuentre listo para radicación en fase 3 para viabilidad en el mes de julio de 2021.

Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el Cangrejo - Playa Blanca, San Antero.

- **Estado:** en estructuración



- **Avance:** Se realizó el envío del proyecto por parte del municipio de San Antero, al grupo sectorial del DNP para la revisión de los requisitos acorde a la lista de chequeo establecida por ENTerritorio. A la fecha, se encuentra pendiente la revisión la cual se espera se encuentre realizada a más tardar en el mes de julio.

Proyecto construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero, Departamento de Córdoba.

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** El municipio y consultor, se encuentran realizando los ajustes acordes a las observaciones realizadas a los documentos de estructuración del proyecto, el cual es susceptible de financiación a través de los recursos del FRPT. El documento deberá radicarse nuevamente con las observaciones y requerimientos subsanados por parte del municipio. El municipio se encuentra revisando oficio enviado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el cual solicita según sus determinantes que el proyecto debe realizar un programa de arqueología preventiva para el desarrollo del proyecto, por tanto, se deberá revisar las implicaciones del alcance de dicho oficio y subsanar por parte del municipio.

Proyecto Construcción unidad recreodeportiva Moñitos, Córdoba.

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Se realizó el envío del proyecto por parte del municipio de Moñitos, al grupo sectorial del DNP para la revisión de este. A la fecha, se encuentra pendiente la revisión la cual se espera se realice a más tardar en el mes de julio.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	4	-	1	3
Comercio Industria y Turismo	4	-	-	4
Deporte y Recreación	2	-	-	2
Educación	1	-	1	-
Interior	4	-	2	2
Salud y Protección Social	3	-	2	1
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	-	1	-
Trabajo	1	-	1	-
Transporte	8	-	7	1
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	3	-	2	1
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	1	-	1	-
Total, general	32	-	18	14

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)



Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$144.023	\$17.499	12%	\$126.524	88%
Comercio Industria y Turismo	\$79.441	\$30.080	38%	\$49.361	62%
Deporte y Recreación	\$13.200	\$0	0%	\$13.200	100%
Educación	\$20.309	\$8.231	41%	\$12.078	59%
Interior	\$19.932	\$500	3%	\$19.432	97%
Salud y Protección Social	\$59.695	\$5.500	9%	\$54.195	91%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$0	0%	\$5.361	100%
Trabajo	\$20.000	\$16.000	80%	\$4.000	20%
Transporte	\$528.717	\$4.911	1%	\$523.806	99%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$258.303	\$17.820	7%	\$240.483	93%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$3.542	100%	\$0	0%
TOTAL	\$1.152.523	\$104.083	9%	\$1.048.440	91%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO DE 2021



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2020 – 2025
(Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$144.023	\$495	0%	\$494	0%
Comercio Industria y Turismo	\$79.441	\$0	0%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$13.200	\$0	0%	\$0	0%
Educación	\$20.309	\$0	0%	\$29.231	144%
Interior	\$19.932	\$813	4%	\$5.046	25%
Salud y Protección Social	\$59.695	\$2.555	4%	\$5.743	10%



Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$0	0%	\$5.361	100%
Trabajo	\$20.000	\$0	0%	\$751	4%
Transporte	\$528.717	\$41.972	8%	\$308.787	58%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$258.303	\$10.799	4%	\$31.035	12%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$0	0%	\$3.369	95%
TOTAL	\$1.152.523	\$56.634	4,9%	\$389.817	33,8%

3. PRINCIPALES AVANCES POR LÍNEA TEMÁTICA Y SECTOR

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN/PACTO TERRITORIAL– INDICADORES ESTRATÉGICOS
N/A*

3.2 INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA
N/A*

3.3 AVANCE CUALITATIVO ACUMULADOR POR SECTOR
N/A*

*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en proceso de construcción, la cual una vez avala y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 6 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 56.634 millones (4,9%).

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera	En Ejecución	\$0	\$494	\$495	\$494
Interior	Estructuración de Estación de Bomberos	En Ejecución	\$0	\$813	\$813	\$813
Salud y Protección Social	Estructuración Hospital Coveñas	En Ejecución	\$0	\$2.555	\$2.555	\$2.555
Transporte	Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y tolú en el departamento de Sucre.	En Ejecución	\$0	\$41.972	\$41.972	\$41.972
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo	En Ejecución	\$0	\$495	\$495	\$495
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Infraestructuras de acueducto y saneamiento básico en los municipios del PTGM	En Ejecución	\$16.775	\$13.765	\$10.304	\$30.540
Total, general			\$16.775	\$60.094	\$56.634	\$76.869

Millones de \$ COP
