



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
26/10/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/09/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

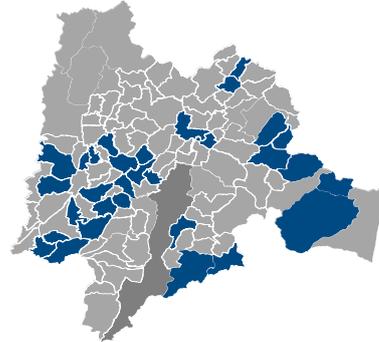
Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.

Líneas Temáticas:

- Infraestructura para la integración social
- Gestión ambiental y saneamiento básico

TEMAS ESTRATÉGICOS

- Compromisos instancias administración:
 - En la sesión No. 1 del Consejo Directivo se estableció el siguiente compromiso:
Citar la próxima sesión del Consejo Directivo de conformidad con el Reglamento Interno
 - Estado: Asignado.
 - Detalle: Pendiente de realizar la sesión en el segundo semestre de 2021.
- Impactos esperados
 - Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Cundinamarca generaría cerca de 7.515 empleos directos y 11.771 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 1.3 millones habitantes del área de influencia del Pacto Cundinamarca.

Área de Intervención: Cundinamarca**Departamento:**

Cundinamarca Municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Cajicá, Caquezá, Chía, Chipaque, Chocontá, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Fomeque, Funza, Fúquene, Gachetá, Girardot, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Pulí, Quetame, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Subachoque, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Viotá y Zipaquirá.

Fecha de suscripción:

19/02/2021

Fecha de terminación:

19/02/2024

Plazo:

3 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$536.821 (100%)
Nación (%)	\$518.598 (97%)
Territorio y otros (%)	\$18.223 (3%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$ 0 (0%)
Compromiso Nación	\$ 0
Compromiso Territorio	\$ 0

Proyectos en ejecución	\$ 0 (0 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Construcción ciclo ruta de la sabana.

- **Estado:** en estructuración.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$83.380 millones y su estructuración está a cargo de la Gobernación de Cundinamarca. El 17 de septiembre de 2021 remitió el proyecto ajustado, sin embargo, esta subsanación no está de acuerdo con los requisitos del FRPT lo cual se informó al equipo de la Gobernación y se espera la entrega del proyecto ajustado para revisión del FRPT y avanzar con el proceso de viabilización para la suscripción del contrato específico.

Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá

- **Estado:** en estructuración.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$1.500 millones. El proyecto se presentó al DNP de acuerdo con los requisitos establecidos y se encuentra en revisión por parte del FRPT.

Construcción Coliseo municipio de Funza.

- **Estado:** Viabilizado.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$38.692 millones y cuenta con viabilidad del Mindeporte. El 14 de septiembre de 2021, el DNP remitió el proyecto presentado por el municipio al equipo del FRPT, el cual emitió observaciones y fueron subsanadas por la entidad territorial el 26 de septiembre. Se estima que se pueda realizar la suscripción del contrato específico el 08 de octubre de 2021.

Adecuación estadio Villa San Diego municipio de Ubaté.

- **Estado:** Viabilizado.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$7.455 millones. El concepto de viabilidad del Mindeporte se encuentra en proceso de firma. El municipio presentó el proyecto conforme a la lista de requisitos del Fondo Regional de Pactos Territoriales el 28 de septiembre.

Construcción Estadio Zipaquirá.

- **Estado:** Viabilizado.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$21.408 millones y cuenta con viabilidad del Mindeporte. El 13 de septiembre de 2021, el DNP remitió el proyecto presentado por el municipio al equipo del FRPT, el cual emitió observaciones y fueron subsanadas por la entidad territorial el 24 de septiembre. Se estima que se pueda realizar la suscripción del contrato específico el 08 de octubre de 2021.

Mejoramiento del parque recreo deportivo Los Patos del municipio de Tocancipá.

- **Estado:** en estructuración.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$20.000 millones y se encuentra en proceso de reformulación que permita tener un complejo deportivo con áreas aptas para el desarrollo de diferentes actividades recreo-deportivas como patinaje, BMX, Hockey y tenis. Se han realizado mesas de trabajo en las cuales se han presentado los avances en el proceso de estructuración de los componentes técnicos y se han recibido las observaciones y recomendaciones del Mindeporte. En espera que el municipio ajuste la totalidad de los estudios y presente proyecto al Mindeporte, estableciendo fecha límite de entrega el 4 de octubre al Mindeporte.

Construcción del centro de práctica deportiva BMX en la vereda La Balsa, sector Delicias Sur del municipio de Chía, Cundinamarca

- **Estado:** en estructuración.



- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$12.811 millones. En mesa de trabajo del 10 de agosto se socializaron los requisitos sectoriales y la metodología para la presentación del proyecto al Ministerio para iniciar el proceso de viabilidad técnica. El proyecto fue presentado al Mindeporte el 24 de septiembre y se encuentra en revisión.

Construcción, mejoramiento y adecuación del polideportivo con cubierta en estructura metálica en la cancha del barrio La Esmeralda II, municipio de Girardot, Cundinamarca

- **Estado:** en viabilidad.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$2.206 millones. El 20 de agosto el municipio radicó el proyecto al Mindeporte para su revisión en el marco del proceso de viabilidad técnica. En espera resultado de la revisión del Ministerio.

Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca

- **Estado:** en proceso de ajuste.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$4.372 millones. Se encuentra en proceso de ajuste el componente predial para cumplir la totalidad de requisitos solicitados por Mindeporte. El 28 de septiembre la entidad territorial presentó el documento del certificado de libertad y tradición del predio ajustado y se encuentra en validación por Mindeporte.

Mejoramiento de los polideportivos de los barrios La Magnolia, Escallón, Villa María y San Luis de la zona urbana del municipio de Madrid, Cundinamarca

- **Estado:** en proceso de ajuste.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$4.418 millones. Se requiere realizar actualización de precios y que el municipio consolide la información de acuerdo con la lista de requisitos y metodología para la presentación del proyecto al Ministerio, socializada el 10 de agosto. El municipio informa que espera culminar la estructuración del proyecto al 30 de octubre.

Proyectos construcción /adecuación plazas de mercado.

- **Estado:** en revisión técnica sector
- **Avance:** la Gobernación de Cundinamarca presentó a la convocatoria 0001 de DPS un total de 27 proyectos para la construcción o adecuación de plazas de mercado y centros de acopio en los municipios de Agua de Dios, Apulo, Bojacá, El Colegio, El Rosal, Guayabetal, Machetá, Madrid, Nilo, Pulí, Ricaurte, Bituima, Chipaque, Gacheta, Guayabal de Siquima, Gutiérrez, La Mesa, Manta, Medina, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Ubalá y Zipaquirá, que tienen una inversión indicativa de \$82.405 millones.

A la fecha no se tiene viabilidad de ninguno de los proyectos presentados a DPS, sin embargo, se tiene mayor avance en el proceso de viabilización para los proyectos de centro de acopio vereda cerezos de Chipaque, plaza de mercado Ricaurte, centro acopio Gutiérrez, centro acopio El Rosal, plaza mercado Bituima, plaza de ferias Manta. Se requiere celeridad y calidad técnica por parte de las alcaldías de Machetá, Nilo, Agua de Dios, Guayabetal, Apulo, Sasaima, Madrid, El Colegio, Bojacá, Ubalá en la subsanación de las observaciones.

Para el caso del proyecto de Viotá, el 28 de septiembre el MADR remitió observaciones al proyecto para ajustes por parte del municipio.

Por otra parte, se priorizaron 6 nuevos proyectos de plazas de mercado y centros de acopio de los cuales Gutiérrez, Fómeque, Quetame, Chipaque fueron presentados al MADR para concepto técnico y Subachoque fue revisado y observado por DPS. Está pendiente la entrega del proyecto de Chocontá al MADR.

Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Facatativá.

- **Estado:** en proceso de ajuste.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$100.668 millones. El 5 de agosto por parte del municipio y Empresas Públicas de Cundinamarca se realizaron los ajustes a las observaciones y fueron presentados al Viceministerio de Aguas. El 13 de agosto se realizó visita técnica con el MVCT, EPC y Municipio para verificar estado actual del proyecto y su alcance. El 18 de agosto se realizó reunión entre Viceministerio de Aguas, Empresas Públicas de Cundinamarca y municipio de Facatativá en la cual se verificó la información subsanada el 5 de agosto, identificándose que



aun faltan documentos, de acuerdo con lo solicitado en la lista de requisitos del sector. El 27 de agosto se presentaron los ajustes por parte del municipio de Facatativá y se realizaron reuniones el 6 y 15 de septiembre entre consultores y Viceministerio dando como resultado un acta de fecha del 21 de septiembre.

En esta acta se evidencia que la situación del proyecto es preocupante toda vez que se ve comprometida la viabilidad en el año 2021. Las observaciones que genera el MVCT están asociadas a: un sobredimensionamiento de la Planta de Tratamiento, se indica *“el proyecto no busca optimizar la PTAR existente, al contrato, busca demoler la infraestructura existente, para construir sobre sus escombros una nueva PTAR”*, se solicita incorporar el diagnóstico y evaluación del sistema existente con el fin de realizar verificaciones de capacidad, adicionalmente el MVCT reiteran lo señalado en la mesa de trabajo del 25 de mayo de 2021. Por lo anterior, en la vigencia 2021 no se lograría realizar la suscripción del contrato específico con ENTerritorio.

Construcción de la primera etapa del auditorio cultural, Gachetá

- **Estado:** en estructuración.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$5.736 millones. Se realizó mesa con Mincultura el 18 de agosto en la cual se socializaron los requisitos sectoriales y la ruta de presentación del proyecto para viabilidad. El municipio se encuentra ajustando los documentos y culminando estructuración para presentar el proyecto al Ministerio.

Remodelación parque principal municipio de Chocontá

- **Estado:** en estructuración.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$2.000 millones. El proyecto culminó su estructuración a nivel de estudios y diseños por parte del ICCU y el municipio se encuentra formulando MGA, documento técnico y ajustando la información para presentar al MVCT y Mincultura para viabilidad sectorial.

Infraestructura y equipamientos municipales - Centro de desarrollo local barrio San Carlos; Madrid

- **Estado:** en estructuración.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$8.270 millones. El proyecto culminó su estructuración a nivel de estudios y diseños por parte del ICCU y el municipio se encuentra organizando la documentación para presentar al MVCT para viabilidad sectorial.

Construcción del Centro de desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector los pinos del municipio de Cajicá

- **Estado:** Viabilizado.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$6.352 millones. El 17 de septiembre de 2021, el FRPT emitió observaciones que están siendo subsanadas por la entidad territorial. Se estima que se pueda realizar la suscripción del contrato específico el 15 de octubre de 2021.

Intervención ambiental para mitigación del riesgo, Cáqueza

- **Estado:** Viabilizado.
- **Avance:** Proyecto viabilizado por parte de la UNGRD por un valor de \$20.900 millones. La UDGRD se encuentra organizando la documentación del proyecto de acuerdo con los requisitos del FRPT para realizar la presentación del proyecto. Es importante indicar que se debe concretar el cierre financiero a través del FNGRD.

Intervención ambiental para mitigación del riesgo, Paime, Ubaque

- **Estado:** en ajustes.
- **Avance:** UNGR informa que estos proyectos fueron presentados para viabilidad pero están incompletos, por lo cual se realizó reunión el 28 de septiembre en la cual se socializaron con las alcaldías la documentación pendiente y el estado de avance en la subsanación. Para el caso de Paime está pendiente la revisión de los ajustes presentados por parte de la UDGRD para su aval. En el caso de Ubaque está pendiente la reformulación del proyecto teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del DNP.



Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	34	-	-	34
Ambiente y Desarrollo Sostenible	4	-	-	4
Cultura	1	-	-	1
Deporte y Recreación	8	-	-	8
Inclusión Social y Reconciliación	1	-	-	1
Planeación	2	-	-	2
Transporte	2	-	-	2
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	1	-	-	1
Total, general	53	-	-	53

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$147.951	\$7.123	5%	\$140.829	95%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$69.600	\$0	0%	\$69.600	100%
Cultura	\$5.736	\$0	0%	\$5.736	100%
Deporte y Recreación	\$111.363	\$11.100	10%	\$100.263	90%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.352	\$0	0%	\$6.352	100%
planeación	\$10.270	\$0	0%	\$10.270	100%
Transporte	\$84.880	\$0	0%	\$84.880	100%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$100.668	\$0	0%	\$100.668	100%
TOTAL	\$536.821	\$18.223	3%	\$518.598	97%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2021

0,0%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$147.951	\$0	0%	\$0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$69.600	\$0	0%	\$0	0%
Cultura	\$5.736	\$0	0%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$111.363	\$0	0%	\$0	0%



Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.352	\$0	0%	\$0	0%
Planeación	\$10.270	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$84.880	\$0	0%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$100.668	\$0	0%	\$0	0%
TOTAL	\$536.821	\$0	0%	\$0	0%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP

N/A*

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

N/A*

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

N/A*

*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en construcción, la cual una vez sea avalada y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de información de la ficha no hay proyectos cofinanciados por el DNP.
