



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
26/10/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/09/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Funcional Santander tiene como objetivo consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo económico y social.

Líneas Temáticas:

- Conectividad subregional.
- Infraestructura para el desarrollo económico y social.


TEMAS ESTRATEGICOS

➤ Compromisos instancias administración:

- En la sesión N° 3 del Consejo Directivo, se estableció el siguiente compromiso: Modificar el Plan Estratégico de Inversiones - PEI y Plan de Acción - PA2021, aprobados por el Consejo Directivo No. 3.
- Avance: Se presentó a la Gerencia Nacional para su revisión y aprobación y respectiva firma.

➤ Impactos esperados

- Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Funcional Santander generaría cerca de 10.658 empleos directos, 17.971 indirectos.
- Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a más de 2 millones de habitantes de las diferentes provincias, sin contar el beneficio generado a población flotante o exógena que llega o transita por los territorios y que se benefician de las obras de conectividad vial principalmente.

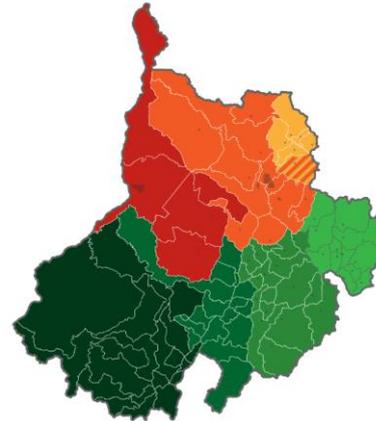Área de Intervención: Pacto Santander

Departamento:	Santander
No. de Municipios en el Pacto Territorial:	(7 provincias y 80 municipios)
Fecha de suscripción:	31/10/2020
Fecha de terminación:	31/10/2025
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$1.944.333 (100%)
Nación (%)	\$1.332.993 (69%)
Territorio y otros (%)	\$611.340 (31%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$693.757 (35,7%)
Compromiso Nación	\$616.845
Compromiso Territorio	\$76.913

Proyectos en ejecución	\$693.757 (13 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

- **Pavimentación vía Curos – Málaga**
Valor: \$320.000 millones
Estado: Avance: INVIAS: Obra adjudicada el 09/04/2021 (Proceso LP-PT-066-2020). Acta de inicio 29/06/20021.
Beneficiarios: 33.129
- **Pavimentación Troncal Central Norte**
Valor: \$180.000 millones
Estado: En ejecución
Avance: INVIAS: Contrato obra 1684 de 2020 por \$153.012 y contrato interventoría 1912 de 2020 por \$7200 millones.
Beneficiarios: 29.115
- **Pavimentación Transversal Carare**
Valor: \$90.000 millones
Estado: En ejecución
Avance: INVIAS: Contrato obra 1628 de 2020 por \$81.013 millones y contrato interventoría 1871 de 2020 por \$5.940 millones.
Beneficiarios: 109.162
- **Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín – Mogotes**
Valor: \$90.000 Millones
Estado: En estructuración
Avance: Se encuentra en estructuración por parte del INVIAS. Fue incluido en el Conpes 4039 de 2021 con cargo al INVIAS.
Beneficiarios: 17.707
- **Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional**
Valor: \$6.706 millones
Estado: En ejecución
Avance: En ejecución con recursos Nación a través del INVIAS contrato obra 1962 de 2020 por \$3.459 millones y contrato interventoría 1811 de 2020 por \$748 millones.
Recursos Territorio: En ejecución estudios y diseños según contrato adjudicado el 25 de enero de 2021 por \$2.353 millones por parte del departamento.
Beneficiarios: 454.923
- **Anillo vial Girón – Floridablanca**
Valor: \$20.000 millones
Estado: En ejecución
Avance: En ejecución contrato No. LP-DO-SRN-060-202 por \$ 17.485.276.053,00 Contrato 2327-2020 - CMA-DO-SRN-182-2020 por \$1.908.120.839,00 contrato 1968 de 2020 y contrato interventoría 2327 de 2020.
Beneficiarios: 450.351
- **Pavimentación vía Zapatoca - Galán – Barichara.**
Valor: \$152.281 Millones
Estado: En ejecución
Avance: Adjudicados estudios y diseños obra CO1.PCCNTR. 2157119 por valor de \$2.039 millones (proceso IT-CM-20-04). Interventoría CO1.PCCNTR.2326406 por valor de \$331 millones.



Beneficiarios: 18.301

- **Pavimentación Socorro – Páramo**

Valor: \$15.792 Millones

Estado: En fase III

Avance: Aprobado por el Banco de Proyectos del departamento. Se cuenta con el respectivo SSEPI, Se encuentra en proceso de contratación en la página del Secop II (proceso IT-LP-21-01) (Valor: 14.997.463.123).

Beneficiarios: 34.875

- **Pavimentación acceso a Puerto Wilches**

Valor: \$13.000 Millones

Estado: Se encuentra con el respectivo SSEPI

Avance: Aprobado por el Banco de Proyectos del departamento. Se cuenta con el respectivo SSEPI, Se encuentra en proceso de contratación en la página del Secop II (proceso IT-LP-21-01) (Valor: \$11.753.923.067).

Beneficiarios: 31.510

- **Mejoramiento /pavimentación Guavatá – Vélez**

Valor: \$10.000 Millones

Estado: En estructuración

Avance: En revisión por parte de Regalías Departamental.

Beneficiarios: 22.613

- **Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.**

Valor: \$132.994 millones

Estado: Contratos adjudicados (41) / Viabilizados (4) del departamento.

Avance: La ejecución de los recursos Nación corresponde a los convenios firmados entre INVIAS y 41 municipios. El aporte del territorio corresponde a proyectos aprobados por regalías por \$7.104 millones.

Beneficiarios: 509.138

- **Construcción Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga**

Valor: \$28.773 millones

Estado: Con concepto favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional. En trámite revisión del proyecto por parte del Fondo Regional de Pactos Territoriales en mesas de trabajo conjuntas con DNP, UTS y Gobernación de Santander. Proyecto aprobado por el banco de proyectos del departamento.

Beneficiarios: 528.352

- **Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fase III), Vélez**

Valor: \$14.560 millones

Estado: En estructuración

Avance: En estructuración por parte de las UTS.

Beneficiarios: 18.993

- **Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta**

Valor: \$13.840 millones

Estado: En estructuración

Avance: Se cuenta con diseño arquitectónico, estructural, eléctrico, hidráulico, sanitario y de voz y datos y de suelos al 100%. En revisión y trámite de concepto por parte del MEN.



Beneficiarios: 1.152.665

- **Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander**

- **Valor:** \$101.481 millones (actualizado en valor a \$106.177 millones)

Estado: En trámite de aprobación por parte del FRPT.

Avance: Con concepto favorable del Ministerio de Educación Nacional. Por parte del DNP, se avanza en la gestión del nuevo contrato de mandato entre el DNP y ENTerritorio para la operación por parte del Fondo Regional de Pactos Territoriales.

Beneficiarios: 528.352

- **Ampliación SENA, San Gil**

Valor: \$28.000 millones

Estado: Convenio firmado

Avance: Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social valor del convenio \$13.000 millones, el cual se encuentra en avance de estudios y diseños.

Beneficiarios: 45.605

- **Terminación hospital, Mogotes**

Valor: \$5.000 millones

Estado: En estructuración

Avance: El documento de ajuste fue enviado al Ministerio de Salud, revisado y devuelto con observaciones, a la fecha la Secretaría de Salud Departamental realizó los ajustes en atención a los requerimientos del Ministerio con el fin y se radica a inicios de septiembre de 2021.

Beneficiarios: 10.885

- **Construcción hospital, San Andrés**

Valor: \$8.000 millones

Estado: En contratación

Avance: Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los documentos medico arquitectónico para los Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02).

Beneficiarios: 8.432

- **Construcción hospital Barbosa**

Valor: \$10.000 millones

Estado: En contratación.

Avance: Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los documentos medico arquitectónico para los Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02).

Beneficiarios: 28.873

- **Construcción hospital, Suaita**

Valor: \$8.000 millones

Estado: En contratación

Avance: Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los documentos medico arquitectónico para los Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02).



Beneficiarios: 10.212

- **Centro de alto rendimiento en altura, Tona**

Valor: \$80.000 millones

Estado: Sin avance

Avance: En revisión propuesta de cambio de esta iniciativa con la inclusión del proyecto Plan Maestro de la Villa Deportiva de Bucaramanga, la cual se encuentra en proceso de estudios y diseños por parte del departamento.

Beneficiarios: 7.129

- **Construcción de la villa olímpica, Oiba**

Valor: \$5.000 millones

Estado: En ejecución

Avance: Convenio realizado con el municipio convenio N°1480 de 2021 por un valor de \$4.998.543.093. Proceso No. IT-CD-21-005

Beneficiarios: 11.815

- **Construcción de la villa olímpica, Matanza**

Valor: \$5.000 millones

Estado: En ejecución

Avance: Convenio realizado con el municipio de Matanza Convenio CO1.PCCNTR.2606912 N°1663 de 2021 por un valor de \$4.999.352.989,59.

Beneficiarios: 5.238

- **Construcción del Malecón, Barrancabermeja**

Valor: \$64.737 millones

Estado: En estructuración.

Avance: En estructuración por parte del distrito de Barrancabermeja. Se disponen de los estudios y diseños en fase 3 por componentes y fuentes de financiación (Fontur, Cormagdalen, Ecopetrol, Gobernación y Distrito Barrancabermeja).

Beneficiarios: 191.704

- **Parque Agroturístico para la investigación, transformación y comercialización del Cacao**

Valor: \$140.023 millones

Estado: En estructuración

Avance: Proyecto radicado en el Viceministerio de Turismo el septiembre 7 de 2021, se realizó reunión el 21 de septiembre con el Ministerio para realizar seguimiento, donde se ha planteado precisar el nombre y alcance del proyecto.

Beneficiarios: 5.075

- **Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón**

Valor: \$12.276 millones

Estado: En estructuración

Avance: Se encuentra con el respectivo SSEPI ya tiene aprobación de vigencias futuras por Asamblea Departamental, Se encuentra en proceso de contratación en la página del Secop II Proceso IT-LP-21-05. (Valor: \$8.012.483.684). Se encuentra en proceso la publicación en Secop del proceso para la interventoría

Beneficiarios: 185.248

- **Parque Lineal de la Libertad, Socorro**



Valor: \$5.000 millones

Estado: En estructuración

Avance: En revisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental.

Beneficiarios: 32.577

- **Módulo de integración social barrio El Reposo – Floridablanca**

Valor: \$11.500 millones

Estado: En estructuración

Avance: Se presentará ante la Asamblea Departamental para cambio de este proyecto solicitud realizada por el municipio por el proyecto "Construcción de las obras geotécnicas de prevención, mitigación y estabilización en el sector de la transversal oriental (ASOMIFLOR), fases I, II, III en el municipio de Floridablanca Departamento de Santander" una vez la asamblea lo apruebe, este se presentará el cambio al Consejo Directivo para consideración.

Beneficiarios: 266.102

- **Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja**

Valor: \$10.064 millones

Estado: Viabilizado

Avance: Aprobado por el Banco de Proyectos del Departamento. Se encuentra en proceso de contratación en la página del Secop II, Proceso IT-LP-21-02 (Valor: \$ 9.291.096.387,00).

Beneficiarios: 191.704

- **Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta**

Valor: \$23.000 millones

Estado: En ejecución

Avance: Se firmó convenio con la Empresa municipal de servicios públicos domiciliario de Piedecuesta E.S.P.- Piedecuestana de servicios públicos. Convenio CO1.PCCNTR.2584008. (Valor: 23.139.977.876,00)

Beneficiarios: 152.665

- **Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta**

Valor: \$20.000 millones

Estado: En estructuración

Avance: En proceso la firma del convenio con UNGR.

Beneficiarios: 152.665

- **Construcción fase 2 Plan Maestro Alcantarillado, Charalá**

Valor: \$6.181 millones

Estado: Viabilizado

Avance: Proyecto estructurado y en proceso de aprobación definitiva por parte de MVCT.

Beneficiarios: 10.454

- **Construcción vivienda nueva: (Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratoca, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaita, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia)**

Valor: \$ 71.889 millones

Estado: En ejecución



Avance: Firmó decreto 383 del 5 de agosto de 2021 el Señor Gobernador de Santander para iniciar ejecución de los Municipios de: Aratocha, Villanueva, Onzaga, Gambita, Guadalupe, Valle de San José, Confines y Socorro. Se encuentran aprobados por OCAD No. 89 y 90 de 2020, en proceso de resolución los municipios de Charalá y Suaita, solicitaron prórroga para contratar los municipios de Barbosa y Oiba, terminando licitación San Gil y Curití. El total de viviendas son 180, a cada municipio con construcción de 30 viviendas. Se encuentran en formulación y estructuración proyectos de los municipios: Chima, Guavatá, Guapota, California, Gambita, Paramo, San Miguel, Lebrija, Piedecuesta, Puente Nacional, El Peñón, El Palmar, Betulia, Puerto Wilches, Barichara, San Benito (Mejoramientos). Firmado decreto 383 del 5 de agosto

Beneficiarios: 297.837

- **Mejoramiento vivienda:** (Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos)

Valor: \$12.600 millones

Estado: En ejecución

Avance: Se encuentran en resolución para iniciar ejecución los municipios de El Playón, Chipatá, Capitanejo, Palmas del Socorro, Ocamonte, Carcasí, Coromoro, Encino, Hato, Pinchote.

Ejecutados mejoramientos de vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebrija, Piedecuesta con un total de 54 viviendas.

Beneficiarios: 10.212

- **Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza - Santander**

Valor: \$1.064 millones

Estado: Estructurado.

Avance: Se encuentra en proceso de viabilidad sectorial.

Beneficiarios: 5.238

- **Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.**

Valor: \$50.000 millones

Estado: En estructuración

Avance: El municipio no ha presentado el proyecto para avanzar en los respectivos trámites ante el DNP y el FRPT.

Beneficiarios: 528.352

- **Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Girón.**

Valor: \$15.500 millones

Estado: En estructuración.

Avance: Se encuentra en gestión los trámites entre el DNP, FRPT y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Beneficiarios: 185.248

- **Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga.**

Valor: \$30.000 millones

Estado: En estructuración

Avance: Se encuentra en gestión los trámites entre el DNP, FRPT y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Beneficiarios: 19.884

- **Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Bucaramanga.**

Valor: \$15.000 millones



Estado: En estructuración

Avance: El municipio no ha presentado el proyecto para avanzar en los respectivos trámites ante el DNP y el FRPT.

Beneficiarios: 528.352

- **Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.**

Valor: \$15.000 millones

Estado: En estructuración

Avance: Se encuentra en gestión los trámites entre el DNP y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Beneficiarios: 185.248

- **Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación San Gil**

Valor: \$12.000 millones

Estado: En estructuración

Avance: Se encuentra en gestión los trámites entre el DNP y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Beneficiarios: 45.605

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	1	-	-	1
Ambiente y Desarrollo Sostenible	6	-	-	6
Comercio Industria y Turismo	3	-	-	3
Deporte y Recreación	4	-	2	2
Educación	5	-	1	4
Interior	1	-	-	1
Salud y Protección Social	5	-	-	5
Transporte	15	-	7	8
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	3	-	1	2
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	4	-	2	2
Total, general	47	-	13	34

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$140.093	\$140.093	100%	\$0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$137.500	\$0	0%	\$137.500	100%
Comercio Industria y Turismo	\$82.013	\$34.963	43%	\$47.050	57%
Deporte y Recreación	\$100.000	\$20.000	20%	\$80.000	80%
Educación	\$186.654	\$63.481	34%	\$123.173	66%
Interior	\$1.064	\$0	0%	\$1.064	100%



Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$56.000	100%	\$0	0%
Transporte	\$1.085.775	\$141.568	13%	\$944.207	87%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$49.181	\$49.181	100%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$106.053	\$106.053	100%	\$0	0%
TOTAL	\$1.944.333	\$611.340	31%	\$1.332.993	69%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2021



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2020 – 2025 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$140.093	\$0	0%	\$0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$137.500	\$0	0%	\$0	0%
Comercio Industria y Turismo	\$82.013	\$0	0%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$100.000	\$0	0%	\$9.998	10%
Educación	\$186.654	\$0	0%	\$13.000	7%
Interior	\$1.064	\$0	0%	\$0	0%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$1.085.775	\$0	0%	\$615.672	57%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$49.181	\$0	0%	\$21.792	44%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$106.053	\$0	0%	\$33.295	31%
TOTAL	\$1.944.333	\$0	0%	\$693.757	35,7%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.



(2021)

(2020-2025)

%Avance 11,71%



Avance Acumulado 3,23%



Fecha de corte: 30 de septiembre de 2021


*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Conectividad Subregional % Avance: - % Avance Acumulado: -

- Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander.	2172,48	-	-	-		Gris	2.504,98	-	-		Gris	




Infraestructura para el desarrollo económico y social % Avance: 11,71% % Avance Acumulado: 3,23%
Educación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura educativa construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	2	-	-	-		Gris	5,00	-	-		Gris	




SEMÁFORO



Salud % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura hospitalaria construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	5	-	-	-		Gris	5,00	-	-		Gris	


SEMÁFORO



Deporte y recreación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva y al servicio del deporte construida y mejorada en el Marco del Pacto Funcional Santander.	1	-	-	-		Gris	4,00	-	-		Gris	

SEMÁFORO



Turismo % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Funcional Santander.	10	-	-	-		Gris	4,00	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: 11,71% % Avance Acumulado: 3,23%

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Soluciones de vivienda rural y urbanas entregadas en el marco del Pacto Funcional Santander.	1.621	54,00	461,00	11,71%		Rojo	1.671,00	54,00	3,23%		Rojo	30/09/2021
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Funcional Santander.	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS



Conectividad Subregional

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander.	A 30 de septiembre de 2021. Las Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander. Línea base: 2172 km Avance: 0 km. Avance total: 2172 kilómetros que hayan sido intervenidos incluyendo línea base. Descripción del avance: se encuentran en ejecución los siguientes proyectos en ejecución: Pavimentación Troncal Central Norte: obra 1684 de 2020 por \$ 153.012 e interventoría 1912 de 2020 por \$7200 millones. . Pavimentación Transversal Carare: obra 1628 de 2020 por \$81.013 millones e interventoría 1871 de 2020 por \$5.940 millones. . Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional: Recursos Nación: obra 1962 de 2020 por \$3.459 millones, interventoría 1811 de 2020 por \$748 millones. Recursos Territorio: En ejecución estudios y diseños según contrato adjudicado el 25 de enero de 2021 por \$2.353 millones. . Anillo vial Girón – Floridablanca: obra 1968 de 2020 por \$17.485 millones e interventoría 2327 de 2020 por \$1.908 millones. . Pavimentación vía Zapatoaca - Galán – Barichara: Adjudicados estudios y diseños obra por valor de \$2.039 millones (proceso IT-CM-20-04). Interventoría por valor de \$331 millones.. Mejoramiento vías terciarias: Contratos adjudicados (41) / Viabilizados (4) del departamento, la ejecución de los recursos Nación corresponde a los convenios firmados entre INVIAS y 41 municipios. El aporte del territorio corresponde a proyectos aprobados por regalías por \$7.104 millones. Informe suministrado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, la Gobernación de Santander.

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional	En Ejecución	\$6.707	• Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional Valor: \$6.706 millones Estado: En ejecución Avance: En ejecución con recursos Nación a través del INVIAS contrato obra 1962 de 2020 por \$3.459 millones y contrato interventoría 1811 de 2020 por \$748 millones. Recursos Territorio: En ejecución estudios y diseños según contrato adjudicado el 25 de enero de 2021 por \$2.353 millones por parte del departamento. Beneficiarios: 454.923
Mejoramiento anillo vial Girón – Floridablanca	En Ejecución	\$20.000	• Anillo vial Girón – Floridablanca Valor: \$20.000 millones Estado: En ejecución Avance: En ejecución contrato No. LP-DO-SRN-060-202 por \$ \$17.485.276.053,00 Contrato 2327-2020 - CMA-DO-SRN-182-2020 por \$1.908.120.839,00 contrato 1968 de 2020 y contrato interventoría 2327 de 2020. Beneficiarios: 450.351
Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	En Ejecución	\$132.995	• Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria. Valor: \$132.994 millones Estado: Contratos adjudicados (41) / Viabilizados (4) del departamento. Avance: La ejecución de los recursos Nación corresponde a los convenios firmados entre INVIAS y 41 municipios. El aporte del territorio corresponde a proyectos aprobados por regalías por \$7.104 millones. Beneficiarios: 509.138
Pavimentación Transversal Carare	En Ejecución	\$90.000	• Pavimentación Transversal Carare Valor: \$90.000 millones Estado: En ejecución Avance: INVIAS: Contrato obra 1628 de 2020 por \$81.013 millones y contrato interventoría 1871 de 2020 por \$5.940 millones. Beneficiarios: 109.162



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Pavimentación Troncal Central Norte	En Ejecución	\$180.000	• Pavimentación Troncal Central Norte Valor: \$180.000 millones Estado: En ejecución Avance: INVIAS: Contrato obra 1684 de 2020 por \$153.012 y contrato interventoría 1912 de 2020 por \$7200 millones. Beneficiarios: 29.115
Pavimentación vía Curos - Málaga	En Ejecución	\$320.000	• Pavimentación vía Curos – Málaga Valor: \$320.000 millones Estado: Avance: INVIAS: Obra adjudicada el 09/04/2021 (Proceso LP-PT-066-2020). Acta de inicio 29/06/20021. Beneficiarios: 33.129
Pavimentación vía Zapatoca - Galán - Barichara	En Ejecución	\$50.000	• Pavimentación vía Zapatoca - Galán – Barichara. Valor: \$152.281 Millones Estado: En ejecución Avance: Adjudicados estudios y diseños obra CO1.PCCNTR. 2157119 por valor de \$2.039 millones (proceso IT-CM-20-04). Interventoría CO1.PCCNTR.2326406 por valor de \$331 millones. Beneficiarios: 18.301

(Millones de \$COP)

Infraestructura para el desarrollo económico y social

- Educación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura educativa construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	A 30 de septiembre de 2021. Un proyecto en ejecución: Ampliación SENA, San Gil, valor: \$28.000 millones. Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social valor del convenio \$13.000 millones. Dos proyectos viabilizados: Construcción Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga, Valor: \$28.773 millones. En trámite revisión del proyecto por parte del Fondo Regional de Pactos Territoriales en mesas de trabajo conjuntas con DNP, UTS y Gobernación de Santander. Construcción Edificio Facultad de Salud de la UIS, Bucaramanga Valor: \$101.481 millones (actualizado en valor a \$106.177 millones). Con concepto favorable del Ministerio de Educación Nacional. Por parte del DNP, se avanza en la gestión del nuevo contrato de mandato entre el DNP y ENTeriorito para la operación por parte del Fondo Regional de Pactos Territoriales. Los dos proyectos faltantes se encuentran en estructuración. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.

- Salud

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura hospitalaria construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	A 30 de septiembre de 2021. Se encuentran en contratación tres proyectos Construcción hospital San Andrés, Construcción hospital Barbosa, Construcción hospital, Suaita: Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los documentos medico arquitectónico para los Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02). Hospital de Mogotes: El documento de ajuste fue enviado al



Indicador	Avance Cualitativo
	Ministerio de Salud, revisado y devuelto con observaciones, a la fecha la Secretaría de Salud Departamental realizó los ajustes en atención a los requerimientos del Ministerio con el fin y se radico a inicios de septiembre de 2021.

- Deporte y recreación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura deportiva y al servicio del deporte construida y mejorada en el Marco del Pacto Funcional Santander.	A 30 de septiembre de 2021. Se encuentran en ejecución: Construcción Villa Olímpica de Oiba: Convenio realizado con el municipio convenio N°1480 de 2021 por un valor de \$4.998.543.093. Proceso No. IT-CD-21-005. Villa Olímpica de Matanza: Convenio realizado con el municipio de Matanza Convenio CO1.PCCNTR.2606912 N°1663 de 2021 por un valor de \$4.999.352.989,59. En estructuración demás proyectos. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.

- Turismo

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Funcional Santander.	A 30 de septiembre de 2021. Se encuentran en estructuración los proyectos. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
Soluciones de vivienda rural y urbanas entregadas en el marco del Pacto Funcional Santander.	A 30 de septiembre de 2021: Construcción de Vivienda: Se firmó decreto 383 del 5 de agosto de 2021 el Señor Gobernador de Santander para iniciar ejecución de los Municipios de: Aratoca, Villanueva, Onzaga, Gambita, Guadalupe, Valle de San José, Confines y Socorro. Se encuentran aprobados por OCAD No. 89 y 90 de 2020, en proceso de resolución los municipios de Charalá y Suaita, solicitaron prórroga para contratar los municipios de Barbosa y Oiba, terminando licitación San Gil y Curití. El total de viviendas son 180, a cada municipio con construcción de 30 viviendas. Se encuentran en formulación y estructuración proyectos de los municipios: Chima, Guavatá, Guapota, California, Gambita, Paramo, San Miguel, Lebrija, Piedecuesta, Puente Nacional, El Peñón, El Palmar, Betulia, Puerto Wilches, Barichara, San Benito (Mejoramientos). Firmado decreto 383 del 5 de agosto. Y en Mejoramiento de Vivienda: Se encuentran en resolución para iniciar ejecución los municipios de El Playón, Chipatá, Capitanejo, Palmas del Socorro, Ocamonte, Carcasí, Coromoro, Encino, Hato, Pinchote. Ejecutados mejoramientos de vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebrija, Piedecuesta con un total de 54 viviendas.
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Funcional Santander.	A 30 de septiembre de 2021. Se encuentra en ejecución el proyecto: Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta: Se firmó convenio con la Empresa municipal de servicios públicos domiciliario de Piedecuesta E.S.P.- Piedecuestana de servicios públicos. Convenio CO1.PCCNTR.2584008. (Valor: 23.139.977.876,00). Viabilizado el Proyecto Construcción fase 2 Plan Maestro Alcantarillado, Charalá En estructuración los demás proyectos. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.



Sector	Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Deporte y Recreación	Construcción de la villa olímpica, Matanza	En Ejecución	\$5,000	• Construcción de la villa olímpica, Matanza Valor: \$5.000 millones Estado: En ejecución Avance: Convenio realizado con el municipio de Matanza Convenio CO1.PCCNTR.2606912 N°1663 de 2021 por un valor de \$4.999.352.989,59. Beneficiarios: 5.238
Deporte y Recreación	Construcción de la villa olímpica, Oiba	En Ejecución	\$5,000	• Construcción de la villa olímpica, Oiba Valor: \$5.000 millones Estado: En ejecución Avance: Convenio realizado con el municipio convenio N°1480 de 2021 por un valor de \$4.998.543.093. Proceso No. IT-CD-21-005 Beneficiarios: 11.815
Educación	Ampliación SENA, San Gil	En Ejecución	\$20,500	• Ampliación SENA, San Gil Valor: \$28.000 millones Estado: Convenio firmado Avance: Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social valor del convenio \$13.000 millones, el cual se encuentra en avance de estudios y diseños. Beneficiarios: 45.605
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta	En Ejecución	\$23,000	• Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta Valor: \$23.000 millones Estado: En ejecución Avance: Se firmó convenio con la Empresa municipal de servicios públicos domiciliario de Piedecuesta E.S.P.- Piedecuestana de servicios públicos. Convenio CO1.PCCNTR.2584008. (Valor: 23.139.977.876,00) Beneficiarios: 152.665
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Construcción vivienda nueva, Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratoca, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaita, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia	En Ejecución	\$26,322	• Construcción vivienda nueva: (Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratoca, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaita, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia) Valor: \$ 71.889 millones Estado: En ejecución Avance: Firmó decreto 383 del 5 de agosto de 2021 el Señor Gobernador de Santander para iniciar ejecución de los Municipios de: Aratoca, Villanueva, Onzaga, Gambita, Guadalupe, Valle de San José, Confines y Socorro. Se encuentran aprobados por OCAD No. 89 y 90 de 2020, en proceso de resolución los municipios de Charalá y Suaita, solicitaron prórroga para contratar los municipios de Barbosa y Oiba, terminando licitación San Gil y Curití. El total de viviendas son 180, a cada municipio con construcción de 30 viviendas. Se encuentran en formulación y estructuración proyectos de los municipios: Chima, Guavatá, Guapota, California, Gambita, Paramo, San Miguel, Lebrija, Piedecuesta, Puente Nacional, El Peñón, El Palmar, Betulia, Puerto Wilches, Barichara, San Benito (Mejoramientos). Firmado decreto 383 del 5 de agosto Beneficiarios: 297.837



Sector	Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Mejoramiento vivienda, Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos	En Ejecución	\$9,282	<ul style="list-style-type: none">Mejoramiento vivienda: (Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos) Valor: \$12.600 millones Estado: En ejecución Avance: Se encuentran en resolución para iniciar ejecución los municipios de El Playón, Chipatá, Capitanejo, Palmas del Socorro, Ocamonte, Carcasí, Coromoro, Encino, Hato, Pinchote. Ejecutados mejoramientos de vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebrija, Piedecuesta con un total de 54 viviendas. Beneficiarios: 10.212

(Millones de \$COP)



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL
PACTO FUNCIONAL SANTANDER

PÁGINA: 18 de 18

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de la presente ficha no hay proyectos cofinanciados por DNP.
