



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
12/04/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/03/2021**1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA**

**Objeto:** El Pacto Funcional Santander tiene como objetivo consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo económico y social.

**Líneas Temáticas:**

- Conectividad subregional.
- Infraestructura para el desarrollo económico y social.

**TEMAS ESTRATEGICOS**

- El Plan Estratégico de Inversiones fue ajustado por el Consejo Directivo N° 2 celebrado el 5 de marzo de 2021, incluyendo los estudios y diseños del proyecto Pavimentación vía Zapatocha Galán Barichara, así como la inclusión del proyecto Pavimentación Corredor Onzaga San Joaquín Mogotes, para un total de 40 iniciativas con valor indicativo de \$1.805.526.950.206.

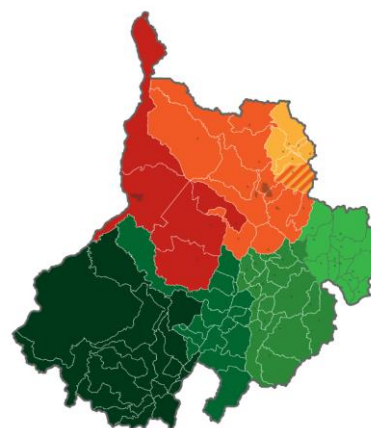
- Compromisos instancias administración:

En la sesión N° 2 del Consejo Directivo, se estableció el siguiente compromiso: Realizar seguimiento a los proyectos de Centro de Alto Rendimiento y Terminación Hospital Mogotes.

Avance: Se está avanzando por parte de Indersantander en la estructuración de los proyectos que se encuentran incluidos en la propuesta para ser presentada en la próxima sesión del Consejo Directivo.

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

- **Pavimentación vía Curos – Málaga**  
Estado: En proceso de licitación  
Avance: Se recibieron las ofertas para la respectiva adjudicación.
- **Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional**  
Estado: En ejecución  
Avance: Recursos Nación: contrato obra 1962 de 2020 y contrato interventoría 1811 de 2020  
Recursos Territorio: Adjudicados recursos por \$2352.772.800 para adelantar los estudios y diseños del Anillo Vial Externo Piedecuesta – Girón y la Circunvalar de Menzuly.
- **Pavimentación Troncal Central Norte**  
Estado: En ejecución

**Área de Intervención: Pacto Santander**

<b>Departamento:</b>	<b>Santander</b>
<b>No. de Municipios en el Pacto Territorial:</b>	(7 provincias y 80 municipios)
<b>Fecha de suscripción:</b>	31/10/2020
<b>Fecha de terminación:</b>	31/10/2025
<b>Plazo:</b>	5 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$ 1.805.769 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$ 1.194.429 (66%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$ 611.340 (34%)



Avance: Contrato obra 1684 de 2020 y contrato interventoría 1912 de 2020.

- **Pavimentación Transversal Carare**

Estado: En ejecución

Avance: Contrato obra 1628 de 2020 y contrato interventoría 1871 de 2020.

- **Anillo vial Girón – Floridablanca**

Estado: En ejecución

Avance: Contrato 1968 de 2020 y contrato interventoría 2327 de 2020

- **Pavimentación Socorro – Páramo**

Estado: En fase III

Avance: Aprobado por el Banco de Proyectos del Departamento. Se cuenta con el respectivo SSEPI y en proceso de avance con la Secretaría de Hacienda Dptal.

- **Pavimentación acceso a Puerto Wilches**

Estado: En fase III

Avance: Aprobado por el Banco de Proyectos del Departamento. Se cuenta con el respectivo SSEPI y en proceso de avance con la Secretaría de Hacienda Dptal.

- **Mejoramiento /pavimentación Guavatá – Vélez**

Estado: En estructuración

Avance: En revisión por parte de la Secretaría de Infraestructura.

- **Mejoramiento vías terciarias**

Estado: Contratos adjudicados (41) / Viabilizados (4) del departamento.

Avance: La ejecución de los recursos Nación corresponde a los convenios firmados entre INVIAS y 41 municipios. La del aporte del territorio corresponde a proyectos aprobados por regalías por \$7.104 millones, así:

Lebrija: \$1.000 millones.

Matanza: \$886 millones.

San Gil: \$2.373 millones.

Oiba: \$2.845 millones.

- **Construcción Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga**

Estado: Viabilizado. En trámite de distribución de recursos por parte del DNP al Ministerio de Educación.

Avance: 28 de enero: Reunión UTS, Fondo Regional de Pactos Territoriales y DNP para revisar los ajustes presentados por UTS en enero.

29 de enero: Emisión de ajustes por parte del Ministerio de Educación Nacional.

9 de febrero: Presentación del proyecto ajustado por parte de las UTS. En trámite de concepto favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional para avanzar en el trámite de distribución entre el DNP y Ministerio de Educación.

#### Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$ 331.937 (18,4%)
Compromiso Nación	\$ 310.675
Compromiso Territorio	\$ 21.262

Proyectos en ejecución	\$ 331.937 (9 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



19 de marzo de 2021: Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional.

24 de marzo: Inició trámite de distribución de recursos del DNP al Ministerio de Educación Nacional.

- **Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fase III), Vélez**  
Estado: En estructuración  
Avance: En estructuración por parte de las UTS. Se estima tener el proyecto estructurado para el mes de abril de 2021.

- **Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta**  
Estado: En estructuración  
Avance: La última semana de enero se contó con las respectivas escrituras a nombre la UTS cedida por la Alcaldía de Piedecuesta.  
Se cuenta con diseño arquitectónico, estructural, Eléctrico, Hidráulico, sanitario y de voz y datos y de suelos al 100%.  
Se estima presentar el proyecto al MEN en el mes de abril de 2021.

- **Construcción Edificio Facultad de Salud de la UIS, Bucaramanga**  
Estado: Viabilizado.  
Avance: Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. En trámite ante el Fondo Regional de Pactos Territoriales para la respectiva asignación de recursos por parte del DNP.

- **Ampliación SENA, San Gil**  
Estado: Convenio firmado  
Avance: Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social, la cual incluye estudios y diseños fase 3 del proyecto.

- **Terminación hospital, Mogotes**  
Estado: En estructuración  
Avance: Se está elaborando el documento de ajuste para presentar al Ministerio de Salud y Protección Social. Actualmente se encuentra suspendida la primera fase con un avance del 25%.

- **Construcción hospital, San Andrés**  
Estado: En estructuración  
Avance: Se inició estructuración a través de consultoría que será por el departamento a partir del mes de febrero. Se estima tener los proyectos estructurados en julio de 2021.

- **Construcción hospital Barbosa**  
Estado: En estructuración  
Avance: Se inició estructuración a través de consultoría que será por el departamento a partir del mes de febrero.



Se estima tener los proyectos estructurados en julio de 2021.

- **Construcción hospital, Suaita**  
Estado: En estructuración  
Avance: Se inició estructuración a través de consultoría que será por el departamento a partir del mes de febrero. Se estima tener los proyectos estructurados en julio de 2021.
- **Centro de alto rendimiento en altura, Tona**  
Estado: En estructuración  
Avance: En proceso de licitación por parte del departamento según documento IT-CM-20-08 por valor de \$1.730.081.500. Tiempo: 5 meses.
- **Construcción de la villa olímpica, Oiba**  
Estado: En estructuración  
Avance: En estructuración por parte del departamento. Se radicó en la Secretaría de Infraestructura Departamental. Actualmente en revisión.
- **Construcción del Malecón, Barrancabermeja**  
Estado: En estructuración  
Avance: En estructuración por parte del municipio de Barrancabermeja. Se estima disponer de los estudios y diseños en el mes de abril de 2021.
- **Parque Agroturístico para la investigación, transformación y comercialización del Cacao**  
Estado: En estructuración  
Avance: En etapa de factibilidad prevista para ser entregada en el mes de abril de 2021 y realizar la respectiva compra de predios en julio de 2021.
- **Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón**  
Estado: En estructuración  
Avance: En estructuración, se radicó en el Banco de Proyectos del departamento el 1 de marzo y se encuentra en evaluación.
- **Parque Lineal de la Libertad, Socorro**  
Estado: En estructuración  
Avance: En estructuración por parte del municipio de Socorro. Se estima radicación en el mes de abril de 2021.
- **Módulo de integración social barrio El Reposo – Floridablanca**  
Estado: En estructuración  
Avance: En estructuración por parte del municipio de Floridablanca. Se tiene previsto entrega de ajustes a observaciones del departamento en el mes de abril de 2021.
- **Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja**  
Estado: Viabilizado



Avance: Aprobado por el Banco de Proyectos del Departamento.

- **Construcción vivienda nueva, Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratocha, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaita, Piedecuesta, Lebríja, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia**

Estado: En estructuración

Avance: En estructuración por parte del departamento. En ejecución construcción de vivienda de los Municipios de: Charalá, Suaita, Barbosa, Oiba, San Gil y Curití

- **Mejoramiento vivienda, Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebríja, Piedecuesta, Los Santos**

Estado: En estructuración

Avance: En estructuración por parte del departamento. En ejecución mejoramiento de vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebríja, Piedecuesta

- **Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta**

Estado: En estructuración

Avance: Presentado a planeación departamental a la espera de SSEPI.

- **Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta**

Estado: En estructuración

Avance: Presentado a la Secretaría de Planeación Departamental, en proceso de emisión de SSEPI.

- **Construcción fase 2 Plan Maestro Alcantarillado, Charalá**

Estado: En estructuración

Avance: Proyecto estructurado y en proceso de aprobación definitiva por parte de MVCT.

## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Comercio Industria y Turismo	5	-	-	5
Deporte y Recreación	3	-	-	3
Educación	5	-	1	4
Salud y Protección Social	5	-	-	5
Transporte	15	-	6	9



Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Vivienda Ciudad y Territorio o Agua	3	-	-	3
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	4	-	2	2
<b>Total, general</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>31</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

### 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Comercio Industria y Turismo	\$227.106	\$180.056	79%	\$47.050	21%
Deporte y Recreación	\$95.000	\$15.000	16%	\$80.000	84%
Educación	\$186.654	\$63.481	34%	\$123.173	66%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$56.000	100%	\$0	0%
Transporte	\$1.085.775	\$141.568	13%	\$944.207	87%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$49.181	\$49.181	100%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$106.053	\$106.053	100%	\$0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.805.769</b>	<b>\$611.340</b>	<b>34%</b>	<b>\$1.194.429</b>	<b>66%</b>

### 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2021



18,4%

#### EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

#### Total, Ejecución 2020 – 2025 (Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Comercio Industria y Turismo	\$227.106	\$0	0%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$95.000	\$0	0%	\$0	0%
Educación	\$186.654	\$0	0%	\$13.000	7%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$1.085.775	\$0	0%	\$307.277	28%



Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	\$49.181	\$0	0%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$106.053	\$0	0%	\$11.660	11%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.805.769</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	<b>\$331.937</b>	<b>18,4%</b>

### 3. PRINCIPALES AVANCES POR LÍNEA TEMÁTICA Y SECTOR

#### 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN- INDICADORES ESTRATÉGICOS\*

\*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en revisión técnica por parte de la DSEEP del DNP, las cuales una vez avaladas y aprobadas por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederán a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.

Principales avances de proyectos por línea temática y sector:



#### Línea temática 1

#### • Conectividad Subregional.

Sector	Avances
Transporte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pavimentación vía Zapatoca - Galán – Barichara.</b> Adjudicados estudios y diseños según proceso IT-CM-20-04 por \$2.039.260.160, por parte del departamento (21 de enero de 2021). Tiempo: 8 meses. El 1 de febrero se adelantó visita de inspección y reconocimiento a todo el Corredor: Gobernación, DNP – Pacto Funcional Santander, Alcaldes de Barichara, Galán, Zapatoca y Cabrera, Personerías y firma contratista.</li> <li>• <b>Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional</b> Estado: En ejecución Avance: Recursos Nación: contrato obra 1962 de 2020 y contrato interventoría 1811 de 2020 Recursos Territorio: En ejecución recursos por \$2352.772.800. para adelantar los estudios y diseños del Anillo Vial Externo Piedecuesta – Girón y la Circunvalar de Menzuly,</li> <li>• <b>Pavimentación Troncal Central Norte</b> Estado: En ejecución Avance: Contrato obra 1684 de 2020 y contrato interventoría 1912 de 2020.</li> <li>• <b>Pavimentación Transversal Carare</b> Estado: En ejecución Avance: Contrato obra 1628 de 2020 y contrato interventoría 1871 de 2020.</li> <li>• <b>Anillo vial Girón – Floridablanca</b></li> </ul>



Sector	Avances
	<p><b>Estado:</b> En ejecución</p> <p><b>Avance:</b> Contrato 1968 de 2020 y contrato interventoría 2327 de 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mejoramiento vías terciarias</b></li> </ul> <p><b>Estado:</b> Contratos adjudicados (41) / Viabilizados (4) del departamento.</p> <p><b>Avance:</b> La ejecución de los recursos Nación corresponde a los convenios firmados entre INVIAS y 41 municipios. La del aporte del territorio corresponde a proyectos aprobados por regalías por \$7.104 millones, así:</p> <p>Lebrija: \$1.000 millones. Matanza: \$886 millones. San Gil: \$2.373 millones. Oiba: \$2.845 millones.</p>



## Línea temática2

- **Infraestructura para el desarrollo económico y social.**

Sector	Avances
Comercio, Industria y Turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>
Deporte y Recreación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>
Educación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ampliación SENA, San Gil.</b> Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social, la cual incluye estudios y diseños fase 3 del proyecto.</li> <li>•</li> </ul>
Salud y Protección Social	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>
Vivienda, Ciudad y Territorio - Agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>
Vivienda, Ciudad y Territorio - Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Construcción vivienda nueva, Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratoca, California, Matanza, Rio-negro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Gua-potá, Suaita, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia.</b> En estructuración por parte del departamento. En ejecución construcción de vivienda de los Municipios de: Charalá, Suaita, Barbosa, Oiba, San Gil y Curití.</li> </ul>





Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mejoramiento vivienda, Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos.</b> En estructuración por parte del departamento. En ejecución mejoramiento de vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebrija, Piedecuesta</li></ul>



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

FICHA TRIMESTRAL  
PACTO TERRITORIAL SANTANDER

PÁGINA: 10 de 10

4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:** Al corte de la presente ficha no hay proyectos cofinanciados por DNP.
