



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
18/04/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/03/2022

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** El Pacto Funcional Santander tiene como objetivo consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo económico y social.

**Líneas Temáticas:**

- Conectividad subregional.
- Infraestructura para el desarrollo económico y social.

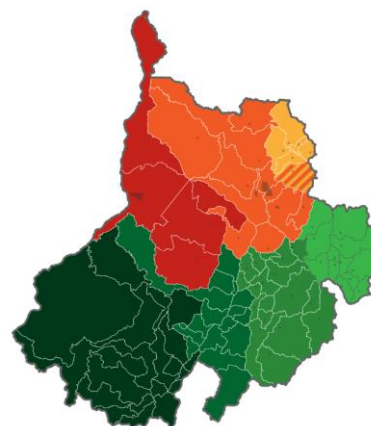
**TEMAS ESTRATEGICOS**

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión extraordinaria No 4, realizada el 09 de noviembre de 2021, se priorizan un total de 47, dichas iniciativas tienen un valor indicativo de \$1.944.333.134.006, de los cuales \$1.392.993.223.913 son aporte indicativo de la Nación y \$551.339.915.093 del territorio.

## ➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Funcional Santander generaría cerca de 14.000 empleos directos, 24.000 indirectos.

Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a más de 2 millones de habitantes de las diferentes provincias, sin contar el beneficio generado a población flotante o exógena que llega o transita por los territorios y que se benefician de las obras de conectividad vial principalmente.

**Área de Intervención: Pacto Santander**

<b>Departamento:</b>	<b>Santander</b>
<b>No. de Municipios en el Pacto Territorial:</b>	(7 provincias y 80 municipios)
<b>Fecha de suscripción:</b>	31/10/2020
<b>Fecha de terminación:</b>	31/10/2025
<b>Plazo:</b>	5 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$1.944.333 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$1.392.993 (72%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$551.340 (28%)

**Avance financiero (Millones)**

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$1.409.993 (72,5%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$1.086.502
<b>Compromiso Territorio y otros</b>	\$ 323.491

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$1.409.993 (24 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.	En Gestión	\$0	• Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga. Valor: \$56.830 millones (DNP: \$46.830 millones; Municipio: \$10.000 millones). Estado: Viabilizado. Avance: En proceso de estructuración de minuta de contrato específico por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. Beneficiarios: 528.352
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Girón.	En Gestión	\$0	• Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Girón. Valor: \$15.225 millones Estado: Vaibilizado. Avance: En proceso de estructuración de minuta de contrato específico por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales Beneficiarios: 185.248
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga.	En Gestión	\$0	• Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga. Valor: \$29.731 millones Estado: viabilizado Avance: En proceso de estructuración de minuta de contrato específico por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. Beneficiarios: 19.884
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación San Gil.	En Gestión	\$0	• Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación San Gil Valor: \$12.000 millones Estado: En estructuración Avance: En trámite de revisión por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. Beneficiarios: 45.605
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Bucaramanga.	En Ejecución	\$14.554	• Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Bucaramanga. Valor: \$14.553 millones Estado: En ejecución Avance: Se firmó contrato específico No. 2210947 el 13 de enero de 2022, por un valor de \$ 14.553.552.351, aporte del DNP, por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales. Beneficiarios: 528.352
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	En Gestión	\$0	• Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón. Valor: \$14.757 millones Estado: En estructuración Avance: En trámite de aprobación por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. Beneficiarios: 185.248
Construcción de Infraestructura Agroturística y Náutica en el Departamento de Santander	En Gestión	\$0	• Construcción de Infraestructura Agroturística y Náutica en el Departamento de Santander Valor: \$140.093 millones Estado: En proceso de viabilidad. Avance: 7 septiembre: Presentación por parte del departamento al Viceministerio de turismo, el proyecto para viabilidad sectorial. 6 octubre: Celebración comité técnico N° 3 del Pacto Funcional Santander, donde se avaló el cambio de nombre y sector del proyecto para ser presentado al Consejo Directivo N° 4. 11 octubre: Emisión de observaciones al proyecto por parte del Viceministerio de Turismo. 29 octubre: Legalización de las escrituras del predio a nombre del departamento. 29 octubre: Presentación proyecto subsanado por parte del departamento, al Viceministerio de Turismo. 22 de noviembre: Radicación del proyecto ante el Inviás para concepto sectorial sobre el componente de infraestructura vial que contiene el proyecto (2 kms de vía terciaria a ser pavimentada). 26 de



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			<p>noviembre: Se adelantó mesa de trabajo Viceministerio de Turismo, DNP, ENTerritorio y departamento de Santander para revisión del estado de avance del proyecto. 9 y 10 de diciembre: Se realizó visita de inspección por parte del Viceministerio de Turismo para el respectivo proceso de viabilidad sectorial. 15 de diciembre: Mesa de trabajo DNP, ENTerritorio, Gobernación y Viceministerio de Turismo para revisar el proyecto de acuerdo con la lista de verificación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 20 de diciembre: Entrega por parte del departamento, de las subsanaciones recomendadas 15 y 16 de febrero: Se adelantó mesa de trabajo Viceministerio de Turismo, DNP, ENTerritorio y departamento de Santander para revisión del estado de avance del proyecto, se revisaron aspectos técnicos, documentales, del proyecto se generaron observaciones al proyecto, se aclaró el alcance del proyecto. En el trámite de las subsanaciones, el departamento ha manifestado que requiere precisar con la firma consultora UG21, responsable de los estudios y diseños, el alcance de especificaciones técnicas planteadas en el proyecto y que presentan observaciones por parte de Cotecmar, entidad consultada por el departamento para la revisión del producto de consultoría entregado por UG21. En el componente de lado tierra (equipamiento y edificaciones) y lado agua (componente de la marina), el departamento informó al DNP que esta situación ha generado el retraso en la entrega de las subsanaciones finales, hasta no tener la claridad necesaria que garantice un proyecto viable técnica y financieramente. Beneficiarios: 5.075</p>
Construcción del Malecón, Barrancabermeja	En Ejecución	\$45.561	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construcción del Malecón, Barrancabermeja Valor: \$64.737 millones Estado: En ejecución. Avance: En ejecución convenio de asociación No.3044720 el 12 de noviembre de 2021, entre Ecopetrol y el Municipio de Bucaramanga por un valor de \$24.660.234.618 Beneficiarios: 191.704</li> </ul>
Parque Lineal de la Libertad, Socorro	En Gestión	\$0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Lineal de la Libertad, Socorro Valor: \$5.000 millones Estado: En estructuración Avance: En revisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental. Beneficiarios: 32.577</li> </ul>
Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón	En Ejecución	\$12.276	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón Valor: \$12.276 millones Estado: En Ejecución Avance: Aporte territorio, se firmó contrato de obra No. 2882297 con el Consorcio Arte y Cultura Girón el 31/12/2021 por un valor de \$8.011.241.428 y contrato de interventoría No. 11718383-4343 con el Consorcio Interparques Girón el 31/12/2021 por un valor de \$551.000.000,00 Beneficiarios: 185.248</li> </ul>
Centro de alto rendimiento en altura, Tona	En Gestión	\$0	<p>Centro de alto rendimiento en altura, Tona Valor: \$80.000 millones Estado: Sin avance Avance: En revisión propuesta de cambio de esta iniciativa con la inclusión del proyecto Plan Maestro de la Villa Deportiva de Bucaramanga, la cual se encuentra en</p>



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			proceso de estudios y diseños por parte del departamento. Beneficiarios: 7.129
Construcción de la villa olímpica, Matanza	En Ejecución	\$5.000	Construcción de la villa olímpica, Matanza Valor: \$5.000 millones Estado: En ejecución Avance: Convenio realizado con el municipio de Matanza Convenio CO1.PCCNTR.2606912 N°1663 de 2021 por un valor de \$4.999.352.989,59. Beneficiarios: 5.238
Construcción de la villa olímpica, Oiba	En Ejecución	\$5.000	• Construcción de la villa olímpica, Oiba Valor: \$5.000 millones Estado: En ejecución Avance: Avance: 5% Convenio realizado con el municipio convenio N°1480 de 2021 por un valor de \$4.998.543.093. Proceso No. IT-CD-21-005. Beneficiarios: 11.815
Sede administrativa Indersantander, Bucaramanga	En Gestión	\$0	Sede administrativa Indersantander, Bucaramanga Valor: \$10.000 millones Estado: En estructuración Avance: En estructuración, Plan de Acción 2022. Beneficiarios: 528.352
Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fase III), Vélez	En Gestión	\$0	• Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fase III), Vélez Valor: \$14.560 millones Estado: En estructuración Avance: Continúa en estructuración por parte de las UTS. Se estima tener el proyecto estructurado para finales de abril del 2022 y ser presentado al Ministerio de Educación. Beneficiarios: 18.993
Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta	En Gestión	\$0	• Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta Valor: \$13.840 millones Estado: En estructuración Avance: Se cuenta con diseño arquitectónico, estructural, eléctrico, hidráulico, sanitario y de voz y datos y de suelos al 100%. En revisión final y trámite de concepto por parte del MEN. Beneficiarios: 1.152.665
Ampliación SENA, San Gil	En Ejecución	\$13.000	• Ampliación SENA, San Gil Valor: \$28.000 millones Estado: Convenio firmado Avance: Físico: 48% Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social valor del convenio \$13.000 millones, el cual se encuentra en avance de estudios y diseños. Beneficiarios: 45.605
Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.	En Ejecución	\$28.275	• Construcción Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga Valor: \$28.773 millones Estado: En ejecución. Avance: Se firmó contrato específico No. 2210677 el 10 de noviembre del 2021, por un valor de \$28.274.924.970, aporte del DNP, por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, entre la Gobernación de Santander, ENTerritorio y UTS. Actualmente se encuentra en etapa precontractual. Beneficiarios: 528.352
Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.	En Ejecución	\$114.196	• Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander Valor: \$101.481 millones (actualizado en valor a \$114.196 millones) Estado: En ejecución. Avance: Se firmó contrato específico No. 2210733 el 10 de noviembre del 2021, entre el departamento de Santander, ENTerritorio y UIS. Por un valor de \$114.196.122.634, de los cuales \$60.000.000.000 son



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			aporte del DNP por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, \$18.005.575.267 serán aportados con recursos de la Universidad Industrial de Santander y \$36.190.547.367 serán aportados con recursos del Departamento de Santander. Este contrato se encuentra en la actualidad en proceso precontractual. Beneficiarios: 528.352
Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.	En Gestión	\$0	Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de Matanza - Santander. Valor: \$1.064 millones Estado: Estructurado. Avance: Continua en proceso de viabilidad sectorial por parte del Ministerio del Interior. En la actualidad el municipio de Matanza esta ajustando los estudios debido a que hace falta el estudio de suelos y esta gestionando con el consultor para completar este incumplimiento.Estructurado. Avance: Se encuentra en proceso de viabilidad sectorial por parte del Ministerio del Interior. Beneficiarios: 5.238
Construcción hospital Barbosa	En Gestión	\$0	Construcción hospital Barbosa Valor: \$10.000 millones Estado: En contratación. Avance: Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los diseños arquitectónicos y los estudios de suelos para los tres Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02). Beneficiarios: 28.873
Construcción hospital, San Andrés	En Gestión	\$0	Construcción hospital, San Andrés Valor: \$8.000 millones Estado: En contratación Avance: Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los diseños arquitectónicos y los estudios de suelos para los tres Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02). Beneficiarios: 8.432
Construcción hospital, Suaita	En Gestión	\$0	Construcción hospital, Suaita Valor: \$8.000 millones Estado: En contratación Avance: Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los diseños arquitectónicos y los estudios de suelos para los tres Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02). Beneficiarios: 10.212
Terminación hospital, Mogotes	En Gestión	\$0	Terminación hospital, Mogotes Valor: \$5.000 millones Estado: En estructuración Avance: En el caso de la terminación la Secretaría de Salud Departamental realizo los ajustes al proyecto en atención a requerimientos del Ministerio de salud y se radicó el 25 de octubre de 2021. El proyecto su primera fase se encuentra suspendida por deficiencia en los estudios y diseños. Beneficiarios: 10.885
Terminación hospital, San Gil	En Gestión	\$0	Terminación hospital San Gil Valor: \$25.000 millones Estado: En estructuración Avance: Su alcance dependerá de las obras faltantes en la fase 1 actualmente en ejecución. Beneficiarios: 45.605
Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional	En Ejecución	\$6.707	• Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional Valor: \$6.706 millones Estado: En ejecución



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			Avance: Físico: 50% Recursos Nación: contrato obra 1962 de 2020 por \$3.459 millones y contrato interventoría 1811 de 2020 por \$748 millones.
Mejoramiento / pavimentación Gámbita - Palermo	En Gestión	\$0	Mejoramiento / pavimentación Gámbita – Palermo Valor: \$10.000 Millones Estado: En estructuración Avance: Se encuentra en estructuración por parte de la Secretaría de Infraestructura previsto para el Plan de Acción 2024. Beneficiarios: 8658
Mejoramiento / rehabilitación Girón - Zapatoca	En Gestión	\$0	Mejoramiento / rehabilitación Girón – Zapatoca Valor: \$15.000 Millones Estado: En estructuración Avance: Se encuentra en estructuración por parte de la Secretaría de Infraestructura previsto para el Plan de Acción 2022. Beneficiarios: 194.139
Mejoramiento /pavimentación Carmen - Yarima	En Gestión	\$0	Mejoramiento /pavimentación Carmen - Yarima Valor: \$20.000 Millones Estado: En estructuración Avance: Se encuentra en estructuración por parte de la Secretaría de Infraestructura previsto para el Plan de Acción 2023. Beneficiarios: 55.055
Mejoramiento /pavimentación Enciso - Carcasí	En Gestión	\$0	Mejoramiento /pavimentación Enciso – Carcasí Valor: \$10.000 Millones Estado: En estructuración Avance: Se encuentra en estructuración por parte de la Secretaría de Infraestructura previsto para el Plan de Acción 2023. Beneficiarios: 8.279
Mejoramiento /pavimentación Guavatá - Vélez	En Ejecución	\$10.000	Mejoramiento /pavimentación Guavatá – Vélez Valor: \$10.000 Millones Estado: En ejecución Avance: Se firmo decreto 505 el 21 de octubre de 2021 por el Gobernador de Santander, con un valor total de \$9.999.994.539, valor obra \$9.324.407.739, valor interventoría \$675.586.800. Beneficiarios: 22.613
Mejoramiento anillo vial Girón – Floridablanca	En Ejecución	\$20.000	Anillo vial Girón – Floridablanca Valor: \$20.000 millones Estado: En ejecución Avance: En ejecución contrato No. LP-DO-SRN-060-202 por \$17.485.276.053,00 Contrato 2327-2020 - CMA-DO-SRN-182-2020 por \$1.908.120.839,00 contrato 1968 de 2020 y contrato interventoría 2327 de 2020. Beneficiarios: 450.351
Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	En Ejecución	\$132.995	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria. Valor: \$132.994 millones Estado: Contratos adjudicados (41) / Viabilizados (4) del departamento Colombia Rural (41) Municipios firmado convenio. Avance: La ejecución de los recursos Nación corresponde a los convenios firmados entre INVIAS y 41 municipios. Colombia Rural: firmados convenio con INVIAS y 41 Municipios valor comprometido: \$48.550 millones. El aporte del territorio corresponde a 13 proyectos aprobados por regalías por \$28.657 millones. Se firmó contrato específico el 12 de noviembre de 2021, entre el DNP por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales y la Gobernación de Santander No. 2210745 por valor de \$29.422.679.762 y se encuentra actualmente en proceso contractual. Beneficiarios: 509.138
Pavimentación acceso a Puerto Wilches	En Ejecución	\$13.000	• Pavimentación acceso a Puerto Wilches Valor: \$11.816 Millones Estado: En ejecución Avance: Recursos territorio, contrato de obra No. 2970 con el Consorcio Corredor Vial, firmado el 16 de febrero de





Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			2022 por un valor de \$11.333.638.835. Se adjudicó interventoría por un valor de \$483.060.227 al consorcio Wilches – Socorro, según resolución de adjudicación N° 23988. En trámite firma del contrato de interventoría. Beneficiarios: 31.510
Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín - Mogotes	En Ejecución	\$90.000	• Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín – Mogotes Valor: \$90.000 Millones Estado: En ejecución Avance: Convenio de firmado el 12 de noviembre de 2021 entre Inviás y departamento de Santander por \$90.000 millones. Se encuentra en etapa precontractual por parte del departamento. Beneficiarios: 17.707
Pavimentación Socorro - Páramo	En Ejecución	\$15.792	• Pavimentación Socorro – Páramo Valor: \$15.792 Millones Estado: En ejecución Avance: Recursos territorio, contrato de obra No. 2972 con el Consorcio vial Santander CGM, firmado el 07 de febrero de 203 por un valor de \$14.438.640.939, pendiente contrato de interventoría Beneficiarios: 34.875
Pavimentación Transversal Carare	En Ejecución	\$90.000	• Pavimentación Transversal Carare Valor: \$90.000 millones Estado: En ejecución Avance: Físico: 3% Contrato obra 1628 de 2020 por \$114.060 millones y contrato interventoría 1871 de 2020 por \$5.940 millones. Beneficiarios: 109.162
Pavimentación Troncal Central Norte	En Ejecución	\$180.000	• Pavimentación Troncal Central Norte Valor: \$173.680 millones Estado: En ejecución Avance: Físico: 18% INVIAS: Contrato obra 1684 de 2020 por \$153.012 millones se adiciono un valor de \$12.468 millones y contrato interventoría 1912 de 2020 por \$7.200 millones. Beneficiarios: 29.115
Pavimentación vía Curos - Málaga	En Ejecución	\$320.000	• Pavimentación vía Curos – Málaga Valor: \$316.125 millones Estado: Ejecución. Avance: Físico: 3% INVIAS: Obra adjudicada el 09/04/2021 al CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 (Proceso LP-DT-066-2020), Contrato 1042 de 2021 inicialmente por \$286.170 millones, se adiciono un valor de \$9.955 millones por valor total \$ 296.125 millones. Acta de inicio 29/06/20021. Interventoría adjudicada el 26 de abril al CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (Proceso CMA-DT-191-2020) Contrato 1002 valor \$ 20.000 millones. Beneficiarios: 33.129
Pavimentación vía Zapatoca - Galán - Barichara	En Ejecución	\$197.936	• Pavimentación vía Zapatoca - Galán – Barichara. Valor: \$152.281 Millones Estado: En ejecución Avance: Finalizados estudios y diseños obra CO1.PCCNTR. 2157119 por valor de \$2.039 millones (proceso IT-CM-20-04). Interventoría CO1.PCCNTR.2326406 por valor de \$331 millones. Viabilizado por INVIAS. Se firmó convenio entre el Inviás y el departamento de Santander el 12 de noviembre de 2021, por \$147.936 millones. Beneficiarios: 18.301
Construcción fase 2 Plan Maestro Alcantarillado, Charalá	En Gestión	\$0	Construcción fase 2 Plan Maestro Alcantarillado, Charalá Valor: \$6.181 millones Estado: Viabilizado Avance: Proyecto estructurado y en proceso de aprobación definitiva por parte de MVCT. Descartado en PA 2021 y PA 2022, ya tiene cierre financiero,



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			actualmente en proceso precontractual. Beneficiarios: 10.454
Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta	En Ejecución	\$25.000	Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta Valor: \$20.000 millones Estado: En ejecución firma del convenio con UNGRD No 9677-PPAL001-1598-2021, el 10 de noviembre de 2021 por un valor de \$25.000.000.000,00 Beneficiarios: 152.665
Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta	En Ejecución	\$25.000	Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta Valor: \$25.000 millones Estado: En ejecución firma del convenio con UNGRD No 9677-PPAL001-1598-2021, el 10 de noviembre de 2021 por un valor de \$25.000.000.000,00 Beneficiarios: 152.665
Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta	En Ejecución	\$23.140	• Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta Valor: \$23.000 millones Estado: En ejecución Avance: Avance físico: 61%. Se firmó convenio con la Empresa municipal de servicios públicos domiciliario de Piedecuesta E.S.P.- Piedecuestana de servicios públicos. Convenio CO1.PCCNTR.2584008. (Valor: 23.139.977.876,00) Beneficiarios: 152.665
Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja	En Gestión	\$10.064	Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja Valor: \$10.064 millones Estado: Viabilizado Avance: Aprobado por el Banco de Proyectos del Departamento. Se encuentra en proceso de contratación en la página del Secop II, Proceso IT-LP-21-02 (Valor: \$ 9.291.096.387,00). Beneficiarios: 191.704
Construcción vivienda nueva, Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratoca, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaita, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia	En Ejecución	\$64.916	• Construcción vivienda nueva: (Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratoca, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaita, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia) Valor: \$ 71.889 millones Estado: En ejecución Avance: A la fecha se encuentran comprometido por un valor \$58.158.593.436 con 18 iniciativas en los siguientes decretos: Acuerdo No 89 de 14 de diciembre de 2020, proyectos de los municipios de: Charala, Suaita, Barbosa, Oiba, San Gil, Curití por \$11.059.915.036. , en proceso de resolución los municipios de Charalá y Suaita, solicitaron prórroga para contratar los municipios de Barbosa y Oiba, terminando licitación San Gil y Curití. El total de viviendas son 180, a cada municipio con construcción de 30 viviendas. Decreto 290 del 30 de junio de 2021 para iniciar la contratación los municipios de: Socorro, Guavatá, Paramo, San Miguel, Lebrija, Piedecuesta, Puente Nacional, El Peñón, El Palmar, Betulia, Puerto Wilches, Barichara, Confines, Valle de San José, Aratoca, Chima, Villa Nueva, Onzaga, Guapota, California, Gambita, Guadalupe, San Benito (Mejoramientos). Por un valor de \$24.627.800.000 Firmó decreto 383 del 5 de agosto de 2021 el Señor Gobernador de Santander para iniciar contratación de los





Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			Municipios de: Aratoca, Villanueva, Onzaga, Gambita, Guadalupe, Valle de San José. Por un valor de \$15.261.600.000. Beneficiarios: 297.837
Mejoramiento vivienda, Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos	En Ejecución	\$22.512	Avance: A la fecha se encuentra comprometido por un valor de \$ 6.973.761.170. Así: En resolución para iniciar ejecución los municipios de El Playón, Chipatá, Capitanejo, Palmas del Socorro, Ocamonte, Carcasí, Coromoro, Encino, Hato, Pinchote. Ejecutados mejoramientos de vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebrija, Piedecuesta con un total de 54 viviendas. Beneficiarios: 10.212
Módulo de integración social barrio El Reposo - Floridablanca	En Ejecución	\$34.600	<ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo de integración social barrio El Reposo – Floridablanca (“Construcción de las obras geotécnicas de prevención, mitigación y estabilización en el sector de la transversal oriental (ASOMIFLOR), fases I, II, III en el municipio de Floridablanca Departamento de Santander”) Valor: \$34.600 millones Estado: En ejecución Avance: Se debe cambiar nombre del proyecto y sector en el próximo CD para su consideración. Se presentó ante la Asamblea Departamental para cambio de este proyecto solicitud realizada por el municipio por el proyecto "Construcción de las obras geotécnicas de prevención, mitigación y estabilización en el sector de la transversal oriental (ASOMIFLOR), fases I, II, III en el municipio de Floridablanca Departamento de Santander" Convenio No. CO1.PCCNTR.1171844-4342 firmado entre el Fondo Nacional de Desastres, Alcaldía de Floridablanca y la Gobernación de Santander el día 31/12/2021 por un valor de \$34.600.000.000,00 Beneficiarios: 266.102</li> </ul>
Módulo de integración social barrio El Reposo - Floridablanca	En Ejecución	\$34.600	<ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo de integración social barrio El Reposo – Floridablanca (“Construcción de las obras geotécnicas de prevención, mitigación y estabilización en el sector de la transversal oriental (ASOMIFLOR), fases I, II, III en el municipio de Floridablanca Departamento de Santander”) Valor: \$34.600 millones Estado: En ejecución Avance: Se debe cambiar nombre del proyecto y sector en el próximo CD para su consideración. Se presentó ante la Asamblea Departamental para cambio de este proyecto solicitud realizada por el municipio por el proyecto "Construcción de las obras geotécnicas de prevención, mitigación y estabilización en el sector de la transversal oriental (ASOMIFLOR), fases</li> </ul>



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			I, II, III en el municipio de Floridablanca Departamento de Santander" Convenio No. CO1.PCCNTR.1171844-4342 firmado entre el Fondo Nacional de Desastres, Alcaldía de Floridablanca y la Gobernación de Santander el día 31/12/2021 por un valor de \$34.600.000.000,00 Beneficiarios: 266.102

Millones de \$COP

## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	6	-	1	5
Comercio Industria y Turismo	4	-	2	2
Deporte y Recreación	4	-	2	2
Educación	5	-	3	2
Interior	1	-	-	1
Salud y Protección Social	5	-	-	5
Transporte	15	-	11	4
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	3	-	2	1
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	4	-	3	1
<b>Total, general</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>23</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

## 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$137.500	\$0	0%	\$137.500	100%
Comercio Industria y Turismo	\$222.106	\$115.056	52%	\$107.050	48%
Deporte y Recreación	\$100.000	\$20.000	20%	\$80.000	80%
Educación	\$186.654	\$63.481	34%	\$123.173	66%
Interior	\$1.064	\$0	0%	\$1.064	100%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$56.000	100%	\$0	0%
Transporte	\$1.085.775	\$141.568	13%	\$944.207	87%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$49.181	\$49.181	100%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$106.053	\$106.053	100%	\$0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.944.333</b>	<b>\$551.340</b>	<b>28%</b>	<b>\$1.392.993</b>	<b>72%</b>



## 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2022

72,5%

## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2020 – 2025  
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$137.500	\$29.311	21%	\$14.554	11%
Comercio Industria y Turismo	\$222.106	\$0	0%	\$54.120	24%
Deporte y Recreación	\$100.000	\$0	0%	\$9.998	10%
Educación	\$186.654	\$88.275	47%	\$155.471	83%
Interior	\$1.064	\$0	0%	\$0	0%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$1.085.775	\$29.423	3%	\$1.021.221	94%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$49.181	\$0	0%	\$48.140	98%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$106.053	\$0	0%	\$106.490	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.944.333</b>	<b>\$147.008</b>	<b>8%</b>	<b>\$1.409.993</b>	<b>72,5%</b>

## 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO FUNCIONAL

## 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2020-2025)

%Avance 8,97%



Avance Acumulado 4,36%



Fecha de corte: 31 de marzo de 2022

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.



### 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

**Conectividad Subregional % Avance: 8,64 % Avance Acumulado: 2,26%**

- Transporte % Avance: 8,64 % Avance Acumulado: 2,26%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander.	2172,48	2.180	2.259,48	8,64%		Rojo	2.504,98	2.180	2,26%		Rojo	31/03/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

**Infraestructura para el desarrollo económico y social % Avance: 9,31% % Avance Acumulado: 6,46%**

Educación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura educativa construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	2	-	-	-		Gris	5,00	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Salud % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura hospitalaria construida y mejorada	5	-	-	-		Gris	5,00	-	-		Gris	



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
en el marco del Pacto Funcional Santander												

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Deporte y recreación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva y al servicio del deporte construida y mejorada en el Marco del Pacto Funcional Santander.	1	-	-	-		Gris	4,00	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Turismo % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Funcional Santander.	10	-	-	-		Gris	4,00	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: 9,31% % Avance Acumulado: 6,46%



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Soluciones de vivienda rural y urbanas entregadas en el marco del Pacto Funcional Santander.	1.621	54	580	9,31%		Rojo	1.671	108	6,46%		Rojo	31/03/2022
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Funcional Santander.	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	

## SEMÁFORO



&lt;60%

≥80%

## 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

## Conectividad Subregional

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander.	A 31 de marzo de 2022. Las Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander. Línea base: 2172 km Avance: 6 km. Avance total: 2180 kilómetros que hayan sido intervenidos incluyendo línea base. Descripción del avance: se encuentran en ejecución los siguientes proyectos en ejecución: Cueros Málaga: INVIAS: Obra adjudicada el 09/04/2021 al CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 (Proceso LP-DT-066-2020), Contrato 1042 de 2021 por valor de \$ 286.170.023.299. Acta de inicio 29/06/2021. Interventoría adjudicada el 26 de abril al CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (Proceso CMA-DT-191-2020) Contrato 1002 valor \$ 19.999.940.500. Avance: 1 km físico: 3% . Pavimentación Troncal Central Norte: obra 1684 de 2020 por \$ 153.012 e interventoría 1912 de 2020 por \$7200 millones. Avance: 5 km físico: 18%. Pavimentación Transversal Carare: obra 1628 de 2020 por \$81.013 millones e interventoría 1871 de 2020 por \$5.940 millones. Avance físico: 3% Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional: Recursos Nación: obra 1962 de 2020 por \$3.459 millones, interventoría 1811 de 2020 por \$748 millones. Recursos Territorio: En ejecución estudios y diseños según contrato adjudicado el 25 de enero de 2021 por \$2.353 millones. Anillo vial Girón – Floridablanca: obra 1968 de 2020 por \$17.485 millones e interventoría 2327 de 2020 por \$1.908 millones. . Pavimentación vía Zapatoca - Galán – Barichara: Adjudicados estudios y diseños obra por valor de \$2.039 millones (proceso IT-CM-20-04). Interventoría por valor de \$331 millones. Mejoramiento vías terciarias: Contratos adjudicados





Colombia Rural: La ejecución de los recursos Nación corresponde a los convenios firmados entre INVIAS y 41 municipios. Colombia Rural: firmados convenio con INVIAS y 41 Municipios valor comprometido: \$48.550 millones. El aporte del territorio corresponde a 13 proyectos aprobados por regalías por \$28.657 millones. Se firmó contrato específico entre el DNP por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales y la Gobernación de Santander No. 2210745 por valor de \$29.422.679.762. Actualmente se encuentra en etapa precontractual. Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín – Mogotes: Convenio de firmado el 12 de noviembre de 2021 entre Invías y departamento de Santander por \$90.000 millones. Mejoramiento /pavimentación Guavatá – Vélez: Se firmó decreto 505 el 21 de octubre de 2021 por el Gobernador de Santander, con un valor total de \$9.999.994.539, valor obra \$9.324.407.739, valor interventoría \$675.586.800. Socorro- Paramo: Recursos territorio, contrato de obra No. 2972 con el Consorcio vial Santander CGM, firmado el 07 de febrero de 203 por un valor de \$14.438.640.939, pendiente contrato de interventoría. Puerto Wilches: Recursos territorio, contrato de obra No. 2970 con el Consorcio Corredor Vial, firmado el 16 de febrero de 2022 por un valor de \$11.333.638.835. Se adjudicó interventoría por un valor de \$483.060.227 al consorcio Wilches – Socorro, según resolución de adjudicación N° 23988. En trámite firma del contrato de interventoría. Mejoramiento Pavimentación Guavata Velez: Se firmó decreto 505 el 21 de octubre de 2021 por el Gobernador de Santander, con un valor total de \$9.999.994.539

### Infraestructura para el desarrollo económico y social

- Educación

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura educativa construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander</b>	A 31 de marzo de 2022. Un proyecto en ejecución: Ampliación SENA, San Gil, valor: \$28.000 millones. Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del %Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social valor del convenio \$13.000 millones. Avance físico: Construcción Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga: Se firmó contrato específico No. 2210677 el 10 de noviembre del 2021, por un valor de \$28.274.924.970, aporte del DNP, por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales. Entre la Gobernación de Santander, ENTerritorio y UTS. Se encuentra en etapa precontractual. Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander Valor: \$101.481 millones (actualizado en valor a \$106.177 millones). Avance: Se firmó contrato específico No. 2210733 el 10 de noviembre del 2021, entre el departamento de Santander, ENTerritorio y UIS. Por un valor de \$114.196.122.634, de los cuales \$60.000.000.000 son aporte del DNP por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, \$18.005.575.267 serán aportados con recursos de la Universidad Industrial de Santander y \$36.190.547.367 serán aportados con recursos del Departamento de Santander. Se encuentra en etapa precontractual. Los dos proyectos faltantes se encuentran en estructuración. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.

- Salud

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura hospitalaria construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander</b>	A 31 de marzo de 2022. Se encuentran en contratación tres proyectos Construcción hospital San Andrés, Construcción hospital Barbosa, Construcción hospital, Suaita: Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los diseños arquitectónicos y los estudios de suelos para los tres Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02). Hospital San Gil: Su



Indicador	Avance Cualitativo
	alcance dependerá de las obras faltantes en la fase 1 actualmente en ejecución. Hospital de Mogotes: En el caso de la terminación la Secretaría de Salud Departamental realizó los ajustes al proyecto en atención a requerimientos del Ministerio de salud y se radicó el 25 de octubre de 2021. El proyecto su primera fase se encuentra suspendida por deficiencia en los estudios y diseños. Información suministrada por la Gobernación de Santander.

- Deporte y recreación

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura deportiva y al servicio del deporte construida y mejorada en el Marco del Pacto Funcional Santander.</b>	A 31 de marzo de 2022 Se encuentran en ejecución: Construcción Villa Olímpica de Oiba: Convenio realizado con el municipio convenio N°1480 de 2021 por un valor de \$4.998.543.093. Proceso No. IT-CD-21-005. Villa Olímpica de Matanza: Convenio realizado con el municipio de Matanza Convenio CO1.PCCNTR.2606912 N°1663 de 2021 por un valor de \$4.999.352.989,59. En estructuración los demás proyectos. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.

- Turismo

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Funcional Santander.</b>	A 31 de marzo de 2022. Se encuentran en ejecución: Construcción del Malecón, Barrancabermeja Valor: \$64.737 millones. Avance: se firmó convenio de asociación No.3044720 el 12 de noviembre de 2021, entre Ecopetrol y el Municipio de Bucaramanga por un valor de \$24.660.234.618. • Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón. Valor: \$12.276 millones. Avance: Aporte territorio, se firmó contrato de obra No. 2882297 con el CONSORCIO ARTE Y CULTURA GIRÓN el 31/12/2021 por un valor de \$8.011.241.428 y contrato de interventoría No. 11718383-4343 con el CONSORCIO INTERPARQUES GIRÓN el 31/12/2021 por un valor de \$551.000.000. En proceso de viabilidad: • Construcción de Infraestructura Agroturística y Náutica en el Departamento de Santander. Valor: \$140.093 millones 15 y 16 de febrero: Se adelantó mesa de trabajo Viceministerio de Turismo, DNP, ENTerritorio y departamento de Santander para revisión del estado de avance del proyecto, se revisaron aspectos técnicos, documentales, del proyecto se generaron observaciones al proyecto, se aclaró el alcance del proyecto. Con el compromiso del enviar el 25 de febrero las subsana-ciones a las observaciones. En estructuración Parque la Libertad de Socorro. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Soluciones de vivienda rural y urbanas entregadas en el marco del Pacto Funcional Santander.</b>	A 31 de marzo de 2022: Construcción de Vivienda: Acuerdo No 89 de 14 de diciembre de 2020, proyectos de los municipios de: Charalá, Suaita, Barbosa, Oiba, San Gil, Curití por \$11.059.915.036., en proceso de resolución los municipios de Charalá y Suaita, solicitaron prórroga para contratar los municipios de Barbosa y Oiba, terminando licitación San Gil y Curití. El total de viviendas son 180, a cada municipio con construcción de 30 viviendas. Decreto 290 del 30 de junio de 2021 para iniciar la contratación los municipios de: Socorro, Guavatá, Paramo, San Miguel, Lebrija, Piedecuesta, Puente Nacional, El Peñón, El Palmar, Betulia, Puerto Wilches, Barichara, Confines, Valle de San José, Aratocha, Chima, Villa Nueva, Onzaga, Guapota, California, Gambita, Guadalupe, San Benito (Mejoramientos). Por un valor de \$24.627.800.000. Firmó decreto 383 del 5 de agosto de 2021 el



Indicador	Avance Cualitativo
	Señor Gobernador de Santander para iniciar contratación de los Municipios de: Aratoca, Villanueva, Onzaga, Gambita, Guadalupe, Valle de San José. Por un valor de \$15.261.600.000,00. Mejoramiento vivienda: (Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos). Mejoramiento de Vivienda: Ejecutados mejoramientos de vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebrija, Piedecuesta con un total de 54 viviendas. Información suministrada por la Gobernación de Santander.
<b>Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Funcional Santander.</b>	A 31 de marzo 2022. Se encuentra en ejecución el proyecto: • Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta Valor: \$23.000 millones. Avance: Se firmó convenio con la Empresa municipal de servicios públicos domiciliario de Piedecuesta E.S.P.- Piedecuestana de servicios públicos. Convenio CO1.PCCNTR.2584008. (Valor: 23.139.977.876,00). Avance físico: 61% • Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta. Valor: \$25.000 millones Pendiente cambio de sector en el próximo CD, se firmó convenio No 9677-PPAL001-1598-2021, entre UNGRD, Gobernación de Santander, alcaldía de Piedecuesta el día 10/11/2021 por un valor de \$25.000.000.000. En estructuración los demás proyectos. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.



## 4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:**

En total son 5 proyectos cofinanciados, 4 en estado en ejecución y 1 en gestión, por valor de \$ 147.008 millones equivalente al 8% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Bucaramanga.	En Ejecución	\$0	\$14.554	\$14.554	\$14.554
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	En Gestión	\$0	\$0	\$14.757	\$0
Educación	Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.	En Ejecución	\$0	\$28.275	\$28.275	\$28.275
Educación	Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.	En Ejecución	\$54.196	\$60.000	\$60.000	\$114.196
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	En Ejecución	\$18.852	\$90.533	\$29.423	\$109.385
<b>Total, general</b>			<b>\$73.048</b>	<b>\$193.361</b>	<b>\$147.008</b>	<b>\$266.409</b>
