



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
23/05/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2023

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre y los municipios signatarios, las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de la región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento y ordenamiento institucional.
- Infraestructura para la disminución de las NBI.
- Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.


TEMAS ESTRATEGICOS

El 22 de marzo de 2023 se realizó el séptimo Consejo Directivo, en el que se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Inversiones pasando de \$1.510.518 millones a \$1.394.768 millones con 75 iniciativas estratégicas.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Golfo de Morrosquillo generará cerca de 19.527 empleos directos y 28.705 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 415.196 habitantes del área de influencia del Pacto Golfo de Morrosquillo.

Área de Intervención: Pacto Golfo de Morrosquillo

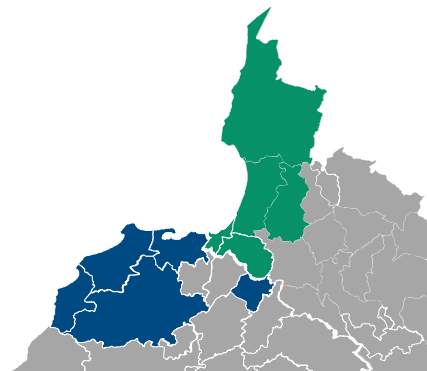

Departamentos:	Córdoba y Sucre
No. de Municipios en el Pacto Territorial:	Departamento de Córdoba: (5) Departamento de Sucre (5)
Fecha de suscripción:	07/02/2020
Fecha de terminación:	07/02/2025
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$1.394.768 (100%)
Nación (%)	\$1.170.161 (84%)
Territorio (%)	\$224.608 (16%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$900.701 (65%)
Compromiso Nación	\$721.999
Compromiso Territorio y otros	\$178.701

Proyectos en ejecución	\$822.549 (48 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$78.151 (16 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Proyectos en ejecución:

#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
1	Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera	FINDETER	Ejecución Contratos Derivados	30/06/2023	84%	El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 17.618.699.992, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 17.618.699.992, cuenta con un avance físico del 84 % y financiero del 33 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 194.296 personas ubicadas en Coveñas (Sucre), Moñitos (Córdoba), San Antero (Córdoba), San Bernardo del Viento (Córdoba), San Onofre (Sucre), Santiago de Tolú (Sucre), generar 142 empleos directos y 207 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
2	Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos, departamento de Córdoba	Aguas de Córdoba S.A E.S.P	Ejecución Contratos Derivados	17/12/2022	21,19%	*De acuerdo con el informe reportado por Aguas de Córdoba con corte al 31 de diciembre de 2023, el avance de ejecución del proyecto es del 21,29% contra el 20,96% programado, por lo cual acreditó la condición para la segunda transferencia de recursos por valor de \$1.186.619.476.
3	Construcción de mirador turístico, en el sector de playa blanca, municipio de San Antero, departamento de Córdoba	Municipio de San Antero	Ejecución Contratos Derivados	05/06/2023	52,74%	*El 11.ene.2023, el Municipio reportó el informe de ejecución del mes de diciembre de 2022, mediante el cual



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
						indica que el avance de ejecución es del 52,22% contra el 53,87% programado, y acreditó la condición para la tercera transferencia de recursos por valor de \$1.272.200.000.
4	Mejoramiento y Construcción de la vía tramo 1 - Coliseo El Cangrejo – Playa blanca, municipio de San Antero, departamento de Córdoba	Municipio de San Antero	Ejecución Contratos Derivados	18/06/2023	13,45%	*De acuerdo con el informe de ejecución con corte al 31.ene.2023, el avance de ejecución es del 13,45%
5	Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y tolú en el departamento de Sucre.	Santiago de Tolú	Ejecución Contratos Derivados	31/12/2023	57%	La obra fue adjudicada el 25 de agosto de 2021 por FINDETER (en el marco del convenio suscrito entre la Gobernación de Sucre y FINDETER) y el 15 de octubre de 2021 se firmó el Acta de inicio de obras, con plazo de ejecución de 12 meses. A la fecha se tiene avance ejecutado del 57 %. Se realizó prórroga del contrato hasta 31 de mayo de 2023, para traslado de redes. A la espera de adición y segunda prórroga.
6	Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo	FINDETER	Ejecución contratos derivados	30/06/2023	90%	El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 14.621.691.926, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nacional de \$ 14.621.691.926, cuenta con un avance físico del 90% y financiero del 65 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 267.559 personas ubicadas en



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
						Coveñas (Sucre), Moñitos (Córdoba), San Antero (Córdoba), San Antonio de Palmito (Sucre), San Bernardo del Viento (Córdoba), San Onofre (Sucre), Santa Cruz de Llorica (Córdoba), Santiago de Tolú (Sucre), Tolviejo (Sucre), Tuchín (Córdoba), generar 198 empleos directos y 333 empleos indirectos.
7	Mejoramiento y Construcción de la vía tramo 2 vía paralela a la playa, sector Bucaneros desde PR 00+000 hasta el PR 01+821 más glorieta, municipio de San Antero, departamento de Córdoba	Municipio de San Antero	Incorporación de Recursos	18/08/2023	0,00%	*En trámite de compra predios, licencia ambiental e instalación de redes de alcantarillado.
8	Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre	CARSUCRE	Proceso contratación derivada	27/12/2024	0,00%	*El 27.ene.2023 se aprobó la póliza del CE. *No se han aperturado los procesos de contratación derivada.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Ambiente y Desarrollo Sostenible	6	-	5	1
Comercio Industria y Turismo	14	4	7	3
Deporte y Recreación	3	-	2	1
Educación	1	1	-	-
Interior	7	2	4	1
Salud y Protección Social	3	2	-	1
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	1	-	-
Trabajo	2	1	-	1
Transporte	28	4	23	1
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	9	-	7	2
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	1	1	-	-
Total, general	75	16	48	11



2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Compromisos (Territorio)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$194.471	\$1.000	1%	\$121.991	63%
Comercio Industria y Turismo	\$187.939	\$90.909	48%	\$89.916	48%
Deporte y Recreación	\$38.252	\$25.052	65%	\$13.200	35%
Educación	\$29.230	\$8.230	28%	\$21.000	72%
Interior	\$23.759	\$1.581	7%	\$20.928	88%
Salud y Protección Social	\$50.628	\$5.072	10%	\$45.555	90%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$0	0%	\$5.361	100%
Trabajo	\$20.000	\$12.217	61%	\$22.221	111%
Transporte	\$717.388	\$56.642	8%	\$734.491	102%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$239.949	\$20.363	8%	\$95.498	40%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$3.542	100%	\$0	0%
TOTAL	\$1.394.768	\$224.608	16%	\$1.170.161	84%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2023

65%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2020 – 2025
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$122.991	\$109.882	89%	\$110.882	90%
Comercio Industria y Turismo	\$180.825	\$35.746	20%	\$92.743	51%
Deporte y Recreación	\$38.252	\$8.000	21%	\$31.198	82%
Educación	\$29.230	\$5.000	17%	\$28.411	97%
Interior	\$22.509	\$813	4%	\$11.808	52%
Salud y Protección Social	\$50.628	\$2.555	5%	\$7.564	15%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$0	0%	\$5.361	100%
Trabajo	\$34.437	\$0	0%	\$1.583	5%
Transporte	\$791.133	\$71.515	9%	\$518.209	66%



Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$115.861	\$30.812	27%	\$89.403	77%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$0	0%	\$3.538	100%
TOTAL	\$1.394.768	\$264.323	19%	\$900.701	65%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2023)

(2020-2025)

% Avance 39,63%



% Avance Acumulado 53,88%



Fecha de corte: 31 de marzo de 2023

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas % Avance: 29,27% % Avance Acumulado: 54,86%


- Vivienda Ciudad y Territorio % Avance: -% % Avance Acumulado: 50%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Golfo de	-	-	-	-	Gris	2	0	0%	Rojo	



Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Morrosquillo.												
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.		-	-	-		Gris	174	174	100%		verde	


SEMÁFORO



- Transporte % Avance: 29,27% % Avance Acumulado: 19,44%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo	0	38,35	131	29,27%		Verde	180	35	19,44		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO




- TIC % Avance: -% % Avance Acumulado: 100 %



Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Zonas digitales instaladas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo	0	11	-	-		Gris	11	11	100%		Verde	

SEMÁFORO




Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas/ Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible % Avance: 50% % Avance Acumulado: 50%

- Educación/ Salud y Protección Social/ Interior/ Trabajo % Avance: 50% % Avance Acumulado: 50%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura educativa, hospitalaria, pública y para el trabajo construida y mejorada en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	-	1	2	50%		Rojo	4	2	50%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO



3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas

- Vivienda Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	Avanza la ejecución de los contratos específicos de proyectos del sector Vivienda Ciudad y Territorio, así: 1. Optimización del acueducto de San Antero y corregimiento El Porvenir (Córdoba): El 10 de octubre de 2020 se firmó el convenio por \$18.002 millones para la optimización del acueducto de San Antero. El 12 de abril de 2021 se adjudicó por parte del PDA de Córdoba este proyecto a AQUALIA y el inicio de obra fue el 25 de mayo de 2021, el cual preveía ejecución por 12 meses. A la fecha el avance es del 30%, debido a que el proyecto se encuentra suspendido y obtuvo viabilidad del MVCT para nuevos diseños y valor adicional por \$8.642 millones, financiados por la gobernación de Córdoba, para un valor total de \$26.644 millones. Los



	<p>permisos del INVIAS y de la ANI ya se obtuvieron para las respectivas intervenciones en los tramos viales a cargo de cada entidad. Pendiente reinicio de obras entre el PDA de Córdoba (ejecutor) y contratista de obra. 2. Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos, departamento de Córdoba: Convenio suscrito por \$8.476 millones, que serán financiados en 70% por el FRPT (\$5.933 millones) y la Gobernación de Córdoba a través de Aguas de Córdoba en 30% (\$2.543 millones). Se realizó adjudicación del contrato de obra el 11 de mayo del 2022, y la adjudicación del contrato de interventoría el 9 de mayo del 2022, el acta de inicio fue suscrita el 11 del Agosto del 2022. el 14 de diciembre se suscribió prorroga al CE por 11 meses estableciendo la nueva fecha de terminación para el 17 de noviembre de 2023 En comité N5 del 10 de marzo de 2023 fue informado por parte de ENTerritorio que el avance de la ejecución corresponde a: Programado: 43.29% vs Ejecutado: 35.36% , se encuentra en tramite la adición de recursos al contrato de obra por parte de Aguas de Córdoba. 3. Construcción Sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre: Proyecto en ejecución con recursos del territorio por \$7.814 millones. A la fecha presenta un avance de 26%. Se estima la entrega de obra para finales del primer semestre de 2023. 4. Construcción de obras de recolección y manejo de aguas residuales y optimización del sistema de abastecimiento de agua, construcción de obras para las conexiones hidrosanitarias intradomiciliarias, en las localidades de la Libertad y Sabanética del municipio de San Onofre, Sucre: proyecto en ejecución por Aguas de Sucre por valor de \$20.761 millones.</p>
<p>Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.</p>	<p>Para el periodo se encuentra ejecutado el contrato LP .002-2020 de obra pública "Construcción de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de San Onofre, Sucre</p>

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
<p>Vías intervenidas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo</p>	<p>Avanza la intervención de obras en el Golfo de Morrosquillo: 1. La pavimentación de la vía Bahía la Rada, en el municipio de Moñitos, es una obra en ejecución por el municipio y se espera que sea entregada en el mes de abril. 2. Vía Santa Lucía – Moñitos (Córdoba). Vía adjudicada por el INVÍAS el 9 de abril de 2021 por \$183.473 millones, incluyendo la interventoría. La obra inició su ejecución en julio de 2021, con un plazo de ejecución de 54 meses. A la fecha el proyecto presenta avance ejecutado del 28,28% vs un 28.97% programado. 3. Vía El Delirio - Puerto Viejo. (entre Palmito, Coveñas y Tolú): La obra fue adjudicada el 25 de agosto de 2021 por FINDETER (en el marco del convenio suscrito entre la Gobernación de Sucre y FINDETER) y el 15 de octubre de 2021 se firmó el Acta de inicio de obras, con plazo de ejecución de 12 meses. A la fecha se tiene un avance ejecutado del 57% contra un programado 62%. 4. Vía Moñitos - San Bernardo del Viento – Lorica - Chinú: Proyecto en ejecución por INVIAS, con avance de obra del 94.64%, respecto al 100% programado, que hace parte del Programa "Concluir - Concluir". 5. El departamento de Sucre adjudicó contrato el 23 de marzo de 2022 para la intervención de las cinco vías terciarias y se firmó acta de inicio de obras el 01 de junio de 2022. A la fecha presenta un avance de ejecución de 2% de un 9% programado. 6. El departamento de Córdoba suscribió el acta de Inicio de obras del contrato para la intervención de las tres vías terciarias de los municipios del Golfo el 16 de marzo de 2022. A la fecha presenta un 9% de avance ejecutado frente a un 38, 5% de avance programado. 7. La vía terciaria de Murcielagal - El Tigre- San Patricio- Mangle en el municipio de Moñitos, Córdoba, fue una obra ejecutada por el municipio.</p>

- TIC



Indicador	Avance Cualitativo
Zonas digitales instaladas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	Para el periodo se encuentra ejecutadas las 11 zonas digitales instaladas cuya finalidad es ampliar la cobertura de conectividad y con ello impulsar la productividad y competitividad de las zonas rurales y urbanas en los departamentos que conforman el Pacto Golfo de Morrosquillo.

Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas/ Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.

- Educación/ Salud y Protección Social/ Interior/ Trabajo

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura educativa, hospitalaria, pública y para el trabajo construida y mejorada en el marco del pacto Golfo de Morrosquillo.	Avanza la ejecución de los contratos específicos de los proyectos del sector Educación/Salud y Protección Social/Interior/Trabajo, así: 1. Megacolegio Heriberto García Garrido en Santiago de Tolú, Sucre: El 24 de julio de 2022 en el marco de la visita del Señor Presidente a Tolú se realizó acta de entrega de esta obra a la Rectora de la institución con la presencia de la comunidad. El Megacolegio Heriberto García Garrido en Tolú, Sucre, atenderá 2.160 estudiantes con una inversión total de \$29.365 millones. 2. Ampliación de la sede del SENA en Tolú, Sucre: Para la ampliación de la sede del SENA en Tolú, esta institución adquirió los lotes necesarios con un área de 2.200 m ² por \$1.354 millones. Para la construcción se firmará convenio entre el SENA y la Gobernación de Sucre por \$29.299 millones, de los cuales \$12.000 millones serán aporte del departamento, se espera iniciar obras en el segundo semestre de 2023. 3. CAM (Centro Administrativo Municipal) Santiago de Tolú: Con cargo al Ministerio de Interior se hará cierre financiero al proyecto, el cual tiene aprobados estudios y diseños por esa cartera por \$4.324 millones. A la fecha el proyecto presenta un avance físico de 15%. 4. Construcción y equipamiento del Hospital de Coveñas obtuvo concepto favorable por parte del Ministerio de Salud y Protección Social el 21 de Diciembre de 2022. Inició trámite de verificación de requisitos del FRPT el 6 de marzo de 2023. El FRPT remitió ficha de verificación N°1 el 17 de marzo de 2023. Se encuentra en ajustes de la entidad territorial.

4. ANEXOS
Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 19 proyectos cofinanciados, 16 proyectos ejecución y 3 ejecutados, por valor financiado DNP de \$ 264.323 millones equivalente al 19% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba	En Ejecución	\$0	\$24.298	\$24.298	\$24.298
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, Córdoba.	En Ejecución	\$1.000	\$19.482	\$19.482	\$20.482
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera	En Ejecución	\$0	\$17.619	\$17.619	\$17.619
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín	En Ejecución	\$0	\$7.015	\$7.015	\$7.015
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre	En Ejecución	\$0	\$41.468	\$41.468	\$41.468
Comercio Industria y Turismo	Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero	En Ejecución	\$1.580	\$6.319	\$6.319	\$7.899
Comercio Industria y Turismo	Malecón de Coveñas (Segunda Ensenada)	En Ejecución	\$570	\$29.427	\$29.427	\$29.998
Deporte y Recreación	Construcción de Unidad Recreo deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$2.219	\$8.000	\$8.000	\$10.219
Educación	Megacolegio Heriberto García Garrido en Toluviéjo, Sucre	Ejecutado	\$6.667	\$21.745	\$5.000	\$28.411
Interior	Estructuración y compra de lote Estación de Bomberos	Ejecutado	\$622	\$813	\$813	\$1.435
Salud y Protección Social	Estructuración y compra de lote Hospital Coveñas	Ejecutado	\$1.884	\$2.555	\$2.555	\$4.440



Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Transporte	Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento	En Ejecución	\$0	\$7.524	\$7.524	\$7.524
Transporte	Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y tolú en el departamento de Sucre.	En Ejecución	\$0	\$40.650	\$40.650	\$40.650
Transporte	Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$0	\$14.549	\$14.549	\$14.549
Transporte	Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$0	\$8.792	\$8.792	\$8.792
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo	En Ejecución	\$0	\$14.622	\$14.622	\$14.622
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas	En Ejecución	\$0	\$5.304	\$5.304	\$5.304
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta el corregimiento del Porvenir, San Antero, Córdoba	En Ejecución	\$9.909	\$7.925	\$4.953	\$17.834
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba.	En Ejecución	\$2.543	\$5.933	\$5.933	\$8.476
Total, general			\$26.993	\$284.040	\$264.323	\$311.033

Millones de \$ COP
