



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
24/05/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2023

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Funcional Santander tiene como objetivo articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para su desarrollo económico y social.

Líneas Temáticas:

- Conectividad subregional.
- Infraestructura para el desarrollo económico y social.

TEMAS ESTRATEGICOS


Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión No. 7, realizada el 8 de marzo de 2023, se priorizan un total de 47, dichas iniciativas tienen un valor indicativo de \$1.832.858.347.878, de los cuales \$1.313.685.496.588 son aporte indicativo de la Nación y \$519.172.851.290 del territorio.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Funcional Santander generaría cerca de 25.660 empleos directos, 43.155 indirectos.

Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a más de 2 millones de habitantes de las diferentes provincias, sin contar el beneficio generado a población flotante o exógena que llega o transita por los territorios y que se benefician de las obras de conectividad vial principalmente.

Área de Intervención: Pacto Santander

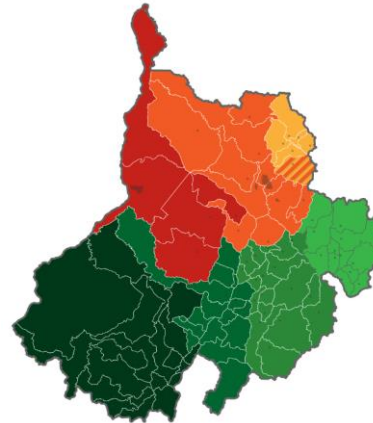

Departamento:	Santander
No. de Municipios en el Pacto Territorial:	(7 provincias y 80 municipios)
Fecha de suscripción:	31/10/2020
Fecha de terminación:	31/10/2025
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$1.832.858 (100%)
Nación (%)	\$1.313.685 (72%)
Territorio (%)	\$519.173 (28%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$1.741.336 (95%)
Compromiso Nación	\$1.361.736
Compromiso Territorio	\$379.600

Proyectos en ejecución	\$1.741.336 (35 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Proyectos financiados por el Fondo Regional de Pactos Territoriales con Contratos Específicos en Ejecución:

#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
1	Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, sede Bucaramanga	Unidades Tecnológicas de Santander	Ejecución Contratos Derivados	15/03/2024	15,22%	*El avance del proyecto es de 15,22% contra un 12,86% programado.
						*La entidad ejecutora radicó desembolso e informe de supervisión de diciembre de 2022, el 10.ene.2023.
2	Mejoramiento de la infraestructura física de la facultad de salud de la Universidad Industrial de Santander	Universidad Industrial de Santander	Ejecución Contratos Derivados	17/05/2025	1,20%	*De acuerdo con el informe de ejecución con corte al 31 de diciembre de 2022, el avance de ejecución es del 1,20% contra el 1,40% programado.
3	Mejoramiento de las vías rurales en los municipios de Rionegro, Lebrija, San Vicente de Chucuri, El Carmen de Chucuri, Cimitarra, Vélez, Güepsa y San Andrés, mediante la construcción de placa huellas en el departamento de Santander	Departamento de Santander	Ejecución Contratos Derivados	21/06/2024	7,97%	*El Departamento del Santander, en el informe de ejecución corte al 31.dic.2022, reporta un avance de ejecución del 7,97% contra el 12,38%, programado.
						*Se programa visita de inspección ocular para la semana del 20.feb.2023.
4	Construcción de obras de mitigación y estabilización en los sectores la Gloria, Nazaret y Pablo VI del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander	Municipio de Bucaramanga	Proceso contratación derivada	27/09/2024	0,00%	*El 27.ene.2023 se aprobó la póliza del CE.
						*El Municipio decretó urgencia manifiesta.
						*Se llevó a cabo Comité No. 1, el 03.feb.2023 - En análisis solicitud de adición con observaciones del FRPT.
*La mesa de trabajo programada para el 07.feb.2023 fue aplazada por el Municipio.						
5	Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de Matanza, Santander	Municipio de Matanza	Proceso contratación derivada	11/058/2023	0,00%	*El 11.ene.2023 se adjudica el PROCESO DE LICITACION PUBLICA MAT-LP-02-2022, para la obra.
						*El 25.ene.2023 se adjudica el PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO MAT-CM-02-2022.
						*La entidad ejecutora informa que el 07.feb.2023 proyecta firmar actas de inicio y remitir al FRPT.
6	Construcción de obras de mitigación y estabilización en el barrio Gaitán, Escarpa Norte, secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, del	Municipio de Bucaramanga	Proceso contratación derivada	27/09/2024	0,00%	*El 27.ene.2023 se aprobó la póliza del CE.
						*El Municipio decretó urgencia manifiesta.
						*Se llevó a cabo Comité No. 1, el 03.feb.2023 - En análisis solicitud de adición con observaciones del FRPT.



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
	departamento de Santander.					*La mesa de trabajo programada para el 07.feb.2023 fue aplazada por el Municipio.
7	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander	CAS	Incorporación de Recursos	20/06/2024	0,00%	*El 20.ene.2023 se aprobó la póliza del CE. *El 02.feb.2023 se llevó a cabo sesión del Consejo Directivo de la CAS para dar claridad sobre la suscripción de vigencias futuras, cuenta con concepto jurídico favorable.
8	Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. Fase I - sector 2	CAS	Incorporación de Recursos	20/03/2025	0,00%	*El 20.ene.2023 se aprobó la póliza del CE. *El 02.feb.2023 se llevó a cabo sesión del Consejo Directivo de la CAS para dar claridad sobre la suscripción de vigencias futuras, cuenta con concepto jurídico favorable.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Ambiente y Desarrollo Sostenible	8	-	7	1
Comercio Industria y Turismo	4	-	3	1
Deporte y Recreación	3	-	2	1
Educación	5	-	3	2
Interior	1	-	1	
Salud y Protección Social	5	-	3	2
Transporte	17	-	13	4
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	2	-	1	1
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	2	-	2	-
Total, general	47	-	35	12

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$174.599	\$41.500	24%	\$133.099	76%



Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Comercio Industria y Turismo	\$158.664	\$51.614	33%	\$107.050	67%
Deporte y Recreación	\$22.098	\$22.098	100%	\$0	0%
Educación	\$205.332	\$82.657	40%	\$122.675	60%
Interior	\$1.064	\$0	0%	\$1.064	100%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$56.000	100%	\$0	0%
Transporte	\$1.101.430	\$151.632	14%	\$949.798	86%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$29.181	\$29.181	100%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$84.489	\$84.489	100%	\$0	0%
TOTAL	\$1.832.858	\$519.173	28%	\$1.313.685	72%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2023



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2020 – 2025 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$174.599	\$133.099	76%	\$168.099	96%
Comercio Industria y Turismo	\$158.664	\$60.000	38%	\$161.847	102%
Deporte y Recreación	\$22.098	\$0	0%	\$12.098	55%
Educación	\$205.332	\$88.275	43%	\$167.932	82%
Interior	\$1.064	\$1.064	100%	\$1.064	100%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$0	0%	\$844	2%
Transporte	\$1.101.430	\$29.423	3%	\$1.125.546	102%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$29.181	\$0	0%	\$23.140	79%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$84.489	\$0	0%	\$80.767	96%
TOTAL	\$1.832.858	\$311.860	17%	\$1.741.336	95%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO FUNCIONAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS DEL DNP.



(2023)

(2020-2025)

%Avance 14,28%



Avance Acumulado 18,88%



Fecha de corte: 31 de marzo de 2023

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Conectividad Subregional % Avance: 100 % Avance Acumulado: 91,28%

- Transporte % Avance: 100 % Avance Acumulado: 91,28%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander.	2172,4	2.476	2.404,48	100%		Verde	2.504,9	2.476	91,28%		Amarillo	31/03/2023

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura para el desarrollo económico y social % Avance: 0% % Avance Acumulado: 6,82%

Educación % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura educativa construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	2	0	2	0%		Rojo	5,00	0	0%		Rojo	31/03/2023



SEMÁFORO



<60% ≥80%

Salud % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura hospitalaria construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	5	0	2	0%		Rojo	5,00	0	0%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO



<60% ≥80%

Deporte y recreación % Avance: 0% % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva y al servicio del deporte construida y mejorada en el Marco del Pacto Funcional Santander.	1	0	2	0%		Rojo	4	0	0%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO



<60% ≥80%

Turismo % Avance: 0% Avance Acumulado: 0%



Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Funcional Santander.	10	0	2	0%		Rojo	4,00	0	0%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO




<60%

≥80%

Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: 0% % Avance Acumulado: 20,46%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Soluciones de vivienda rural y urbanas entregadas en el marco del Pacto Funcional Santander.	1.621	0	330	0%		Rojo	1.671	684	40,93%		Rojo	31/03/2023
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Funcional Santander.	0	0	1	0%		Rojo	3	0	0%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO



<60%

≥80%



3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Conectividad Subregional

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander.	Línea base: 2172 km Avance: 304 km. Avance total: 2476 km han sido intervenidos incluyendo línea base. Descripción del avance: -Pavimentación vía Curos – Málaga: se encuentra en ejecución, presenta un Avance Físico: 18% y financiero: 17%. Ejecutado por INVIAS. Se presenta un avance de 10,32 Km. -Pavimentación Troncal Central Norte: se encuentra en ejecución, presenta un Avance Físico: 71% y financiero: 64%. Ejecutado por INVIAS. Se presenta un avance de 17,38 Km pavimentados de 22 Km en el sector del Paramo del Almorzadero, mantenimiento y rehabilitación de sectores priorizados. -Mejoramiento vías terciarias: Contratos adjudicados Colombia Rural: La ejecución de los recursos Nación corresponde a los convenios firmados entre INVIAS y 62 municipios, se han ejecutado 15 municipios para un total de 276 km intervenidos.

Infraestructura para el desarrollo económico y social

- Educación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura educativa construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: "Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga", el avance del proyecto es de 15,90%. "Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander", el avance de ejecución es del 7,01%. "Ampliación SENA, San Gil", el avance de ejecución es del 16%. Los proyectos: "Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Vélez" y "Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta", no han iniciado ejecución.

- Salud

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura hospitalaria construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	Los siguientes proyectos se encuentran en ejecución: "Construcción hospital, San Andrés", cuenta con un avance físico del 1 %. "Construcción hospital Barbosa", cuenta con un avance físico del 1 %. "Construcción hospital, Suaita", cuenta con un avance físico del 1 %.

- Deporte y recreación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura deportiva y al servicio del deporte construida y mejorada en el Marco del Pacto Funcional Santander.	Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: "Construcción de la villa olímpica, Oiba", cuenta con un avance físico del 40 %. "Construcción de la villa olímpica, Matanza", cuenta con un avance físico del 7 %.

- Turismo



Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Funcional Santander.	Se encuentran en ejecución 3 proyectos: "Construcción del Malecón, Malecón de Barranca", avance: 15%. "Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón", avance 7%. "Construcción de Infraestructura Agroturística y Náutica en el Departamento de Santander", cuanta con contrato Específico en Constitución de Garantías.

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
Soluciones de vivienda rural y urbanas entregadas en el marco del Pacto Funcional Santander.	El avance acumulado es de 684 viviendas entregadas e intervenidas: Acuerdo No 89 de 14 de diciembre de 2020, Acuerdo 90 21 de diciembre de 2020 son proyectos de los municipios de: Charalá, Suaita, Barbosa, Oiba, San Gil, Curití, a la fecha se han terminado y entregado 30 viviendas por municipio con un total de 180 viviendas. Firmó decreto 383 del 5 de agosto de 2021 el Señor Gobernador de Santander para los Municipios de: Confines, Valle de San Jose, Socorro, Aratoca, Villanueva, Onzaga, Gambita, Guadalupe, Guapota, California, Chima, Barichara. Por un valor de \$15.261.600.000,00. Cada municipio con avance de 30 viviendas cada uno para un total de 390 viviendas Firmo decreto 124 de 2022 avance viviendas intervenidas Municipios de Paramo y Lebrija de 30 vivienda cada uno, total 60 de 60 viviendas Mejoramiento vivienda: (Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos). Mejoramiento de Vivienda: Ejecutados mejoramientos de vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebrija, Piedecuesta con un total de 54 viviendas por un valor de \$770 millones. Información suministrada por la Gobernación de Santander.
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Funcional Santander.	Se encuentra en ejecución el proyecto: "Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta", avance físico: 81%..



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 11 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 311.811 millones equivalente al 17% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander	En Ejecución	\$0	\$12.000	\$12.000	\$12.000
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander	En Ejecución	\$0	\$15.226	\$15.226	\$15.226
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander	En Ejecución	\$0	\$14.757	\$14.757	\$14.757
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.	En Ejecución	\$10.000	\$46.830	\$46.830	\$56.830
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase 1 sector 2	En Ejecución	\$0	\$29.732	\$29.732	\$29.732
Ambiente y Desarrollo Sostenible	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO GAITÁN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	En Ejecución	\$0	\$14.554	\$14.554	\$14.554



Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Comercio Industria y Turismo	Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander.	En Ejecución	\$16.651	\$60.000	\$60.000	\$76.651
Educación	Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.	En Ejecución	\$0	\$28.275	\$28.275	\$28.275
Educación	Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.	En Ejecución	\$60.657	\$60.000	\$60.000	\$120.657
Interior	Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.	En Ejecución	\$0	\$1.064	\$1.064	\$1.064
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	En Ejecución	\$18.852	\$95.591	\$29.423	\$114.443
Total, general			\$106.160	\$378.029	\$311.860	\$484.189

Cifras en millones
