



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
28/05/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2023

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.

Líneas Temáticas:

- Infraestructura para la integración social
- Gestión ambiental y saneamiento básico


TEMAS ESTRATÉGICOS

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue modificado en la sesión No. 6 del Consejo Directivo del Pacto Cundinamarca, realizado el 7 de diciembre de 2022. En esta modificación se pasó de un valor indicativo de \$493.920.668.269 a \$519.012.723.070 de los cuales \$457.267.519.339 son aporte indicativo de la Nación y \$ 61.745.203.731 del territorio

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Cundinamarca generaría cerca de 6.913 empleos directos y 10.685 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 1.3 millones habitantes del área de influencia del Pacto Cundinamarca.

Área de Intervención: Cundinamarca

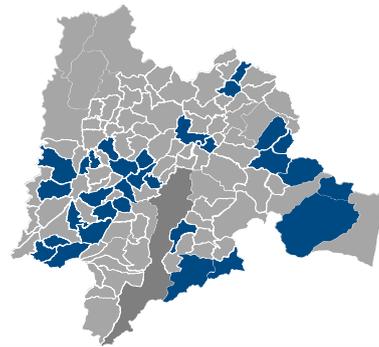

Departamento:	Cundinamarca Municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Cajicá, Cáqueza, Chía, Chipaque, Chocontá, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Fomeque, Funza, Fúquene, Gachetá, Girardot, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Paima, Pulí, Quetame, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Subachoque, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Viotá, Zipaquirá y Gachancipá.
Fecha de suscripción:	19/02/2021
Fecha de terminación:	19/02/2024
Plazo:	3 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$519.013 (100%)
Nación (%)	\$457.268 (88%)
Territorio y otros (%)	\$61.745 (12%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$453.288 (87%)
Compromiso Nación	\$ 393.312
Compromiso Territorio	\$59.785

Proyectos en ejecución	\$ 453.288 (38 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.



Proyectos financiados por el Fondo Regional de Pactos Territoriales con Contratos Específicos en Ejecución:

#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
1	Construcción de un Centro de Acopio para el sector campesino del municipio de Gutierrez, Cundinamarca	Municipio de Gutierrez	Ejecución Contratos Derivados	30/06/2023	61,43%	*A febrero de 2023, el avance es del 61,43 % contra el 77,75% programado (atraso del 16,32%).
2	Adecuación y remodelación del estadio municipal de la Villa de San Diego de Ubaté	Municipio de Ubaté	Ejecución Contratos Derivados	03/09/2023	85,15%	*A febrero de 2023, el avance es del 91,60 % contra el 97% programado (atraso del 5,4%).
3	Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza	Municipio de Funza	Proceso contratación derivada	28/05/2024	0,31%	*Las actas de inicio de obra e interventoría se suscribieron el 12.ene.2023. A febrero de 2023, el avance es del 0,31 % contra el 0,31% programado.
4	Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González del municipio de Zipaquirá	Municipio de Zipaquirá	Proceso contratación derivada	16/08/2023	7%	*A febrero de 2023, el avance es del 7 % contra el 24,92% programado (atraso del 17,92%).
5	Construcción de un centro de desarrollo infantil CDI en la vereda Chuntame sector Tayrona en el municipio de Cajicá	Municipio de Cajicá	Proceso contratación derivada	02/11/2023	0,00%	*A febrero de 2023, el avance es del 1,39 % contra el 10,30% programado (atraso del 8,91%).
6	Mejoramiento del parque recreo deportivo los patos del municipio de Tocancipá	Municipio de Tocancipá	Ejecución Contratos Derivados	12/09/2023	36,84%	*A febrero de 2023, el avance es del 36,84 % contra el 44% programado (atraso del 7,16%).
7	Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes del municipio de Chipaque, Cundinamarca	Municipio de Chipaque	Ejecución Contratos Derivados	30/06/2023	75,75%	* A diciembre de 2022, el avance es del 75,75 % contra el 59,89% programado. * Falta informe de enero y febrero de 2023
8	Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	Municipio de Gachetá	Ejecución Contratos Derivados	02/05/2023	0,00%	*El municipio tiene suspendidos los contratos derivados desde el 28 de septiembre de 2023 hasta el 25 de marzo de 2023. * El 15 de marzo de 2023 se realizó comité operativo del contrato en el cual quedó el compromiso por parte del municipio de presentar solicitud de adición y



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
						prórroga con los soportes técnicos y el CDP.
9	Mejoramiento de las vías urbanas de bajo tránsito del municipio de Chocotá, Cundinamarca	Municipio de Chocotá	Ejecución Contratos Derivados	16/08/2023	28,00%	* A febrero de 2023, el avance es del 30,0 % contra el 70,0% programado (atraso del 40,0%).
10	Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado La Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	Municipio de Bituima	Proceso contratación derivada	01/06/2023	3,00%	* A febrero de 2023, el avance es del 3,0 % contra el 3,0% programado.
11	Construcción de ciclo infraestructura y servicios complementarios en las provincias de sabana centro y sabana occidente en el departamento de Cundinamarca	ICCU	Proceso contratación derivada	24/04/2026	0,00%	*No ha iniciado con la contratación derivada de la obra.
12	Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca	Unidad de Riesgos - Gobernación Cundinamarca	Proceso contratación derivada	25/11/2023	0,00%	*El 25.oct.2022 se aprobó la póliza del CE. *No han dado apertura a los procesos derivados.
13	Construcción del centro de acopio del municipio de El Rosal, Cundinamarca	Municipio de El Rosal	Proceso contratación derivada	21/12/2023	0,00%	*El 21 de octubre de 2022 se aprobó la póliza del CE. *Hasta el día 02 de marzo de 2023 se dio apertura al proceso de contratación derivada de obra



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
14	Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales, y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paime, departamento de Cundinamarca	Municipio de Paime	Proceso contratación derivada	08/09/2023	0,00%	*El 08 de diciembre de 2022 se aprobó la póliza del CE. *El 17 de febrero de 2023 fue suscrita la contratación de obra y el 17 de marzo de 2023 fue suscrita la contratación de interventoría
15	Construcción de la plaza de mercado en el municipio de Ricaurte - Cundinamarca	Municipio de Ricaurte	Proceso contratación derivada	06/01/2024	0,58%	*El 06 de septiembre de 2022 se aprobó la póliza del CE. *El 19.ene.2023, se suscribieron los contratos de obra e interventoría. *A febrero de 2023, el avance es del 0,58 % contra el 16%.
16	Construcción de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá, Cundinamarca	Municipio de Ubalá	Proceso contratación derivada	29/11/2023	0,00%	*El 29 de noviembre de 2022 se aprobó la póliza de garantía. *El municipio suspendió proceso licitación 11 ene 2023 - Observación de proponentes sobre precios. LP-009-2022
17	Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio - Ubaque, Cundinamarca	Municipio de Ubaque	Proceso contratación derivada	25/06/2023	0,00%	* El 25 de octubre de 2022 con aprobación de la póliza. *El 30 de enero de 2023, el Municipio publica la Adenda No. 4, donde la adjudicación es el 24.feb.2023. *No han dado apertura el proceso de interventoría.
18	Mejoramiento del escenario deportivo de la Villa Olímpica en el casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca	Municipio de Jerusalén	Proceso contratación derivada	29/03/2024	0,00%	*El 29.nov.2022 se aprobó la póliza del CE. *El 06.ene.2023 se dio apertura al proceso de interventoría. *El 12.ene.2023 se dio apertura al proceso de obra. *Falta informe de diciembre de 2022 y enero de 2023
19	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios,	Municipio de Agua de Dios	Proceso contratación derivada	21/06/2024	0,00%	*El 21.nov.2022 se aprobó la póliza del CE. *El Municipio no ha dado apertura a los procesos licitatorios.



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
	departamento de Cundinamarca					*Falta informe de diciembre de 2022 y enero de 2023
20	Reestructuración plaza de mercado El Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí, departamento de Cundinamarca	Municipio de Pulí	Proceso contratación derivada	23/03/2024	0,00%	*El 23.nov.2022 se aprobó la póliza del CE. *El 23.ene.2023, el Municipio publicó el informe de evaluación de la interventoría
21	Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta, departamento de Cundinamarca	Municipio de Manta	Proceso contratación derivada	23/11/2023	0,00%	*El Municipio dio apertura al proceso licitatorio de obra, proyecta adjudicar el 28 feb..2023. *El Municipio dio apertura al proceso licitatorio de interventoría, proyecta adjudicar el 03 mar..2023.
22	Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá, Cundinamarca	Municipio de Machetá	Proceso contratación derivada	24/04/2024	0,00%	* El 24.nov.2022 se aprobó la póliza del CE. Falta informe de diciembre 2022, enero y febrero de 2023 El Proceso de obra LP-001-2022- fue adjudicado el 10 de febrero de 2023 y el de interventoría CMA-001-2023 fue adjudicado el 10 de marzo de 2023.
23	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca	Municipio de Guayabetal	Proceso contratación derivada	10/08/204	0,00%	*El 10 de enero de 2023 se aprobó la póliza del CE. *El 27 de febrero de 2023 se suscribió el contrato de obra y el 24 de febrero de 2023 se suscribió el contrato de interventoría
24	Construcción y mejoramiento de centro de acopio agroindustrial - centro funcional, Quetame, Cundinamarca	Municipio de Quetame	Proceso contratación derivada	13/08/2026	0,00%	*El 13 de febrero de 2023 se aprobó la póliza del CE
25	Construcción y puesta en marcha del centro de recepción y alistamiento de productos agropecuarios del municipio de Sasaima	Municipio de Sasaima	Proceso contratación derivada	13/08/2026	0,00%	*El 13 de febrero de 2023, se aprobó la póliza de garantía.
26	Construcción y mejoramiento de centros de acopio agroindustrial II etapa del	Municipio de Chipaque	Proceso contratación derivada	15/02/2023	0,00%	*El 15 de febrero de 2023, se aprobó la póliza de garantía.



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
	municipio de Chipaque, Cundinamarca.					
27	Ampliación y reforzamiento estructural Teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá	Municipio de Zipaquirá	Proceso contratación derivada	08/12/2025	0,00%	*El 08 de marzo de 2023 se aprobó la póliza del CE *El 10 de marzo de 2023, se dio apertura al proceso de contratación de obra
28	Construcción y mejoramiento de centros de acopio agroindustrial II etapa del municipio de Chipaque, Cundinamarca	Municipio de Chipaque	Proceso de contratación derivada	15/04/2024	0,00%	*El 15 de febrero de 2023 se aprobó la póliza del CE *El 09 de marzo de 2023, se dio apertura el proceso de obra
29	Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca	Municipio de Chocontá	Proceso de contratación derivada	22/06/2024	0,00%	*El 22 de febrero de 2023 se aprobó la póliza del CE *El 27 de febrero de 2023, se dio apertura el proceso de obra
30	Construcción plaza comercial municipio de Nilo, Cundinamarca sector vía panamericana	Municipio de Nilo	Proceso de contratación derivada	22/07/2025	0,00%	*El 22 de febrero de 2023 se aprobó la póliza del CE
31	Construcción del Centro Cultural en Gachancipá, Cundinamarca	Municipio de Gachancipá	Proceso de contratación derivada	13/05/2025	0,00%	*El 13 de marzo de 2023 se aprobó la póliza del CE
32	Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá Cundinamarca	Municipio de Zipaquirá	Proceso de contratación derivada	08/08/2025	0,00%	*El 08 de marzo de 2023 se aprobó la póliza del CE

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Agricultura y Desarrollo Rural	32	-	23	9
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	3	-
Cultura	4	-	3	1
Deporte y Recreación	7	-	6	1
Inclusión Social y Reconciliación	1	-	1	-
Planeación	2	-	-	2
Transporte	2	-	2	-
Total, general	51	-	38	13

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL



2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$42.642	\$0	0%	\$42.642	100%
Deporte y Recreación	\$101.316	\$19.283	19%	\$82.033	81%
Transporte	\$85.247	\$367	0%	\$84.880	100%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$145.444	\$19.934	14%	\$125.509	86%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.110	\$387	6%	\$5.723	94%
Planeación	\$10.270	\$0	0%	\$10.270	100%
Cultura	\$127.984	\$21.773	17%	\$106.211	83%
TOTAL	\$519.013	\$61.745	12%	\$457.268	88%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2023



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$42.642	\$42.642	100%	\$42.642	100%
Deporte y Recreación	\$101.316	\$80.641	80%	\$100.114	99%
Transporte	\$85.247	\$84.880	100%	\$85.247	100%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$145.444	\$78.952	54%	\$96.927	67%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.110	\$5.723	94%	\$6.110	100%
Planeación	\$10.270	\$0	0%	\$0	0%
Cultura	\$127.984	\$100.475	79%	\$122.248	96%
TOTAL	\$519.013	\$393.312	76%	\$453.288	87%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS DEL DNP

(2023)

%Avance 33.3%



(2021-2024)

% Avance Acumulado 8,25%





Fecha de corte: 31 de marzo de 2023


*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Gestión ambiental y saneamiento básico % Avance: 100,00 % Avance Acumulado: 40,00%

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: 100,00% - % Avance Acumulado:40,00%


Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Obras de mitigación de riesgo realizadas en el marco del Pacto Cundinamarca	0	2	2	100%		Naranja	5	2	40,00%		Naranja	31/03/2023



Infraestructura Para la Integración Social % Avance: -% Avance Acumulado: 0,31%

Transporte % Avance: 0,00 -% Avance Acumulado: 1,26%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías y cicloinfraestructura intervenidas en el marco del Pacto Cundinamarca	32,67		40,04	-		Rojo	77,10	33,23	1,26%		Rojo	31/03/2023






Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acum-lada	Avance Acu-mulado	% Avance Acu-mulado	Semáforo		Fecha Corte
Productores beneficiados con proyectos dirigidos al sector agropecuario en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	700	-		Rojo	3.010	-	-		Rojo	31/03/2023


SEMÁFORO



Deporte y Recreación % Avance: - % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acum-lada	Avance Acu-mulado	% Avance Acu-mulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva y recreativa intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	8	-	-		Gris	


SEMÁFORO



Planeación/ Inclusión Social y Reconciliación/ Cultura % Avance: - % Avance Acumulado: 0%



Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acum-lada	Avance Acu-mulado	% Avance Acu-mulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura pública intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	4	-	-		Gris	



3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Gestión ambiental y saneamiento básico

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Obras de mitigación de riesgo realizadas en el marco del Pacto Cundinamarca	Se tienen los siguientes avances: 1) Intervención ambiental para mitigación del riesgo, Cáqueza: Se suscribió el contrato específico N°2210766 entre ENTerritorio y Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, el 4 de agosto de 2022, por valor de \$10.245 millones. El 25 de octubre de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. No ha iniciado obra. 2) Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paimé. Se suscribió el contrato específico N°2210813 entre ENTerritorio y el municipio de Paimé el 12 de agosto de 2022, por valor de \$3.803 millones. El 8 de septiembre de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El 17 de febrero de 2023 se adjudicó la obra. El proyecto se encuentra en proceso de contratación derivada.3) Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca. Se suscribió el contrato específico N°2221015 entre ENTerritorio y el municipio de Ubaque el 4 de agosto de 2022, por valor de \$28.593 millones. El 25 de octubre de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. Se adjudicó obra el 23 de febrero de 2023. El proyecto se encuentra en proceso de contratación derivada.

Infraestructura Para la Integración Social

Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías y cicloinfraestructura intervenidas en el marco del Pacto Cundinamarca	A corte 31 de marzo de 2023, se avanza en la ejecución de los siguientes proyectos: 1) Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá por valor de \$1.867 millones, la Alcaldía reportó avance de obra del 30% físico en comité pero la información se encuentra en proceso de validación, la obra presenta atrasos por ola invernal y están implementando plan de contingencia para cumplir el cronograma pactado. 2) Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las



Indicador	Avance Cualitativo
	provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca el proyecto se encuentra en proceso de contratación derivada.

Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
Productores beneficiados con proyectos dirigidos al sector agropecuario en el marco del Pacto Cundinamarca	Avanza la ejecución de los siguientes proyectos: 1) Contrato Especifico (CE) N°2210753 Plaza mercado de la Sierra, Bituima, suscrito el 12-11-2021 por \$1.603 millones, el 01-12-2021 se aprobaron pólizas. Inició obras el 09-11-2022. 2) CE N°2210746 Centro de acopio Cerezos Grandes, Chipaque, suscrito el 12-11-2021 por \$1.093 millones, el 30-12-2021 se aprobaron pólizas. Se suscribió acta de inicio de obra el 21-06-2022. 3) CE N°2210748 Plaza de mercado Gachetá, suscrito el 12-11-2021 por \$2.481 millones, el 28-06-2022 se aprobaron pólizas. Contrato suspendido desde el 11-11-2022. 4) CE N°2210728 Centro de acopio Gutiérrez, suscrito el 10-11-2021 por \$1.705 millones. 5) Contrato Interadministrativo (CI) 906 Edificación mujer tejedora Chipaque por \$1.464 millones. Inició obra el 16-05-2022. 6) CI 660 Plaza de mercado Guayabal de Siquima con una inversión de \$ 1.484 millones, inició obra el 2 de mayo. 7) CI 742 Plaza de mercado de La Mesa, por valor de \$3.167 millones, se encuentra en ejecución de obras. 8) CI 731 Plaza de mercado San Antonio del Tequendama por \$536 millones. 9) CI 754 Plaza de mercado de Zipaquirá, por \$851 millones: en ejecución de obras. 10) CE 2220798 Centro de acopio municipio de El Rosal, suscrito el 05-08-2022 por \$1.046 millones, el 21-10-2022 se aprobaron las garantías. El 02-03-2023 municipio publicó proceso de contratación de obra y el 06-03-2023 de interventoría. 11) CE 2220951 Plaza de mercado Ricaurte, suscrito el 23-08-2022 por \$4.945 millones y el 06-2022 se aprobaron las garantías. Se suscribió acta de inicio de obra el 14 de febrero de 2023. 12) CE 2220968 Plaza de mercado Ubalá, suscrito el 23 de agosto de 2022 por \$1.885 millones, el 29-11-2022 se aprobaron garantías. 13) CE 2221137 Plaza de mercado Agua de Dios, suscrito el 24-10-2022 por \$10.133 millones, el 21-11-2022 se aprobaron pólizas. El día 06-02-2023 se inició obra. 14) CE 2221143 Plaza de mercado Guayabetal, suscrito el 31-10-2022 por \$3.759 millones. 15) CE 2221138 Plaza de mercado Machetá. Suscrito el 28-10-2022 por \$6.081 millones, el 24-11-2022 se aprobaron pólizas. Se adjudicó obra el 10-02-2023. 16) CE 2221134 Plaza de ferias Manta, suscrito el 27-10-2022 por \$1.367 millones, el 22-11-2022 se aprobaron pólizas. Se adjudicó obra el 28-02-2023. 17) CE 2221135 Plaza de mercado Pulí, suscrito el 27-10-2022 por \$2.947 millones, el 23-11-2022 se aprobaron pólizas. Se suscribió acta de inicio de obra el 02-02-2023. 18) CE 2221178 Centro de acopio agroindustrial- Chipaque, suscrito el 06-12-2022 por \$2.195 millones, el 15-02-2022 se aprobaron pólizas. 19) CE 2221188 Plaza de mercado- Chontá, suscrito el 22-12-2022 por \$2.272 millones, el 22-02-2023 se aprobaron pólizas. 20) CE 2221179 Centro de acopio municipio de Fomeque. Suscrito el 16-12-2022 por \$16.092 millones. 21) CE 2221187 Plaza comercial de Nilo, suscrito el 22-12-2022 por \$3.642 millones, el 22-02-2023 se aprobaron pólizas 22) CE 2221177 Centro de acopio agroindustrial -Quetame. Suscrito el 06-12- 2022, por \$24.588 millones, el 13-02-2023 se aprobaron pólizas. 23) CE N°2221185 Centro de acopio Sasaima. Suscrito el 19-12-2022 por \$1.586 millones, el 13-02-2023 se aprobaron pólizas

Deporte y Recreación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura deportiva y recreativa intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	A corte 31 de marzo, se avanza en la ejecución de los proyectos de estadios, coliseos, escenarios deportivos y se cuenta con el siguiente avance, así: 1) Adecuación y remodelación estadio municipal Ubaté. Se suscribió el contrato específico N°2210729, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$7.455 millones. El 7 de marzo se aprobaron las garantías del contrato. Se suscribió acta de inicio el 8 de julio de 2021. Se reporta avance de ejecución del 87%.2) Estadio Zipaquirá. Se suscribió el contrato específico



Indicador	Avance Cualitativo
	<p>N°2210732 el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$21.407 millones. El 16 de febrero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. Se suscribió acta de inicio de obra el 25 de noviembre de 2022. Se reporta avance de ejecución del 2.4%. 3) Coliseo de Funza. Se suscribió el contrato específico N°2210731 el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$38.692 millones. El 28 de junio se aprobaron las garantías del contrato. Las actas de inicio de obra e interventoría se suscribieron el 12 de enero de 2023. No ha iniciado obra. 4) Parque recreo deportivo Los Patos de Tocancipá. Se suscribió el contrato específico N°2210741 el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$20.000 millones. El 12 de enero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. Se suscribió acta de inicio el 2 de agosto y se reporta avance de ejecución 51% a febrero de 2023. 6) Mejoramiento escenario deportivo Jerusalén. Se suscribió el contrato específico N°2221133 el 24 de octubre de 2022, por valor de \$4.185 millones. El 29 de noviembre se contó con la aprobación de garantías. No ha iniciado obra.</p>

Planeación/ Inclusión Social y Reconciliación/ Cultura

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura pública intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	<p>A corte 31 de marzo, se avanza en la ejecución de los siguientes proyectos de infraestructura pública intervenida, así: 1) Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá. Se suscribió el contrato específico N°2210738 entre ENTerritorio y el municipio de Cajicá, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$5.722 millones. El 2 de marzo de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El comité operativo y de seguimiento aprobó modificación del contrato específico el cual quedó suscrito el 12 de agosto. El 19 de octubre el municipio adjudicó el proceso LP-006-2022 al Consorcio Construcajicá por valor de \$5.470.186.487 y el 7 de octubre adjudicó el concurso de méritos CM-006-2022 al Consorcio Inter CDI por valor de \$399.712.578. Se suscribió acta de inicio de obra el 2 de diciembre de 2022, presenta un avance de obra de 10,95%. 2) Teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá. - Contrato - 2221190, suscrito el 22 de diciembre de 2022 por un valor de \$41.178 millones. Cuenta con pólizas aprobadas el día 8 de marzo de 2022. 3) Centro Cultural en Gachancipá, Contrato -2221191, suscrito el 21 de diciembre de 2022 por un valor de \$15.544 millones. Cuenta con pólizas aprobadas el día 13 de marzo de 2022, no tiene avance de obra. 3) Contrato -2221191, Centro Cultural en Gachancipá, suscrito el 21 de diciembre de 2022 por un valor de \$15.544 millones. Cuenta con pólizas aprobadas el día 13 de marzo de 2022, no tiene avance de obra. 4) Centro Cultural en Zipaquirá, Contrato - 2221203, suscrito el 22 de diciembre de 2022 por un valor de \$59.526 millones. Cuenta con pólizas aprobadas el día 8 de marzo de 2022, no tiene avance de obra.</p>



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 32 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 393.312 millones, equivalente al 76% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá	En Ejecución	\$743	\$1.142	\$1.142	\$1.885
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$2.481	\$2.481	\$2.481
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	En Ejecución	\$178	\$1.190	\$1.190	\$1.368
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca	En Ejecución	\$505	\$3.255	\$3.255	\$3.759
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$212	\$882	\$882	\$1.093
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutierrez, Cundinamarca	En Ejecución	\$568	\$1.137	\$1.137	\$1.705
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana	En Ejecución	\$0	\$3.642	\$3.642	\$3.642
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte	En Ejecución	\$2.606	\$2.339	\$2.339	\$4.945
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá	En Ejecución	\$2.696	\$3.386	\$3.386	\$6.082
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - centro funcional Quetame	En Ejecución	\$0	\$24.588	\$24.588	\$24.588
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; II etapa, Chipaque	En Ejecución	\$0	\$2.194	\$2.194	\$2.194
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	En Ejecución	\$362	\$1.242	\$1.242	\$1.603
Agricultura y Desarrollo Rural	Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí	En Ejecución	\$0	\$2.948	\$2.948	\$2.948
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima	En Ejecución	\$0	\$1.586	\$1.586	\$1.586
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$10.133	\$10.133	\$10.133
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque, Cundinamarca	En Ejecución	\$2.331	\$13.762	\$13.762	\$16.092



Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal	En Ejecución	\$0	\$1.046	\$1.046	\$1.046
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca	En Ejecución	\$272	\$2.000	\$2.000	\$2.272
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$28.593	\$28.593	\$28.593
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$10.246	\$10.246	\$10.246
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paime, departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$3.803	\$3.803	\$3.803
Cultura	Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá	En Ejecución	\$7.447	\$39.732	\$39.732	\$47.178
Cultura	Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá Cundinamarca	En Ejecución	\$13.526	\$46.000	\$46.000	\$59.526
Cultura	Construcción del Centro Cultural en Gachancipá	En Ejecución	\$800	\$14.744	\$14.744	\$15.544
Deporte y Recreación	Adecuación y remodelación estadio municipal Ubaté	En Ejecución	\$0	\$7.455	\$7.455	\$7.455
Deporte y Recreación	Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	En Ejecución	\$10.722	\$15.000	\$15.000	\$25.722
Deporte y Recreación	Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca	En Ejecución	\$4.692	\$34.000	\$34.000	\$38.692
Deporte y Recreación	Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$4.185	\$4.185	\$4.185
Deporte y Recreación	Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	En Ejecución	\$0	\$20.000	\$20.000	\$20.000
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	En Ejecución	\$387	\$5.723	\$5.723	\$6.110
Transporte	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$83.380	\$83.380	\$83.380
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	En Ejecución	\$367	\$1.500	\$1.500	\$1.867
Total, general			\$48.414	\$393.312	\$393.312	\$441.726

Millones de \$ COP
