




Pacto CASANARE

Ficha trimestral, junio de 2024.

\$ 326 Mil millones

Recursos aportados



12 Proyectos financiados



 Proyectos no iniciados (en proceso de estructuración o viabilidad sectorial)

56%
Avance consolidado

Pacto Territorial Casanare

27/02/2021 Fecha suscripción	5 Plazo en años	27/02/2026 Fecha de Terminación	19 Meses para vencimiento	67% % Tiempo Transcurrido
19 Total Proyectos		\$577,324 Valor Indicativo (Millones)		
\$382,087 Aporte indicativo nación (Millones)	\$195,237 Aporte indicativo territorio (Millones)	\$0 Aporte indicativo otros (Millones)		

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$80,118	\$75,532	\$4,586	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$65,755	\$0	\$65,755	\$0
Deporte y Recreacion	\$24,569	\$19,069	\$5,500	\$0
Transporte	\$404,046	\$285,804	\$118,242	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$2,837	\$1,683	\$1,155	\$0
Total	\$577,324	\$382,087	\$195,237	\$0

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

56.41%	\$325,661 Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado
--------	--

Número de Proyectos por Estado



Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ejecutado	Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare	\$18,497	\$18,497	\$0	\$0
Ejecutado	Construcción de obras de protección sobre la rivera del río meta o el casco urbano del municipio de Orocué del departamento del Casanare.	\$9,500	\$9,500	\$0	\$0
Ejecutado	Construcción de obras de mitigación y protección para control de fenómeno de remoción en masa en el sector de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Sabanalarga Casanare.	\$1,140	\$1,140	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento a nivel de pavimento en mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - Orocué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) municipio de Orocué departamento de Casanare.	\$149,068	\$100,653	\$48,415	\$0
En Ejecución	Mejoramiento y adecuación de la vía que comunica el casco urbano del municipio de Trinidad con el corregimiento de Bocas del Pauto a orillas del Río Meta - fase I	\$47,240	\$0	\$47,240	\$0
En Ejecución	Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare	\$45,078	\$45,078	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección del Río Cravo sur margen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización El Paraíso del municipio de Yopal - departamento de Casanare	\$41,518	\$36,933	\$4,586	\$0

En Ejecución	Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.	\$18,511	\$18,511	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.	\$14,992	\$14,992	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción parador y obras de urbanismo en El Parque del Arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare	\$11,355	\$0	\$11,355	\$0
En Ejecución	Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.	\$9,448	\$9,448	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de la planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario centro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey departamento de Casanare	\$2,837	\$1,683	\$1,155	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de vías terciarias a nivel de capa de rodadura, placas huellas y obras de arte en diferentes vías de los municipios del departamento de Casanare	\$59,671	\$50,914	\$8,756	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de la vía entre los municipios de Aguazul - Maní y la vereda La Poyata en el municipio de Maní, departamento de Casanare	\$55,670	\$55,670	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción parque lineal ecoturístico y malecón del municipio de Yopal en el departamento de Casanare	\$42,000	\$0	\$42,000	\$0

No Iniciado	Construcción del coliseo departamental en el Polideportivo Pier Lora Muñoz del municipio de Yopal	\$24,569	\$19,069	\$5,500	\$0
No Iniciado	Construcción parque lineal y mirador 360° en la vereda Cuarto Unete del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare	\$12,400	\$0	\$12,400	\$0
No Iniciado	Mejoramiento a nivel de capa de rodadura de la vía que conduce de Monterralo - Los Lirios en el municipio de Aguazul - a Visinaca municipio de Tauramena , departamento de Casanare	\$9,728	\$0	\$9,728	\$0
No Iniciado	Mejoramiento a nivel de pavimento del tramo vial que conduce desde el casco urbano de municipio de Nunchía al sector la Y vereda Buenos Aires del municipio de Nunchía, departamento de Casanare	\$4,103	\$0	\$4,103	\$0
Total		\$577,324	\$382,087	\$195,237	\$0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

3 Total Proyectos	\$42,951 Valor Indicativo (Millones)					
\$42,951 Aporte indicativo DNP FRPT	\$0 Aporte indicativo territorio	\$0 Aporte indicativo Sector	\$0 Aporte indicativo Otros			
Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.	En Ejecución	\$9,448	\$9,448	\$0	\$0	\$0

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.	En Ejecución	\$18,511	\$18,511	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.	En Ejecución	\$14,992	\$14,992	\$0	\$0	\$0
Total		\$42,951	\$42,951	\$0	\$0	\$0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Casanare.aspx>

Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Casanare

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$9,448

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$9,448

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Orocué
BPIN	2021852300012	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	124-2220768	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	38	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	8/18/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una obra de infraestructura en geotubos, adecuación de cauce con dragados y conformación de banca, como obra principal para el desarrollo del proyecto, para la mitigación y la atención de desastres en el centro poblado El Algarrobo del municipio de Orocué.	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1
		Numero de obras de infraestructura

Información específica de ejecución contrato específico

2/08/2022

Fecha de Suscripción

30/08/2022

Fecha de Inicio

28

Plazo en Meses

10/12/2024

Fecha Terminación

600

Número de Beneficiarios

\$9,448

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$299

Presupuesto Comprometido Territorio

\$9,747

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

30/04/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

33%

% Ejecutado

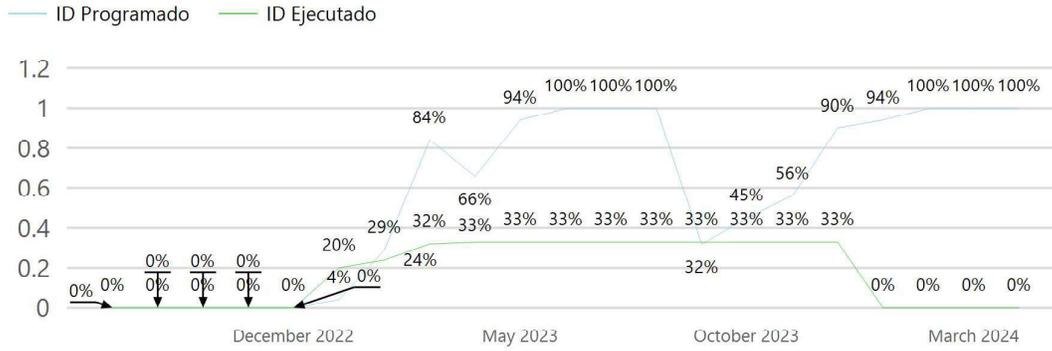

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Casanare

Fecha de Corte

17/06/2024

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$18,511

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$18,511

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Aguazul
BPIN	2022850100003	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	129-2220844	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	37	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	8/3/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Canalización de 1800 mts de los caños Aguazulero y Cimarrón mediante revestimiento en concreto reforzado al talud, con zona de transitabilidad.	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1
		Numero de obras de infraestructura

Información específica de ejecución contrato específico

12/08/2022	21/11/2022	26	21/01/2025	5,637
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios


\$18,511	\$0	\$0
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

\$18,511


Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

21/01/2024	26%	52%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

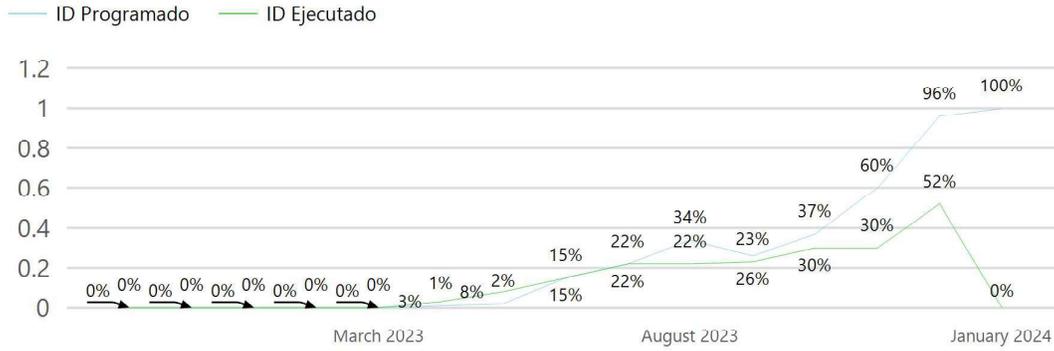

Avance Financiero del proyecto

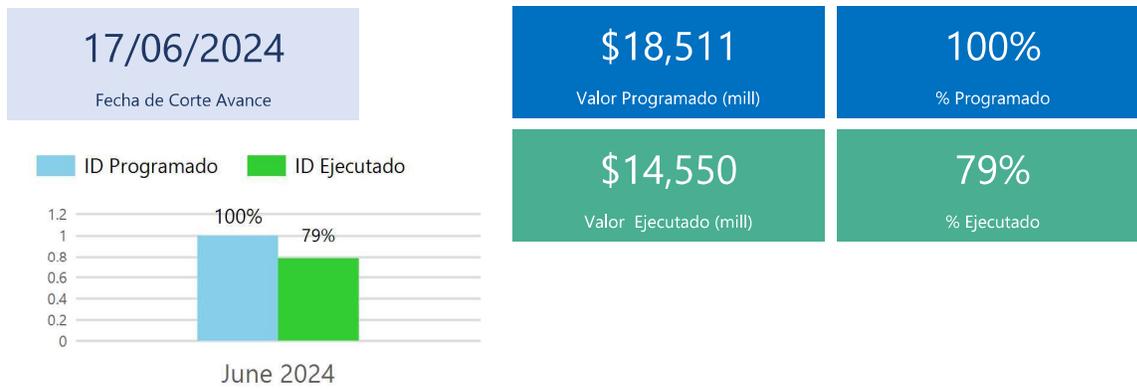

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Casanare

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$14,992

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$14,992

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Yopal
BPIN	2021000070026	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	179-2230153	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	101	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	4	Fecha viabilidad	3/27/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 6 km de vías en pavimento flexible. Adicionalmente se construirán 14 alcantarillas de 36'.	Vía terciaria mejorada	6
		Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

16/06/2023

Fecha de Suscripción

11/09/2023

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

11/02/2025

Fecha Terminación

12,393

Número de Beneficiarios

\$13,818

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$13,818

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Fecha de Corte Avance

% Programado

% Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.
