


# Pacto CESAR – LA GUAJIRA

## Ficha trimestral, junio de 2024.

**\$ 2,91** Billones

### Recursos aportados



**84** Proyectos financiados



Proyectos no iniciados (en proceso de estructuración o viabilidad sectorial)

**83%**  
Avance consolidado

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

14/01/2021 Fecha suscripción	5 Plazo en años	14/01/2026 Fecha de Terminación	18 Meses para vencimiento	69% % Tiempo Transcurrido
104 Total Proyectos		\$3,515,203 Valor Indicativo (Millones)		
\$2,365,998 Aporte indicativo nación (Millones)	\$1,124,872 Aporte indicativo territorio (Millones)	\$24,333 Aporte indicativo otros (Millones)		

### Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)


Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138,191	\$128,651	\$9,540	\$0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114,686	\$60,056	\$54,630	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$163,000	\$126,500	\$36,500	\$0
Cultura	\$160,458	\$0	\$160,458	\$0
Defensa y Policia	\$74,560	\$74,560	\$0	\$0
Deporte y Recreacion	\$100,405	\$99,604	\$801	\$0
Educacion	\$230,339	\$56,000	\$150,005	\$24,333
Inclusion Social y Reconciliacion	\$66,049	\$66,049	\$0	\$0
Justicia y Del_Derecho	\$222,786	\$222,786	\$0	\$0
Minas y Energia	\$229,890	\$139,076	\$90,814	\$0
Salud y Proteccion Social	\$32,834	\$0	\$32,834	\$0
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132,696	\$132,696	\$0	\$0
Transporte	\$1,516,011	\$1,007,496	\$508,515	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308,914	\$252,524	\$56,390	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24,385	\$0	\$24,385	\$0
<b>Total</b>	<b>\$3,515,203</b>	<b>\$2,365,998</b>	<b>\$1,124,872</b>	<b>\$24,333</b>

### Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

82.86%	\$2,912,759 Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado
--------	--

### Número de Proyectos por Estado

Proyectos por estado



Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)


Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ejecutado	Mejoramiento a través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada Valledupar-Puente Rafael Escalona-La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Paz-Cuestecitas, en los departamentos del Cesar y La Guajira	\$108,013	\$108,013	\$0	\$0
Ejecutado	Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Cuatro vientos Codazzi en el Departamento de Cesar, en marco del Programa de Obras Publica "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Modulo 2.	\$53,185	\$53,185	\$0	\$0
Ejecutado	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	\$19,955	\$19,955	\$0	\$0
Ejecutado	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera El Carmen - Valledupar - Maicao. Transversal Carmen - Bosconia - Valledupar - Maicao. Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira	\$13,885	\$13,885	\$0	\$0

Ejecutado	Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi	\$13,079	\$0	\$13,079	\$0
Ejecutado	Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en la zona rural de diferentes municipios del Departamento de Cesar	\$12,900	\$0	\$12,900	
Ejecutado	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, Departamento del Cesar	\$10,211	\$6,055	\$4,155	\$0
Ejecutado	Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril	\$9,848	\$0	\$9,848	\$0
Ejecutado	Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar	\$7,807	\$0	\$7,807	\$0
Ejecutado	Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure	\$6,290	\$0	\$6,290	\$0
Ejecutado	Construcción del parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.	\$5,707	\$5,600	\$107	\$0
Ejecutado	Construcción de obras para el control de inundación y erosión en los arroyos Kutanamana y Chemerrain en el municipio de Uribia departamento de La Guajira	\$4,397	\$4,397	\$0	\$0



Ejecutado	Desarrollo de acciones para la protección y recuperación de la biodiversidad del ecosistema de la Serranía del Perijá en el municipio de Codazzi, Cesar	\$3,846	\$3,846	\$0	\$0
Ejecutado	Construcción de canal abierto en concreto rígido para evitar las inundaciones en el sector nororiental del casco urbano de San Juan del Cesar - La Guajira	\$3,323	\$3,323	\$0	\$0
Ejecutado	Recuperación hidrodinámica y ambiental del caño Paraluz como estrategia de recuperación de la ciénaga mata de palma, en el municipio de El Paso y Chiriguaná, Cesar	\$3,310	\$3,310	\$0	\$0
Ejecutado	Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca 2802-03 del río Chirriaimo y Manaure en el Departamento de Cesar	\$2,165	\$2,165	\$0	\$0
Ejecutado	Estudios y diseños mejoramiento pavimentación carretera Cuatro Vientos Codazzi Dto. Cesar	\$2,035	\$2,035	\$0	\$0
Ejecutado	Restauración de áreas degradadas en las microcuencas del río Magirriaimo, jurisdicción de CorpoCesar	\$1,862	\$1,862	\$0	\$0
Ejecutado	Construcción de 121 unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa del municipio de Gamarra	\$1,834	\$1,834	\$0	\$0
Ejecutado	Implementación de acciones de adaptación al cambio climático en el edificio bioclimático y el CAVFFS, sedes de CorpoCesar en el marco del PIGCCT del Departamento de Cesar	\$1,381	\$1,381	\$0	\$0
Ejecutado	Estudios y diseños fase 3 para la construcción de terminales, torre de control, base SEI y obras complementarias del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, Cesar	\$1,086	\$1,086	\$0	\$0

En Ejecución	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)	\$302,328	\$189,804	\$112,524	\$0
En Ejecución	Conexión Alta Guajira (Uribe- Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu)	\$284,974	\$284,974	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar (Grupo I)	\$195,642	\$144,867	\$50,775	\$0
En Ejecución	Cárcel de Riohacha	\$184,786	\$184,786	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar	\$146,458	\$0	\$146,458	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo III)	\$94,684	\$87,847	\$6,837	\$0
En Ejecución	Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	\$80,333	\$56,000		\$24,333
En Ejecución	Tramo Florida - Cuestecitas	\$75,000	\$0	\$75,000	\$0
En Ejecución	Policía Metropolitana de Valledupar	\$74,560	\$74,560	\$0	\$0
En Ejecución	Proyecto solar Uribe	\$72,121	\$72,121	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción Adecuación y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecón, Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0
En Ejecución	Conectividad y transformación digital Departamento de Cesar	\$69,487	\$69,487	\$0	\$0
En Ejecución	Conectividad y transformación digital departamento de La Guajira	\$63,209	\$63,209	\$0	\$0

 Departamento Nacional de Planeación		<b>FICHA TRIMESTRAL            PACTOS TERRITORIALES</b>			Página 6 De 16	
En Ejecución	Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	
En Ejecución	Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar	\$45,720	\$45,720	\$0	\$0	
En Ejecución	Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello	\$43,212	\$0	\$43,212	\$0	
En Ejecución	Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira	\$33,353	\$0	\$33,353	\$0	
En Ejecución	Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi	\$33,241	\$0	\$33,241	\$0	
En Ejecución	Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira	\$32,928	\$0	\$32,928	\$0	
En Ejecución	Atención extramural	\$32,834	\$0	\$32,834	\$0	
En Ejecución	Construcción de una Marina Multipropósito en Riohacha, Distrito Especial Turístico y Cultural, La Guajira	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	
En Ejecución	Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar	\$30,407	\$30,407	\$0	\$0	

En Ejecución	Mejoramiento vial de la ruta folclorica mediante la construccion de pavimento en asfalto entre el Municipio de Villanueva y la zona agricola de Veracruz, Municipio de San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira	\$28,885	\$28,885	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.	\$28,562	\$28,562	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	\$24,859	\$24,859	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril	\$24,501	\$0	\$24,501	\$0
En Ejecución	Mejoramiento urbanístico y obras complementarias en los municipios de hatonuevo y el molino departamento de La Guajira	\$24,385	\$0	\$24,385	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure BC	\$19,846	\$0	\$19,846	\$0
En Ejecución	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	\$19,036	\$19,036	\$0	\$0
En Ejecución	Juegos Bolivarianos - Coliseo Multifuncional Oscar Muñoz Oviedo.	\$18,331	\$18,331	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi	\$18,298	\$0	\$18,298	\$0
En Ejecución	Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico	\$18,219	\$18,219	\$0	\$0

En Ejecución	Ejecución de estudios, diseños construcción y apuesta en funcionamiento del proyecto de abastecimiento de agua mediante el esquema de pilas publicas, en el sector de La Guajira zona industrial-municipio de Uribia	\$16,339	\$11,283	\$5,057	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego	\$15,541	\$0	\$15,541	\$0
En Ejecución	Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	\$15,225	\$15,225	\$0	\$0
En Ejecución	Energía convencional Cabo	\$14,000	\$7,000	\$7,000	\$0
En Ejecución	Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - Departamento del del Cesar	\$13,707	\$8,129	\$5,578	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira	\$12,797	\$0	\$12,797	\$0
En Ejecución	Construcción de Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz, departamento del Cesar	\$12,694	\$12,000	\$694	\$0
En Ejecución	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	\$12,012	\$12,012	\$0	\$0

En Ejecución	Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.	\$11,226	\$11,226	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar	\$11,211	\$7,738	\$3,473	\$0
En Ejecución	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar	\$10,995	\$10,995	\$0	\$0
En Ejecución	Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patilla, Municipio de Valledupar	\$10,496	\$0	\$10,496	\$0
En Ejecución	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	\$10,210	\$10,210	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento del Cesar	\$9,600	\$9,600	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira	\$9,570	\$0	\$9,570	\$0
En Ejecución	Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaoero del Municipio de San Diego	\$9,540	\$0	\$9,540	\$0
En Ejecución	Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar	\$9,365	\$9,365	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira	\$6,855	\$0	\$6,855	\$0



En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de sichichon, municipio de Manaure, La Guajira	\$5,543	\$3,827	\$1,715	\$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de puerto estrella municipio de Uribia	\$5,336	\$3,499	\$1,837	\$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de punta espada municipio de Uribia	\$5,227	\$5,227	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de flor de La Guajira, municipio de Uribia, La Guajira	\$5,105	\$5,105	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira	\$4,669	\$4,669	\$0	\$0

En Ejecución	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, Departamento del del Cesar	\$4,659	\$2,763	\$1,896	\$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de la gloria, municipio de Manaure, La Guajira	\$4,552	\$3,143	\$1,409	\$0
En Ejecución	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	\$4,036	\$4,036	\$0	\$0
En Ejecución	Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el Departamento del del Cesar.	\$3,764	\$2,232	\$1,532	\$0
En Ejecución	Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey	\$3,498	\$2,116	\$1,383	\$0
En Ejecución	Actualización Estudios y Diseños Distrito de Riego San Juan y Ranchería	\$2,615	\$2,615	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, Departamento del del Cesar.	\$2,559	\$1,517	\$1,041	\$0
En Ejecución	Construcción de puente vehicular sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva – Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0
No Iniciado	Infraestructura educativa	\$150,005	\$0	\$150,005	\$0
No Iniciado	Distrito de Riego San Juan	\$107,000	\$107,000	\$0	\$0
No Iniciado	Ampliación PTAR sobre río Cesar. Valledupar	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0
No Iniciado	Erosión Costera Dibulla	\$41,729	\$0	\$41,729	\$0

No Iniciado	Energía Solar del Sur	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0
No Iniciado	Segunda Torre del Palacio de Justicia de Valledupar	\$38,000	\$38,000	\$0	\$0
No Iniciado	Centro de Energía Renovables	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0
No Iniciado	Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores del distrito de Riohacha	\$28,251	\$18,363	\$9,888	\$0
No Iniciado	Mejoramiento Aeropuerto Hacaritama	\$28,000	\$21,000	\$7,000	\$0
No Iniciado	Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi	\$23,027	\$0	\$23,027	\$0
No Iniciado	Amoblamiento de Espolones	\$18,000	\$18,000	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de la junta, la peña y curazao, en el municipio de san juan (departamento de La Guajira)	\$15,152	\$10,152	\$5,000	\$0
No Iniciado	Mercados de Maicao	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0
No Iniciado	Mercados de Riohacha	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0
No Iniciado	Archivo departamental	\$14,000	\$0	\$14,000	\$0
No Iniciado	Muelles de Cabotaje (4 municipios sin Riohacha, Dibulla, Manaure y dos en Uribia)	\$13,000	\$6,500	\$6,500	\$0
No Iniciado	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de El Molino-departamento de La Guajira	\$6,260	\$6,260	\$0	\$0
No Iniciado	Optimización hidráulica acueducto Hatonuevo	\$4,822	\$2,893	\$1,929	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San Diego	\$2,664	\$2,664	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción De Pavimento En Concreto Rígido De Las Calles Y Carreras Del Municipio De Pueblo Bello - Cesar	\$2,030	\$2,030	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>\$3,515,203</b>	<b>\$2,365,998</b>	<b>\$1,124,872</b>	<b>\$24,333</b>

### Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

23

Total Proyectos

\$1,050,059

Valor Indicativo (Millones)

\$854,789

Aporte indicativo DNP FRPT

\$170,937

Aporte indicativo territorio


\$0

Aportes indicativo Sector

\$24,333

Aporte indicativo Otros

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar	En Ejecución	\$30,407	\$30,407	\$0	\$0	\$0
Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar	En Ejecución	\$9,365	\$9,365	\$0	\$0	\$0
Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	En Ejecución	\$12,012	\$12,012	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar (Grupo I)	En Ejecución	\$195,642	\$144,867	\$50,775	\$0	\$0
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo III)	En Ejecución	\$94,684	\$87,847	\$6,837	\$0	\$0

 Departamento Nacional de Planeación		<b>FICHA TRIMESTRAL            PACTOS TERRITORIALES</b>				Página 1 De 16 4	
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)	En Ejecución	\$302,328	\$189,804	\$112,524	\$0	\$0	
Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	Ejecutado	\$19,955	\$19,955	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	En Ejecución	\$10,210	\$10,210	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.	En Ejecución	\$11,226	\$11,226	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.	En Ejecución	\$28,562	\$28,562	\$0	\$0	\$0	
Construcción de puente vehicular sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva – Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira	En Ejecución	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0	\$0	

Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	En Ejecución	\$15,225	\$15,225	\$0	\$0	\$0
Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	En Ejecución	\$4,036	\$4,036	\$0	\$0	\$0
Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	En Ejecución	\$80,333	\$56,000		\$0	\$24,333
Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar	En Ejecución	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0
Construcción de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento del Cesar	En Ejecución	\$9,600	\$9,600	\$0	\$0	\$0
Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar	En Ejecución	\$10,995	\$10,995	\$0	\$0	\$0
Construcción de Estadio Municipal Edíson Mejía en el Municipio de la Paz, departamento del Cesar	En Ejecución	\$12,694	\$12,000	\$694	\$0	\$0



Construcción del parque recreacional-cancha de fútbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.	Ejecutado	\$5,707	\$5,600	\$107	\$0	\$0
Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico	En Ejecución	\$18,219	\$18,219	\$0	\$0	\$0
Construcción de una Marina Multipropósito en Riohacha, Distrito Especial Turístico y Cultural, La Guajira	En Ejecución	\$32,000	\$32,000	\$0	\$0	\$0
Construcción Adecuación y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecón, Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0
Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$24,859	\$24,859	\$0	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>\$1,050,059</b>	<b>\$854,789</b>	<b>\$170,937</b>	<b>\$0</b>	<b>\$24,333</b>

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Cesar-La-Guajira.aspx>

# Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales  
Proyectos en ejecución y ejecutados

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción del parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.**

Estado Proyecto

Ejecutado

### Información general del contrato específico

<b>\$5,707</b> Valor Indicativo del Proyecto (millones)	<b>En Liquidación</b> Estado Detallado
--	---

<b>\$5,600</b> Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	<b>\$0</b> Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	<b>\$107</b> Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
---	--	--

<b>Sector de Inversión</b>	Deporte y Recreación	<b>Municipio Intervención</b>	Pueblo Bello
<b>BPIN</b>	2021205700033	<b>Área de influencia</b>	Urbano
<b>No. Contrato Específico</b>	069-2210652	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	59	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	5/27/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción parque recreacional con área a intervenir de 12.857m <sup>2</sup> que consta de una cancha de futbol de 6.174 m <sup>2</sup> , con grama natural y graderías con capacidad para 363 personas aproximadamente, gimnasio biosaludable, juegos de niños, andenes de circulaciones peatonal, zonas verdes, parqueaderos, infraestructura para servicios complementarios como: Baterías sanitarias, oficina administrativa, camerinos, cuarto técnico o de bombas, cuarto eléctrico y deposito.	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	1
		Número de personas

### Información específica de ejecución contrato específico


<b>13/10/2021</b> Fecha de Suscripción	<b>5/01/2022</b> Fecha de Inicio	<b>19</b> Plazo en Meses	<b>5/08/2023</b> Fecha Terminación	<b>1,459</b> Número de Beneficiarios
---	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---

<b>\$5,600</b> Presupuesto Comprometido DNP FRPT	<b>\$0</b> Presupuesto Comprometido Sector	<b>\$107</b> Presupuesto Comprometido Territorio
---	---	---

<b>\$5,707</b> Presupuesto Comprometido Total (millones)
---

### Avance físico del proyecto

<b>5/07/2023</b> Fecha de Corte Avance	<b>100%</b> % Programado	<b>100%</b> % Ejecutado
---	-----------------------------	----------------------------

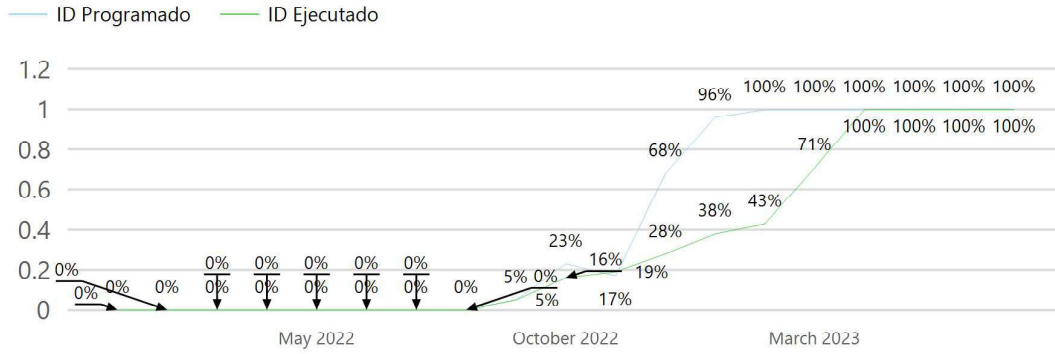

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$5,600  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado



\$5,040  
Valor Ejecutado (mill)

90%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar (Grupo I)**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$195,642

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$144,867

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$50,775

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Transporte	<b>Municipio Intervención</b>	Departamento de Cesar
<b>BPIN</b>	2021002200118	<b>Área de influencia</b>	Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	070-2210657	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	98	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	6	<b>Fecha viabilidad</b>	5/11/2021


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar las condiciones de rodadura en ocho (8) vías terciarias de siete (7) municipios de la zona norte y centro del departamento, equivalentes a 88.49 km intervenidos	Vía terciaria mejorada	76565
		Kilómetros de vías terciaria

### Información específica de ejecución contrato específico

13/10/2021	1/04/2022	31	1/11/2024	329,245
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios
\$144,867	\$0	\$50,775		
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio		
\$195,642				
Presupuesto Comprometido Total (millones)				

### Avance físico del proyecto

1/10/2024	16%	86%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

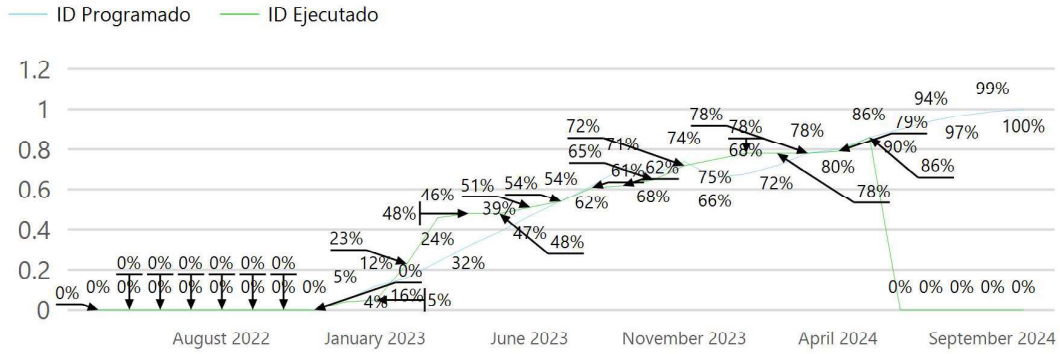

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$144,867  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado



\$101,099  
Valor Ejecutado (mill)

70%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.



## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción de Estadio Municipal Edison Mejía en el Municipio de la Paz, departamento del Cesar**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$12,694

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$12,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$694

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Deporte y Recreación	<b>Municipio Intervención</b>	La Paz
<b>BPIN</b>	2021206210028	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	075-2210678	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	61	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	3	<b>Fecha viabilidad</b>	7/16/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un estadio de futbol con la intervención de áreas libres 26.580,52 metros cuadrados, áreas cubiertas 889.97 metros cuadrados y tribunas con un aforo para 1.170 personas aproximadamente, para beneficiar a 21.391 personas.	Cancha construida	1
		Número de canchas

### Información específica de ejecución contrato específico

21/10/2021	6/05/2022	29	6/10/2024	29,603
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios


\$12,000	\$0	\$694
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

\$12,694

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

6/09/2024	100%	98%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

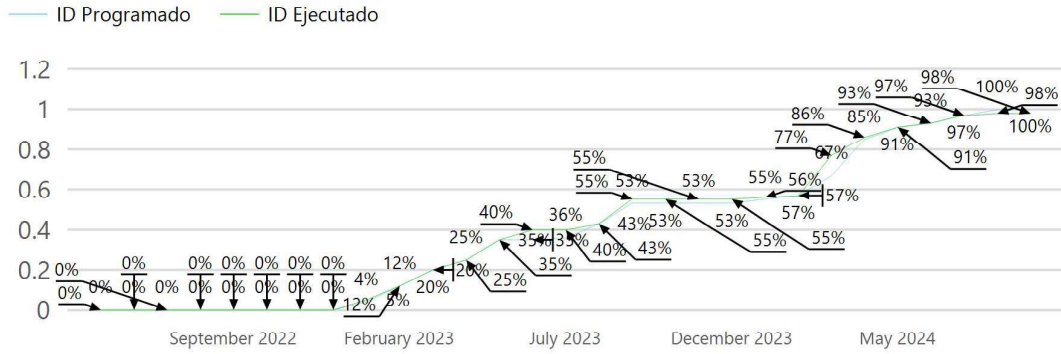

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$12,000  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado



\$8,760  
Valor Ejecutado (mill)

73%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

### Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar

Estado Proyecto

En Ejecución

#### Información general del contrato específico

\$10,995

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$10,995

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Deporte y Recreacion	<b>Municipio Intervención</b>	Chimichagua
<b>BPIN</b>	2021201750026	<b>Área de influencia</b>	Urbano
<b>No. Contrato Específico</b>	078-2210702	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	60	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	10/20/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de escenarios deportivos en 25.797,68 m2 que consta de cancha de futbol en grama sintética, pista de patinaje de velocidad ruta con sus respectivas graderías, áreas de integración de los escenarios deportivos, juegos infantiles y gimnasio biosaludable al aire libre, parqueadero	Parque recreo-deportivo construido y dotado	1
		Número de parques recreo-deportivos

#### Información específica de ejecución contrato específico

2/11/2021

Fecha de Suscripción

26/11/2021

Fecha de Inicio

33

Plazo en Meses

31/08/2024

Fecha Terminación

14,530

Número de Beneficiarios

\$10,995

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$10,995

Presupuesto Comprometido Total (millones)

#### Avance físico del proyecto

26/07/2024


Fecha de Corte Avance

20%


% Programado

83%

% Ejecutado

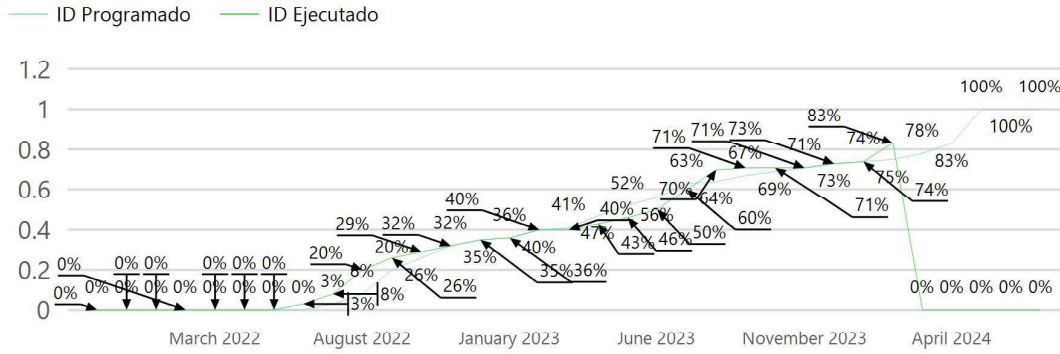

Avance Financiero del proyecto

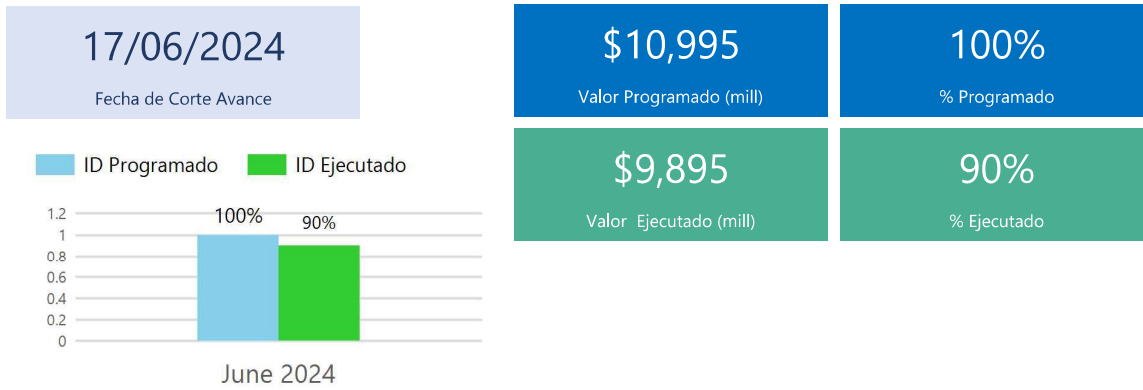

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento del Cesar**

Estado Proyecto

**En Ejecución**

### Información general del contrato específico

**\$9,600**

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

**En ejecución de obra**

Estado Detallado

**\$9,600**

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

**\$0**

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

**\$0**

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Deporte y Recreación	<b>Municipio Intervención</b>	El Paso
<b>BPIN</b>	2021202500031	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	082-2210723	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	62	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	9/27/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un escenario deportivo el cual consta de un (1) patinódromo y gradería, una (1) cancha de fútbol y gradería, instalaciones eléctricas e iluminación zonas exteriores – andenes, juego de niños, gimnasio bio-saludable, zonas verdes, cerramiento exterior, para beneficiar a 5.379 habitantes.	Parque recreo-deportivos construidos	1
		Número de parques recreo-deportivos

### Información específica de ejecución contrato específico

**9/11/2021**

Fecha de Suscripción

**29/12/2021**

Fecha de Inicio

**30**

Plazo en Meses

**29/06/2024**

Fecha Terminación

**7,422**

Número de Beneficiarios

**\$9,600**

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

**\$0**

Presupuesto Comprometido Sector

**\$32**

Presupuesto Comprometido Territorio

**\$9,632**

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

**29/05/2024**


Fecha de Corte Avance

**7%**

% Programado

**78%**

% Ejecutado

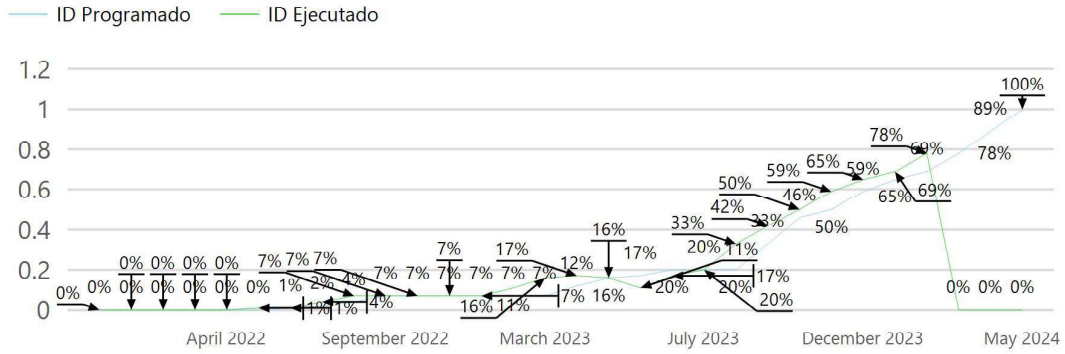


Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$9,600  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado



\$8,640  
Valor Ejecutado (mill)

90%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.



## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira**

Estado Proyecto

**Ejecutado**

### Información general del contrato específico


<b>\$19,955</b> Valor Indicativo del Proyecto (millones)		<b>En Liquidación</b> Estado Detallado	
<b>\$19,955</b> Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)		<b>\$0</b> Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	
<b>\$0</b> Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)			
<b>Sector de Inversión</b>	Minas y Energía	<b>Municipio Intervención</b>	Uribia(La Guajira), Riohacha(La Guajira), Maicao(La Guajira), Manaure (La Guajira)
<b>BPIN</b>	2020002440062	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	093-2210739	<b>Es Inversión climática?</b>	Si
<b>No. CONPES Anexo B</b>	87	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	2	<b>Fecha viabilidad</b>	8/6/2021
<b>Alcance</b>		<b>Producto Principal</b>	<b>Meta del Producto</b>
Suministro instalación y puesta en funcionamiento de 1.122 soluciones de energía solar fotovoltaica en los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia, para beneficiar a 4.488 habitantes.		Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	1122
			unidades

### Información específica de ejecución contrato específico

<b>11/11/2021</b> Fecha de Suscripción	<b>3/01/2022</b> Fecha de Inicio	<b>19</b> Plazo en Meses	<b>3/08/2023</b> Fecha Terminación	<b>4,488</b> Número de Beneficiarios
<b>\$19,955</b> Presupuesto Comprometido DNP FRPT		<b>\$0</b> Presupuesto Comprometido Sector		<b>\$0</b> Presupuesto Comprometido Territorio
<b>\$19,955</b> Presupuesto Comprometido Total (millones)				

### Avance físico del proyecto

<b>3/07/2023</b> Fecha de Corte Avance	<b>100%</b> % Programado	<b>100%</b> % Ejecutado
---	-----------------------------	----------------------------

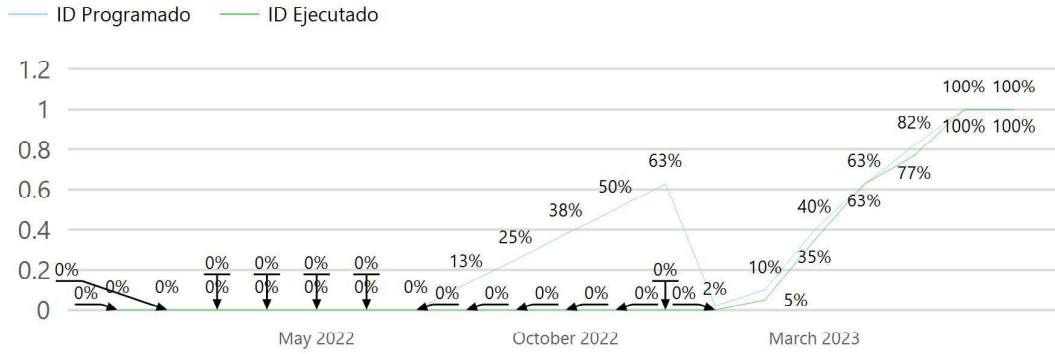

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$19,955  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado



\$19,954  
Valor Ejecutado (mill)

100%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

<p><b>\$302,328</b></p> <p>Valor Indicativo del Proyecto (millones)</p>	<p><b>En ejecución de obra</b></p> <p>Estado Detallado</p>
---	--

<p><b>\$189,804</b></p> <p>Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)</p>	<p><b>\$112,524</b></p> <p>Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)</p>
--	---	---

<b>Sector de Inversión</b>	Transporte	<b>Municipio Intervención</b>	Departamento de Cesar
<b>BPIN</b>	2021002200129	<b>Área de influencia</b>	Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	094-2210740	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	99	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	6	<b>Fecha viabilidad</b>	5/11/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar seis corredores viales con una longitud total de 127.74	Vía terciaria mejorada	108,19 Kilómetros de vías terciaria

### Información específica de ejecución contrato específico

<p><b>11/11/2021</b></p> <p>Fecha de Suscripción</p>	<p><b>1/04/2022</b></p> <p>Fecha de Inicio</p>	<p><b>31</b></p> <p>Plazo en Meses</p>	<p><b>1/11/2024</b></p> <p>Fecha Terminación</p>	<p><b>329,245</b></p> <p>Número de Beneficiarios</p>
--	--	--	--	--

<p><b>\$189,804</b></p> <p>Presupuesto Comprometido DNP FRPT</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Sector</p>	<p><b>\$112,524</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Territorio</p>
--	--	--

<p><b>\$302,328</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Total (millones)</p>
--

### Avance físico del proyecto

<p><b>1/10/2024</b></p> <p>Fecha de Corte Avance</p>	<p><b>20%</b></p> <p>% Programado</p>	<p><b>65%</b></p> <p>% Ejecutado</p>
--	---------------------------------------	--------------------------------------



## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

**\$80,333**

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

**En ejecución de obra**

Estado Detallado

**\$56,000**

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

**\$0**

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Educación	<b>Municipio Intervención</b>	La Paz
<b>BPIN</b>	2021206210067	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	105-2210716	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	75	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	10/12/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz”, se ejecutará un (1) bloque de aulas laboratorio para imagen y sonido, un (1) bloque de aulas laboratorio para visualización, análisis de datos y GIScience, un (1) bloque de aulas laboratorio para inteligencia artificial y percepción remota; la construcción de estos bloques incluye la generación de los siguientes espacios: 30 salas de estudio, 1 restaurante con capacidad para 240 personas, 1 cocina, 6 puntos fijos con cuartos técnicos y zonas de servicio y Áreas comunes y zonas de circulación, para beneficiar a 1.112 habitantes.	Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas (Producto principal del proyecto)	1
		unidades


### Información específica de ejecución contrato específico

<b>2/12/2021</b> Fecha de Suscripción	<b>4/02/2022</b> Fecha de Inicio	<b>32</b> Plazo en Meses	<b>4/10/2024</b> Fecha Terminación	<b>1,053,000</b> Número de Beneficiarios
<b>\$56,000</b> Presupuesto Comprometido DNP FRPT	<b>\$0</b> Presupuesto Comprometido Sector	<b>\$0</b> Presupuesto Comprometido Territorio		
<b>\$80,333</b> Presupuesto Comprometido Total (millones)				

### Avance físico del proyecto

<b>4/09/2024</b>	<b>2%</b>	<b>64%</b>
------------------	-----------	------------

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado
-----------------------	--------------	-------------

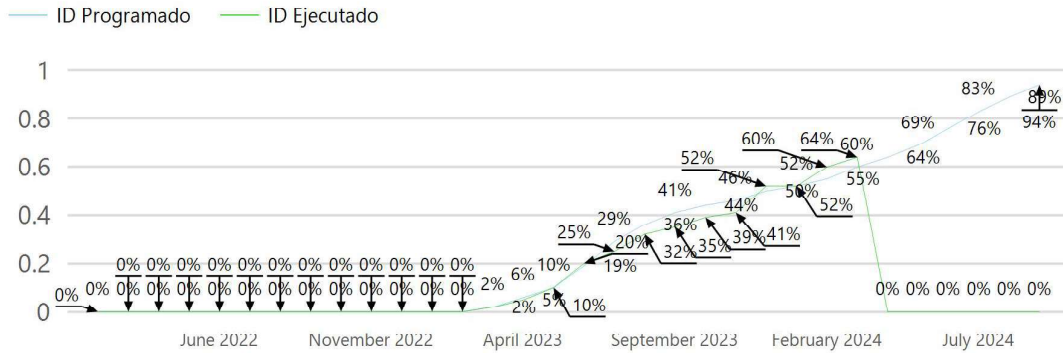

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$56,000  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado

\$44,800  
Valor Ejecutado (mill)

80%  
% Ejecutado



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira**

Estado Proyecto

**En Ejecución**

### Información general del contrato específico

**\$24,859**

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

**En ejecución de obra**

Estado Detallado

**\$24,859**

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

**\$0**

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

**\$0**

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Deporte y Recreación	<b>Municipio Intervención</b>	Urumita
<b>BPIN</b>	2021448550077	<b>Área de influencia</b>	Urbano
<b>No. Contrato Específico</b>	119-2220696	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	72	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	3	<b>Fecha viabilidad</b>	11/11/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construir los espacios deportivos que constan de: Construcción de 1 pista del patinaje, 1 cancha de futbol, 1 pista de atletismo, 1 cancha multifuncional para básquet, voleibol, cancha futbol sala y 1 cancha futbol cinco; senderos de caminata, plazas de reunión, jardines arborizados y áreas comerciales para la autosostenibilidad. Área a intervenir aproximada de 52.483,26 m2	Parques recreativos construidos y dotados	1
		Número de parques

### Información específica de ejecución contrato específico

<b>18/07/2022</b>	<b>12/08/2022</b>	<b>29</b>	<b>12/01/2025</b>	<b>6,887</b>
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios


<b>\$24,859</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

**\$24,859**

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

<b>12/12/2024</b>	<b>0%</b>	<b>52%</b>
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

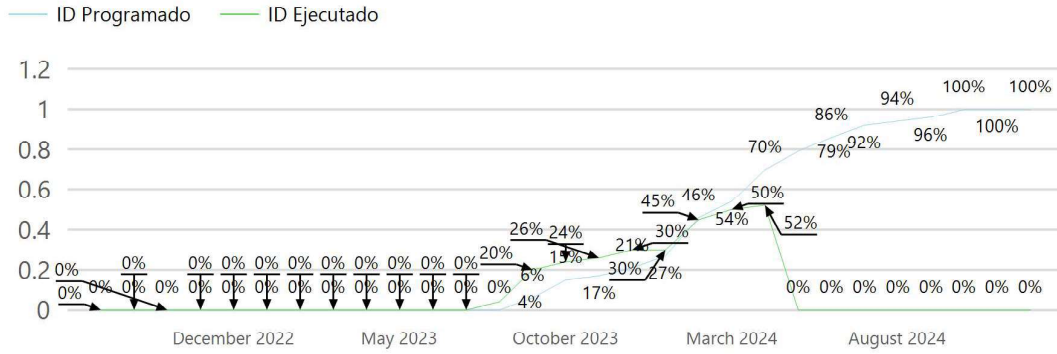

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$24,859  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado

ID Programado ID Ejecutado

\$16,158  
Valor Ejecutado (mill)

65%  
% Ejecutado



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.



## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

### Infraestructura deportiva - Patinódromo de la Jagua de Ibirico

Estado Proyecto

En Ejecución

#### Información general del contrato específico

**\$18,219**

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

**En ejecución de obra**

Estado Detallado

**\$18,219**

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

**\$0**

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

**\$0**

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Deporte y Recreacion	<b>Municipio Intervención</b>	La Jagua de Ibirico
<b>BPIN</b>	2022204000035	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	131-2220889	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	63	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	6/29/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un Patinódromo Profesional y cancha de futbol 5 con área deportiva, área de servicios y área recreativa, para beneficiar a 329.245 habitantes	Pistas construidas (Producto principal del proyecto)	1
		unidades

#### Información específica de ejecución contrato específico

**17/08/2022**

Fecha de Suscripción

**2/12/2022**

Fecha de Inicio

**22**

Plazo en Meses

**2/10/2024**

Fecha Terminación

**50,946**

Número de Beneficiarios

**\$18,219**

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

**\$0**

Presupuesto Comprometido Sector

**\$0**

Presupuesto Comprometido Territorio

**\$18,219**

Presupuesto Comprometido Total (millones)

#### Avance físico del proyecto

**2/09/2024**


Fecha de Corte Avance

**49%**

% Programado

**96%**

% Ejecutado

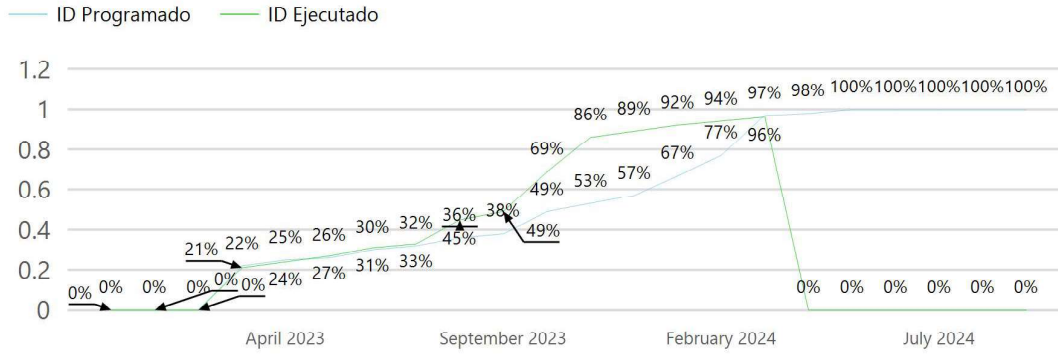

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$18,219  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado



\$16,400  
Valor Ejecutado (mill)

90%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

**\$10,210**

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

**En ejecución de obra**

Estado Detallado

**\$10,210**

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

**\$0**

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

**\$0**

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Transporte	<b>Municipio Intervención</b>	Departamento de La Guajira
<b>BPIN</b>	2022448550050	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	132-2220890	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	94	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	6	<b>Fecha viabilidad</b>	3/10/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto consiste en la construcción de 6.67 km de tramos viales en los municipios de Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva Y San Juan Del Cesar, en el departamento de La Guajira específicamente en: URUMITA: 1 K6+254.12 K6+383.39 129.270 2 K6+603.79 K6+863.34 259.550 3 K7+655.92 K8+832.91 1176.990 TOTAL 1565.810 LA JAGUA DEL PILAR: 1 K0+000.00 K1+236.28 1236.280 TOTAL 1236.280 EL MOLINO: 1 K0+000.00 K1+284.39 1284.390 TOTAL 1284.390 VILLANUEVA: 1 K0+000.00 K1+560.09 1560.090 TOTAL 1560.090 SAN JUAN DEL CESAR: 1 K0+000.00 K1+025.30 1025.300 TOTAL 1025.300  El proyecto en cuestión incluye las siguientes actividades: *CONTROL Y MEDICIÓN PERMANENTE (COMISIÓN DE TOPOGRÁFICA). *ESTRUCTURAS DE DRENAJE. *PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO. *PLACA HUELLA	Vía terciaria mejorada	6.67 Kilómetros de vías terciaria

### Información específica de ejecución contrato específico

**17/08/2022**

Fecha de Suscripción

**10/10/2022**

Fecha de Inicio

**24**

Plazo en Meses

**10/10/2024**



Fecha Terminación

**101,180**


Número de Beneficiarios



**Avance físico del proyecto**

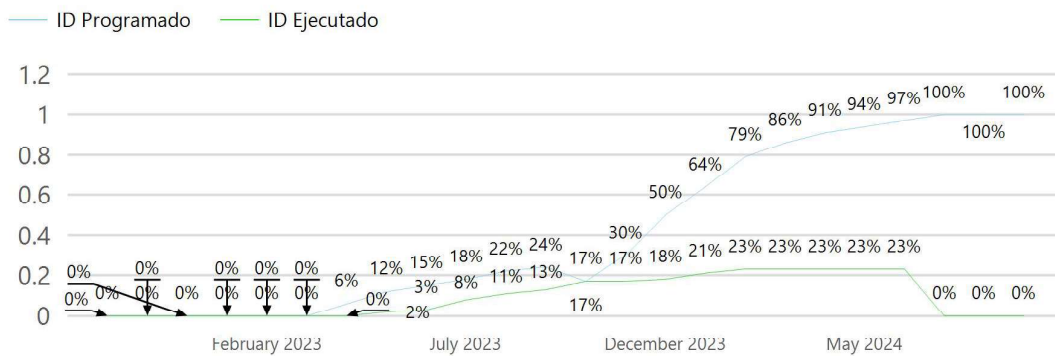

**Avance Financiero del proyecto**

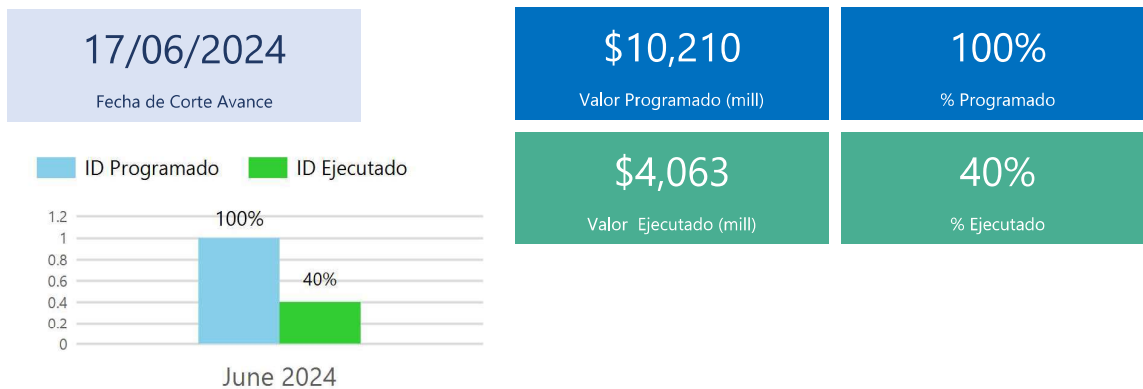

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

<p><b>\$15,225</b></p> <p>Valor Indicativo del Proyecto (millones)</p>	<p><b>En ejecución de obra</b></p> <p>Estado Detallado</p>	
<p><b>\$15,225</b></p> <p>Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)</p>

<b>Sector de Inversión</b>	Transporte	<b>Municipio Intervención</b>	Villanueva
<b>BPIN</b>	2022448470020	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	134-2220940	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	147	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	6	<b>Fecha viabilidad</b>	7/28/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Construcción de 5.730 kilómetros de pavimento en Asfalto en el tramo Veracruz - corregimiento de San Juan del Cesar y Badillo - corregimiento de Valledupar. Para ello se ejecutaran las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- EXPLANACIONES Y PRELIMINARES.</li> <li>2- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT 1,5X1,5</li> <li>3- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT 1X1</li> <li>4- CANAL SEMICIRCULAR</li> <li>5- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT DOBLE DE 2X3</li> <li>6- PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO</li> <li>7- OBRAS DE PROTECCIÓN</li> <li>8- SEÑALIZACIÓN</li> </ul>	Vía terciaria mejorada	<p>5.73</p> <p>Kilómetros de vías terciaria</p>


### Información específica de ejecución contrato específico

<p><b>19/08/2022</b></p> <p>Fecha de Suscripción</p>	<p><b>31/10/2022</b></p> <p>Fecha de Inicio</p>	<p><b>25</b></p> <p>Plazo en Meses</p>	<p><b>1/11/2024</b></p> <p>Fecha Terminación</p>	<p><b>29,704</b></p> <p>Número de Beneficiarios</p>
<p><b>\$15,221</b></p> <p>Presupuesto Comprometido DNP FRPT</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Sector</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Territorio</p>		
<p><b>\$15,221</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Total (millones)</p>				

### Avance físico del proyecto

<p>1/10/2024</p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>5%</b></p>
------------------	--------------------	------------------

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado
-----------------------	--------------	-------------

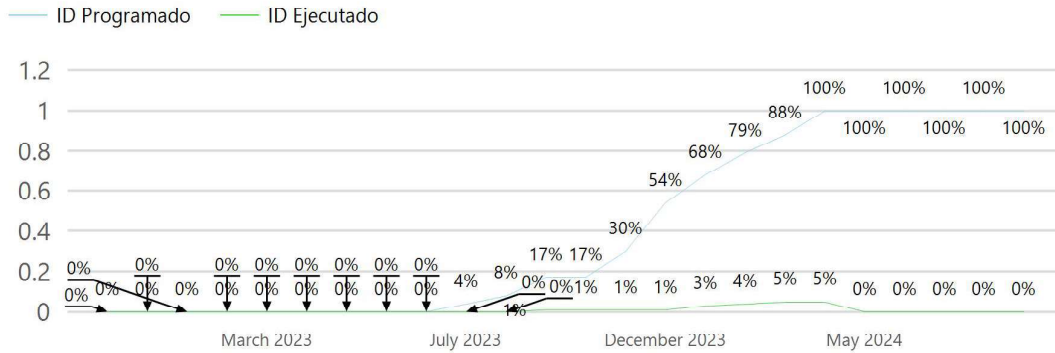

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$15,221  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado

\$3,045  
Valor Ejecutado (mill)

20%  
% Ejecutado



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$4,036

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$4,036

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Inclusion Social y Reconciliación	<b>Municipio Intervención</b>	Valledupar
<b>BPIN</b>	2021200010085	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	135-2220939	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	82	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	9/27/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un centro de desarrollo infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar, que albergará 250 niños entre 0 y 5 años en los estratos 0, 1 y 2 de la comuna 4 y que beneficiará a 3.000 habitantes.	Centros regionales de atención a víctimas restaurados (Producto principal del proyecto)	1
		Número de centros

### Información específica de ejecución contrato específico

22/08/2022

Fecha de Suscripción

4/11/2022

Fecha de Inicio

25

Plazo en Meses

4/12/2024

Fecha Terminación

3,000

Número de Beneficiarios

\$4,036

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$4,036

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

4/08/2024


Fecha de Corte Avance

1%

% Programado

61%

% Ejecutado

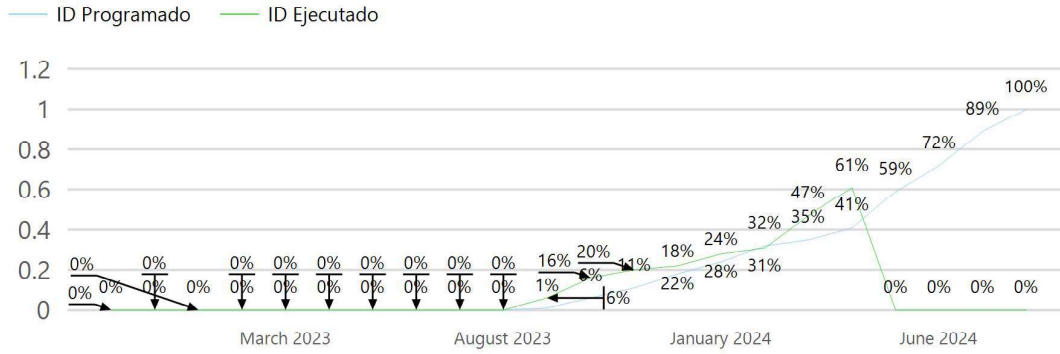

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$4,036  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado



\$2,624  
Valor Ejecutado (mill)

65%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.



## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

<p><b>\$9,365</b></p> <p>Valor Indicativo del Proyecto (millones)</p>	<p><b>Terminado</b></p> <p>Estado Detallado</p>
---	---

<p><b>\$9,365</b></p> <p>Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)</p>
--	---	---

<b>Sector de Inversión</b>	Ambiente y Desarrollo Sostenible	<b>Municipio Intervención</b>	La Gloria
<b>BPIN</b>	2021203830069	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	139-2221129	<b>Es Inversión climática?</b>	Si
<b>No. CONPES Anexo B</b>	39	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	2/18/2021

<b>Alcance</b>	<b>Producto Principal</b>	<b>Meta del Producto</b>
Fortalecer el talud y proteger contra el riesgo de inundación, contemplando la construcción de 430 metros lineales de estructura en concreto de 4000 PSI para proteger contra inundación.	Obras para la prevención y control de inundaciones	430
		Metros lineales de estructura

### Información específica de ejecución contrato específico


<p><b>24/10/2022</b></p> <p>Fecha de Suscripción</p>	<p><b>9/12/2022</b></p> <p>Fecha de Inicio</p>	<p><b>17</b></p> <p>Plazo en Meses</p>	<p><b>30/05/2024</b></p> <p>Fecha Terminación</p>	<p><b>15,543</b></p> <p>Número de Beneficiarios</p>
--	--	--	---	---

<p><b>\$9,365</b></p> <p>Presupuesto Comprometido DNP FRPT</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Sector</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Territorio</p>
--	--	--


<p><b>\$9,365</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Total (millones)</p>
--

### Avance físico del proyecto

<p><b>9/05/2024</b></p> <p>Fecha de Corte Avance</p>	<p><b>100%</b></p> <p>% Programado</p>	<p><b>80%</b></p> <p>% Ejecutado</p>
--	--	--------------------------------------

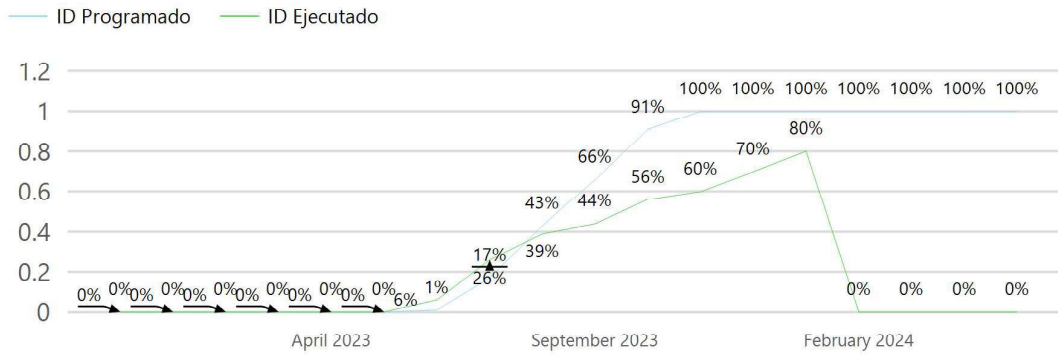

Avance Financiero del proyecto

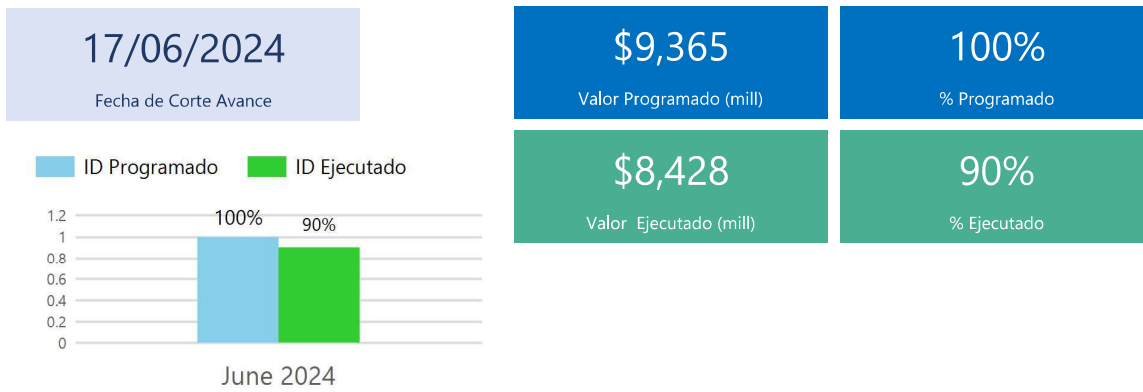

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar**

Estado Proyecto

**En Ejecución**

### Información general del contrato específico

<b>\$30,407</b> Valor Indicativo del Proyecto (millones)	<b>En ejecución de obra</b> Estado Detallado
---	---

<b>\$30,407</b> Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	<b>\$0</b> Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	<b>\$0</b> Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
--	--	--

<b>Sector de Inversión</b>	Ambiente y Desarrollo Sostenible	<b>Municipio Intervención</b>	La Gloria
<b>BPIN</b>	2021203830068	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	140-2221130	<b>Es Inversión climática?</b>	Si
<b>No. CONPES Anexo B</b>	40	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	5/19/2021

<b>Alcance</b>	<b>Producto Principal</b>	<b>Meta del Producto</b>
Construcción de 6.180,00 ml de dique como estructura de protección del casco urbano del municipio de la Gloria y de 200,00 m de muro en geocontenedor como protección de la orilla derecha del cauce del río Simaña. Obras de dragado a lo largo de los 6.180,00 m objeto de intervención.	Obras para la prevención y control de inundaciones	6180 Longitud de sección hidráulica

### Información específica de ejecución contrato específico


<b>24/10/2022</b> Fecha de Suscripción	<b>6/12/2022</b> Fecha de Inicio	<b>28</b> Plazo en Meses	<b>6/04/2025</b> Fecha Terminación	<b>6,596</b> Número de Beneficiarios
---	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---

<b>\$30,407</b> Presupuesto Comprometido DNP FRPT	<b>\$0</b> Presupuesto Comprometido Sector	<b>\$0</b> Presupuesto Comprometido Territorio
--	---	---

<b>\$30,407</b> Presupuesto Comprometido Total (millones)
--

### Avance físico del proyecto

<b>6/03/2025</b> Fecha de Corte Avance	<b>85%</b> % Programado	<b>85%</b> % Ejecutado
---	----------------------------	---------------------------

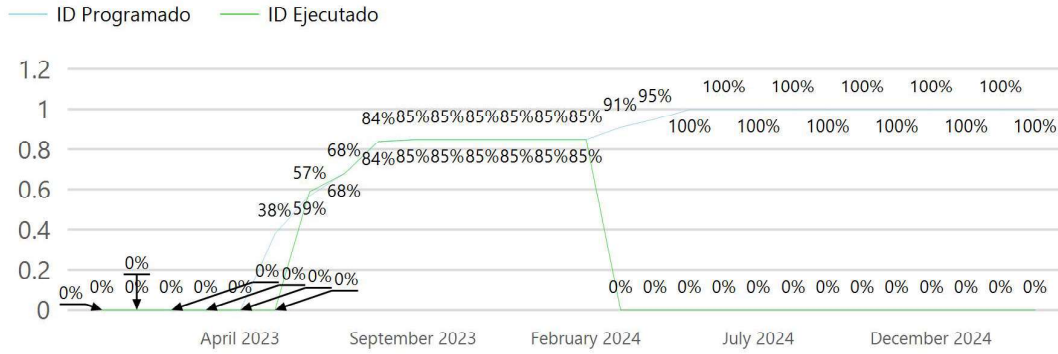

Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo III)**

Estado Proyecto

**En Ejecución**

### Información general del contrato específico

**\$94,684**

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

**En ejecución de obra**

Estado Detallado

**\$87,847**

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

**\$0**

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

**\$6,837**

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Transporte	<b>Municipio Intervención</b>	Departamento de Cesar
<b>BPIN</b>	2021002200141	<b>Área de influencia</b>	Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	144-2221131	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	100	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	6	<b>Fecha viabilidad</b>	6/4/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar la condiciones de rodadura de sietes vías terciarias en seis municipios con un total de longitud de 64.84 km	Vía terciaria mejorada	64,84
		Kilómetros de vías terciaria

### Información específica de ejecución contrato específico

**24/10/2022**

Fecha de Suscripción

**6/02/2023**

Fecha de Inicio

**23**

Plazo en Meses

**6/01/2025**

Fecha Terminación

**329,245**

Número de Beneficiarios

**\$87,847**

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

**\$0**

Presupuesto Comprometido Sector

**\$6,837**

Presupuesto Comprometido Territorio

**\$94,684**

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

**6/12/2024**


Fecha de Corte Avance

**29%**

% Programado

**56%**

% Ejecutado

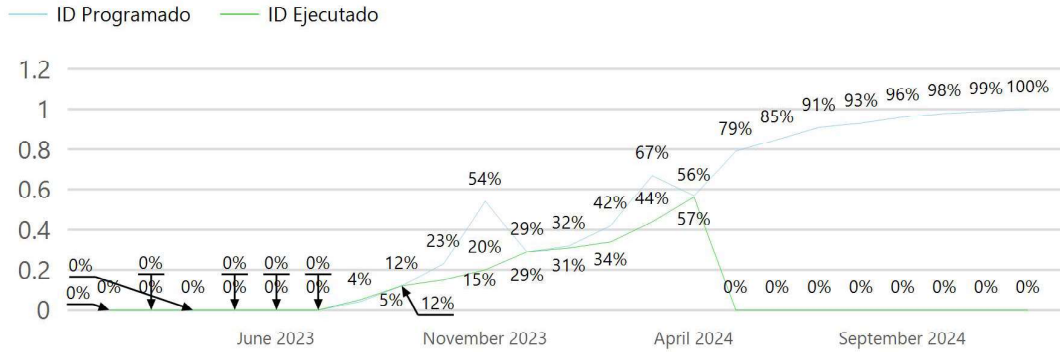

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance


\$87,847  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado

ID Programado ID Ejecutado

\$43,923  
Valor Ejecutado (mill)

50%  
% Ejecutado



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

<p><b>\$11,226</b></p> <p>Valor Indicativo del Proyecto (millones)</p>	<p><b>En ejecución de obra</b></p> <p>Estado Detallado</p>	
<p><b>\$11,226</b></p> <p>Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)</p>

<b>Sector de Inversión</b>	Transporte	<b>Municipio Intervención</b>	Departamento de La Guajira
<b>BPIN</b>	2022442790035	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	146-2221136	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	95	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	6	<b>Fecha viabilidad</b>	3/10/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>El proyecto consiste en la construcción de 6,36 km de tramos viales en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo Y Albania, en el departamento de La Guajira específicamente en:</p> <p>Barrancas- Fonseca: K0+000.00 - K2+590                      Distracción: K0+0.00 - K1+020.00                      Hatonuevo: K0+000.00 - K1+391                      Albania: K0+000.00 - K1+353</p> <p>El proyecto en cuestión incluye las siguientes actividades: CONTROL Y MEDICIÓN PERMANENTE (COMISIÓN DE TOPOGRÁFICA). ESTRUCTURAS DE DRENAJE. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO. PLACA HUELLA</p>	Vía terciaria mejorada	<p>6.37</p> <p>Kilómetros de vías terciaria</p>


### Información específica de ejecución contrato específico

<p><b>27/10/2022</b></p> <p>Fecha de Suscripción</p>	<p><b>11/01/2023</b></p> <p>Fecha de Inicio</p>	<p><b>24</b></p> <p>Plazo en Meses</p>	<p><b>11/01/2025</b></p> <p>Fecha Terminación</p>	<p><b>157,188</b></p> <p>Número de Beneficiarios</p>
<p><b>\$11,226</b></p> <p>Presupuesto Comprometido DNP FRPT</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Sector</p>	<p><b>\$0</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Territorio</p>		
<p><b>\$11,226</b></p> <p>Presupuesto Comprometido Total (millones)</p>				

### Avance físico del proyecto

<p><b>11/12/2024</b></p>	<p><b>33%</b></p>	<p><b>98%</b></p>
--------------------------	-------------------	-------------------

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado
-----------------------	--------------	-------------

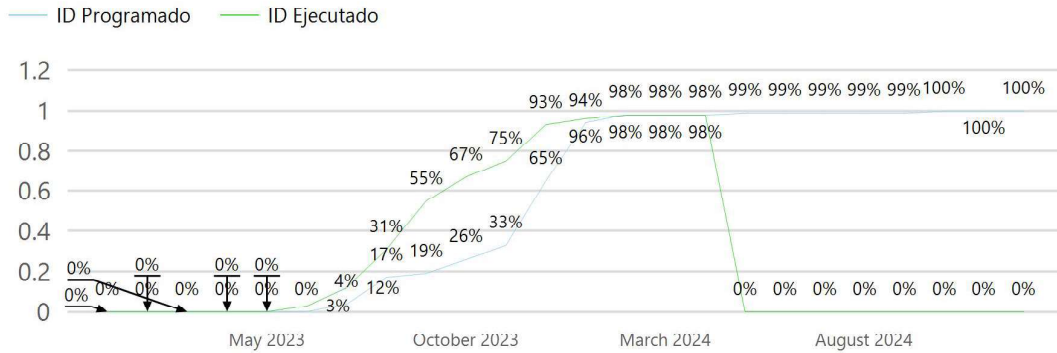

**Avance Financiero del proyecto**

<p><b>17/06/2024</b> Fecha de Corte Avance</p>	<p><b>\$11,226</b> Valor Programado (mill)</p>	<p><b>100%</b> % Programado</p>
	<p><b>\$10,104</b> Valor Ejecutado (mill)</p>	<p><b>90%</b> % Ejecutado</p>

Categoría	Valor (mill)	Porcentaje
ID Programado	\$11,226	100%
ID Ejecutado	\$10,104	90%

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.



## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

### Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar

Estado Proyecto

**En Ejecución**

#### Información general del contrato específico

**\$50,000**

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

**En ejecución de obra**

Estado Detallado

**\$50,000**

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

**\$0**

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

**\$0**

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Inclusion Social y Reconciliacion	<b>Municipio Intervención</b>	Valledupar
<b>BPIN</b>	2022200010097	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	147-2221139	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	83	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	7/1/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una galería de vendedores con 354 locales , zona de parqueaderos, bloque administrativo y plazoleta para beneficiar a 484.453 habitantes	Plaza de mercado construida. 354 LOCLAES, con más de 9200 m2 construidos	1
		unidades

#### Información específica de ejecución contrato específico

**27/10/2022**

Fecha de Suscripción

**30/12/2022**

Fecha de Inicio

**29**

Plazo en Meses

**30/05/2025**

Fecha Terminación

**484,453**

Número de Beneficiarios

**\$50,000**

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

**\$0**

Presupuesto Comprometido Sector

**\$0**

Presupuesto Comprometido Territorio

**\$50,000**

Presupuesto Comprometido Total (millones)

#### Avance físico del proyecto

**30/06/2025**


Fecha de Corte Avance

**24%**

% Programado

**54%**

% Ejecutado

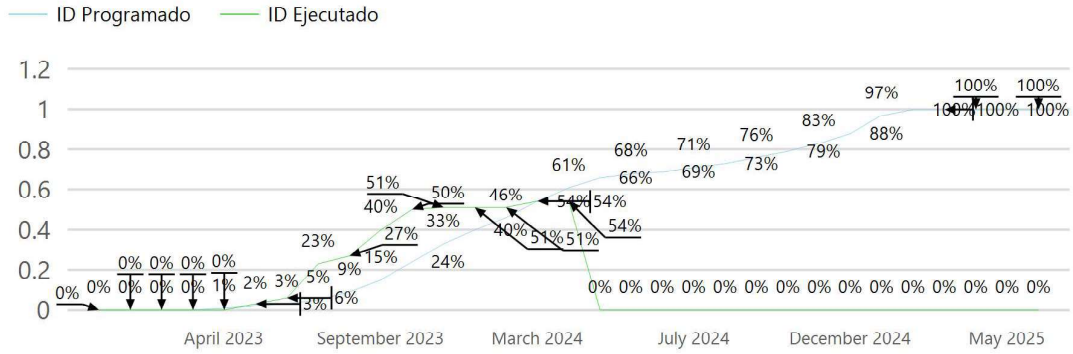

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$50,000  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado

ID Programado ID Ejecutado

\$30,000  
Valor Ejecutado (mill)

60%  
% Ejecutado



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.**

Estado Proyecto

**En Ejecución**

### Información general del contrato específico

**\$28,562**

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

**En contratación derivada**

Estado Detallado

**\$28,562**

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

**\$0**

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

**\$0**

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Transporte	<b>Municipio Intervención</b>	Departamento de La Guajira
<b>BPIN</b>	2021002200141	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	153-2221173	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	96	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	6	<b>Fecha viabilidad</b>	10/24/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto consiste en la construcción de 13,74 km de tramos viales en en los Municipios de Maicao, Riohacha, Dibulla y Uribia, en el departamento de La Guajira, específicamente en: Maicao: alcance de 4.72 K.M Riohacha: - Las Palmas: alcance de 0.942 K.M. - La Gloria: alcance de 0.706 K.M. - Mongui: alcance de 2.991 K.M. Dibulla: alcance de 0.983 K.M. Uribia: Poportin: alcance de 3.4 K.M. El proyecto en cuestión incluye las siguientes actividades: *CONTROL Y MEDICIÓN PERMANENTE (COMISION DE TOPOGRAFIA). *ESTRUCTURAS DE DRENAJE. *PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO. *PLACA HUELLA.	Vía terciaria mejorada	13.74 Kilómetros de vías terciaria

### Información específica de ejecución contrato específico

<b>6/12/2022</b> Fecha de Suscripción	<b>4/05/2023</b> Fecha de Inicio	<b>28</b> Plazo en Meses	<b>4/09/2025</b> Fecha Terminación	<b>445,236</b> Número de Beneficiarios
<b>\$28,562</b> Presupuesto Comprometido DNP FRPT	<b>\$0</b> Presupuesto Comprometido Sector	<b>\$0</b> Presupuesto Comprometido Territorio	<b>\$28,562</b> Presupuesto Comprometido Total (millones)	

### Avance físico del proyecto

4/08/2025


Fecha de Corte Avance

5%

% Programado

2%

% Ejecutado

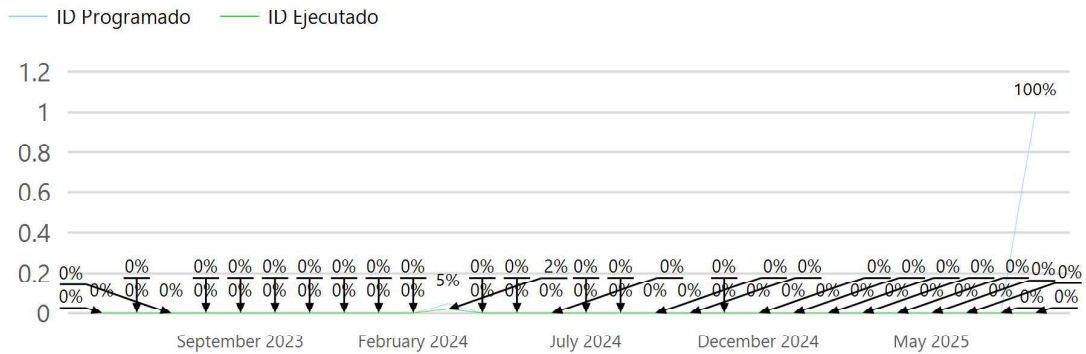

### Avance Financiero del proyecto

17/06/2024

Fecha de Corte Avance

\$28,562

Valor Programado (mill)

100%


% Programado

\$8,568

Valor Ejecutado (mill)

30%

% Ejecutado



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar**

Estado Proyecto

**En Ejecución**

### Información general del contrato específico

<b>\$12,012</b> Valor Indicativo del Proyecto (millones)	<b>En ejecución de obra</b> Estado Detallado
---	---

<b>\$12,012</b> Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	<b>\$0</b> Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	<b>\$0</b> Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
--	--	--

<b>Sector de Inversión</b>	Inclusion Social y Reconciliacion	<b>Municipio Intervención</b>	Pueblo Bello(Cesar), La Paz(Cesar), Manaure(Cesar), San Diego(Cesar)
<b>BPIN</b>	202000020045	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	161-2221182	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	54	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	2	<b>Fecha viabilidad</b>	12/17/2020

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Fortalecer la oferta institucional de estrategias de innovación empresarial en los municipios de Manaure, Pueblo Bello, Sandiego y La Paz en el Departamento de Cesar mediante resultados como: a) 2.000 personas sensibilizadas y capacitadas en talleres de competencia emprendedora, competencia empresarial y educación financiera; b) inyección de capital semilla que arrojará como resultado 120 empresas creadas, 600 empresas fortalecidas, 40 empresas asociativas creadas; c) 760 planes comerciales formulados; d) participación en 5 ferias y 1 rueda de negocio; y e) seguimiento y monitoreo a las 760 empresas apoyadas.	Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos	760 unidades



### Información específica de ejecución contrato específico

<b>21/12/2022</b> Fecha de Suscripción	<b>13/03/2023</b> Fecha de Inicio	<b>16</b> Plazo en Meses	<b>13/07/2024</b> Fecha Terminación	<b>2,000</b> Número de Beneficiarios
---	--------------------------------------	-----------------------------	--	---

<b>\$12,012</b> Presupuesto Comprometido DNP FRPT	<b>\$0</b> Presupuesto Comprometido Sector	<b>\$33</b> Presupuesto Comprometido Territorio
--	---	--

<b>\$12,046</b> Presupuesto Comprometido Total (millones)
--

### Avance físico del proyecto

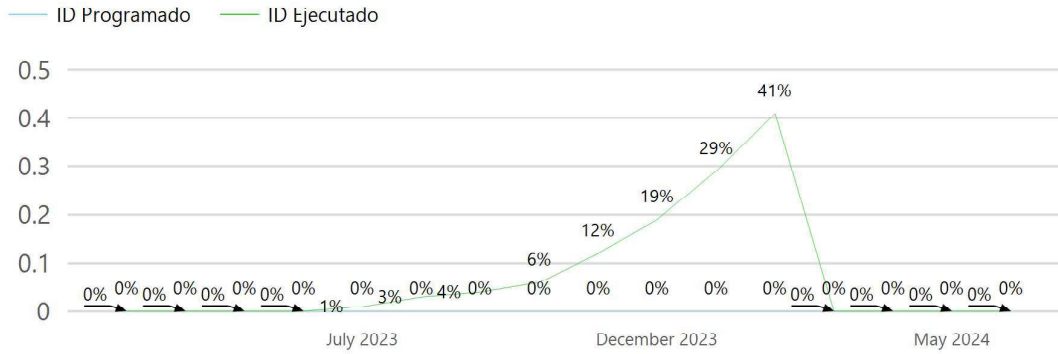

Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción de puente vehicular sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva – Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$2,000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$2,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Transporte	<b>Municipio Intervención</b>	Villanueva
<b>BPIN</b>	2022448740016	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	182-2230150	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	146	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	6	<b>Fecha viabilidad</b>	6/22/2022

**Alcance**

**Producto Principal**

**Meta del Producto**

Puente construido en vía terciaria

1  
Número de puentes

Construcción de un (1) puente vehicular L=25M sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva-Veracruz.

La alternativa propuesta contempla la realización de las siguientes actividades: -EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA

- RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 (Incluye suministro y transporte)
- DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
- PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA
- CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU, PARA ZAPATAS
- CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU, PARA TABLERO, VIGAS Y RIOSTRAS.
- CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU, PARA ESTRIBOS, BORDILLO, ALETAS Y LOSA DE APROXIMACION.
- CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PARA SOLADO
- ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa, PARA ZAPATAS, ESTRIBOS, BORDILLO, LOSA DE APROXIMACION, TABLEROS Y VIGAS Y RIOSTRAS.
- APOYO ELASTOMÉRICO REFORZADO
- RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
- GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N
- BARANDA DE CONCRETO DE 28 MPA
- PRUEBA DE CARGA
- GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC
- LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA CARRILES: 2 ANCHO DE CARRILES 3 M

NO TIENE BERNA. NO TIENE ANDENES. NO TIENE BARRERA VEHICULAR


### Información específica de ejecución contrato específico

23/06/2023 Fecha de Suscripción	4/09/2023 Fecha de Inicio	10 Plazo en Meses	4/07/2024 Fecha Terminación	28,346 Número de Beneficiarios
\$1,914 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$0 Presupuesto Comprometido Territorio		
\$1,914 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

### Avance físico del proyecto

4/06/2024 Fecha de Corte Avance	0% % Programado	0% % Ejecutado
------------------------------------	--------------------	-------------------



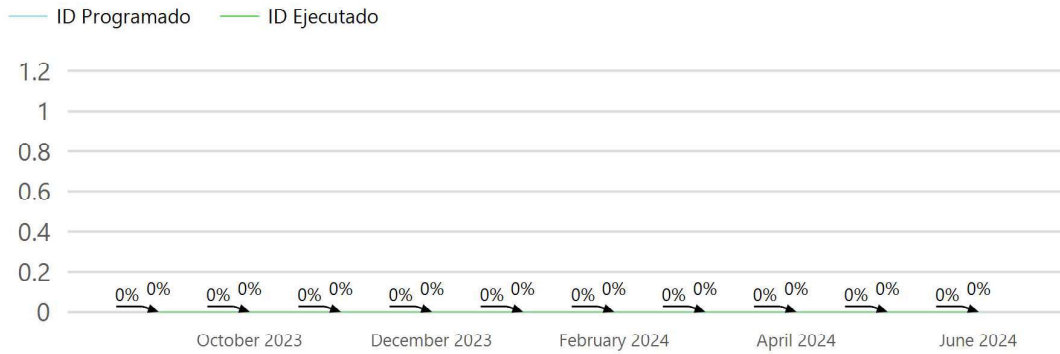

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024  
Fecha de Corte Avance

\$1,914  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado



\$574  
Valor Ejecutado (mill)

30%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción Adecuación y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecón,  
Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

**\$70,000**

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

**En contratación derivada**

Estado Detallado

**\$70,000**

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

**\$0**

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

**\$0**

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Comercio Industria y Turismo	<b>Municipio Intervención</b>	Riohacha
<b>BPIN</b>	2022002440012	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	191-2230172	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	57	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	5	<b>Fecha viabilidad</b>	6/16/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
La propuesta urbana de la se diseñó bajo los criterios de desarrollo sostenible (social, económico, cultural y ambiental), enfocados en la recuperación y complementación de la infraestructura existente. Se planteó una propuesta general del proyecto en diferentes zonas, delimitadas específicamente por una red articuladora que integre escenarios múltiples preservando el entorno natural y resaltando el carácter histórico y cultural en su misma forma. La construcción adecuación y mejoramiento del urbanismo en un área de 79500 m2 y una longitud de 2.5 kilómetros en una sola planta, que incluirá zonas de deportes, restaurantes, tarima, ciclo ruta, kioscos y parques infantiles, entre otros, ideal para disfrutar de los mágicos atardeceres que ofrece Riohacha.	Espacio publico construido	79500 Metros Cuadrados

### Información específica de ejecución contrato específico

**28/06/2023**

Fecha de Suscripción

**11/03/2024**

Fecha de Inicio

**31**

Plazo en Meses

**11/10/2026**

Fecha Terminación

**212,314**

Número de Beneficiarios

**\$69,970**

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

**\$0**

Presupuesto Comprometido Sector

**\$0**


Presupuesto Comprometido Territorio

**\$69,970**

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

11/09/2026 Fecha de Corte Avance	0% % Programado	0% % Ejecutado
-------------------------------------	--------------------	-------------------

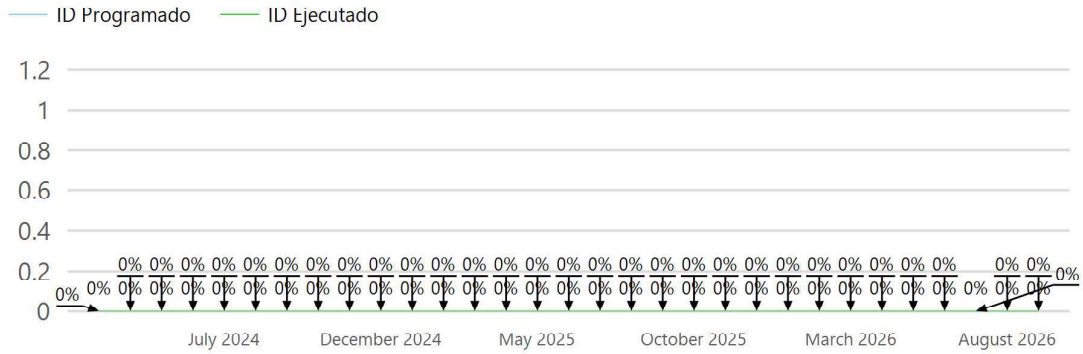

Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

17/06/2024

### Construcción de una Marina Multipropósito en Riohacha, Distrito Especial Turístico y Cultural, La Guajira

Estado Proyecto

En Ejecución

#### Información general del contrato específico

\$32,000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$32,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Comercio Industria y Turismo	<b>Municipio Intervención</b>	Riohacha
<b>BPIN</b>	2022002440009	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	193-2230174	<b>Es Inversión climática?</b>	Si
<b>No. CONPES Anexo B</b>	56	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	5	<b>Fecha viabilidad</b>	6/16/2023


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Realizar los estudios requeridos y la preparación del terreno en la playa para desarrollar el proyecto de construcción de La Marina(Prospección arqueológica y ensayos) Realizar el dragado y construcción de 3 espolones de contención en piedra que garantice el funcionamiento de La Marina en esa zona.(Excavaciones y Dragado, espolón de contención, luminaria solar para espolones)Construcción de un muelle fijo de 714 M2 compuesto por rampas de acceso, plataformas y espacios de prestación de servicios y baños que sirvan a los turistas que accedan a la marina ya sea por tierra o por mar. (Cimentación por medio de pilotes, Fabricación de plataforma,acabado, edificación en estructura metálica, fabricación e instalación de rampas de acceso a muelle fijo y barandas en plataforma). Construir muelle flotante que sirva de atracadero a las embarcaciones que arriben a La Marina multipropósito, con un área total de 8.630 m2 con 3 líneas de atraque de embarcaciones o fingers y torretas de servicios para las embarcaciones, cornamusas de amarre e iluminación. Realizar el montaje de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias que permitan garantizar la electricidad, iluminación, baños y agua potable para brindar servicios óptimos a turistas y personal de funcionamiento de La Marina multipropósito. Propender por el buen desarrollo, seguimiento, control y vigilancia de las obras de construcción de la Marina multipropósito garantizando los recursos para realizar la interventoría y cubrir gastos administrativos y otros componentes necesarios para su ejecución (PMA, Bioseguridad Covid, licencia ambiental, Interventoría del proyecto y gastos administrativos y demás tramites técnicos y legales.</p>	Marina construida	1 UND

#### Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023	11/03/2024 Fecha de Inicio	31 Plazo en Meses	11/12/2025 Fecha Terminación	313 314 Número de Beneficiarios
\$31,794 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector		\$0 Presupuesto Comprometido Territorio	
\$31,794 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

11/11/2025 Fecha de Corte Avance	0% % Programado	0% % Ejecutado
-------------------------------------	--------------------	-------------------

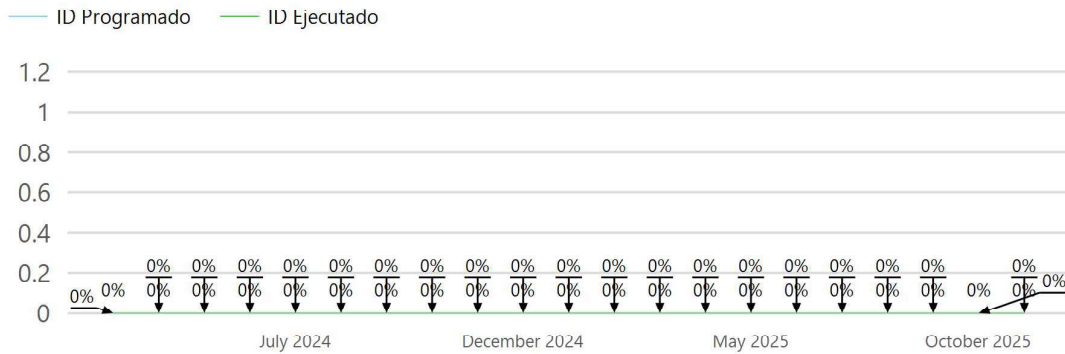

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024 Fecha de Corte Avance	\$31,794 Valor Programado (mill)	100% % Programado
	\$0 Valor Ejecutado (mill)	0% % Ejecutado

Legend: ID Programado (blue bar), ID Ejecutado (green bar)

Month	ID Programado (%)	ID Ejecutado (%)
June 2024	100%	0%

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
