



Pacto CUNDINAMARCA

Ficha trimestral, junio de 2024.

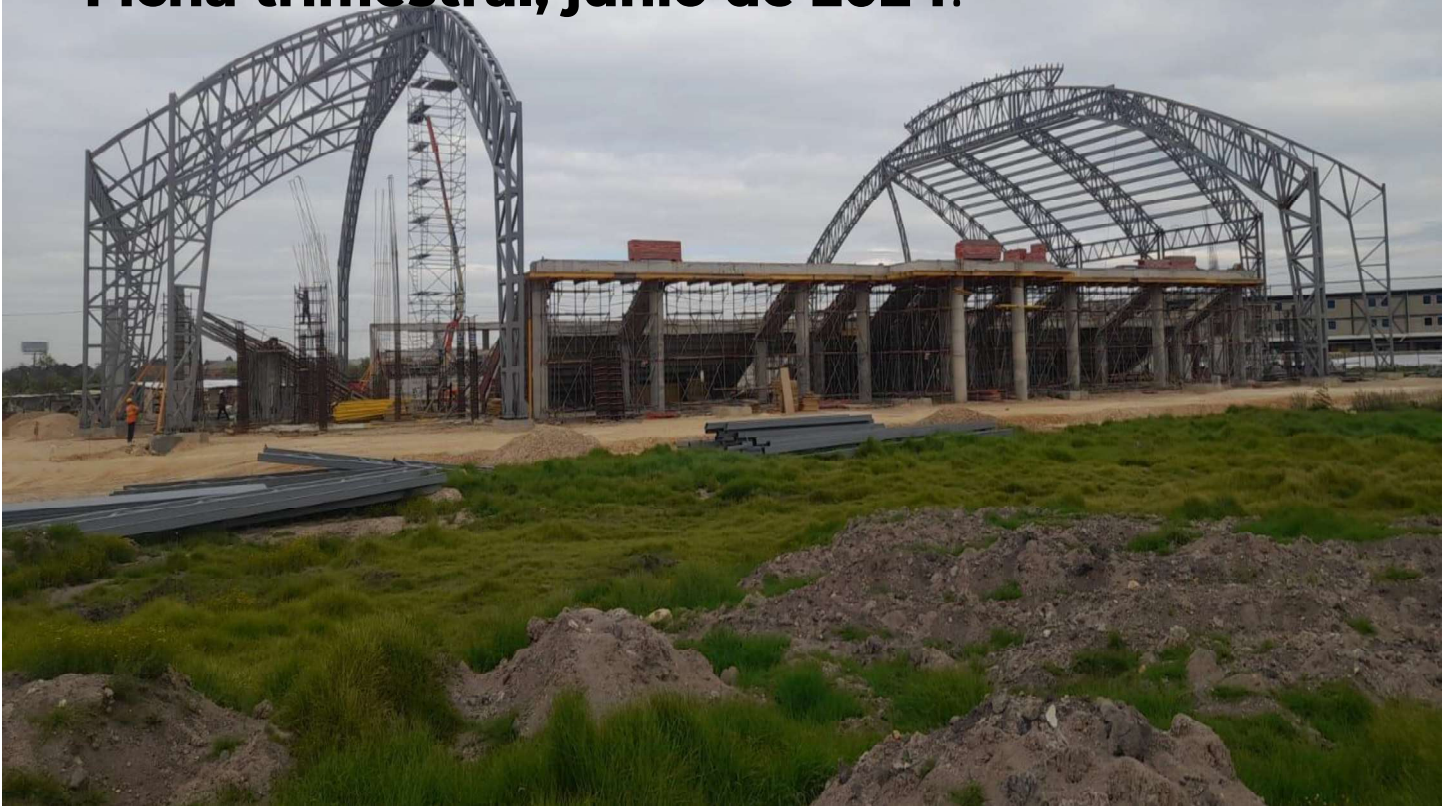

\$ 482 Mil millones

Recursos aportados



38 Proyectos financiados



Proyectos no iniciados (en proceso de estructuración o viabilidad sectorial)

88%
Avance consolidado

Pacto Territorial Cundinamarca

19/02/2021 Fecha suscripción	3 Plazo en años	19/02/2024 Fecha de Terminación	0 Meses para vencimiento	100% % Tiempo Transcurrido
51 Total Proyectos		\$549,487 Valor Indicativo (Millones)		
\$458,970 Aporte indicativo nación (Millones)	\$90,517 Aporte indicativo territorio (Millones)	\$0 Aporte indicativo otros (Millones)		


Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	\$159,558	\$132,600	\$26,957	\$0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$42,839	\$42,839	\$0	\$0
Cultura	\$127,984	\$106,211	\$21,773	\$0
Deporte y Recreacion	\$104,971	\$80,939	\$24,033	\$0
Inclusion Social y Reconciliacion	\$6,110	\$5,723	\$387	\$0
Planeacion	\$5,778	\$5,778	\$0	\$0
Transporte	\$102,247	\$84,880	\$17,367	\$0
Total	\$549,487	\$458,970	\$90,517	\$0

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

87.72%	\$482,019 Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado
--------	--

Número de Proyectos por Estado

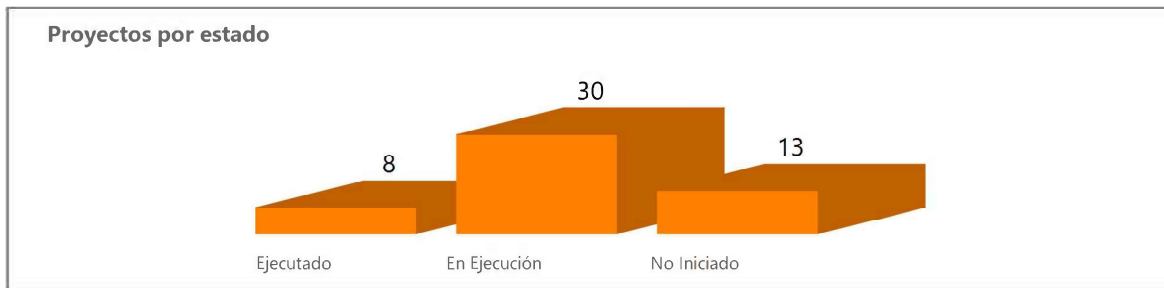

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ejecutado	Adecuación y remodelación del estadio municipal de La Villa de San Diego de Ubaté	\$7,646	\$7,455	\$190	\$0
Ejecutado	Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paimé, departamento de Cundinamarca	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0
Ejecutado	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	\$1,867	\$1,500	\$367	\$0
Ejecutado	Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	\$1,603	\$1,242	\$362	\$0
Ejecutado	Construcción de la edificación de la mujer tejedora cabeza de hogar del municipio de Chipaque	\$1,464	\$0	\$1,464	\$0
Ejecutado	Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	\$1,368	\$1,190	\$178	\$0
Ejecutado	Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	\$1,238	\$882	\$357	\$0
Ejecutado	Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del casco urbano, municipio de San Antonio del Tequendama	\$537	\$0	\$537	\$0
En Ejecución	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	\$100,380	\$83,380	\$17,000	\$0

En Ejecución	Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá Cundinamarca	\$59,526	\$46,000	\$13,526	\$0
En Ejecución	Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá	\$47,179	\$39,732	\$7,447	\$0
En Ejecución	Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza	\$43,251	\$34,000	\$9,251	\$0
En Ejecución	Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - centro funcional Quetame	\$28,774	\$25,847	\$2,927	
En Ejecución	Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca	\$28,593	\$28,593	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	\$25,722	\$15,000	\$10,722	\$0
En Ejecución	Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque, Cundinamarca	\$18,092	\$13,762	\$4,331	\$0
En Ejecución	Construcción del Centro Cultural en Gachancipá	\$15,544	\$14,744	\$800	\$0
En Ejecución	Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca	\$10,246	\$10,246	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca	\$10,210	\$10,210	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá, Cundinamarca	\$8,324	\$5,528	\$2,796	\$0

En Ejecución	Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte	\$6,330	\$2,339	\$3,990	\$0
En Ejecución	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	\$6,110	\$5,723	\$387	\$0
En Ejecución	Mejoramiento del escenario deportivo de la Villa olímpica en el casco urbano del municipio de Jerusalén Cundinamarca	\$4,185	\$4,185	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de los polideportivos de los barrios La Magnolia, Escallón y San Luis de la zona urbana del municipio de Madrid, Cundinamarca	\$3,869	\$0	\$3,869	\$0
En Ejecución	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca	\$3,759	\$3,255	\$505	\$0
En Ejecución	Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana	\$3,723	\$3,723	\$0	\$0
En Ejecución	Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	\$3,721	\$3,721	\$0	\$0
En Ejecución	Adecuación plaza de mercado - central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa	\$3,167	\$0	\$3,167	\$0
En Ejecución	Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí	\$2,949	\$2,949	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutierrez, Cundinamarca	\$2,455	\$1,887	\$568	\$0
En Ejecución	Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá	\$2,351	\$1,142	\$1,209	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca	\$2,272	\$2,000	\$272	\$0

En Ejecución	Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; II etapa, Chipaque	\$2,195	\$2,195	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima	\$1,673	\$1,673	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal	\$1,485	\$1,485	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Siquima	\$1,484	\$0	\$1,484	\$0
En Ejecución	Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá	\$851	\$0	\$851	\$0
No Iniciado	Construcción de la plaza de mercado típico regional y centro de acopio del municipio de Subachoque, Cundinamarca	\$10,601	\$10,601	\$0	\$0
No Iniciado	Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Viotá, Cundinamarca	\$10,508	\$8,548	\$1,960	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de infraestructura de la plaza de mercado del municipio de El Colegio, Cundinamarca	\$10,198	\$10,198	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción plaza de mercado y plazoleta gastronómica de la cocina campesina del municipio de Bojacá, Cundinamarca	\$6,584	\$6,584	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de la primera etapa del auditorio cultural, Gachetá	\$5,736	\$5,736	\$0	\$0
No Iniciado	Infraestructura y equipamientos municipales - Centro de desarrollo local barrio San Carlos; Madrid (Construcción del centro de desarrollo local municipio de Madrid)	\$3,778	\$3,778	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción y dotación de la plaza de mercado en el Municipio de El Rosal	\$3,212	\$3,212	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de equipamiento urbano plaza de mercado municipio de Medina	\$2,624	\$2,624	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de la plaza de mercado ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	\$2,573	\$2,573	\$0	\$0

No Iniciado	Construcción, rehabilitación y mantenimiento plaza de mercado municipio de Apulo, Cundinamarca	\$2,016	\$2,016	\$0	\$0
No Iniciado	Remodelación parque principal municipio de Chocontá	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0
No Iniciado	Adecuación del centro agroempresarial del municipio de San Juan de Rioseco, Cundinamarca	\$1,217	\$1,217	\$0	\$0
No Iniciado	Mejoramiento del polideportivo del barrio Villa María municipio de Madrid, Cundinamarca	\$298	\$298	\$0	\$0
Total		\$549,487	\$458,970	\$90,517	\$0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

44 Total Proyectos	\$534,904 Valor Indicativo (Millones)
------------------------------	---

\$448,758 Aporte indicativo DNP FRPT	\$79,146 Aporte indicativo territorio	\$7,000 Aporte indicativo Sector	\$0 Aporte indicativo Otros
--	---	--	---------------------------------------


Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	Ejecutado	\$1,238	\$882	\$357	\$0	\$0
Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	Ejecutado	\$1,603	\$1,242	\$362	\$0	\$0
Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca	En Ejecución	\$10,246	\$10,246	\$0	\$0	\$0

Construcción, rehabilitación y mantenimiento plaza de mercado municipio de Apulo, Cundinamarca	No Iniciado	\$2,016	\$2,016	\$0	\$0	\$0
Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paime, departamento de Cundinamarca	Ejecutado	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0
Construcción plaza de mercado y plazoleta gastronómica de la cocina campesina del municipio de Bojacá, Cundinamarca	No Iniciado	\$6,584	\$4,584	\$0	\$2,000	\$0
Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$28,593	\$28,593	\$0	\$0	\$0
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$10,210	\$10,210	\$0	\$0	\$0
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabeta, Cundinamarca	En Ejecución	\$3,759	\$3,255	\$505	\$0	\$0
Mejoramiento de infraestructura de la plaza de mercado del municipio de El Colegio, Cundinamarca	No Iniciado	\$10,198	\$5,198	\$0	\$5,000	\$0
Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal	En Ejecución	\$1,485	\$1,485	\$0	\$0	\$0

Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - centro funcional Quetame	En Ejecución	\$28,774	\$25,847	\$2,927	\$0	
Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$3,721	\$3,721	\$0	\$0	\$0
Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; II etapa, Chipaque	En Ejecución	\$2,195	\$2,195	\$0	\$0	\$0
Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutierrez, Cundinamarca	En Ejecución	\$2,455	\$1,887	\$568	\$0	\$0
Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$8,324	\$5,528	\$2,796	\$0	\$0
Construcción de la plaza de mercado ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	No Iniciado	\$2,573	\$2,573	\$0	\$0	\$0
Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	Ejecutado	\$1,368	\$1,190	\$178	\$0	\$0
Construcción de equipamiento urbano plaza de mercado municipio de Medina	No Iniciado	\$2,624	\$2,624	\$0	\$0	\$0
Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana	En Ejecución	\$3,723	\$3,723	\$0	\$0	\$0
Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí	En Ejecución	\$2,949	\$2,949	\$0	\$0	\$0

Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque, Cundinamarca	En Ejecución	\$18,092	\$13,762	\$4,331	\$0	\$0
Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte	En Ejecución	\$6,330	\$2,339	\$3,990	\$0	\$0
Adecuación del centro agroempresarial del municipio de San Juan de Rioseco, Cundinamarca	No Iniciado	\$1,217	\$1,217	\$0	\$0	\$0
Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima	En Ejecución	\$1,673	\$1,673	\$0	\$0	\$0
Construcción de la plaza de mercado típico regional y centro de acopio del municipio de Subachoque, Cundinamarca	No Iniciado	\$10,601	\$10,601	\$0	\$0	\$0
Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá	En Ejecución	\$2,351	\$1,142	\$1,209	\$0	\$0
Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Viotá, Cundinamarca	No Iniciado	\$10,508	\$8,548	\$1,960	\$0	\$0
Construcción de la primera etapa del auditorio cultural, Gachetá	No Iniciado	\$5,736	\$5,736	\$0	\$0	\$0
Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza	En Ejecución	\$43,251	\$34,000	\$9,251	\$0	\$0
Mejoramiento del escenario deportivo de la Villa olímpica en el casco urbano del municipio de Jerusalén Cundinamarca	En Ejecución	\$4,185	\$4,185	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	En Ejecución	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0

 Departamento Nacional de Planeación	FICHA TRIMESTRAL PACTOS TERRITORIALES					Página 1 De 11 0	
Adecuación y remodelación del estadio municipal de La Villa de San Diego de Ubaté	Ejecutado	\$7,646	\$7,455	\$190	\$0	\$0	
Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	En Ejecución	\$25,722	\$15,000	\$10,722	\$0	\$0	
Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	En Ejecución	\$6,110	\$5,723	\$387	\$0	\$0	
Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	Ejecutado	\$1,867	\$1,500	\$367	\$0	\$0	
Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$100,380	\$83,380	\$17,000	\$0	\$0	
Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca	En Ejecución	\$2,272	\$2,000	\$272	\$0	\$0	
Mejoramiento del polideportivo del barrio Villa María municipio de Madrid, Cundinamarca	No Iniciado	\$298	\$298	\$0	\$0	\$0	
Remodelación parque principal municipio de Chocontá	No Iniciado	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0	\$0	
Infraestructura y equipamientos municipales - Centro de desarrollo local barrio San Carlos; Madrid (Construcción del centro de desarrollo local municipio de Madrid)	No Iniciado	\$3,778	\$3,778	\$0	\$0	\$0	

 Departamento Nacional de Planeación		FICHA TRIMESTRAL Pactos Territoriales				Página 1 De 11 1	
Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá	En Ejecución	\$47,179	\$39,732	\$7,447	\$0	\$0	
Construcción del Centro Cultural en Gachancipá	En Ejecución	\$15,544	\$14,744	\$800	\$0	\$0	
Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá Cundinamarca	En Ejecución	\$59,526	\$46,000	\$13,526	\$0	\$0	
Total		\$534,904	\$448,758	\$79,146	\$7,000	\$0	

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Cundinamarca.aspx>

Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales

Proyectos en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$2,455

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$1,887

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$568

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Gutiérrez
BPIN	2021253390015	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	083-2210728	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	18	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/26/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un edificio de 2 plantas, con 555.35 metros cuadrados de área construida, con un voladizo de 60 cm, con el respectivo cerramiento perimetral, obras de contención y adecuación del terreno.	Centros de acopio construidos	1
		Numero de centros de acopio

Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021

Fecha de Suscripción

30/12/2021

Fecha de Inicio

31

Plazo en Meses

1/07/2024

Fecha Terminación

802

Número de Beneficiarios

\$1,137

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$568

Presupuesto Comprometido Territorio

\$1,705

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

30/05/2023


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

66%

% Ejecutado

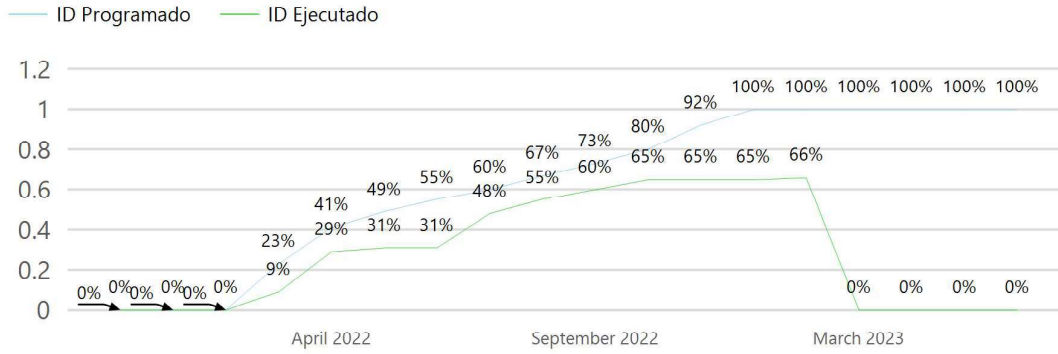

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$1,137
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$909
Valor Ejecutado (mill)

80%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Adecuación y remodelación del estadio municipal de La Villa de San Diego de Ubaté

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$7,646

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En Liquidación

Estado Detallado

\$7,455

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$190

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreación	Municipio Intervención	Villa de San Diego de Ubaté
BPIN	2021258430025	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	084-2210729	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	68	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/22/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Obras de mejoramiento de la estructura existente en el estadio municipal Villa de San Diego de Ubaté que consta de (espacio recreo deportivo) una cubierta a las graderías existentes y entrada principal; baños, skate park, biosaudables, cancha de fútbol, parqueadero vehicular, espacios verdes y senderos peatonales. Area total de intervención 13.883,46m2	Estadios mejorados	1
		Número de estadios

Información específica de ejecución contrato específico

11/11/2021	7/03/2022	14	7/05/2023	42,558
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios


\$7,455	\$0	\$190
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

\$7,646


Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

7/04/2023	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

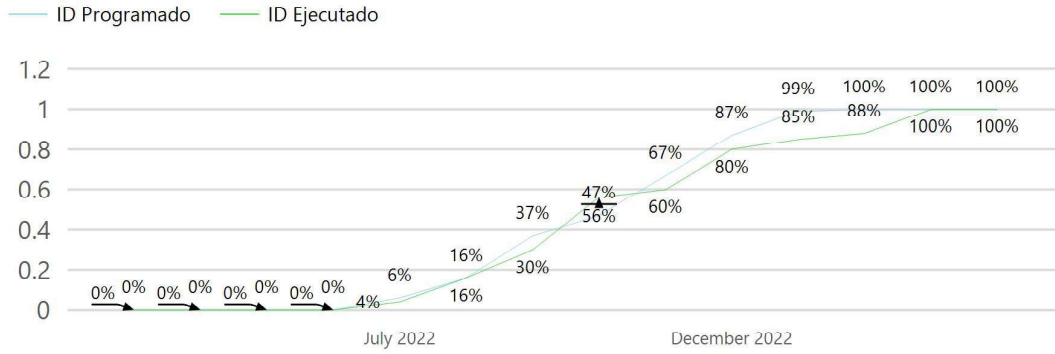

Avance Financiero del proyecto

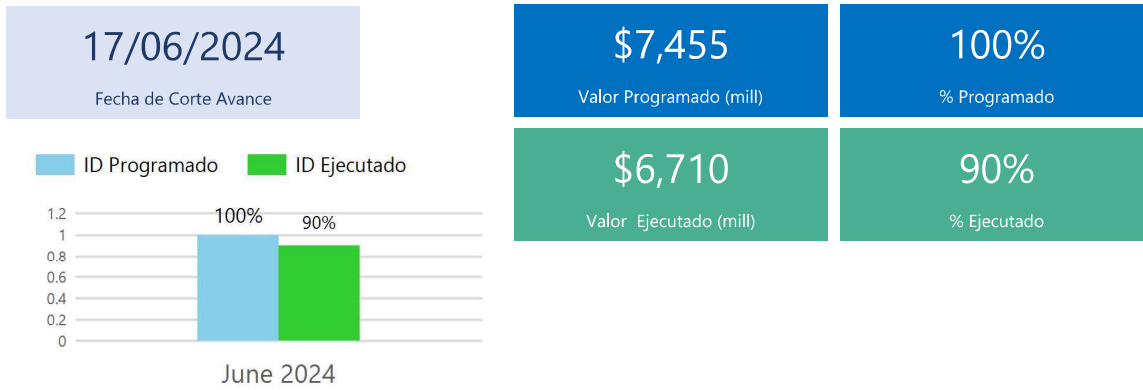

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$43,251

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$34,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$9,251

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreación	Municipio Intervención	Funza
BPIN	2021252860005	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	086-2210731	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	66	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	9/2/2021


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de infraestructura totalmente nueva, del coliseo cubierto con un área de 10.375, 93 m ² , con una capacidad aproximada de 3.712 personas, para ocupar cancha de futbol sala y subdividida para cuatro eventos simultáneos de deportes especializados; vestiers, baños, camerino, sala de entrenadores, enfermería, calistenia, depósitos generales, portería y administración, entre otros; lo que busca incrementar los niveles de competitividad deportiva en el municipio.	Coliseos cubiertos construidos	1
		Número de coliseos

Información específica de ejecución contrato específico


12/11/2021 Fecha de Suscripción	28/06/2022 Fecha de Inicio	26 Plazo en Meses	28/08/2024 Fecha Terminación	70,835 Número de Beneficiarios
\$34,000 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$9,251 Presupuesto Comprometido Territorio		
\$43,251 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

28/07/2024 Fecha de Corte Avance	1% % Programado	51% % Ejecutado
--	---------------------------	---------------------------

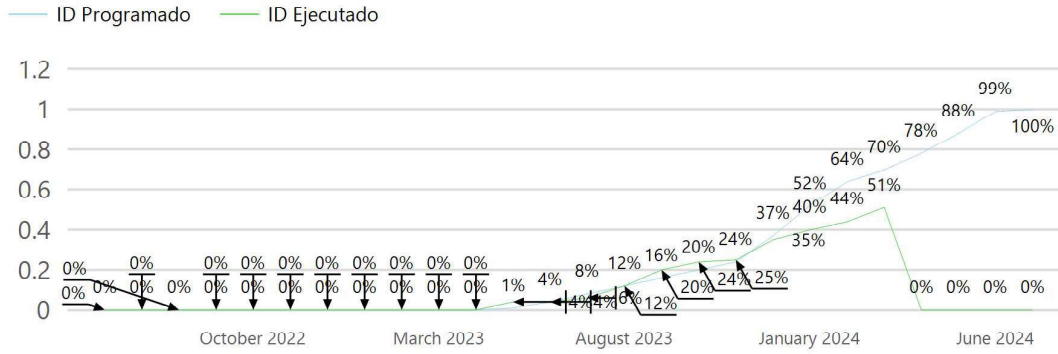

Avance Financiero del proyecto

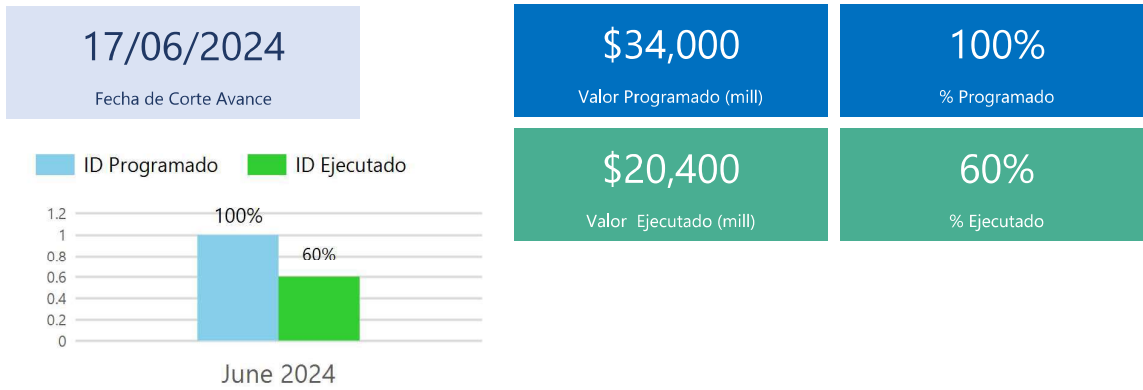

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$25,722

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$15,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$10,722

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreación	Municipio Intervención	Zipaquirá
BPIN	2021258990021	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	087-2210732	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	69	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	9/2/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de gradería oriental y occidental, adición de 2 carriles de pista atlética, acceso taquilla y mueso del deporte; cancha de tennis, cancha multiple, 4 canchas de squash, cancha frontón, gimnasio exterior multifuerza, gimnasio exterior de calistenia, 2 muros de escalado y cancha cubierta de tennis de mesa. Área a intervenir 30.920 m2	Estadios construidos y dotados	1
		Número de estadios

Información específica de ejecución contrato específico

11/11/2021	16/02/2022	31	16/09/2024	146,352
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

\$15,000	\$0	\$10,722
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

\$25,722

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

16/08/2024	4%	77%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado



Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$15,000
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$9,500
Valor Ejecutado (mill)

63%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$6,110

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$5,723

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$387

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Inclusion Social y Reconciliacion	Municipio Intervención	Cajicá
BPIN	2021251260004	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	092-2210738	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	84	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	8/17/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Realizar la construcción de un centro de Desarrollo infantil Cdi en la vereda Chuntame sector Tayrona del municipio de Cajicá.</p> <p>De acuerdo con la focalización del ICBF, el CDI se proyectó para una capacidad de 200 personas, de manera que se propone el traslado de 118 niños que se encuentran siendo atendidos en la modalidad CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL, 18 mujeres gestantes y 64 niños y niñas que se encuentran en lista de espera en el municipio de Cajica, Cundinamarca.</p> <p>Funcionalmente la construcción se plantea un area construida de 1.219,25 m2.</p>	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	1

Información específica de ejecución contrato específico

11/11/2021 Fecha de Suscripción	2/03/2022 Fecha de Inicio	28 Plazo en Meses	2/07/2024 Fecha Terminación	21,515 Número de Beneficiarios
\$5,723 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$387 Presupuesto Comprometido Territorio	\$6,110 Presupuesto Comprometido Total (millones)	

Avance físico del proyecto

2/03/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

57%

% Ejecutado

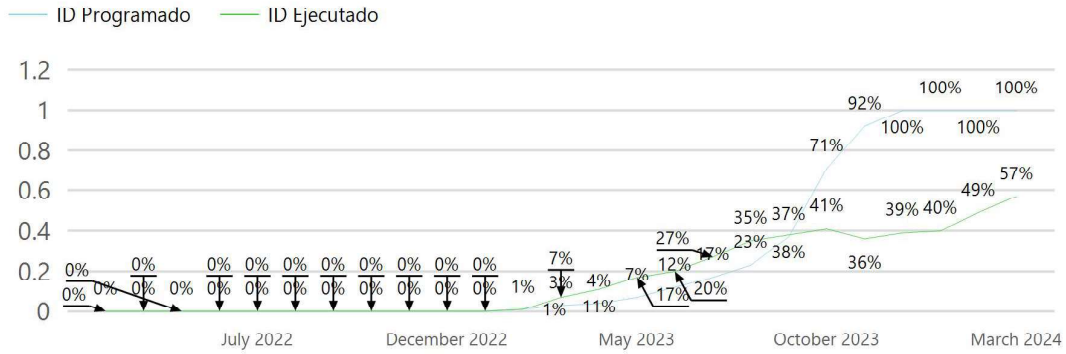

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024


Fecha de Corte Avance

\$5,723

Valor Programado (mill)

100%

% Programado



\$3,684

Valor Ejecutado (mill)

64%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$20,000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$20,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	Tocancipá
BPIN	2021258170001	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	095-2210741	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	67	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/22/2021


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una pista BMX por doble partidor, graderías, cancha de Hockey, Pista de ruta , tiendas, camerinos, enfermería, depósito, administración, locución, parqueaderos, baños, senderos, plazoletas. Área a intervenir de 30.553,00m2	Parques recreativos mejorados	1
		Número de parques

Información específica de ejecución contrato específico


12/11/2021	12/01/2022	32	12/09/2024	11,014
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios
\$20,000	\$0		\$0	
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector		Presupuesto Comprometido Territorio	
\$20,000				
Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

12/08/2024	1%	82%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

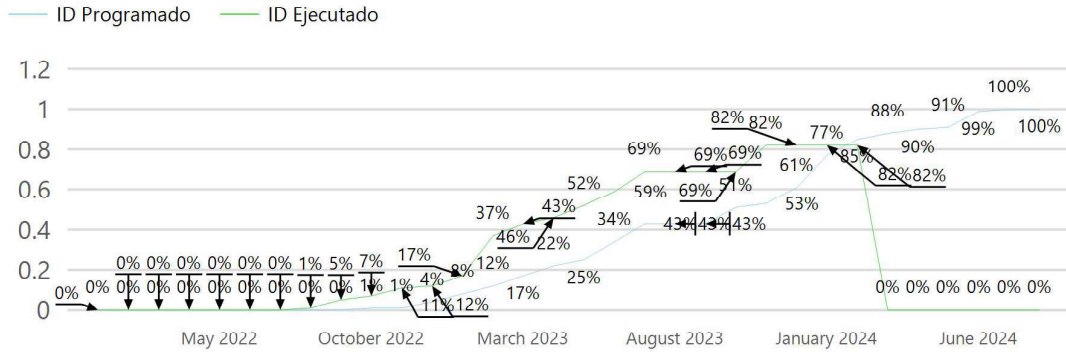

Avance Financiero del proyecto

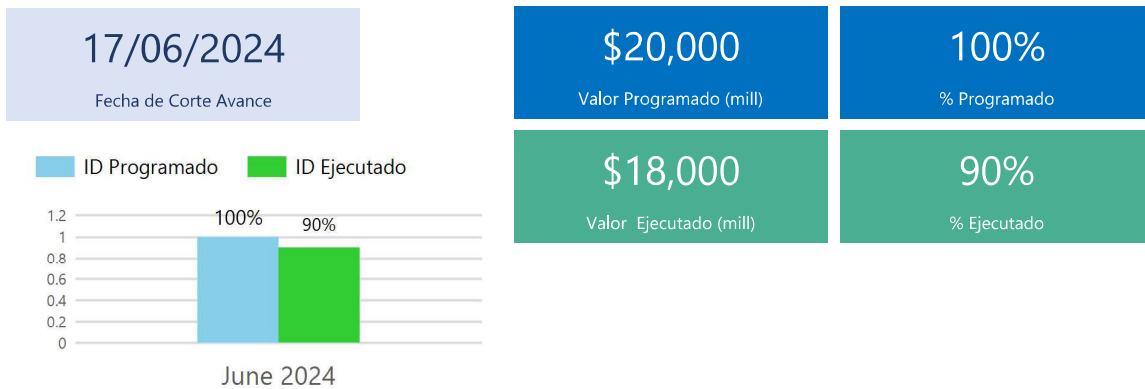

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes
municipio de Chipaque, Cundinamarca**

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$1,238

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Terminado

Estado Detallado

\$882

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$357

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Chipaque
BPIN	2021251780029	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	098-2210746	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	17	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/26/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Realizar la construcción de un centro de acopio que cuente con un área construida de 178 m2, conformado por área de almacenamiento, oficina, baterías sanitarias, zonas de parqueo, zonas de acceso y cafetería.	Centros de acopio construidos	1
		Numero de centros de acopio

Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021

Fecha de Suscripción

30/12/2021

Fecha de Inicio

18

Plazo en Meses

30/06/2023

Fecha Terminación

2,500

Número de Beneficiarios

\$882

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$357

Presupuesto Comprometido Territorio

\$1,238

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

30/05/2023


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

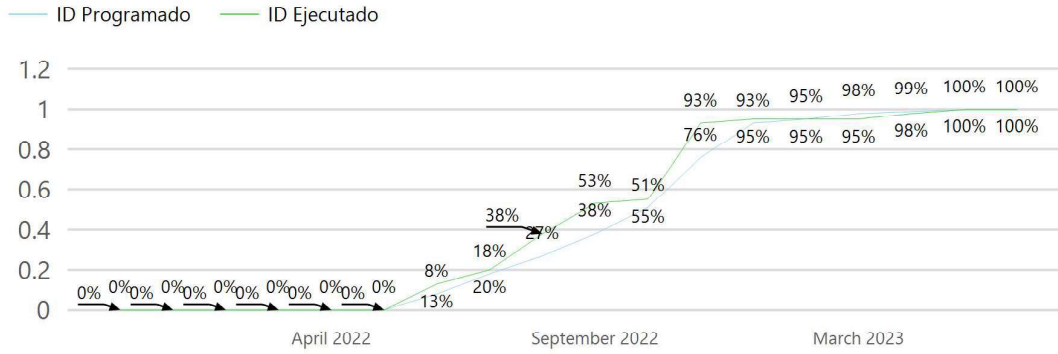

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$882
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$793
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$3,721

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$3,721

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Gachetá
BPIN	2021252970064	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	099-2210748	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	8	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/26/2021


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Adecuación de instalación es que permitan fortalecer los canales de comercialización de productos agropecuarios. Consta de un ares de conservación, almacenamiento y comercialización de productos de forma adecuada	Plazas de mercado restauradas	1
		Numero de plazas de mercado

Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021 Fecha de Suscripción	2/02/2022 Fecha de Inicio	29 Plazo en Meses	4/07/2024 Fecha Terminación	8,745 Número de Beneficiarios
\$2,481 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$0 Presupuesto Comprometido Territorio		
\$2,481 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

2/04/2023 Fecha de Corte Avance	76% % Programado	0% % Ejecutado
---	----------------------------	--------------------------

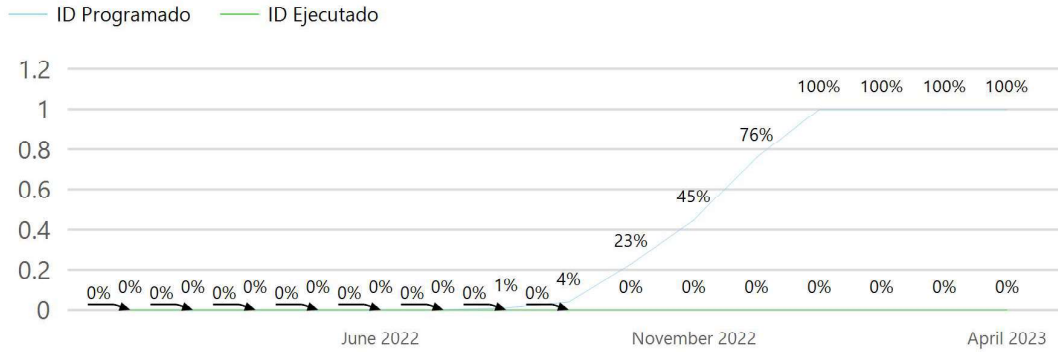

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$2,481
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$505
Valor Ejecutado (mill)

20%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$1,867

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Terminado

Estado Detallado

\$1,500

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$367

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Chocontá
BPIN	2021251830018	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	101-2210751	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	93	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	9/3/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejoramiento de la red vial urbana del municipio mediante la pavimentación en concreto hidráulico de 0.404 km de vías urbanas, en tres barrios del municipio. Específicamente las vías a intervenir tienen dimensiones típicas de 7.0 m con una estructura en concreto hidráulico, con bordillos a cada lado. Contará con líneas de demarcación de borde y de carril, según el manual de señalización.	Vía urbana mejorada	0.4043999999999998 Kilómetros de vías urbanas

Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021

Fecha de Suscripción

16/02/2022

Fecha de Inicio

24

Plazo en Meses

29/02/2024

Fecha Terminación

2,638

Número de Beneficiarios

\$1,500

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$413

Presupuesto Comprometido Territorio

\$1,913

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

16/01/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

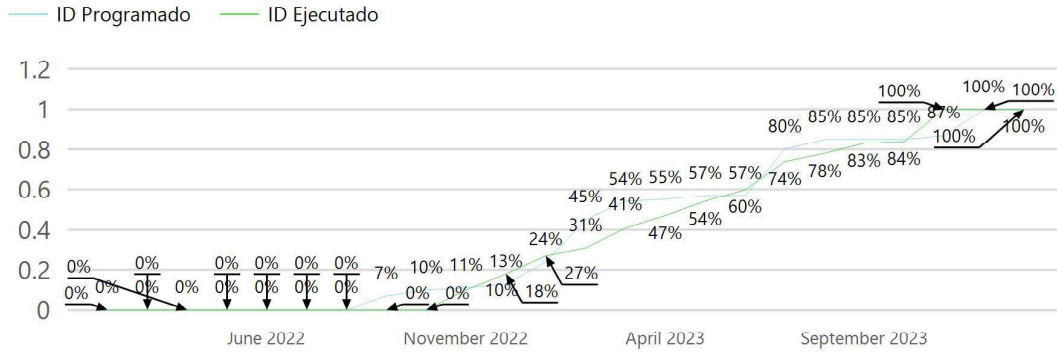

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$1,500
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

ID Programado ID Ejecutado

\$1,350
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$1,603 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Terminado Estado Detallado	
\$1,242 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$362 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Bituima
BPIN	2021250950023	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	103-2210753	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	12	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/26/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar 926 m2 de espacio productivo que conforman la plaza de Mercado de Bituima	Plaza de mercado adecuada	1
		Número de plazas de mercado

Información específica de ejecución contrato específico


11/11/2021 Fecha de Suscripción	1/12/2021 Fecha de Inicio	28 Plazo en Meses	15/04/2024 Fecha Terminación	1,013 Número de Beneficiarios
\$1,242 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$362 Presupuesto Comprometido Territorio		

\$1,603

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

1/03/2024 Fecha de Corte Avance	78% % Programado	77% % Ejecutado
---	----------------------------	---------------------------

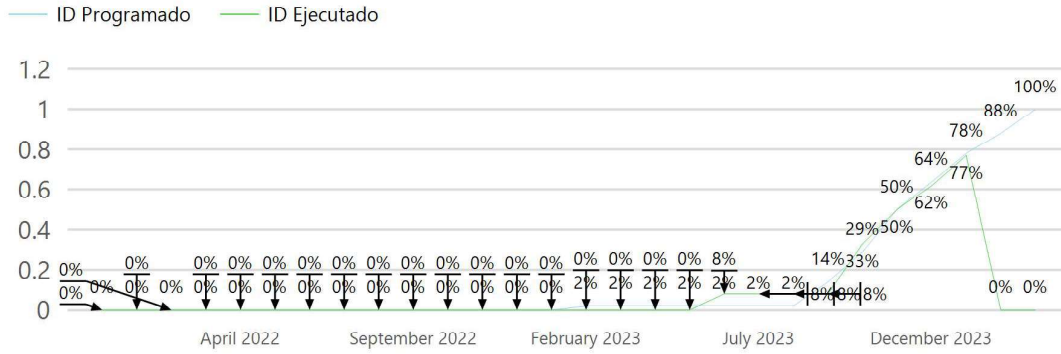

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$1,242
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$1,117
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$100,380

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$83,380

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$17,000

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Departamento de Cundinamarca
BPIN	2021004250606	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	104-2210754	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	92	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/9/2021


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Construcción de una cicloruta de 46,5 km que conectará a los municipios de Cota - Tenjo - Funza - Mosquera - Madrid y El Rosal, mediante una cicloruta en espacio público de andén para la circulación de bicicletas en dos (2) sentidos. Esta configuración se usa en distintas ciudades del país compartiendo el espacio con la circulación de peatones. Específicamente la cicloruta bidireccional tiene dimensiones típicas de 2.4 m en promedio, con un mejoramiento de la rasante, una estructura mediante mezcla densa en caliente tipo MDC19, con dos bordillos prefabricados de 0.20 m de ancho a cada lado. Contará con líneas de demarcación de borde y de carril, según el manual de señalización específica para cicloruta. De igual forma, se considera la construcción de rampas en los cambios de nivel entre superficie de andén y superficie de calzada y accesos vehiculares a garajes, junto con zonas de descanso, bici parqueaderos iluminados mediante lámparas alimentadas por energía solar. La cicloruta está pensada para que semanalmente se generen 274.800 mil viajes en días hábiles.</p>	Cicloinfraestructura construida	44.03 Kilómetros de cicloinfraestructura

Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021 Fecha de Suscripción	27/04/2022 Fecha de Inicio	48 Plazo en Meses	27/04/2026 Fecha Terminación	770,855 Número de Beneficiarios
\$83,380 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$17,000 Presupuesto Comprometido Territorio		
\$100,380				


Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto



Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

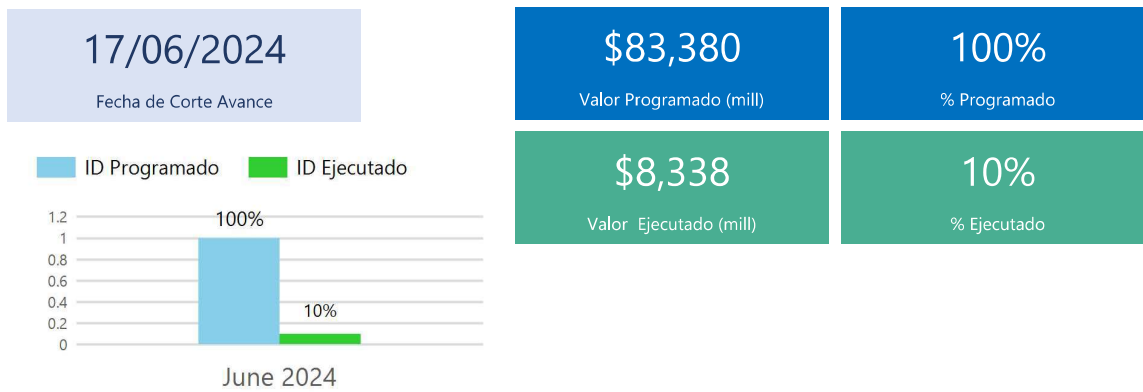

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$10,246 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En ejecución de obra Estado Detallado	
\$10,246 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Cáqueza
BPIN	2021004250604	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	122-2220766	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	45	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	1/7/2022


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Realizar la intervención de 3 puntos críticos, a través de la ejecución de estructuras orientadas a la reducción de la vulnerabilidad y la mitigación del riesgo asociado a la ocurrencia de eventos de remoción en masa. Dichas obras se encuentran asociadas al establecimiento de vigas e implantación de muros de contención en concreto reforzado.	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres	3
		Número de obras

Información específica de ejecución contrato específico

4/08/2022 Fecha de Suscripción	25/10/2022 Fecha de Inicio	22 Plazo en Meses	25/08/2024 Fecha Terminación	1,041 Número de Beneficiarios
\$10,246 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$10,246 Presupuesto Comprometido Total (millones)		

Avance físico del proyecto

25/04/2024 Fecha de Corte Avance	5% % Programado	54% % Ejecutado
--	---------------------------	---------------------------

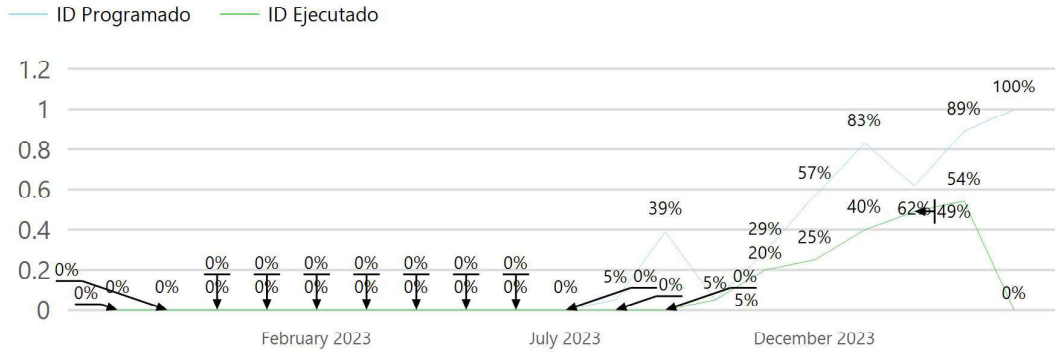

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$10,246
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

ID Programado ID Ejecutado

\$7,172
Valor Ejecutado (mill)

70%
% Ejecutado



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$1,485

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$1,485

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	El Rosal
BPIN	2021252600017	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	126-2220798	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	15	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	2/14/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción, infraestructura y dotación para el funcionamiento de el centro de un centro de acopio que cuente con 2 bodegas de productos secos, 1 bodega de productos en frío, 1 sala de reuniones, 2 oficinas de administración, dos baños, 1 vía de acceso vehicular para descargar los productos y zonas de parqueo.	Centros de acopio construidos	1
		Numero de centros de acopio

Información específica de ejecución contrato específico

5/08/2022

Fecha de Suscripción

21/10/2022

Fecha de Inicio

25

Plazo en Meses

18/11/2024

Fecha Terminación

25,757

Número de Beneficiarios

\$1,046

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$1,046

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

21/11/2023


Fecha de Corte Avance

84%

% Programado

0%

% Ejecutado

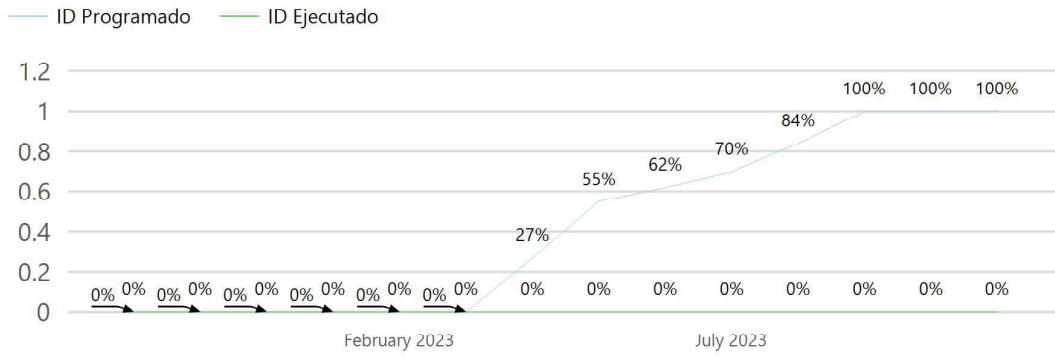

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paime, departamento de Cundinamarca

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$4,000 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Terminado Estado Detallado
--	--------------------------------------

\$4,000 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
---	--	--

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Paime
BPIN	2021255180021	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	127-2220813	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	46	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/26/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Realizar obra de drenaje de escorrentía de alrededor 360m, con el propósito de canalizar el flujo de la quebrada La Mira. Se construirá una canaleta de 80 cm de largo y 15 cm de alto, para controlar la energía del flujo y posteriormente conectarlo a la tubería pluvial. Así mismo, se construirán 4 pozos de inspección.	Obras para la prevención y control de movimientos en masa	73500 Metros cuadrados de área intervenida

Información específica de ejecución contrato específico

12/08/2022 Fecha de Suscripción	8/09/2022 Fecha de Inicio	15 Plazo en Meses	31/12/2023 Fecha Terminación	400 Número de Beneficiarios
---	-------------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------


\$3,803 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$204 Presupuesto Comprometido Territorio
---	---	---

\$4,007

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

8/12/2023 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	100% % Ejecutado
---	-----------------------------	----------------------------

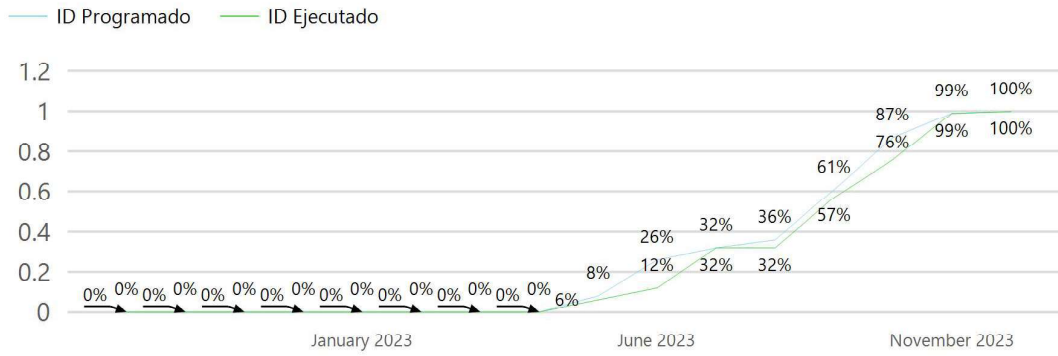

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$6,330

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$2,339

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$3,990

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Ricaurte
BPIN	2021256120002	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	136-2220951	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	21	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/26/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte, area de 1911 m2, 40 locales comerciales de 5,50m2, zonas de administración, baños, zonas de almacenamiento.	Plazas de mercado Construidas	1
		Numero de plazas de mercado

Información específica de ejecución contrato específico

23/08/2022

Fecha de Suscripción

6/09/2022

Fecha de Inicio

23

Plazo en Meses

6/08/2024

Fecha Terminación

14,367

Número de Beneficiarios

\$2,339

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$3,990

Presupuesto Comprometido Territorio

\$6,330

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/12/2023


Fecha de Corte Avance

17%

% Programado

72%

% Ejecutado

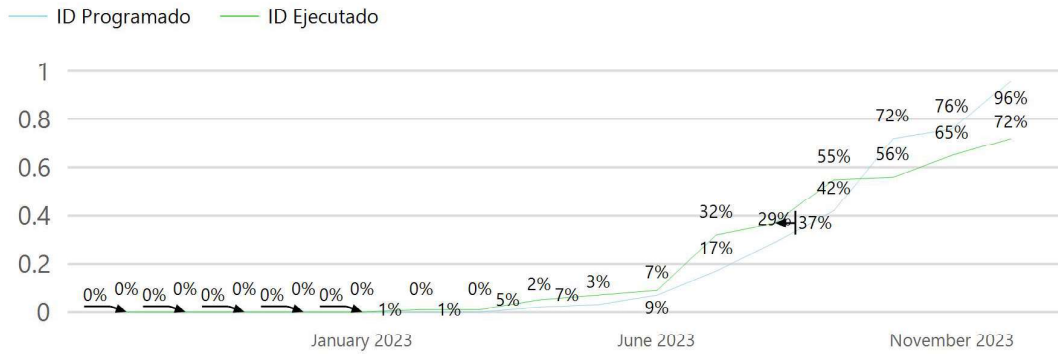

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$2,351

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$1,142

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$1,209

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Ubalá
BPIN	2022258390014	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	137-2220968	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	16	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	4/1/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 642.6 m2 de plaza de mercado y la adecuación de los locales existentes, locales comerciales (adecuación): locales cárnicos, local restaurante y cafetería, local distribuidora de comidas animales, servicios cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, rampas de acceso e instalaciones sanitarias. plaza de mercado (obra nueva) Análisis técnico de la alternativa, Plaza campesina: frutas, verduras, tubérculos y hortalizas, Artesanal y flores: artesanías locales y flores, Productos tradicionales: granos, panela, miel, arepas y café.	Plaza de mercado construidas	1
		Numero de plazas de mercado

Información específica de ejecución contrato específico


23/08/2022	29/11/2022	22	29/09/2024	9,644
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios
\$1,142	\$0	\$1,209		
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio		
\$2,351				
Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado
-----------------------	--------------	-------------

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

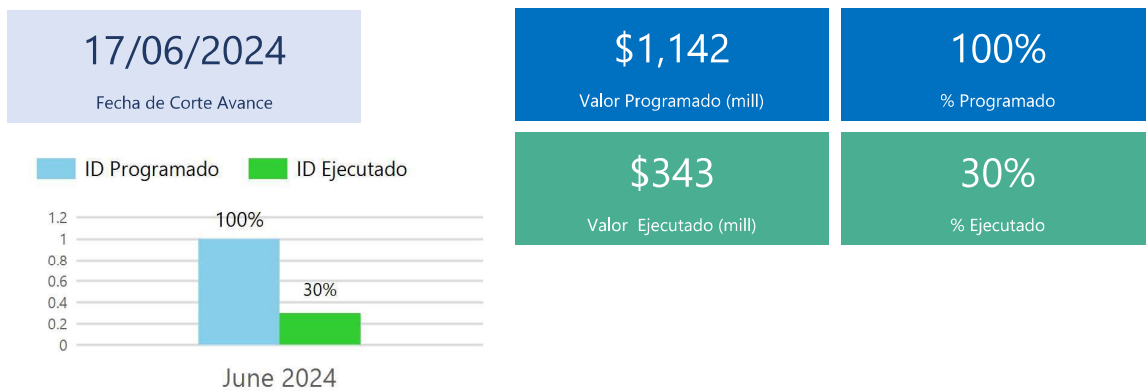

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$28,593

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$28,593

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Ubaque
BPIN	2021258410071	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	138-2221075	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	47	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	12/3/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Establecer una pantalla anclada en la zona sur del casco urbano próximo a las casas existentes, así como un muro de contención de aproximadamente 200 metros de longitud cimentado por caisson o pilotes profundos también en la ladera sur y una serie de muros de contención en voladizo continuos al casco urbano del municipio	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres	5
		Número de obras

Información específica de ejecución contrato específico

9/08/2022

Fecha de Suscripción

25/10/2022

Fecha de Inicio

20

Plazo en Meses

25/06/2024

Fecha Terminación

1,854

Número de Beneficiarios

\$28,593

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$28,593

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

25/06/2024


Fecha de Corte Avance

5%

% Programado

20%

% Ejecutado

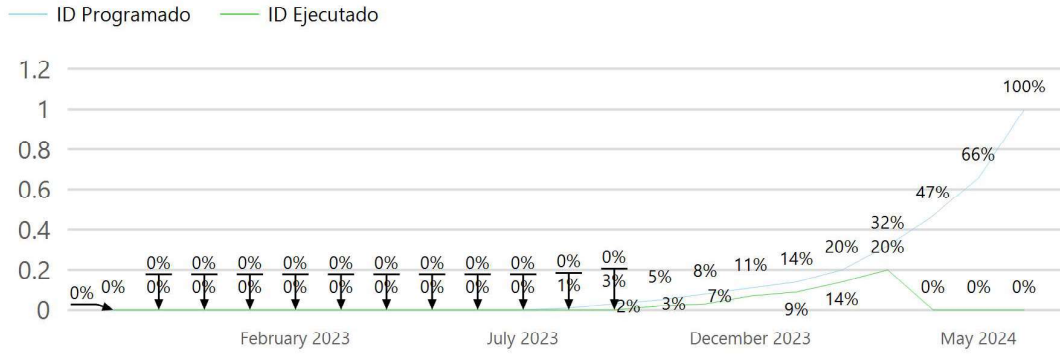

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$28,593
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$8,578
Valor Ejecutado (mill)

30%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento del escenario deportivo de la Villa olímpica en el casco urbano del municipio de Jerusalén Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$4,185

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$4,185

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	Jerusalén
BPIN	2021253680040	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	142-2221133	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	71	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/12/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar el Complejo Deportivo con la adecuación de la cancha de fútbol con un sistema de riego y drenaje, un sistema de iluminación de 6 torres con reflectores y una zona modular de camerinos y gradas, y nivelación de pista atlética. Área de intervención aproximada de 13.458,00m2	Canchas multifuncionales construidas y dotadas	1
		Número de canchas

Información específica de ejecución contrato específico

24/10/2022

Fecha de Suscripción

29/11/2022

Fecha de Inicio

19

Plazo en Meses

29/06/2024

Fecha Terminación

791

Número de Beneficiarios

\$4,185

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$4,185

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

29/02/2024


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

82%

% Ejecutado

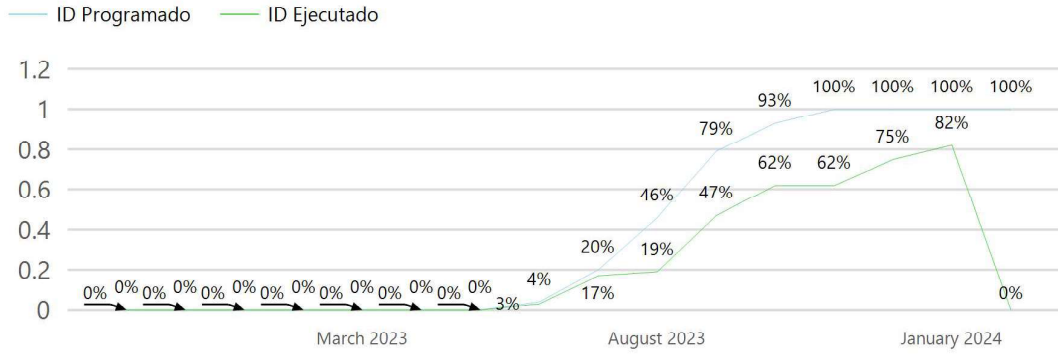

Avance Financiero del proyecto

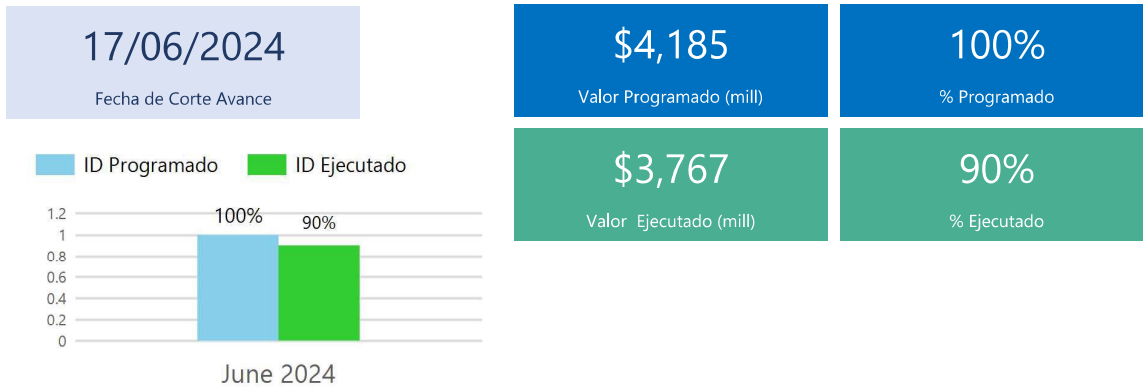

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios,
departamento de Cundinamarca**

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$10,210

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$10,210

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Agua de Dios
BPIN	2021250010007	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	143-2221137	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	2	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	6/23/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una plaza de mercado con un área de aproximadamente 3.700 m2, para el abastecimiento de productos de primera necesidad y regularizar, impulsar y ordenar el comercio informal.	Plaza de mercado construidas	1
		Plazas de mercado construidas

Información específica de ejecución contrato específico

24/10/2022

Fecha de Suscripción

21/11/2022

Fecha de Inicio

20

Plazo en Meses

21/07/2024

Fecha Terminación

6,423

Número de Beneficiarios

\$10,133

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$10,133

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

21/01/2024


Fecha de Corte Avance

56%

% Programado

65%

% Ejecutado

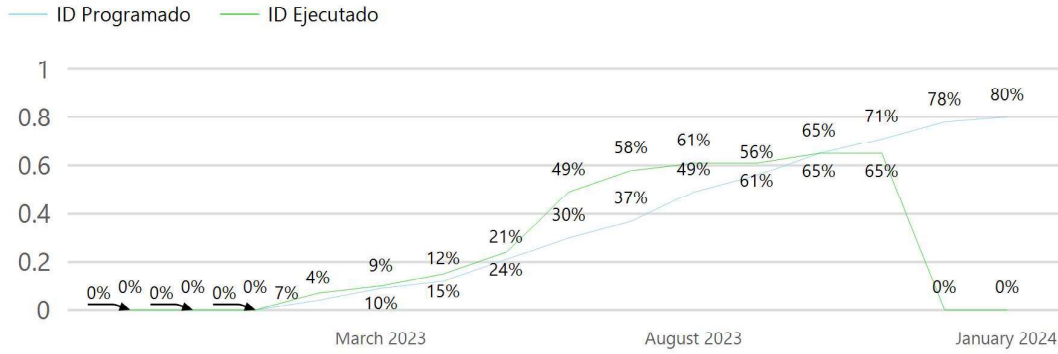

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$2,949

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$2,949

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Pulí
BPIN	2021255800032	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	145-2221135	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	19	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	7/18/2022


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Edificación compuesta por sistemas estructurales combinados de pórticos en concreto y acero, cimentación de zapatas, columnas en concreto, entresijos en concreto, mampostería estructural, estructura de cubierta y cubierta en acero, con acabados en las zonas sanitarias, accesibilidad para personas en condición de discapacidad, espacios de comercialización, refrigeración y almacenamiento de productos agrícolas pecuarios.	Plazas de mercado Construidas	1
		Numero de plazas de mercado

Información específica de ejecución contrato específico

27/10/2022 Fecha de Suscripción	23/11/2022 Fecha de Inicio	19 Plazo en Meses	22/06/2024 Fecha Terminación	600 Número de Beneficiarios
\$2,948 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$0 Presupuesto Comprometido Territorio	\$2,948 Presupuesto Comprometido Total (millones)	

Avance físico del proyecto

23/02/2024 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	52% % Ejecutado
--	-----------------------------	---------------------------

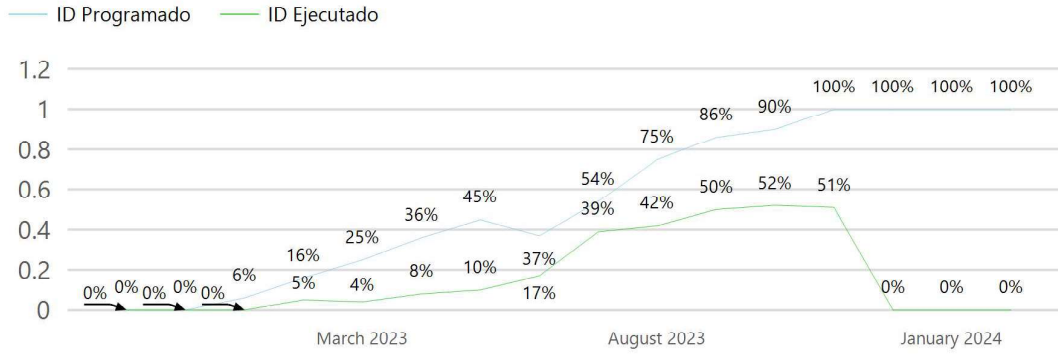

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$1,368

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Terminado

Estado Detallado

\$1,190

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$178

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Manta
BPIN	2021254360035	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	148-2221134	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	14	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/26/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de Plaza de ferias de 900m2 aproximadamente, que contará con corrales, pasarelas, sistema de báscula, acceso y salida de vehículos, zona administrativa, zona de carga y circulación,	Plaza de Ferias construida	1
		Número de plazas de ferias

Información específica de ejecución contrato específico

31/10/2022

Fecha de Suscripción

23/11/2022

Fecha de Inicio

13

Plazo en Meses

23/12/2023

Fecha Terminación

1,200

Número de Beneficiarios

\$1,190

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$178

Presupuesto Comprometido Territorio

\$1,368

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

23/11/2023


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

100%

% Ejecutado

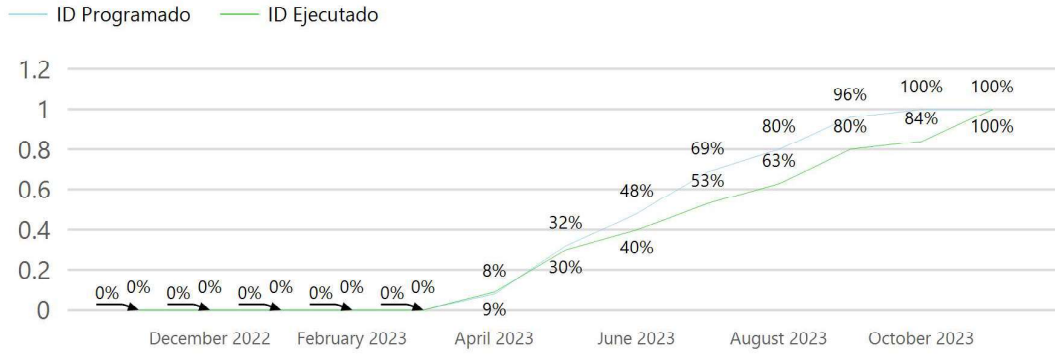

Avance Financiero del proyecto

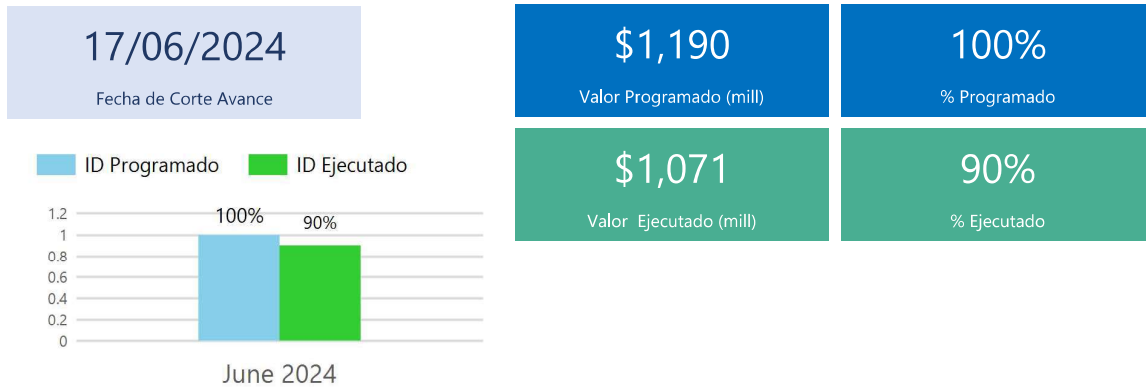

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá, Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$8,324

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$5,528

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$2,796

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Machetá
BPIN	2021254260029	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	149-2221138	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	20	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/26/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de la Plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial, con un área total de 3.882,86, con área de mercado enfermería, depósito y expendio de cerveza, zona de comidas, baños, cuarto de electricidad, parqueadero, urbanismo y zona de cargue y descargue de alimentos.	Plazas de mercado Construidas	1 Numero de plazas de mercado

Información específica de ejecución contrato específico

31/10/2022

Fecha de Suscripción

24/11/2022

Fecha de Inicio

24

Plazo en Meses

24/11/2024

Fecha Terminación

90

Número de Beneficiarios

\$3,386

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$2,696

Presupuesto Comprometido Territorio

\$6,082

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

24/03/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

74%

% Ejecutado

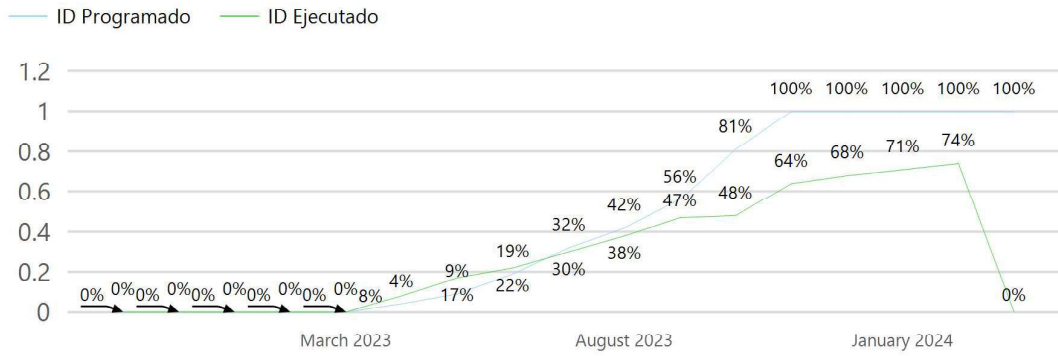

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$3,386
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$3,048
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$3,759

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$3,255

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$505

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Guayabetal
BPIN	2021253350002	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	150-2221143	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	7	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	3/15/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una plaza de mercado con 3 niveles: la primera planta con un área de 424,78, la segunda planta 459,38 M2, la tercera planta 459,38 para un área total de 1.343,54 M2 de construcción; atendiendo a más de 130 familias productoras en temas agropecuarios y de turismo.	Plaza de mercado construidas	1
		Numero de plazas de mercado

Información específica de ejecución contrato específico

31/10/2022

Fecha de Suscripción

10/01/2023

Fecha de Inicio

19

Plazo en Meses

10/08/2024

Fecha Terminación

3,375

Número de Beneficiarios

\$3,255

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$505

Presupuesto Comprometido Territorio

\$3,759

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

10/07/2024


Fecha de Corte Avance

58%


% Programado

80%

% Ejecutado

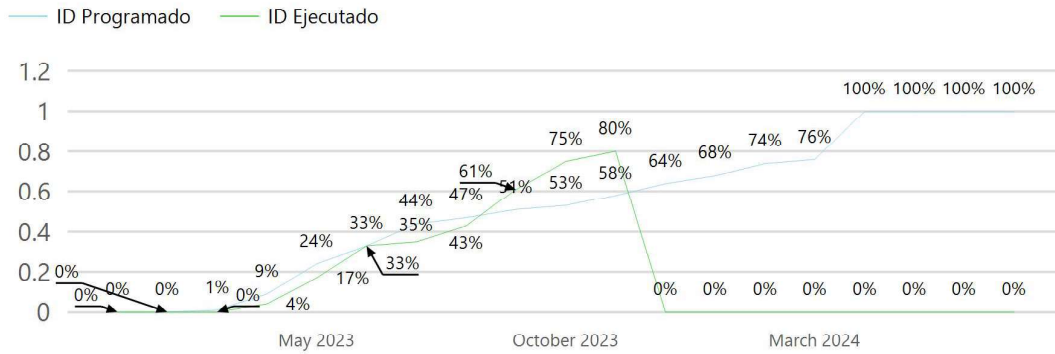

Avance Financiero del proyecto

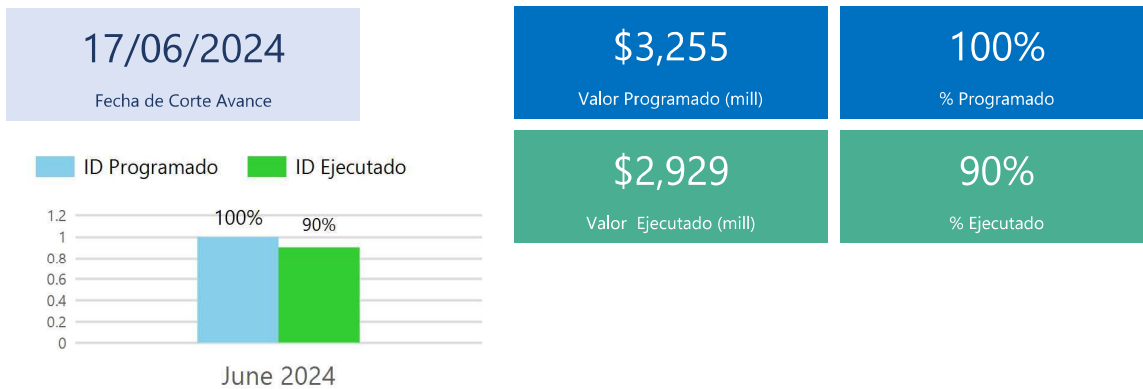

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - centro funcional Quetame

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$28,774

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$25,847

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$2,927

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Quetame
BPIN	2021255940039	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	154-2221177	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	26	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/4/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El Centro de Agroindustrial de Quetame contara con un area de 4.356,51 m2, cuenta con una infraestructura moderna de tres niveles, donde se prodran encontrar 45 puestos de trabajo, zona de plazoleta de comidas, zonas de parqueo, zonas de circulación, zonas de almacenamiento, cuartos frios, zonas de carnicos, zonas de fruver, zonas de descanso y esparcimemiento, zonas bancarias, baños, zona administrativa	Centros de acopio construidos	1
		Numero de centros de acopio

Información específica de ejecución contrato específico

6/12/2022

Fecha de Suscripción

13/02/2023

Fecha de Inicio

34

Plazo en Meses

13/12/2025

Fecha Terminación

7,141

Número de Beneficiarios

\$24,588

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$2,927

Presupuesto Comprometido Territorio

\$27,515

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

13/11/2025

Fecha de Corte Avance

0%

% Programado

25%

% Ejecutado

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; II etapa, Chipaque

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$2,195

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$2,195

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Chipaque
BPIN	2021251780028	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	155-2221178	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	25	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/5/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El centro de Acopio Agroindustrial, II etapa con 340 m2 de construcción de 2 niveles el primer nivel con un area de 228 m2 y el segundo nivel con un area de 112 m2, cuenta con zona de parqueo, zona de descargue, zona de cargue, bodega de almacenamiento, baños, zona de residuos, zona administrativa.	Centros de acopio construidos	1
		Numero de centros de acopio

Información específica de ejecución contrato específico

6/12/2022	15/02/2023	16	15/06/2024	3,500
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios


\$2,194	\$0	\$0
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

\$2,194


Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

15/03/2024	100%	15%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

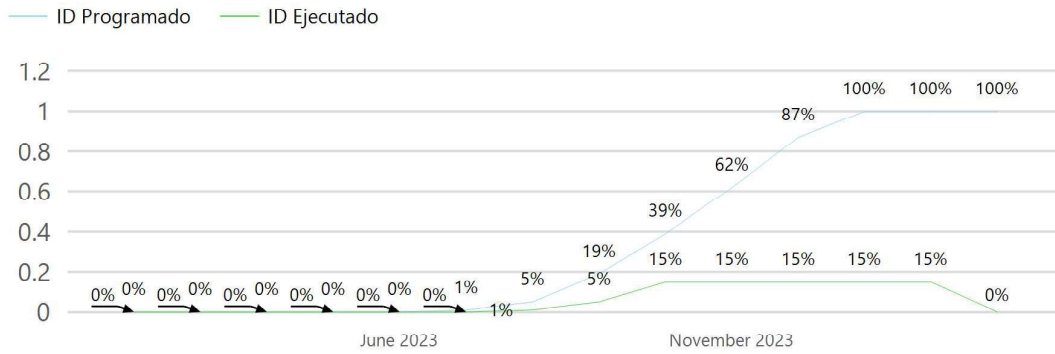

Avance Financiero del proyecto

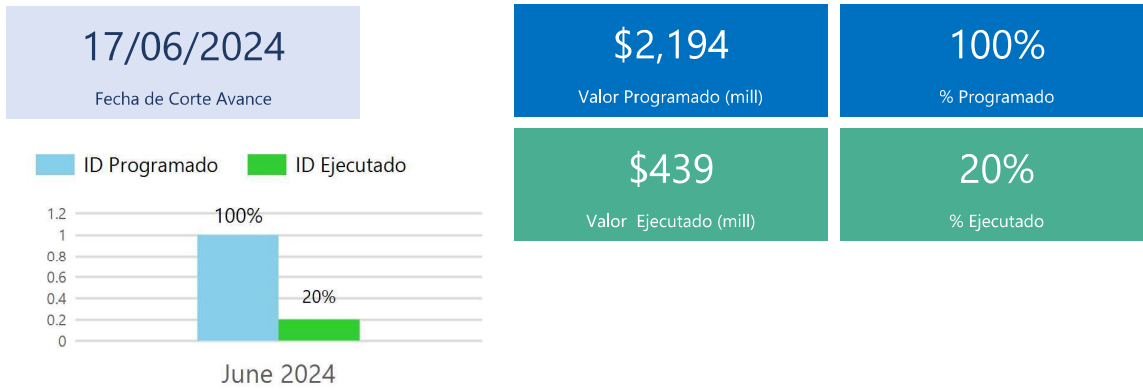

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

**Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque,
Cundinamarca**

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$18,092

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$13,762

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$4,331

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Fómeque
BPIN	2021252790038	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	156-2221179	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	24	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/4/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Contrucción de 2515 m2 de Plaza de mercado, que contienen area de parqueaderos, zona de descargue, zona de residuos, zonas de circulación, plazoleta de comidas, 32 puestos de trabajo, 12 puestos de emprendimientos, zona de almacenamiento, cuartos frios, jardines, bodega y zona de administración	Plaza de mercado construidas	1
		Numero de plazas de mercado

Información específica de ejecución contrato específico

16/12/2022 Fecha de Suscripción	22/03/2023 Fecha de Inicio	28 Plazo en Meses	22/07/2025 Fecha Terminación	10,156 Número de Beneficiarios
---	--------------------------------------	-----------------------------	--	--

\$13,762 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$4,331 Presupuesto Comprometido Territorio
--	---	---

\$18,092

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado
-----------------------	--------------	-------------

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$1,673

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$1,673

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Sasaima
BPIN	2022257180004	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	160-2221185	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	9	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	7/29/2022


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios que consta de las siguientes áreas: área administrativa de dos plantas, el primer piso contiene un stand de exposición de productos, baños, vestier y en el segundo piso sala de juntas, un espacio para oficinas auxiliares y oficina para directivo. En el primer piso se construirá una bodega para el recibo y alistamiento de productos como el café la panela, con un área de 70,4 m2 y áreas de circulación pam el ingreso y la salida de los productos de 46,92 m2	Centro de acopio construidos	1
		Número de centros de acopio

Información específica de ejecución contrato específico

19/12/2022 Fecha de Suscripción	13/02/2023 Fecha de Inicio	19 Plazo en Meses	13/09/2024 Fecha Terminación	1,206 Número de Beneficiarios
\$1,586 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector		\$0 Presupuesto Comprometido Territorio	
\$1,586 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

13/08/2024 Fecha de Corte Avance	20% % Programado	25% % Ejecutado
-------------------------------------	---------------------	--------------------

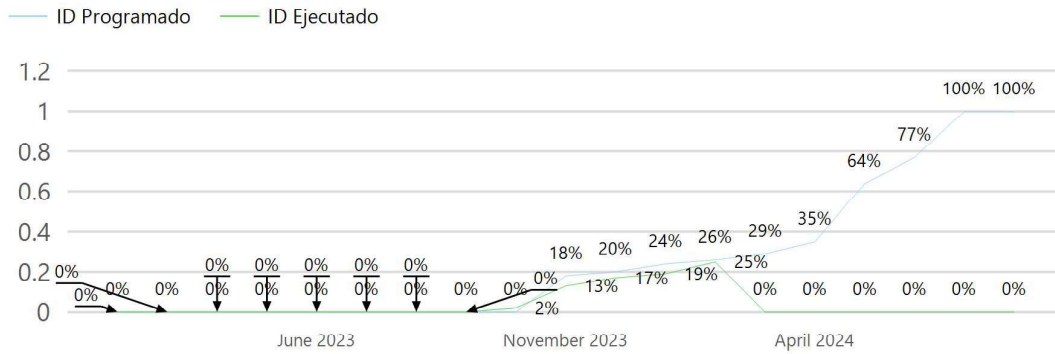

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$1,586
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$502
Valor Ejecutado (mill)

32%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$3,723

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$3,723

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Nilo
BPIN	2022254880024	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	163-2221187	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	5	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/13/2022


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción plaza comercial municipio de Nilo, Cundinamarca sector vía panamericana	Plazas de mercado Construidas	1
		Numero de plazas de mercado

Información específica de ejecución contrato específico

22/12/2022	22/02/2023	20	22/10/2024	5,168
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios
\$3,642	\$0		\$0	
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector		Presupuesto Comprometido Territorio	
\$3,642				
Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

22/09/2024	4%	15%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

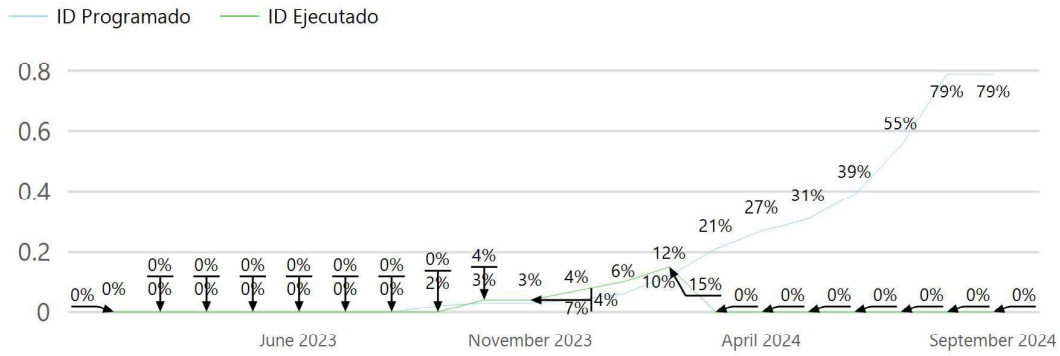

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$2,272

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$2,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$272

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio Intervención	Chocontá
BPIN	2021251830017	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	164-2221188	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	22	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	8/4/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca que consta de un área de 1,807,01 m2	Plaza de mercado adecuada	1
		Numero de plazas de mercado

Información específica de ejecución contrato específico

22/12/2022 Fecha de Suscripción	22/02/2023 Fecha de Inicio	16 Plazo en Meses	22/06/2024 Fecha Terminación	20,568 Número de Beneficiarios
\$2,000 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$272 Presupuesto Comprometido Territorio	\$2,272 Presupuesto Comprometido Total (millones)	

Avance físico del proyecto

22/05/2024 Fecha de Corte Avance	66% % Programado	62% % Ejecutado
--	----------------------------	---------------------------

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$47,179

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$39,732

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$7,447

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Cultura	Municipio Intervención	Zipaquirá
BPIN	2022258990088	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	165-2221190	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	102	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	4	Fecha viabilidad	7/13/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Ampliación y reforzamiento estructural del Teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá, en Cundinamarca, que contempla una adición de una edificación nueva de 529,53m ² y área construida total de 1048,11 m ²	Teatros con reforzamiento estructural	1
		Número de centros culturales

Información específica de ejecución contrato específico

22/12/2022

Fecha de Suscripción

8/03/2023

Fecha de Inicio

25

Plazo en Meses

8/04/2025

Fecha Terminación

156,983

Número de Beneficiarios

\$39,732

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$7,447

Presupuesto Comprometido Territorio

\$47,178

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

8/04/2025

Fecha de Corte Avance

0%

% Programado

1%

% Ejecutado

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción del Centro Cultural en Gachancipá

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$15,544

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$14,744

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$800

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Cultura	Municipio Intervención	Gachancipá
BPIN	2022252950004	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	166-2221191	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	103	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	4	Fecha viabilidad	8/31/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 4.657 m2 del centro cultural para la recuperación de espacios culturales y sociales en el municipio de Gachancipá.	Centros culturales construidos	1
		Número de centros culturales

Información específica de ejecución contrato específico

21/12/2022

Fecha de Suscripción

13/03/2023

Fecha de Inicio

22

Plazo en Meses

13/01/2025

Fecha Terminación

14,268

Número de Beneficiarios

\$14,744

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$800

Presupuesto Comprometido Territorio

\$15,544

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Fecha de Corte Avance

% Programado

% Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Cundinamarca

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá Cundinamarca

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$59,526

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$46,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$13,526

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Cultura	Municipio Intervención	Zipaquirá
BPIN	2022258990087	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	167-2221203	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	104	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	4	Fecha viabilidad	7/13/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un centro cultural y de convenciones para el municipio de Zipaquirá. Cuenta con un área de 25.522,79m ² disposición para área libre 13.558,69 m ² . Construcción de 5.166m ² el primer piso y 1.363 m ² el segundo piso.	Centros culturales construidos y dotados	1
		Número de centros culturales

Información específica de ejecución contrato específico

22/12/2022

Fecha de Suscripción

8/03/2023

Fecha de Inicio

29

Plazo en Meses

8/08/2025

Fecha Terminación

156,315

Número de Beneficiarios

\$46,000

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$13,526

Presupuesto Comprometido Territorio

\$59,526

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

8/07/2025


Fecha de Corte Avance

4%

% Programado

2%

% Ejecutado

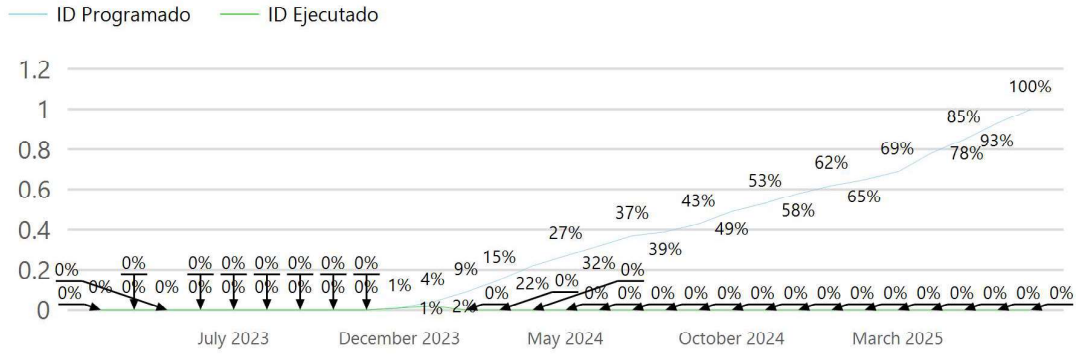

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$46,000
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$8,200
Valor Ejecutado (mill)

18%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.
