

Pacto **BOLIVAR**

Ficha trimestral, junio de 2024.

\$ 406 Mil millones

Recursos aportados



6% ● Territorio \$24 mil millones
94% ● DNP FRPT \$381 mil millones

8 Proyectos financiados



6

Ejecución



2

Terminados



Proyectos no iniciados
(en proceso de estructuración o
viabilidad sectorial)

 **100%**
Avance consolidado

Pacto Territorial Bolívar

5/04/2021 Fecha suscripción	3 Plazo en años	5/04/2024 Fecha de Terminación	0 Meses para vencimiento	100% % Tiempo Transcurrido
8 Total Proyectos		\$399,204 Valor Indicativo (Millones)		
\$381,191 Aporte indicativo nación (Millones)	\$18,012 Aporte indicativo territorio (Millones)	\$0 Aporte indicativo otros (Millones)		


Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$53,873	\$53,873	\$0	\$0
Deporte y Recreación	\$7,911	\$7,911	\$0	\$0
Educación	\$40,558	\$37,591	\$2,967	\$0
Transporte	\$296,862	\$281,817	\$15,045	\$0
Total	\$399,204	\$381,191	\$18,012	\$0

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

100%	\$405,670 Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado
------	--

Número de Proyectos por Estado

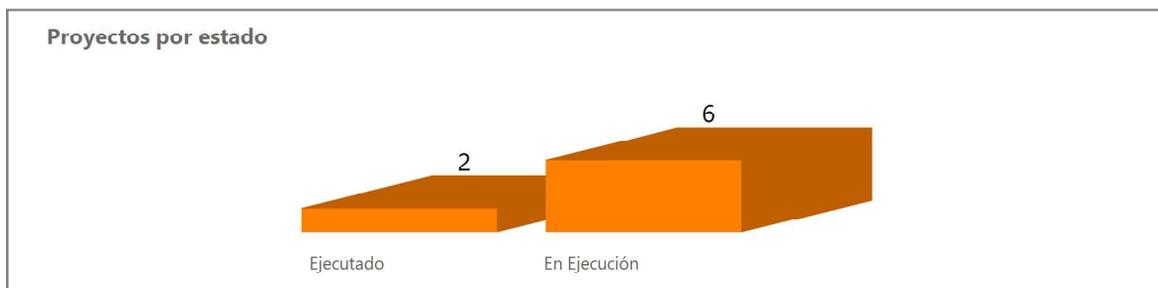

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ejecutado	Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar	\$8,354	\$8,354	\$0	\$0
Ejecutado	Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar en el departamento de Bolívar	\$7,911	\$7,911	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití	\$212,651	\$212,651	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar	\$84,211	\$69,166	\$15,045	\$0
En Ejecución	Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar	\$30,281	\$30,281	\$0	\$0
En Ejecución	Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kotska, departamento de Bolívar	\$22,591	\$21,702	\$889	\$0
En Ejecución	Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona	\$17,967	\$15,889	\$2,078	\$0
En Ejecución	Mejoramiento y canalización del arroyo Alferez del municipio de El Carmen de Bolívar	\$15,237	\$15,237	\$0	\$0
Total		\$399,204	\$381,191	\$18,012	\$0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

8

Total Proyectos

\$399,204

Valor Indicativo (Millones)

Aporte indicativo DNP FRPT		Aporte indicativo territorio		Aporte indicativo Sector		Aporte indicativo Otros	
Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros	
Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Mauricio Nelson Vísbal, municipio de San Estanislao de Kotska, departamento de Bolívar	En Ejecución	\$22,591	\$21,702	\$889	\$0	\$0	
Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona	En Ejecución	\$17,967	\$15,889	\$2,078	\$0	\$0	
Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar	En Ejecución	\$30,281	\$30,281	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití	En Ejecución	\$212,651	\$212,651	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento y canalización del arroyo Alferez del municipio de El Carmen de Bolívar	En Ejecución	\$15,237	\$15,237	\$0	\$0	\$0	
Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar	Ejecutado	\$8,354	\$8,354	\$0	\$0	\$0	

 Departamento Nacional de Planeación	FICHA TRIMESTRAL PACTOS TERRITORIALES					Página 4 De 4	
Construcción de cancha de fútbol sintética en Cícuco Bolívar en el departamento de Bolívar	Ejecutado	\$7,911	\$7,911	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar	En Ejecución	\$84,211	\$69,166	\$15,045	\$0	\$0	
Total		\$399,204	\$381,191	\$18,012	\$0	\$0	

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Funcional-Bolivar.aspx>

Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales

Proyectos en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Bolívar

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, municipio de Simití

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$212,651 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En ejecución de obra Estado Detallado	
\$212,651 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Morales
BPIN	20201301010240	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	071-2210662	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	88	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	6/17/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 40,466 km de vías en pavimento flexible con su señalización horizontal y vertical y 20 alcantarillas de 36", 64 estructuras tipo box culvert y un muro de contención en Gavión de 100 metros.	Vía terciaria mejorada	40.46 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico


14/10/2021 Fecha de Suscripción	5/01/2022 Fecha de Inicio	31 Plazo en Meses	5/08/2024 Fecha Terminación	44,825 Número de Beneficiarios
---	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--

\$212,651 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$0 Presupuesto Comprometido Territorio
---	---	---

\$212,651 Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

5/07/2024 Fecha de Corte Avance	20% % Programado	86% % Ejecutado
---	----------------------------	---------------------------

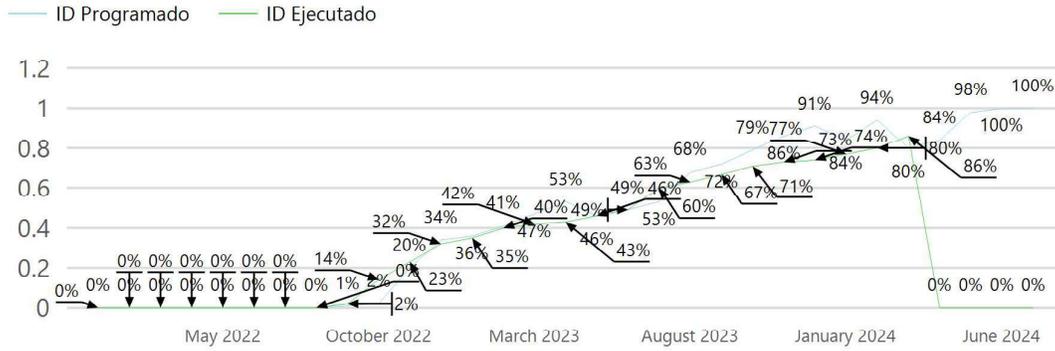

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$212,651
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$170,120
Valor Ejecutado (mill)

80%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Bolívar

Fecha de Corte

17/06/2024

Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$17,967

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$15,889

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$2,078

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Educación	Municipio Intervención	Arjona
BPIN	2019002130077	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	072-2210663	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	74	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	7/2/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de infraestructura educativa existente en el municipio de Arjona con la construcción de 5 aulas de clases de preescolar, 20 aulas de clases básicas y media, 1 aula polivalente, 1 aula tecnológica, 1 centro de recursos, 1 laboratorio integrado, 1 área administrativa, 1 aula múltiple - comedor y 1 cancha múltiple.	Infraestructura educativa mejorada	1
		Número de Sedes

Información específica de ejecución contrato específico

14/10/2021	17/02/2022	29	3/07/2024	815
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

\$15,889	\$0	\$4,732
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

\$20,621

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/06/2024	3%	97%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

Pacto Territorial Bolívar

Fecha de Corte

17/06/2024

Reposición y construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Mauricio Nelson Vísbal, municipio de San Estanislao de Kotska, departamento de Bolívar

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$22,591 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En ejecución de obra Estado Detallado	
\$21,702 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$889 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Educación	Municipio Intervención	San Estanislao de Kotska
BPIN	2021002130162	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	073-2210665	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	73	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	7/12/2021


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 1 aula de clases de preescolar, 20 aulas de clases básicas y media, 1 biblioteca, 1 área administrativa, 1 área de talleres, 1 aula múltiple -comedor - cocina.	Infraestructura educativa mejorada	1
		Número de sedes

Información específica de ejecución contrato específico

14/10/2021 Fecha de Suscripción	4/05/2022 Fecha de Inicio	29 Plazo en Meses	19/10/2024 Fecha Terminación	970 Número de Beneficiarios
\$21,702 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$4,702 Presupuesto Comprometido Territorio		
\$26,403 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

4/10/2024 Fecha de Corte Avance	3% % Programado	75% % Ejecutado
---	---------------------------	---------------------------

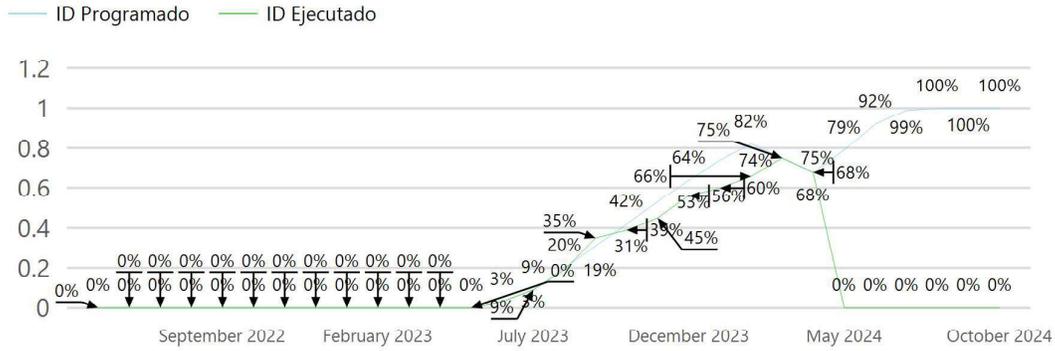

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance


\$21,702
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

ID Programado ID Ejecutado

\$16,927
Valor Ejecutado (mill)

78%
% Ejecutado



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Bolívar

Fecha de Corte

17/06/2024

Canalización del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana, Bolívar

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$30,281

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$30,281

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Turbana
BPIN	2021138380001	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	081-2210721	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	33	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	4/26/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Con este proyecto se realizará la canalización de 1.8 Kilómetros del arroyo Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de taludes en el municipio de Turbana – Bolívar, construcción de 11.940 metros cúbicos de muro de gavión para estabilizar taludes y 772 metros cuadrados de empedrado en la estabilización de taludes.	Obras para estabilización de taludes	1.8
		Metros de obras

Información específica de ejecución contrato específico

9/11/2021

Fecha de Suscripción

18/01/2022

Fecha de Inicio

30

Plazo en Meses

15/07/2024

Fecha Terminación

3,521

Número de Beneficiarios

\$30,281

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$30,281

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

18/06/2024


Fecha de Corte Avance

31%

% Programado

94%

% Ejecutado

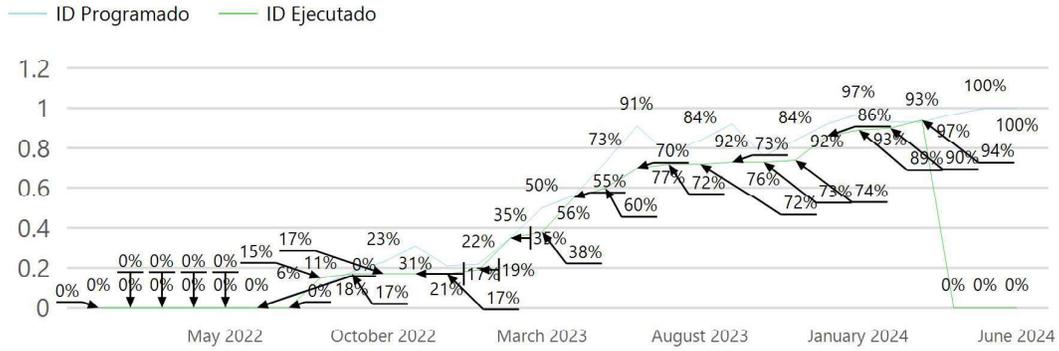

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$30,281
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$27,253
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Bolívar

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de cancha de fútbol sintética en Cicuco Bolívar en el departamento de Bolívar

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$7,911

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En Liquidación

Estado Detallado

\$7,911

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	Cicuco
BPIN	2021131880001	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	091-2210737	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	36	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	9/2/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de cancha sintética , graderías, camerinos, zona de parque biosaludables, zona de juegos infantiles, senderos peatonales y zonas verdes.	Cancha construida y dotada	1
		Número de canchas

Información específica de ejecución contrato específico

11/11/2021

Fecha de Suscripción

22/02/2022

Fecha de Inicio

19

Plazo en Meses

23/09/2023

Fecha Terminación

14,302

Número de Beneficiarios

\$7,911

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$7,911

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

22/08/2023


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

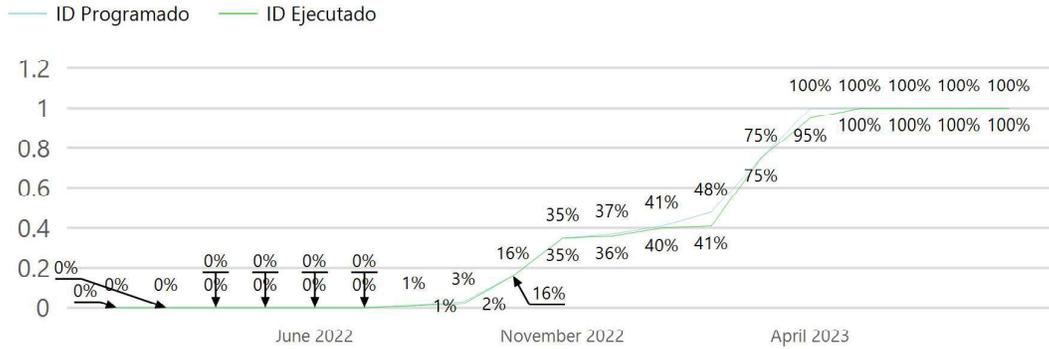

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$7,911
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$7,909
Valor Ejecutado (mill)

100%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Bolívar

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento y canalización del arroyo Alferez del municipio de El Carmen de Bolívar

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$15,237

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$15,237

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	El Carmen de Bolívar
BPIN	20201301011423	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	096-2210744	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	34	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	5/20/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Con este proyecto se realizará la canalización de 2 Kilómetros del arroyo Alférez con la construcción para el revestimiento total de canales y construcción de tramos nuevos y/o adicionales de canales revestidos, para recuperar el funcionamiento del cuerpo de agua a intervenir.	Obras para la prevención y control de inundaciones	2.0230000000000001
		Longitud de sección hidráulica

Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021	4/03/2022	32	4/11/2024	37,295
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios


\$15,237	\$0	\$0
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

\$15,237

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

4/11/2024	100%	54%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

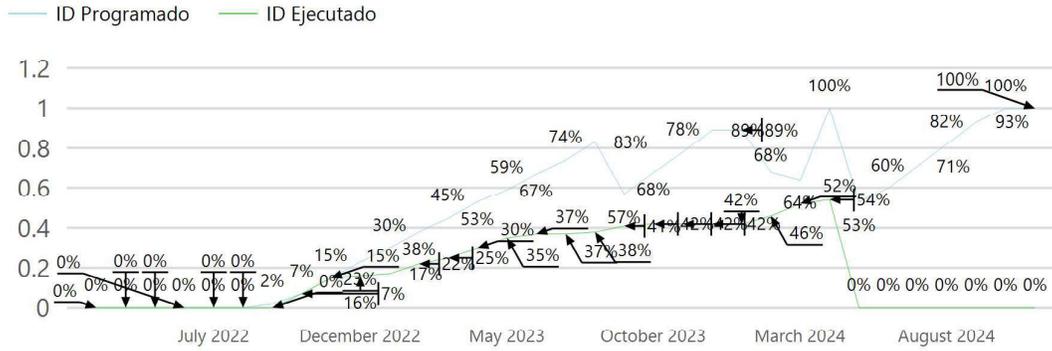

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Bolívar

Fecha de Corte

17/06/2024

Obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación en la vereda Remolino municipio de Morales, departamento de Bolívar

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$8,354

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Terminado

Estado Detallado

\$8,354

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Morales
BPIN	2021134730024	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	100-2210750	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	35	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	5/31/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Con este proyecto se construirán muros gaviones con sección de 27 metros cuadrados en una longitud aproximada de 500 metros, 6 espolones en gaviones con sección de 27 metros cuadrados y una longitud de 14 metros, relleno y retiro de material sobrante	Obras para la prevención y control de inundaciones	500
		Longitud de sección hidráulica

Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021	11/01/2022	18	11/07/2023	8,425
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

\$8,354	\$0	\$0
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

\$8,354

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

11/06/2023	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

Pacto Territorial Bolívar

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el departamento de Bolívar

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$84,211

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$69,166

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$15,045

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Córdoba
BPIN	20201301012450	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	102-2210752	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	89	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	8/30/2021


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Con este proyecto se mejorará la vía entre el Municipio de Córdoba y el Corregimiento de San Andrés, en el Departamento de Bolívar, mediante pavimento flexible en 17.5 Kilómetros, la vía proyectada es bidireccional, con dos carriles de tres (3) m de ancho y bermas a ambos lados de 0.5 m, señalización horizontal y vertical e intervención de treinta y ocho (38) obras de drenajes existentes, las cuales deberán demolerse y construirse nuevamente.	Vía terciaria mejorada	22.4 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021 Fecha de Suscripción	9/02/2022 Fecha de Inicio	38 Plazo en Meses	9/04/2025 Fecha Terminación	12,207 Número de Beneficiarios
\$69,166 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$15,045 Presupuesto Comprometido Territorio	\$84,211 Presupuesto Comprometido Total (millones)	

Avance físico del proyecto

9/03/2025 Fecha de Corte Avance	3% % Programado	54% % Ejecutado
------------------------------------	--------------------	--------------------

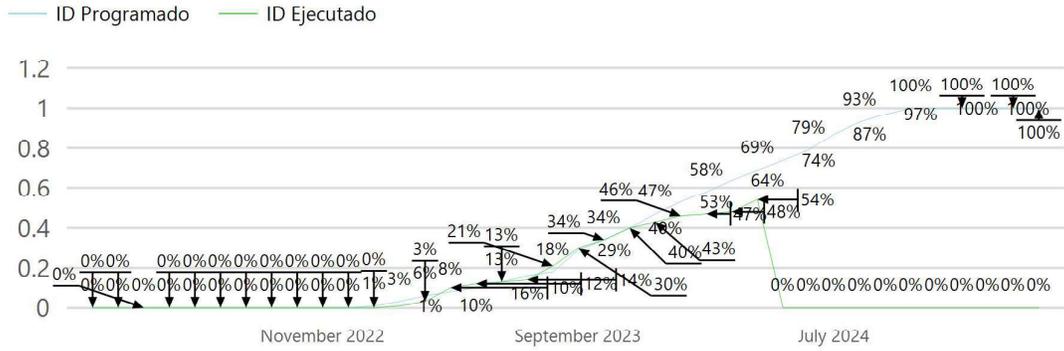

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$69,166
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$43,575
Valor Ejecutado (mill)

63%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.
