


Pacto RÍO BOGOTÁ

Ficha trimestral, junio de 2024.



\$ 29,9 Mil millones

Recursos aportados

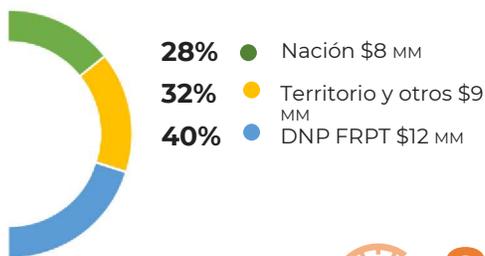

3

Proyectos financiados



Proyectos no iniciados
(en proceso de estructuración o
viabilidad sectorial)

88%
Avance consolidado

Pacto Territorial Río Bogotá

30/06/2021 Fecha suscripción	5 Plazo en años	30/06/2026 Fecha de Terminación	23 Meses para vencimiento	60% % Tiempo Transcurrido
6 Total Proyectos		\$34,072 Valor Indicativo (Millones)		
\$22,047 Aporte indicativo nación (Millones)	\$5,387 Aporte indicativo territorio (Millones)	\$6,638 Aporte indicativo otros (Millones)		


Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$34,072	\$22,047	\$5,387	\$6,638
Total	\$34,072	\$22,047	\$5,387	\$6,638

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

87.68%	\$29,875 Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado
--------	---

Número de Proyectos por Estado

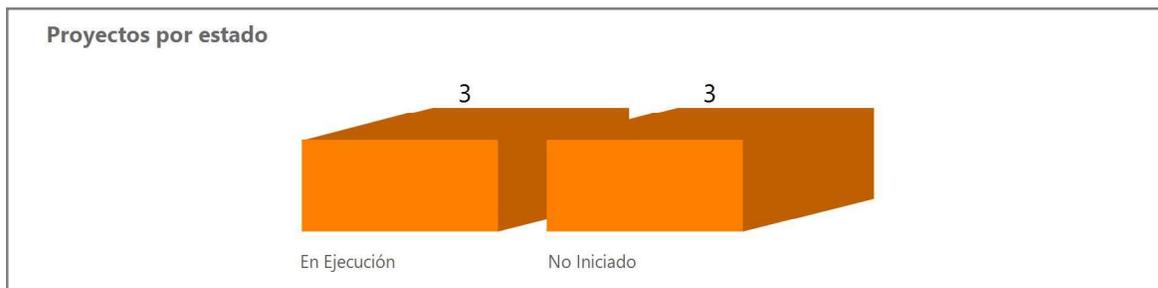

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá.	\$14,634	\$11,997	\$0	\$2,638
En Ejecución	Implementación de un proceso de restauración ecológica como medida de adaptación al cambio climático en Cundinamarca	\$8,626	\$8,626	\$0	\$0

En Ejecución	Fortalecimiento de la producción de material vegetal arbustivo y arbóreo para la recuperación de la cobertura arbórea en el departamento de Cundinamarca	\$3,387	\$0	\$3,387	\$0
No Iniciado	Fortalecer la red de monitoreo en la Cuenca Alta del río Bogotá	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000
No Iniciado	Fortalecimiento y Transferencia de conocimiento en el marco de la educación ambiental en el departamento de Cundinamarca	\$2,000	\$0	\$2,000	\$0
No Iniciado	Implementación de acciones de restauración en el municipio de Suesca Cundinamarca	\$1,424	\$1,424	\$0	\$0
Total		\$34,072	\$22,047	\$5,387	\$6,638

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

1 Total Proyectos	\$14,634 Valor Indicativo (Millones)					
\$11,997 Aporte indicativo DNP FRPT	\$0 Aporte indicativo territorio	\$0 Aporte indicativo Sector	\$2,638 Aporte indicativo Otros			
Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá.	En Ejecución	\$14,634	\$11,997	\$0	\$0	\$2,638
Total		\$14,634	\$11,997	\$0	\$0	\$2,638

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Rio-Bogota.aspx>

Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales

Proyectos en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Río Bogotá

Fecha de Corte

17/06/2024

Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$14,634

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Obra terminada

Estado Detallado

\$11,997

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Bogotá
BPIN	2021011000282	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	117-2220694	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	44	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/14/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Fortalecer la capacidad tecnológica del seguimiento de las estaciones de la RAMCA del río Bogotá con el fin de mejorar el cumplimiento de las funciones establecidas en el marco normativo de la gestión de la cuenca del río Bogotá	Servicio de monitoreo hidrológico	9
		Número de estaciones

Información específica de ejecución contrato específico

25/07/2022

Fecha de Suscripción

17/11/2022

Fecha de Inicio

26

Plazo en Meses

17/01/2025

Fecha Terminación

2,655,816

Número de Beneficiarios

\$11,997

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

Presupuesto Comprometido Territorio

\$14,638

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/01/2025


Fecha de Corte Avance

0%

% Programado

65%

% Ejecutado

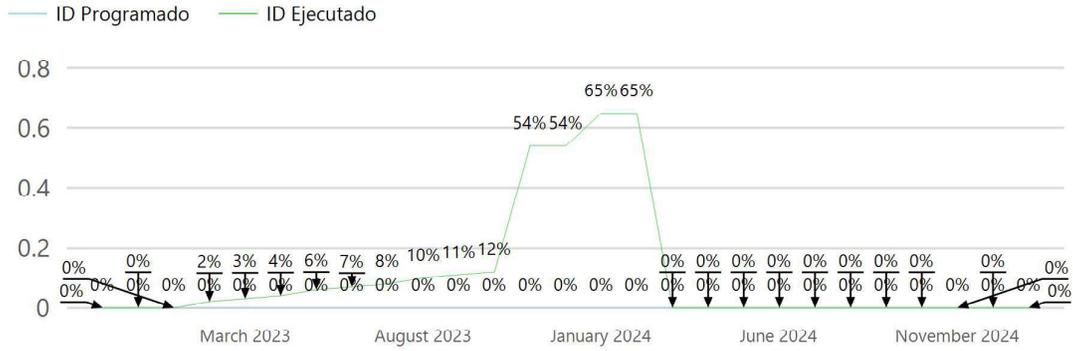

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.
