




Ficha trimestral, junio de 2024.

\$ 1,96 Billones

Recursos aportados



39 Proyectos financiados



 Proyectos no iniciados (en proceso de estructuración o viabilidad sectorial)

100%
Avance consolidado

Pacto Territorial Santander

31/10/2020 Fecha suscripción	5 Plazo en años	31/10/2025 Fecha de Terminación	15 Meses para vencimiento	73% % Tiempo Transcurrido
47 Total Proyectos	\$1,832,858 Valor Indicativo (Millones)			
\$1,313,685 Aporte indicativo nación (Millones)	\$451,515 Aporte indicativo territorio (Millones)	\$67,657 Aporte indicativo otros (Millones)		


Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$174,599	\$133,099	\$41,500	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$158,664	\$107,050	\$51,614	\$0
Deporte y Recreación	\$22,098	\$0	\$22,098	\$0
Educación	\$205,332	\$122,675	\$15,000	\$67,657
Interior	\$1,064	\$1,064	\$0	\$0
Salud y Protección Social	\$56,000	\$0	\$56,000	\$0
Transporte	\$1,101,430	\$949,798	\$151,632	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$29,181	\$0	\$29,181	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$84,489	\$0	\$84,489	\$0
Total	\$1,832,858	\$1,313,685	\$451,515	\$67,657

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

100%	\$1,965,183 Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado
-------------	---

Número de Proyectos por Estado

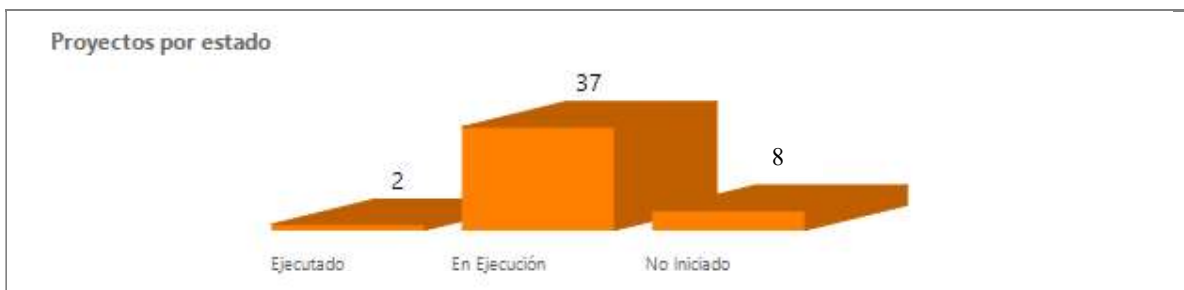

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ejecutado	Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional	\$6,707	\$4,207	\$2,500	\$0
Ejecutado	Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.	\$1,064	\$1,064	\$0	\$0
En Ejecución	Pavimentación vía Curos - Málaga	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0
En Ejecución	Pavimentación Troncal Central Norte	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0
En Ejecución	Pavimentación vía Zapatocha - Galán - Barichara	\$152,281	\$150,000	\$2,281	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.	\$120,657	\$60,000	\$0	\$60,657
En Ejecución	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	\$109,163	\$66,169	\$42,995	\$0
En Ejecución	Pavimentación Transversal Carare	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0
En Ejecución	Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín - Mogotes	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander.	\$76,651	\$60,000	\$16,651	\$0
En Ejecución	Construcción vivienda nueva, Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratocha, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaita, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia	\$71,889	\$0	\$71,889	\$0

 Departamento Nacional de Planeación		FICHA TRIMESTRAL PACTOS TERRITORIALES			Página 3 De 8	
En Ejecución	Construcción del Malecón, Barrancabermeja	\$64,737	\$47,050	\$17,687	\$0	
En Ejecución	Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.	\$56,830	\$46,830	\$10,000	\$0	
En Ejecución	Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2	\$29,732	\$29,732	\$0	\$0	
En Ejecución	Mejoramiento de las vías rurales en los municipios de Rionegro, Lebrija, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Cimitarra, Vélez, Güepsa y San Andrés, mediante la construcción de placa huellas en el Departamento de Santander.	\$29,423	\$29,423	\$0	\$0	
En Ejecución	Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.	\$28,275	\$28,275	\$0	\$0	
En Ejecución	Ampliación SENA, San Gil	\$28,000	\$13,000	\$15,000	\$0	
En Ejecución	Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta	\$23,000	\$0	\$23,000	\$0	
En Ejecución	Mejoramiento /pavimentación Carmen - Yarima	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	
En Ejecución	Mejoramiento anillo vial Girón – Floridablanca	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	
En Ejecución	Control y mitigación de inundaciones mediante la construcción del canal de aguas lluvias para la quebrada Suratoque (entre la carrera 6 y 150 metros debajo de la confluencia con la quebrada la palmira) en el municipio de Piedecuesta y corresponde al sector de Ambiente y desarrollo sostenible	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	

En Ejecución	Pavimentación Socorro - Páramo	\$15,792	\$0	\$15,792	\$0
En Ejecución	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista-Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander	\$15,226	\$15,226	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento / rehabilitación Girón - Zapatoca	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0
En Ejecución	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista-fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander	\$14,757	\$14,757	\$0	\$0
En Ejecución	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO GAITÁN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$14,554	\$14,554	\$0	\$0
En Ejecución	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta	\$13,840	\$10,000	\$0	\$3,840
En Ejecución	Pavimentación acceso a Puerto Wilches	\$13,000	\$0	\$13,000	\$0
En Ejecución	Mejoramiento vivienda, Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos	\$12,600	\$0	\$12,600	\$0
En Ejecución	Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón	\$12,276	\$0	\$12,276	\$0
En Ejecución	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0

En Ejecución	Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja y Santander y corresponde al sector de Transporte	\$10,064	\$0	\$10,064	\$0
En Ejecución	Mejoramiento / pavimentación Gámbita - Palermo	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0
En Ejecución	Mejoramiento /pavimentación Guavatá - Vélez	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0
En Ejecución	Construcción hospital Barbosa	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0
En Ejecución	Construcción hospital, San Andrés	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0
En Ejecución	Construcción hospital, Suaita	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0
En Ejecución	Construcción de la villa olímpica, Oiba	\$7,098	\$0	\$7,098	\$0
En Ejecución	Construcción de la villa olímpica, Matanza	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0
No Iniciado	Terminación hospital, San Gil	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0
No Iniciado	Construcción de las obras geotécnicas para la prevención, mitigación y estabilización, en el sector de la transversal, (Asomiflor) Fase I, II y III, en el municipio de Floridablanca departamento de Santander.	\$11,500	\$0	\$11,500	\$0
No Iniciado	Mejoramiento /pavimentación Enciso - Carcasí	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0
No Iniciado	Sede administrativa Indersantander, Bucaramanga	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0
No Iniciado	Construcción fase 2 Plan Maestro Alcantarillado, Charalá	\$6,181	\$0	\$6,181	\$0
No Iniciado	Terminación hospital, Mogotes	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0
No Iniciado	Parque Lineal de la Libertad, Socorro	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0
No Iniciado	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Vélez.	\$14,560	\$11,400	\$0	\$3,160
Total		\$1,832,858	\$1,313,685	\$451,515	\$67,657

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

13

Total Proyectos

\$427,569

Valor Indicativo (Millones)

\$333,260

Aporte indicativo DNP FRPT

\$26,651

Aporte indicativo territorio

\$0

Aporte indicativo Sector

\$67,657

Aporte indicativo Otros

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.	En Ejecución	\$28,275	\$28,275	\$0	\$0	\$0
Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta	En Ejecución	\$13,840	\$10,000	\$0	\$0	\$3,840
Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.	En Ejecución	\$120,657	\$60,000	\$0	\$0	\$60,657
Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander.	En Ejecución	\$76,651	\$60,000	\$16,651	\$0	\$0
Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander	En Ejecución	\$15,226	\$15,226	\$0	\$0	\$0
Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.	Ejecutado	\$1,064	\$1,064	\$0	\$0	\$0
Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio	En Ejecución	\$29,732	\$29,732	\$0	\$0	\$0

naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2						
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO GAITÁN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	En Ejecución	\$14,554	\$14,554	\$0	\$0	\$0
Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de Santander.	En Ejecución	\$56,830	\$46,830	\$10,000	\$0	\$0
Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander	En Ejecución	\$14,757	\$14,757	\$0	\$0	\$0
Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander	En Ejecución	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de las vías rurales en los municipios de Rionegro, Lebrija, San Vicente de Chucuri, El Carmen de Chucuri, Cimitarra, Vélez, Güepsa y San Andrés, mediante la construcción de placa huellas en el Departamento de Santander.	En Ejecución	\$29,423	\$29,423	\$0	\$0	\$0
Total		\$413,009	\$321,860	\$26,651	\$0	\$64,497

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Santander.aspx>

Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$28,275

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$28,275

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Educación	Municipio Intervención	Bucaramanga
BPIN	2021004680327	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	074-2210677	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	78	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	7/7/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construir una edificación de 5 pisos de altura y 2 sótanos adecuando y mejorando 5.512,52 m2 de planta física, con 11 salones distribuidos en una edificación de 5 pisos de altura y 2 sótanos, 7 laboratorios, 4 oficinas, una biblioteca.	Servicio de apoyo financiero a las Instituciones de Educación Superior	1
		Número instituciones

Información específica de ejecución contrato específico

26/10/2021

Fecha de Suscripción

15/12/2021

Fecha de Inicio

36

Plazo en Meses

14/12/2024

Fecha Terminación

1,750

Número de Beneficiarios

\$28,275

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$31,361

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

15/07/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

46%

% Ejecutado

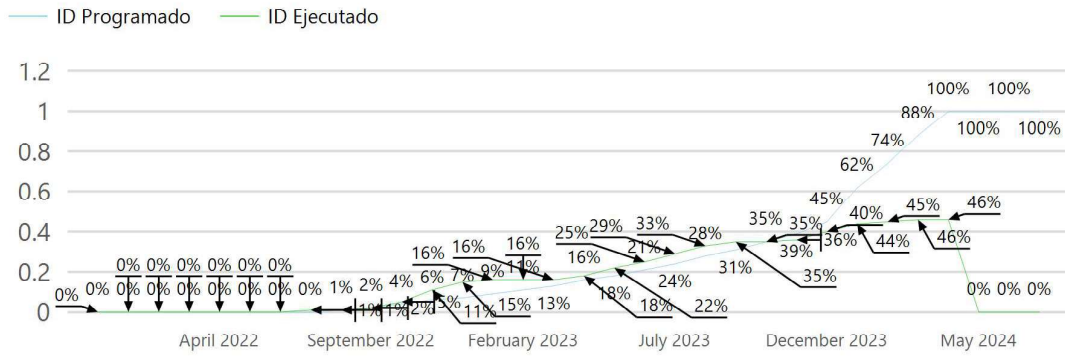

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$28,275
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$16,965
Valor Ejecutado (mill)

60%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$120,657

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$60,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Educación	Municipio Intervención	Bucaramanga
BPIN	2021004680414	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	088-2210733	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	76	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/15/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Se desarrolló un proyecto global para el campus de la Facultad de Salud, que consiste en la construcción de siete (7) niveles de los cuales, se destinaron dos (2) a parqueaderos y cinco (5) al desarrollo y mejoramiento de espacios para actividades académico- administrativas, culturales con sus respectivas conexiones a redes eléctricas, de comunicaciones, automatización, hidrosanitarias, hidráulica, redes contra incendios y gases especiales.</p> <p>El proyecto contempla la construcción de 27.285,32 m2 repartidos en cincuenta y tres Laboratorios, doce Aulas, treinta y un consultorios, Un auditorio, dos Gimnasios; uno para adultos y otro infantil; una biblioteca y dos centros de estudio.</p>	Sede de educación superior o terciaria construida	1
		Número de Sedes


Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021	21/12/2021	40	21/04/2025	2,399
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios
\$60,000	\$0	\$39,041		
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio		
\$120,657				
Presupuesto Comprometido Total (millones)				


Avance físico del proyecto

21/03/2025	1%	83%
-------------------	-----------	------------

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado
-----------------------	--------------	-------------

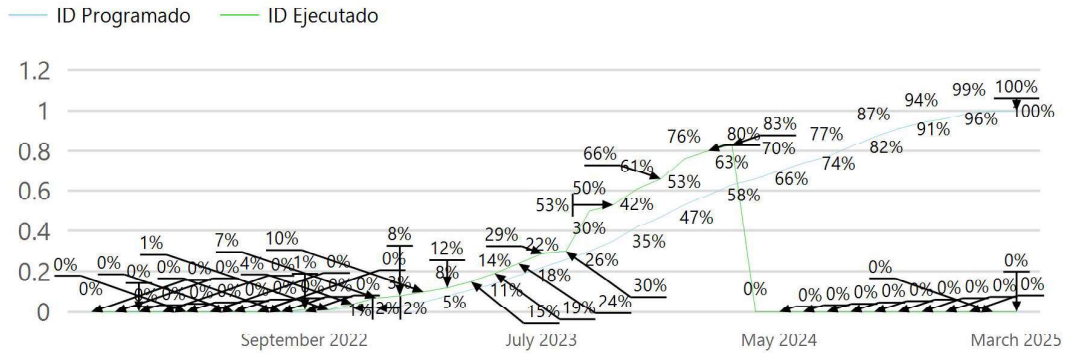

Avance Financiero del proyecto

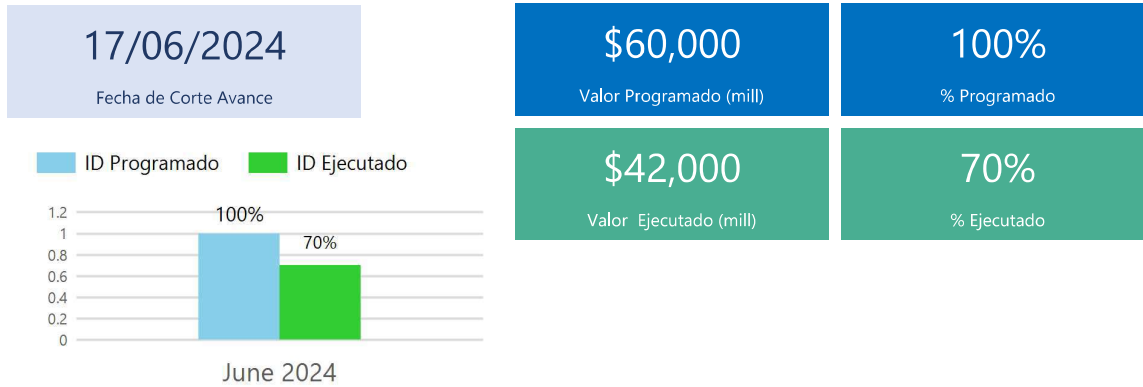

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de las vías rurales en los municipios de Rionegro, Lebrija, San Vicente de Chucuri, El Carmen de Chucuri, Cimitarra, Vélez, Güepsa y San Andrés, mediante la construcción de placa huellas en el Departamento de Santander.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$29,423 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En ejecución de obra Estado Detallado
---	---

\$29,423 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
--	--	--

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Departamento de Santander
BPIN	2021004680423	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	097-2210745	Es Inversión climática?	
No. CONPES Anexo B	97	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	7	Fecha viabilidad	9/20/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Kilometros pavimentados y mejorados		

Información específica de ejecución contrato específico


12/11/2021 Fecha de Suscripción	21/04/2022 Fecha de Inicio	26 Plazo en Meses	21/06/2024 Fecha Terminación	Número de Beneficiarios
---	--------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------

\$29,423 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$0 Presupuesto Comprometido Territorio
--	---	---

\$29,423 Presupuesto Comprometido Total (millones)
--

Avance físico del proyecto

21/05/2024 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	66% % Ejecutado
--	-----------------------------	---------------------------

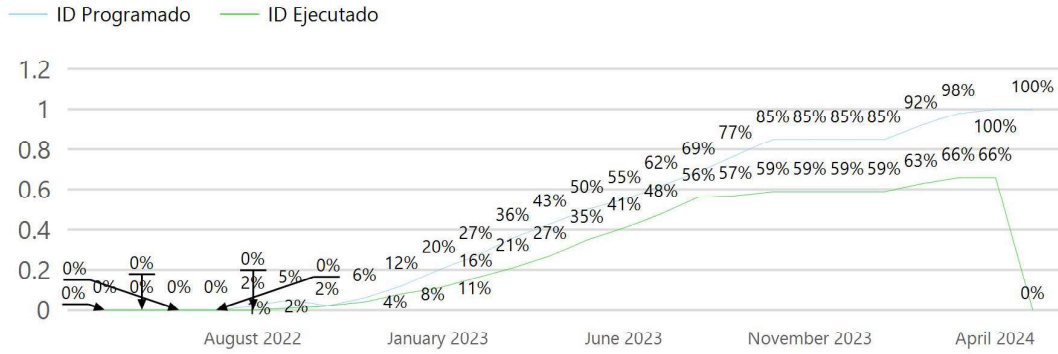

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$29,423
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

ID Programado ID Ejecutado

\$21,000
Valor Ejecutado (mill)

71%
% Ejecutado



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$15,226

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$15,226

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Girón
BPIN	202168307007	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	118-2220695	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	49	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	8/5/2021


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Intervención de un área de aproximadamente 9.600 m2, con la construcción de una pantalla en concreto lanzado con 714 anclajes activos, un muro de contención de 83 metros y 410 ml de canal en concreto reforzado en la corona del talud.	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1
		Número de obras de infraestructur

Información específica de ejecución contrato específico

18/07/2022 Fecha de Suscripción	27/02/2023 Fecha de Inicio	21 Plazo en Meses	27/11/2024 Fecha Terminación	185,248 Número de Beneficiarios
\$15,226 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$0 Presupuesto Comprometido Territorio	\$15,226 Presupuesto Comprometido Total (millones)	

Avance físico del proyecto

27/10/2024 Fecha de Corte Avance	0% % Programado	0% % Ejecutado
--	---------------------------	--------------------------

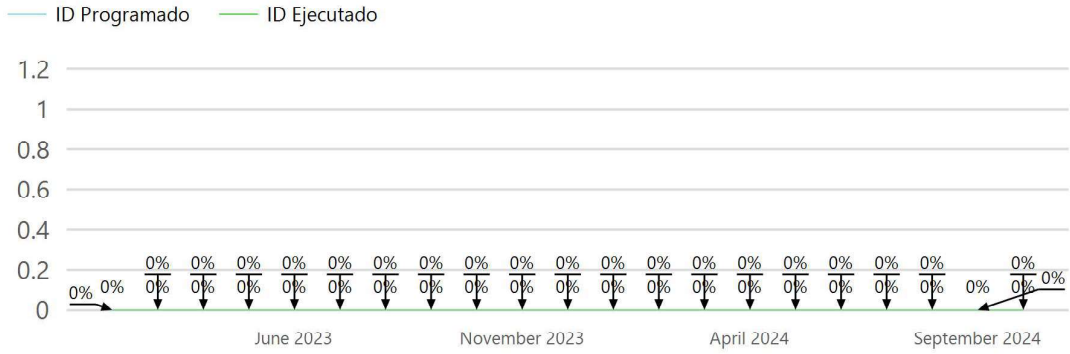

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$15,226
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$4,568
Valor Ejecutado (mill)

30%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$56,830

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$46,830

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$10,000

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Bucaramanga
BPIN	2021680010201	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	121-2220760	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	48	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	12/30/2020



Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
La Gloria: Construcción de 917 anclajes activos de 30 metros tensados a 30 toneladas, Pantalla en concreto lanzado de 3.668 m2 de espesor 10 cm para el control de erosión superficial del terreno, Instalación de 1.860 metros lineales de Drenes de penetración horizontal de 15 metros y construcción de 564 ml de canaleta de coronación, Nazareth: Construcción de 848 anclajes activos de 25 metros tensados a 30 toneladas, Pantalla en concreto lanzado de 3.390 m2 de espesor 10 cm para el control de erosión superficial del terreno, Instalación de 1.740 metros lineales de Drenes de penetración horizontal de 15 metros y Construcción de 393 ml de canaleta de coronación, Pablo VI: Construcción de 376 anclajes activos de 30 metros tensados a 30 toneladas, Pantalla en concreto lanzado de 2.820 m2 de espesor 10 cm para el control de erosión superficial del terreno, Instalación de 780 metros lineales de Drenes de penetración horizontal de 15 metros y Construcción de 675 ml de canaleta de coronación.	Obras para la prevención y control de movimientos en masa (Producto principal del proyecto)	2424 m2

Información específica de ejecución contrato específico

2/08/2022 Fecha de Suscripción	27/01/2023 Fecha de Inicio	20 Plazo en Meses	27/09/2024 Fecha Terminación	528,352 Número de Beneficiarios
\$46,830 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$22,516 Presupuesto Comprometido Territorio		
\$69,346				

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

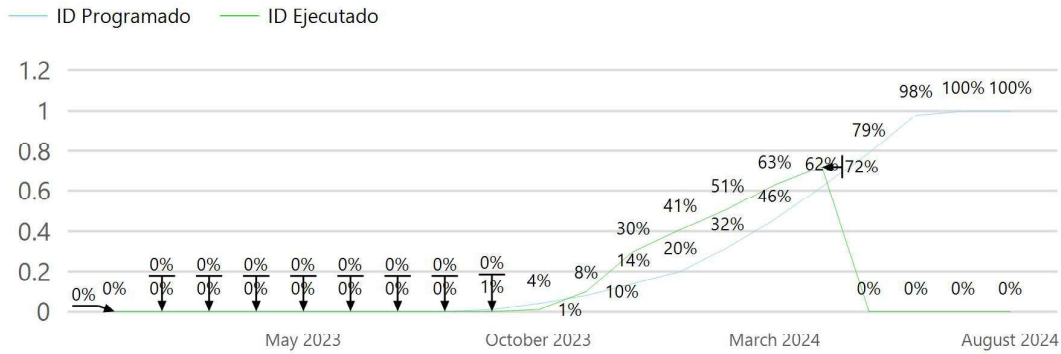

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$14,757

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$14,757

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Girón
BPIN	2021683070092	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	123-2220767	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	52	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	8/26/2021


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Construcción de una pantalla en concreto lanzado de 10 centímetros de espesor con 625 anclajes activos.</p> <p>Construcción de un muro de contención de 120 metros lineales de longitud y 2,5 metros de altura.</p> <p>Construcción de aprox. 310 ml de canal de coronación en concreto reforzado.</p>	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1
		Número de obras de infraestructura

Información específica de ejecución contrato específico

2/08/2022	27/02/2023	21	27/11/2024	185,248
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios
\$14,757	\$0	\$0		
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio		
\$14,757				
Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

27/10/2024	0%	0%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

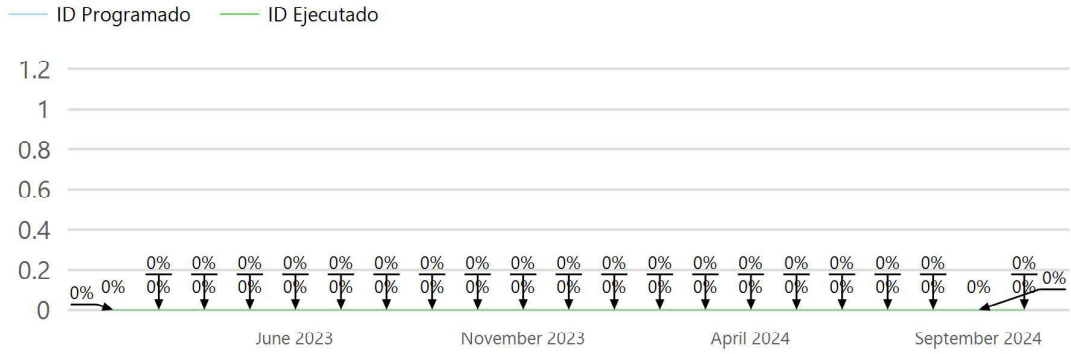

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$14,757
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$4,125
Valor Ejecutado (mill)

28%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$1,064

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En Liquidación

Estado Detallado

\$1,064

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Interior	Municipio Intervención	Matanza
BPIN	2022684440001	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	130-2220886	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	85	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	4/28/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar las instalaciones para su adecuado funcionamiento, con el fin de ofrecer a los funcionarios que allí desempeñan sus labores y a la comunidad en general que visita a diario las diferentes dependencias, que consta de 549 m2 área construida.	Sedes adecuadas	1
		Numero de sedes adecuadas

Información específica de ejecución contrato específico

17/08/2022	12/09/2022	17	27/02/2024	4,499
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios


\$1,064	\$0	\$0
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

\$1,064

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

12/10/2023	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

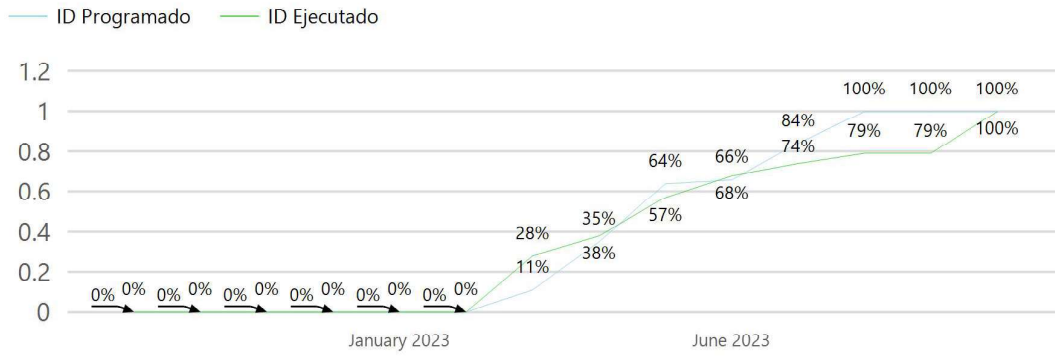

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$1,064
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$958
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO GAITÁN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$14,554 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En ejecución de obra Estado Detallado	
\$14,554 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Bucaramanga
BPIN	2021680010202	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	141-2221132	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	51	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	5/19/2021


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de estructura de estabilización tipo pantalla anclada en concreto lanzado de espesor 10 cm, con anclajes activos tensados, con el fin de reducir el riesgo de desastre a través de medidas estructurales adecuadas que contribuyan a la seguridad y estabilidad en el barrio Gaitán, Escarpa Norte, secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, del departamento de Santander.		

Información específica de ejecución contrato específico

24/10/2022 Fecha de Suscripción	27/01/2023 Fecha de Inicio	20 Plazo en Meses	27/09/2024 Fecha Terminación	528,352 Número de Beneficiarios
\$14,554 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$3,251 Presupuesto Comprometido Territorio		
\$17,804 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

27/08/2024 Fecha de Corte Avance	20% % Programado	88% % Ejecutado
--	----------------------------	---------------------------

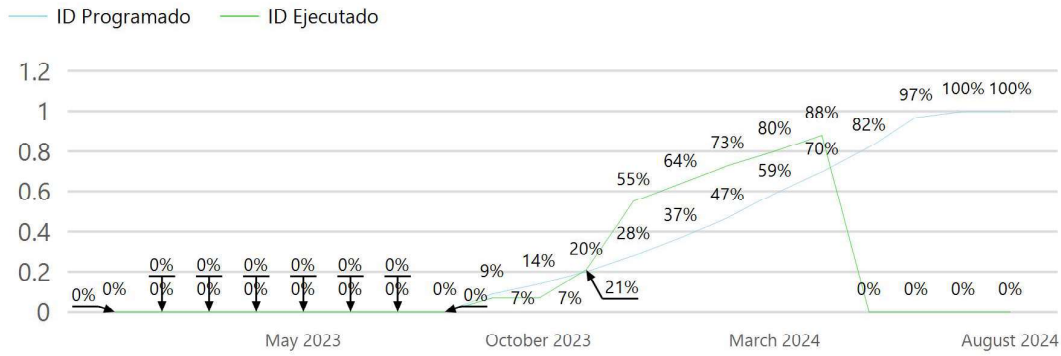

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$14,554
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$13,098
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$76,651

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$60,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$16,651

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Comercio Industria y Turismo	Municipio Intervención	Betulia
BPIN	2022004680101	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	157-2221180	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	27	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	8/22/2022
Alcance		Producto Principal	Meta del Producto
		Centro Turístico construido	1
			UND

Dos (02) Plazoletas principales: en una de ella se desarrollarán las edificaciones y la otra será el punto de conexión entre la plazoleta principal y el inicio de la pasarela hacia el embarcadero. Así mismo, se propone una vía de conexión entre la plazoleta principal y el inicio de la pasarela hacia el embarcadero. Se realizarán pasarelas a los miradores que buscan recorrer el proyecto y finalmente, se encuentra el área de parqueaderos. Primer piso: nueve (09) locales, oficina para el CAI, con un área total de 31.41 m², Hall de acceso y circulación. Un baño con duchas y vestidores, un espacio de 41.99 m² contemplado para la posterior conformación de una escuela náutica. Un espacio contemplado para enfermería. Un espacio de 36.72 m² cuyo uso es la reparación liviana de embarcaciones y oficinas para el uso de las diferentes autoridades ambientales salvavidas y guardacostas. Segundo piso: Se plantea como un área de uso institucional y acceso a las pasarelas, donde se encontrará una empresa de turismo cuya área estipuladas son 83.74 m², una oficina para presencia de la alcaldía, así como oficina para la Gobernación, oficina para la Inspección Fluvial y la Administración del puerto. Dichas oficinas contarán con baños y un centro de reuniones. Tercer piso: Contemplada como una zona de esparcimiento donde se podría encontrar una terraza para disfrute de vista panorámica, Plaza de restaurante – Bar, Cocina y baños. Se proyecta la ejecución de una pasarela suspendida a una altura media del terreno de 1,50 m que contará con 5 miradores, todos habilitados para acceso de minusválidos. La pasarela tendrá ancho mínimo 2,20 m, contando los miradores como un mínimo de 3,50 m. se trata de una reestructura metálica revestida de madera (2 km)


Finalmente, el proyecto contempla un muelle para embarcadero fluvial, el cual se compone de una pasarela de acceso estará formada por módulos de estructura en aluminio con "pavimento" de madera que contarán con flotadores de poliestireno.

Información específica de ejecución contrato específico

6/12/2022 Fecha de Suscripción	17/04/2023 Fecha de Inicio	28 Plazo en Meses	17/08/2025 Fecha Terminación	6,128 Número de Beneficiarios
\$60,000 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$27,797 Presupuesto Comprometido Territorio		
\$87,797 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

17/07/2025 Fecha de Corte Avance	0% % Programado	0% % Ejecutado
-------------------------------------	--------------------	-------------------

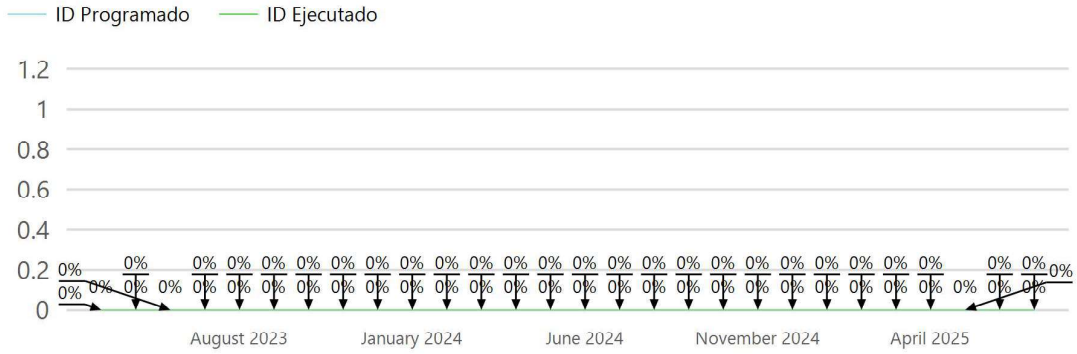

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$60,000
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$0
Valor Ejecutado (mill)

0%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$12,000 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En ejecución de obra Estado Detallado	
\$12,000 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	San Gil
BPIN	2021686790041	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	158-2221183	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	53	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	7/13/2022


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una pantalla en concreto lanzado de 10 centímetros de espesor con 228 anclajes activos, 231 drenes. Construcción de un muro de contención de 120 metros lineales de longitud y 2,5 metros de altura. Construcción de aprox. 515 ml de canal de coronación en concreto reforzado.	Estabilización de taludes sobre los barrios Jose Antonio Galán, Antonia Santos, San Luis, Altos De La Colina, Santa More 1 y 2.	4683 m2

Información específica de ejecución contrato específico


19/12/2022 Fecha de Suscripción	20/01/2023 Fecha de Inicio	17 Plazo en Meses	20/06/2024 Fecha Terminación	45,605 Número de Beneficiarios
\$12,000 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$12,000 Presupuesto Comprometido Total (millones)		

Avance físico del proyecto

20/05/2024 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	100% % Ejecutado
--	-----------------------------	----------------------------

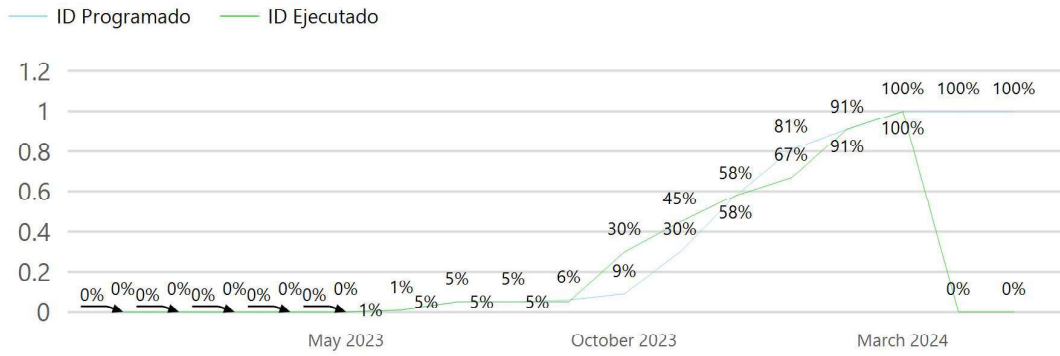

Avance Financiero del proyecto

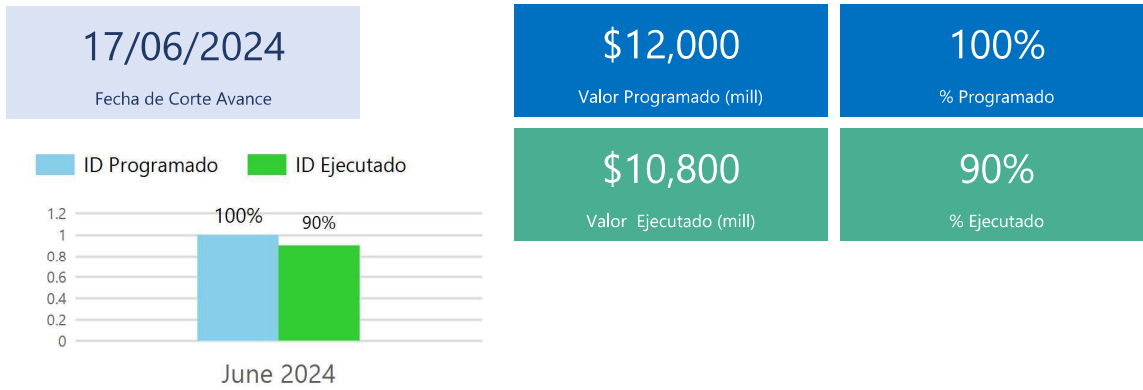

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

<p>\$29,732</p> <p>Valor Indicativo del Proyecto (millones)</p>	<p>En ejecución de obra</p> <p>Estado Detallado</p>	
<p>\$29,732</p> <p>Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)</p>	<p>\$0</p> <p>Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)</p>	<p>\$0</p> <p>Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)</p>

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Málaga
BPIN	2021684320079	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	159-2221184	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	50	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	7/14/2022


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga.		

Información específica de ejecución contrato específico

<p>19/12/2022</p> <p>Fecha de Suscripción</p>	<p>20/01/2023</p> <p>Fecha de Inicio</p>	<p>26</p> <p>Plazo en Meses</p>	<p>20/03/2025</p> <p>Fecha Terminación</p>	<p>19,884</p> <p>Número de Beneficiarios</p>
<p>\$29,732</p> <p>Presupuesto Comprometido DNP FRPT</p>	<p>\$0</p> <p>Presupuesto Comprometido Sector</p>	<p>\$29,732</p> <p>Presupuesto Comprometido Total (millones)</p>		

Avance físico del proyecto

<p>20/02/2025</p> <p>Fecha de Corte Avance</p>	<p>2%</p> <p>% Programado</p>	<p>3%</p> <p>% Ejecutado</p>
---	--------------------------------------	-------------------------------------

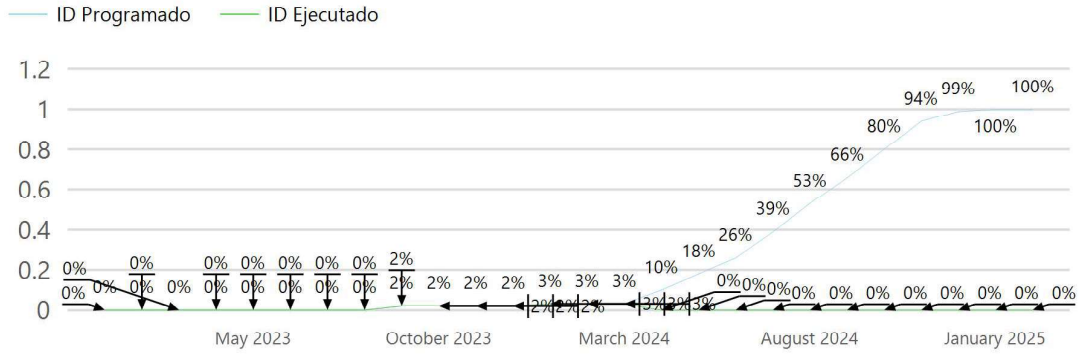

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$29,732
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$5,997
Valor Ejecutado (mill)

20%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

17/06/2024

Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$13,840

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En legalización de permisos,

Estado Detallado

obra
\$10,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Educación	Municipio Intervención	Piedecuesta
BPIN	2022004680208	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	183-2230157	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	77	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	9/2/2022


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construir una edificación en la sede de Piedecuesta de las UTS para atender a sus alumnos, la cual se desarrolla en cuatro (04) niveles, dos (02) sótanos y una (01) terraza, en los sótanos encontramos veintiséis (26) salones de tutorías, una (01) biblioteca, un (01) salón magistral, cuatro (04) salas de reuniones y una (01) sala de profesores, el primer piso cuenta con cinco (05) salones y oficinas Bienestar Universitario, el segundo piso cuenta con nueve (09) salones, tercer y cuarto piso tendrá cada uno nueve (09) laboratorios de informática.	Servicio de apoyo financiero a las Instituciones de Educación Superior	1
		Número instituciones

Información específica de ejecución contrato específico


23/06/2023	2/05/2024	22	2/03/2026	148
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios
\$10,000	\$0			
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector		Presupuesto Comprometido Territorio	
\$15,614				
Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

2/02/2026	0%	0%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

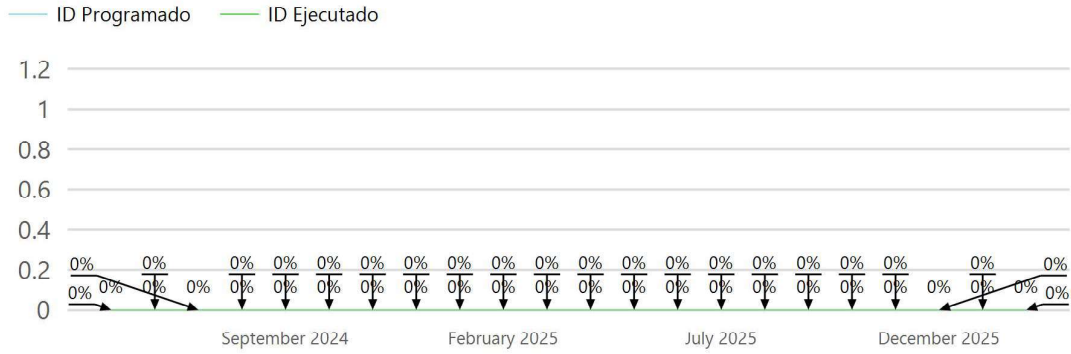

Avance Financiero del proyecto

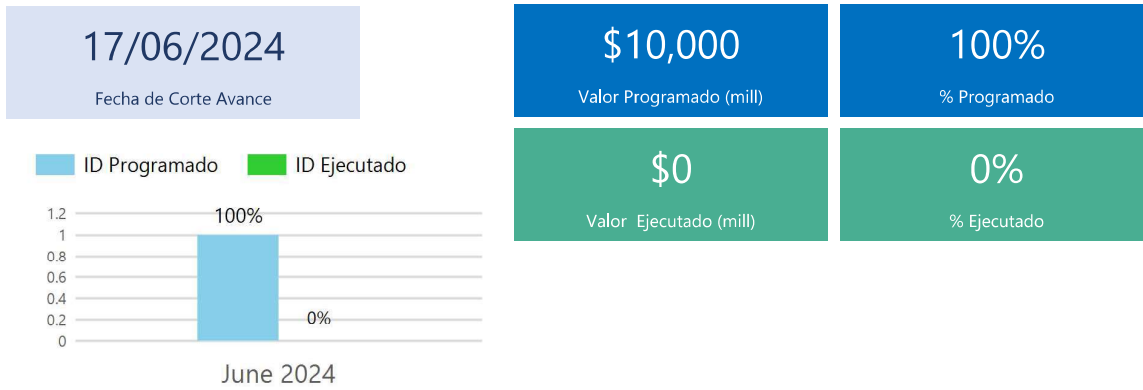

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.
