



Pacto Territorial Atlántico

17/03/2021 Fecha suscripción	3 Plazo en años	17/03/2024 Fecha de Terminación	4 Meses para vencimiento	88% % Tiempo Transcurrido
17 Total Proyectos		\$904,906 Valor Indicativo (Millones)		
\$467,710 Aporte indicativo nación (Millones)	\$437,196 Aporte indicativo territorio (Millones)	\$0 Aporte indicativo otros (Millones)		


Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$326,553	\$225,863	\$100,690	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$169,666	\$0	\$169,666	\$0
Transporte	\$210,372	\$102,205	\$108,167	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$198,315	\$139,642	\$58,673	\$0
Total	\$904,906	\$467,710	\$437,196	\$0

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

83.97%	\$759,891 Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado
--------	--

Número de Proyectos por Estado

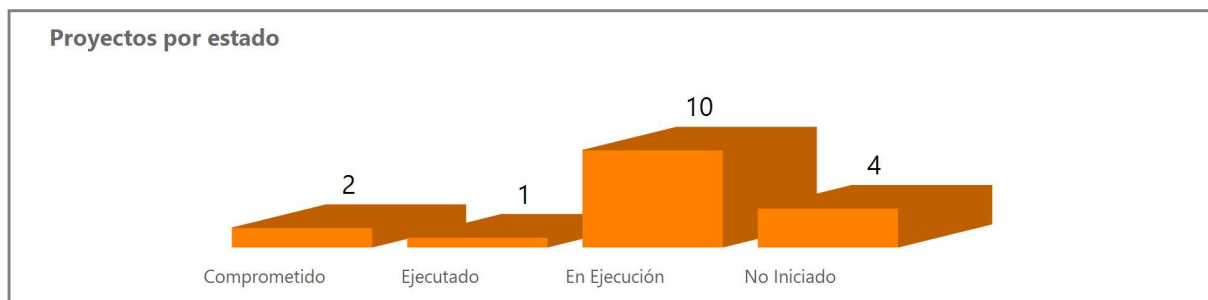

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)



Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Comprometido	Acueducto del Norte	\$198,315	\$139,642	\$58,673	\$0
Comprometido	Canalización de arroyo Pitalito en el casco urbano del corregimiento de Pitalito, Polonuevo Atlántico.	\$7,374	\$7,374	\$0	\$0
Ejecutado	Intervención táctica del municipio de Usiacurí a través del Color Pueblo Mágico	\$2,450	\$0	\$2,450	\$0
En Ejecución	Distrito familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín	\$121,409	\$105,000	\$16,409	\$0
En Ejecución	Mejoramiento del corredor vial que va entre la circunvalar y el municipio de Puerto Colombia en el Departamento del Atlántico, Tramo 1 - UF2	\$108,167	\$0	\$108,167	\$0
En Ejecución	Recuperación integral del caño de La Auyama	\$104,746	\$99,999	\$4,747	\$0
En Ejecución	Mejoramiento del corredor vial que va entre la circunvalar y el municipio de Puerto Colombia en el Departamento del Atlántico, Tramo 1 - UF1	\$102,205	\$102,205	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción del Centro Turístico Gastronómico Internacional en el municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	\$32,080	\$0	\$32,080	\$0
En Ejecución	Construcción del Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey en el municipio de Juan de Acosta	\$27,500	\$0	\$27,500	\$0
En Ejecución	Construcción de infraestructura turística para el ordenamiento de playas de Salgar en el municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico	\$23,953	\$0	\$23,953	\$0
En Ejecución	Construcción del mercado de la sazón y artesanías del Atlántico, en el municipio de Puerto Colombia	\$23,158	\$0	\$23,158	\$0



En Ejecución	Canalización arroyo Florencio en gaviones sección rectangular del municipio de Palmar de Varela, departamento de Atlántico.	\$7,229	\$7,229	\$0	\$0
En Ejecución	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de protección del Cauce del Arroyo El Pozo. Piojó	\$6,261	\$6,261	\$0	\$0
No Iniciado	Estabilización costera en el corregimiento de Santa Verónica, en el municipio de Juan de Acosta	\$79,533	\$0	\$79,533	\$0
No Iniciado	Construcción de infraestructura turística para la playa Miramar y adecuaciones en playa Pradomar	\$35,526	\$0	\$35,526	\$0
No Iniciado	Ecoparque del Manglar de la Playa de Miramar en Puerto Colombia	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0
No Iniciado	Ruta Ecológica Luritza	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0
Total		\$904,906	\$467,710	\$437,196	\$0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

5 Total Proyectos		\$247,019 Valor Indicativo (Millones)				
\$225,863 Aporte indicativo DNP FRPT	\$21,156 Aporte indicativo territorio	\$0 Aporte indicativo Sector	\$0 Aporte indicativo Otros			
Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Recuperación integral del caño de La Auyama	En Ejecución	\$104,746	\$99,999	\$4,747	\$0	\$0
Distrito familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín	En Ejecución	\$121,409	\$105,000	\$16,409	\$0	\$0
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de protección del Cauce del Arroyo El Pozo. Piojó	En Ejecución	\$6,261	\$6,261	\$0	\$0	\$0



Canalización de arroyo Pitalito en el casco urbano del corregimiento de Pitalito, Polonuevo Atlántico.	Comprometido	\$7,374	\$7,374	\$0	\$0	\$0
Canalización arroyo Florencio en gaviones sección rectangular del municipio de Palmar de Varela, departamento de Atlántico.	En Ejecución	\$7,229	\$7,229	\$0	\$0	\$0
Total		\$247,019	\$225,863	\$21,156	\$0	\$0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Atlantico.aspx>

Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos comprometidos, en ejecución y ejecutados



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Pacto Territorial Atlántico

Fecha de Corte

15/09/2023

Canalización de arroyo Pitalito en el casco urbano del corregimiento de Pitalito, Polonuevo Atlántico.

Estado Proyecto

Comprometido

Información general del contrato específico

\$7,374

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$7,374

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Polonuevo
BPIN	2021085580041	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	125-2220769	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	31	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	6/9/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto contempla la construcción de un canal en muros de gaviones en una longitud de 495,96 metros y un acho de 9 metros, con un área total de intervención 4.463,64 metros cuadrados.	Obras para el control y reducción de la erosión	4463.6400000000003
		Metros Cuadrados de area intervenida

Información específica de ejecución contrato específico

2/08/2022

Fecha de Suscripción

31/08/2022

Fecha de Inicio

16

Plazo en Meses

31/12/2023

Fecha Terminación

3,742

Número de Beneficiarios

\$7,374

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$7,374

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

31/08/2023


Fecha de Corte Avance

0%

% Programado

0%

% Ejecutado

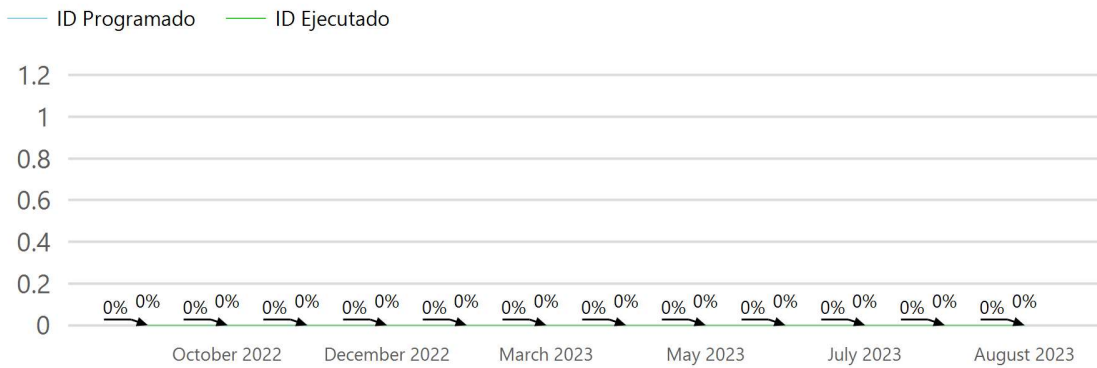

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Atlántico

Fecha de Corte

15/09/2023

Recuperación integral del caño de La Auyama

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$104,746

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución

Estado Detallado

\$99,999

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$4,747

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Barranquilla
BPIN	2021080010130	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	076-2210681	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	28	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	7/12/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Busca mitigar y reducir los factores contaminantes de las aguas, mitigar los riesgos de inundación en los barrios y zonas que se encuentran ubicados a lo largo de caño y su área de influencia y el mejoramiento paisajístico del entorno	Obras para la prevención y control de inundaciones	4.5999999999999996
		Kilómetros

Información específica de ejecución contrato específico

28/10/2021

Fecha de Suscripción

29/11/2021

Fecha de Inicio

25

Plazo en Meses

30/12/2023

Fecha Terminación

47,046

Número de Beneficiarios

\$99,999

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$4,747

Presupuesto Comprometido Territorio

\$104,746

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

29/08/2023


Fecha de Corte Avance

10%

% Programado

52%

% Ejecutado

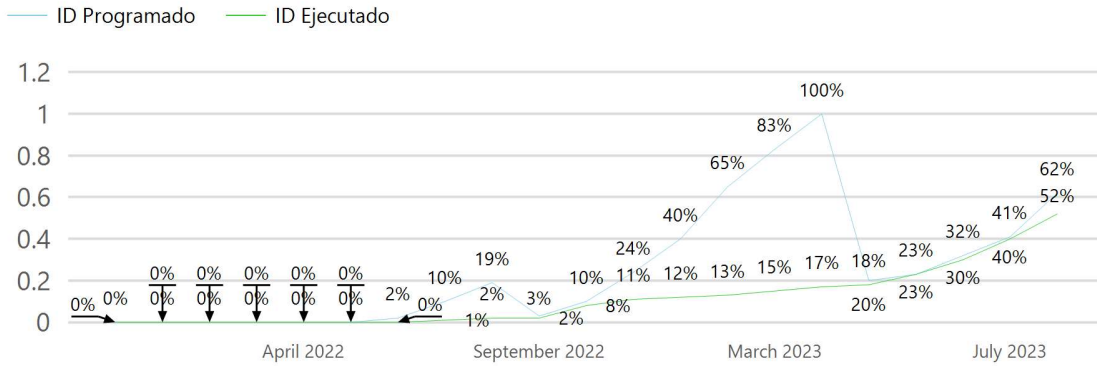

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Atlántico

Fecha de Corte

15/09/2023

Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de protección del Cauce del Arroyo El Pozo. Piojó

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$6,261

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución

Estado Detallado

\$6,261

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Piojó
BPIN	2021085490037	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	120-2220759	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	30	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	3/8/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Obras de protección del cauce del cauce del arroyo el Pozo en Piojó, mediante la construcción de 292.93 ml de canalización en muros de gaviones.	Obras para el control y reducción de la erosión	292.93
		Metros lineales de area intervenida

Información específica de ejecución contrato específico

2/08/2022

Fecha de Suscripción

6/09/2022

Fecha de Inicio

14

Plazo en Meses

6/11/2023

Fecha Terminación

5,098

Número de Beneficiarios

\$6,261

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$6,261

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/09/2023


Fecha de Corte Avance

72%

% Programado

36%

% Ejecutado

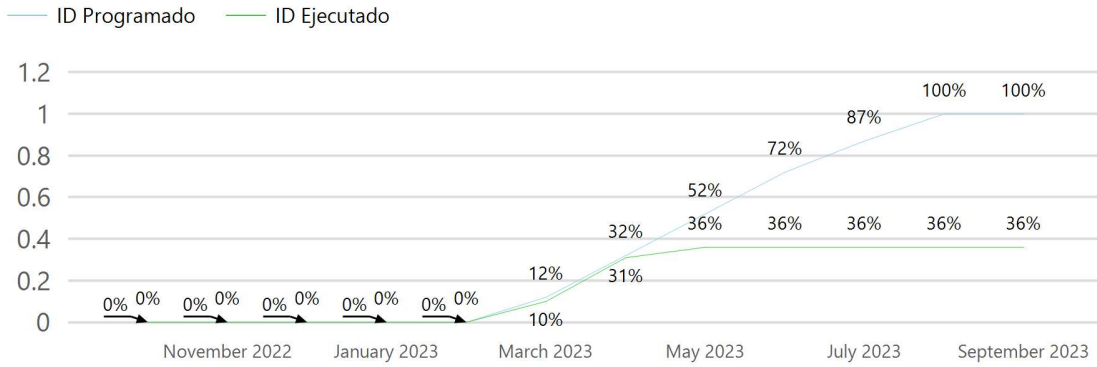

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Atlántico

Fecha de Corte

15/09/2023

Distrito familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$121,409

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución

Estado Detallado

\$105,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$16,409

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Barranquilla
BPIN	2021080010136	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	077-2210698	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	29	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	9/2/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Con esta intervención se busca realizar la adecuación paisajística con senderos peatonales, ciclovías y zonas de recreación, sobre la Ciénaga de Mallorquín, con estructuras en madera (plataformas, barandas, edificaciones y acabados), obras complementarias de urbanismo y parqueaderos. Lo anterior, con el propósito de mejorar el deterioro paisajístico de la ciénaga, atender los problemas asociados a los asentamientos informales que afectan el ecosistema y contribuir a las actividades ecoturísticas de la Ciénaga.	Infraestructura ecoturística construida	1
		Número de infraestructura

Información específica de ejecución contrato específico

28/10/2021

Fecha de Suscripción

14/12/2021

Fecha de Inicio

22

Plazo en Meses

17/10/2023

Fecha Terminación

1,243,113

Número de Beneficiarios

\$105,000

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$16,409

Presupuesto Comprometido Territorio

\$121,409

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

14/09/2023


Fecha de Corte Avance

28%

% Programado

75%

% Ejecutado

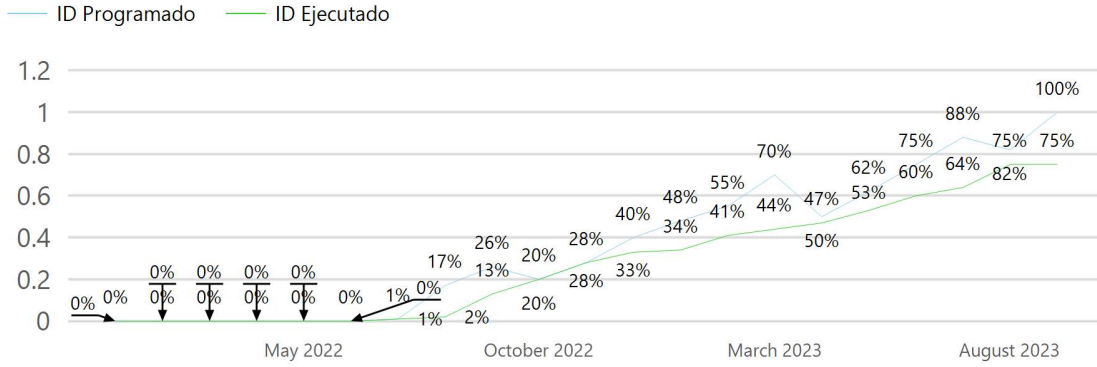

Avance Financiero del proyecto

30/09/2023

Fecha de Corte Avance


\$84,000

Valor Programado (mill)

100%

% Programado

ID Programado ID Ejecutado



September 2023

\$84,000

Valor Ejecutado (mill)

80%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Atlántico

Fecha de Corte

15/09/2023

Canalización arroyo Florencio en gaviones sección rectangular del municipio de Palmar de Varela, departamento de Atlántico.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$7,229

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución

Estado Detallado

\$7,229

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Palmar de Varela
BPIN	2021085200055	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	116-2220692	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	32	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	6/21/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto contempla la construcción de un canal recolector de aguas en muro de gavión de longitud de 521,89 metros con una sección útil de agua de 3 metros de ancho por un (1) metro de alto y un acabado en concreto reforzado de 2500 psi de 8 centímetros de espesor con un filtro francés para manejo de aguas superficiales ambos costados del canal en una longitud de 521.89 metros.	Obras para el control y reducción de la erosión	7800
		Metros Cuadrados de area intervenida

Información específica de ejecución contrato específico

18/07/2022

Fecha de Suscripción

29/09/2022

Fecha de Inicio

16

Plazo en Meses

29/01/2024

Fecha Terminación

4,098

Número de Beneficiarios

\$7,229

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$7,229

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

29/08/2023


Fecha de Corte Avance

10%

% Programado

4%

% Ejecutado

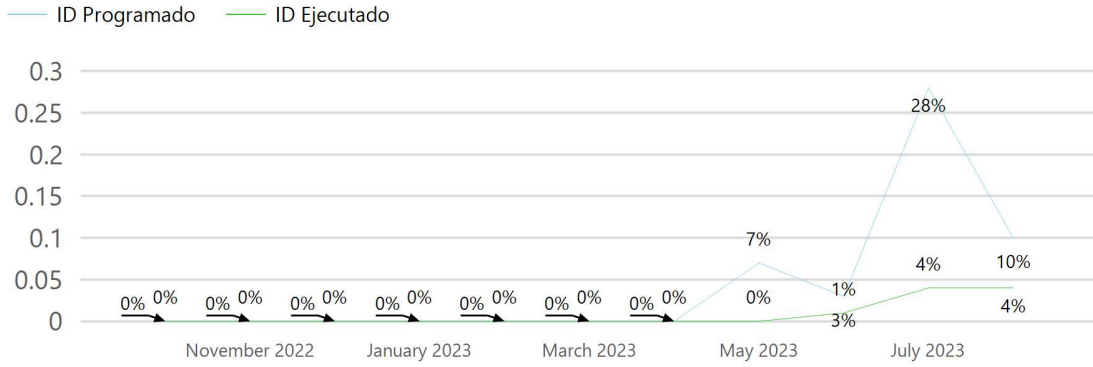


Avance Financiero del proyecto

30/09/2023
Fecha de Corte Avance

\$1,800
Valor Programado (mill)

0%
% Programado

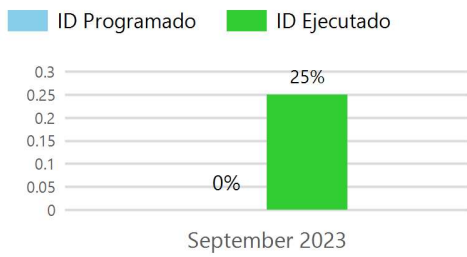

\$1,800
Valor Ejecutado (mill)

25%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
