

	FICHA TRIMESTRAL PACTOS TERRITORIALES	Página 1 De 9
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------

Pacto Territorial Bicentenario

26/06/2019	10	26/06/2029	44	63%
Fecha suscripción	Plazo en años	Fecha de Terminación	Meses para vencimiento	% Tiempo Transcurrido
71	0	71	\$3.654.888	
Total Proyectos	Proyectos FRPT	Proyectos Nación territorio	Valor Indicativo (Millones)	
\$2.446.680	\$1.208.209	\$0		
Aporte indicativo nación (Millones)	Aporte indicativo territorio (Millones)	Aporte indicativo otros (Millones)		

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Comercio Industria y Turismo	\$224.888	\$65.680	\$159.209	\$0
Transporte	\$3.430.000	\$2.381.000	\$1.049.000	\$0
Total	\$3.654.888	\$2.446.680	\$1.208.209	\$0

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Comprometido Total	Consolidado Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Comercio Industria y Turismo	\$94.699	\$42.262	\$52.057	\$380
Transporte	\$2.582.440	\$2.548.777	\$33.663	\$0
Total	\$2.677.139	\$2.591.040	\$85.720	\$380

Entidades Aportantes

Pacto Territorial	Entidad Nación aportante	Entidad Otros aportante	Presupuesto Comprometido Nación	Presupuesto Comprometido Aporte Otros
Pacto Territorial Bicentenario	INVIAS		\$2.548.777	\$0
	MinCIT		\$41.112	\$0
		ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GASTRONÓMICA - ACODRÉS	\$1.150	\$380

Compromisos en Aportantes

Pacto Territorial	Aporte Indicativo Nación	Presupuesto Comprometido Consolidado	% Avance Consolidado
Pacto Territorial Bicentenario	\$2.446.680	\$2.591.040	105,90%

Pacto Territorial	Aporte Indicativo Territorio	Presupuesto Comprometido Territorio	% Avance Consolidado
Pacto Territorial Bicentenario	\$1.208.209	\$85.720	7,09%

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)


73,25%

\$2.677.139

Valor Comprometido = En Ejecución + Ejecutado

Número de Proyectos por Estado

Proyectos por estado




Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

Año	Trimestre	Trimestre	Presupuesto Comprometido Total	% Avance Consolidado	Proyectos En Ejecución	Proyectos Terminados
2024	1. Trim. 04	1. Trim. 04 - 2024	\$2.525.333	69,09%	10	23
2025	2. Trim. 01	2. Trim. 01 - 2025	\$2.525.333	69,09%	10	23
	3. Trim. 02	3. Trim. 02 - 2025	\$2.621.119	71,72%	18	34
	3. Trim. 03	3. Trim. 03 - 2025	\$2.677.139	73,25%	19	34

Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)

Aportes por Fuente de Financiación

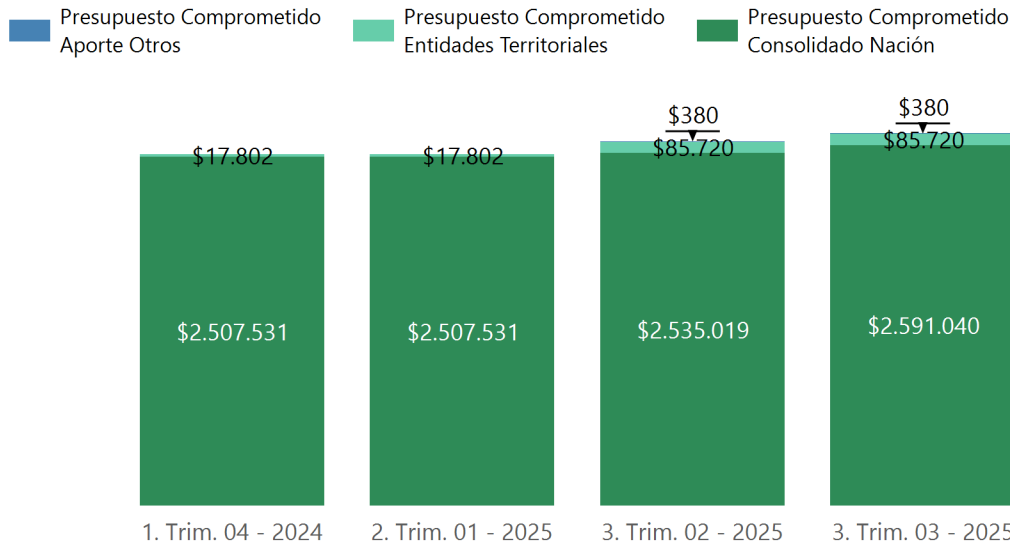

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Zipacquirá - Chiquinquirá-Barbosa	\$750.000	\$525.000	\$225.000	\$0
En Ejecución	Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche - Chiquinquirá	\$620.000	\$434.000	\$186.000	\$0
En Ejecución	Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena	\$600.000	\$420.000	\$180.000	\$0
En Ejecución	Ruta de los Libertadores: Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo	\$520.000	\$364.000	\$156.000	\$0
En Ejecución	Duitama - Charalá - San Gil	\$500.000	\$350.000	\$150.000	\$0
En Ejecución	Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal	\$230.000	\$161.000	\$69.000	\$0
En Ejecución	BTS: Tibasosa - Sogamoso	\$110.000	\$77.000	\$33.000	\$0
En Ejecución	Centro interinstitucional y embarcadero de Topocoro fase II	\$31.000	\$8.370	\$22.630	\$0
En Ejecución	Mejoramiento sitio histórico Puente de Boyacá	\$30.000	\$0	\$30.000	\$0

En Ejecución	Centro interinstitucional y embarcadero de Topocoro fase I	\$18.000	\$0	\$18.000	\$0
En Ejecución	Construcción del parque temático lineal alusivo a la Batalla de Pienta.	\$12.826	\$12.826	\$0	\$0
En Ejecución	Casona de San Gil fase I	\$10.425	\$10.425	\$0	\$0
En Ejecución	Restauración y reforzamiento estructural de la Hacienda El Salitre	\$7.693	\$0	\$7.693	\$0
En Ejecución	Construcción parques temáticos de La Ruta Libertadora (Pore - Nunchía - Tamara - Paz de Ariporo - Hato Corozal)	\$3.675	\$0	\$3.675	\$0
En Ejecución	Gestión para el fortalecimiento de las conexiones de conectividad terrestre a sitios de interés turístico y a atractivos (mejoramientos y construcción de infraestructura en miradores)	\$2.940	\$0	\$2.940	\$0
En Ejecución	Estructuración de rutas y circuitos del Bicentenario y temáticas complementarias	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0
En Ejecución	Desarrollo de productos turísticos	\$1.200	\$1.200	\$0	\$0
En Ejecución	Identificación y fortalecimiento de 40 experiencias de turismo creativo, asociado a la economía naranja (proyecto con impacto nacional, seis experiencias de los departamentos del Pacto Bicentenario)	\$147	\$147	\$0	\$0
En Ejecución	Estrategia de comercialización turística diseñada para los corredores turísticos de Colombia y los destinos Bicentenario	\$69	\$69	\$0	\$0
No Iniciado	Casona de San Gil fase II	\$30.000	\$8.100	\$21.900	\$0
No Iniciado	Producto ecoturístico de senderismo campaña Ruta Libertadora	\$8.800	\$0	\$8.800	\$0

No Iniciado	Mirador ecoturístico de la Peña del Cabro del municipio de Málaga, Santander	\$5.000	\$1.350	\$3.650	\$0
No Iniciado	Construcción nodo turístico Puente del Común	\$4.800	\$0	\$4.800	\$0
No Iniciado	Parque turístico Piedras del Tunjo - conexión con Regiotram	\$3.500	\$945	\$2.555	\$0
No Iniciado	Diseño y construcción de senderos representativos en los atractivos turísticos del departamento de Casanare (Laguna del Tinije, San Miguel de Farallones, Wisirare, Lagunazo)	\$2.940	\$794	\$2.146	\$0
No Iniciado	Remodelación del parque principal del casco urbano del municipio de Coromoro de Santander	\$2.785	\$0	\$2.785	\$0
No Iniciado	Identificación y conceptualización del Paisaje Cultural Llanero de Colombia PCLC de Casanare	\$2.500	\$675	\$1.825	\$0
No Iniciado	Construcción mirador Guane en el municipio de Zapatoca departamento de Santander	\$2.338	\$0	\$2.338	\$0
No Iniciado	Misiones académicas para conocer la estructuración del producto bicentenario en México	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0
No Iniciado	Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame.	\$2.000	\$540	\$1.460	\$0
No Iniciado	Misiones comerciales para la oferta de rutas y circuitos resultantes	\$1.500	\$1.500	\$0	\$0
No Iniciado	Diseño, fabricación, suministro e instalación de señalización vial, peatonal e interpretativa que oriente el acceso a los municipios, y en los principales atractivos turísticos en los 10 Municipios del Corredor de los Llanos del Departamento de Casanare	\$1.200	\$324	\$876	\$0
No Iniciado	Estrategia de internacionalización para destinos maduros con apoyo de Procolombia	\$1.200	\$1.200	\$0	\$0

No Iniciado	Constitución de la red turística del Bicentenario	\$800	\$800	\$0	\$0
No Iniciado	Implementación de señalización turística de los centros históricos de Suesca, Chía y Tame.	\$800	\$800	\$0	\$0
No Iniciado	Participación de la Red en eventos turísticos nacionales	\$500	\$500	\$0	\$0
No Iniciado	Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander	\$250	\$68	\$183	\$0
Terminado	Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito - Aguazul)	\$100.000	\$50.000	\$50.000	\$0
Terminado	Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca	\$8.020	\$0	\$8.020	\$0
Terminado	Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander	\$5.540	\$0	\$5.540	\$0
Terminado	Estudios, diseños y construcción Megaparque Nimaima - Gualivá	\$4.000	\$1.080	\$2.920	\$0
Terminado	1 estudio de mercados para Bicentenario	\$2.500	\$2.500	\$0	\$0
Terminado	Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.	\$1.646	\$1.246	\$400	\$0
Terminado	Revitalización Puente del Común	\$1.415	\$0	\$1.415	\$0
Terminado	Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional	\$1.150	\$1.150	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander	\$946	\$0	\$946	\$0

Terminado	Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario	\$946	\$0	\$946	\$0
Terminado	Plan de Promoción y Fortalecimiento Turístico – “turismo 200” en la vitrina turística de ANATO 2020, 2021 y 2022.	\$680	\$680	\$0	\$0
Terminado	Plan de Promoción Nacional del Bicentenario	\$600	\$600	\$0	\$0
Terminado	Programa de Formación Exportadora	\$600	\$600	\$0	\$0
Terminado	Programa de formación en inglés para actores de la cadena de valor del sector turístico en Colombia	\$500	\$500	\$0	\$0
Terminado	Rutas de aviturismo de los Llanos y Selvas de transición hacia la Amazonía	\$433	\$433	\$0	\$0
Terminado	Programa de Formación Exportadora Capítulos "Pacto Bicentenario" y "Ruta Cusiana"	\$390	\$390	\$0	\$0
Terminado	Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena"	\$350	\$0	\$350	\$0
Terminado	Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.	\$316	\$0	\$316	\$0
Terminado	Elaboración del inventario turístico de los 30 municipios que hacen parte del Pacto Bicentenario	\$283	\$283	\$0	\$0
Terminado	Programa de capacitación empresarial "Experiencia del producto turístico Ruta Leyenda El Dorado"	\$220	\$220	\$0	\$0
Terminado	Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario	\$200	\$200	\$0	\$0

Terminado	Fortalecimiento del producto turístico de biciturismo en municipios del bicentenario	\$200	\$100	\$100	\$0
Terminado	Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander.	\$200	\$200	\$0	\$0
Terminado	Fomento a la cultura turística de los actores de la cadena del turismo de los municipios de Pore, Socorro, Tame, Paipa y Chía	\$198	\$198	\$0	\$0
Terminado	Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.	\$141	\$141	\$0	\$0
Terminado	Promoción del Bicentenario a través de la campaña nacional #yovoy.	\$100	\$100	\$0	\$0
Terminado	Promoción del municipio de Suesca, haciendo referencia al producto turístico deportivo de escalada en roca, en el marco de un evento deportivo.	\$100	\$100		\$0
Terminado	Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa.	\$69	\$69	\$0	\$0
Terminado	Manual de avistamiento responsable de fauna silvestre en la Orinoquía colombiana (Arauca, Casanare, Vichada y Meta)	\$60	\$60	\$0	\$0
Terminado	Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander.	\$50	\$50	\$0	\$0
Terminado	Becas para diplomado en Agroturismo.	\$48	\$48	\$0	\$0

Terminado	Programa de Formación Exportadora Cápsulas de formación en ventas, comercialización y estrategias digitales dirigidas a actores de la cadena de valor del sector	\$44	\$44	\$0	\$0
Terminado	Fortalecimiento de capacidades en experiencia al cliente de la cadena de valor del sector turismo	\$37	\$37	\$0	\$0
Terminado	Fortalecimiento de los emprendimientos turísticos comunitarios con un enfoque competitivo dirigido hacia la comercialización y promoción.	\$19	\$19	\$0	\$0
Total		\$3.654.888	\$2.446.680	\$1.208.209	\$0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

0 Total Proyectos	Valor Indicativo (Millones)
-----------------------------	-----------------------------

Aporte indicativo DNP FRPT	Aporte indicativo territorio	Aporte indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
----------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------

0 Proyectos En Ejecución /Ejecutados	Presupuesto Comprometido (Millones)
------------------------------------------------	-------------------------------------

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Total						

Notas Aclaratorias

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Bicentenario.aspx>

ANEXO

Proyectos de INVIAS en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Bicentenario

BTS: Tibasosa - Sogamoso

Información general del contrato

BPIN	
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$56.020.923.753,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$56.020.923.753,00	\$0,00	\$0,00	56.020.923.753,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	499-2025
Contratista	CONSORCIO VIAL RUTA 55 identificado con el NIT. 901.903.391-9 (Integrado por EXPLANACIONES DEL SUR S.A. con NIT. 890.921.363-1 con un porcentaje de participación del 45%; TRAINCO S.A.S. con NIT 890.902.674-4 con un porcentaje de participación del 45% y HAG S.A. en reorganización con NIT. 800.198.573-0 con un porcentaje de participación del 10%).
Fecha de suscripción	31/01/2025
Fecha terminación inicial	31/07/2026
Fecha terminación actual	31/07/2026
Valor inicial contrato de obra	\$49.020.923.753,00
Adiciones	\$0,00
Valor actual contrato de obra	\$49.020.923.753,00
Meta física contratada	76 km

No. contrato de interventoría	500-2025
Contratista	CONSORCIO INTER CORREDOR BTS 96, identificado con NIT No. 901902803-7, consorcio integrado por COBA CONSULTORES DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S A SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT 900.657.214-4 con una participación del 30%; B&C S.A., identificada con NIT 800.015.774-1 con una participación del 30%; y ALDEIC SAS BIC identificada con el NIT 901.529.306-9 con una participación del 40%
Fecha de suscripción	3/02/2025
Fecha terminación inicial	31/07/2026
Fecha terminación actual	31/07/2026
Valor inicial contrato de interventoría	\$7.000.000.000,00
Adiciones	\$42.020.923.753,00
Valor actual contrato de interventoría	\$49.020.923.753,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 0,30% a fecha 4/07/2025

El proyecto 3934-BTS: Tibasosa - Sogamoso se encuentra no iniciado, con una inversión indicativa de \$ 110.000.000.000, debido a que es un tramo que hace parte de la concesión vial Briceño – Tunja - Sogamoso, la cual está a cargo de la ANI, el alcance que tiene este proyecto no se encuentra definido actualmente en la concesión por lo que implicaría una adición de recursos en el contrato de concesión, lo cual debe ser evaluado por el sector y definir de igual manera la fuente de financiación. El plazo de la concesión. Plazo concesión: 30 años, fecha suscripción contrato concesión: 15/07/2002

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el 31/07/2026

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena

Mejoramiento del corredor vial en pavimento flexible, en una longitud total de 85.85 kilómetros, mediante intervención por tramos.

Tramos a intervenir: PR8+250 al PR19+100 (Pamplona y Labateca) PR21+000 al PR58+000 (Labateca y Toledo) PR77+000 al PR115+000 (Toledo)

Información general del contrato

BPIN	2018011000444
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$426.550.465.706,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$426.550.465.706,00	\$0,00	\$0,00	426.550.465.706,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	0988/2021
Contratista	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063 NIT. 901.476.429-7
Fecha de suscripción	21/05/2021
Fecha terminación inicial	30/08/2030
Fecha terminación actual	30/08/2030
Valor inicial contrato de obra	\$362.133.900.815,00
Adiciones	\$34.431.480.639,00
Valor actual contrato de obra	\$396.565.381.454,00
Meta física contratada	47 KM PAVIMENTACIÓN, 3 ATENCIÓN DE SITIO CRÍTICO, 185 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO, ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. contrato de interventoría	1013/2021
Contratista	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188 NIT. No. 901.479.769-1
Fecha de suscripción	21/05/2021
Fecha terminación inicial	30/08/2030
Fecha terminación actual	30/08/2030
Valor inicial contrato de interventoría	\$28.799.979.413,00
Adiciones	\$1.185.104.839,00
Valor actual contrato de interventoría	\$29.985.084.252,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 17,00% a fecha 7/05/2025

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de \$59.122.000.000,00

La obra espera finalizar el 30/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Duitama – Charalá - San Gil

via secundaria mejorada

Información general del contrato

BPIN	2019011000264
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$353.225.143.093,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$353.225.143.093,00	\$0,00	\$0,00	353.225.143.093,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	987/2021
Contratista	MINCIVIL S.A. con NIT. 890.930.545-1 (CESIÓN DE CONSORCIO PCT SAN-BOY NIT. 901.474.415-5)
Fecha de suscripción	14/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2030
Fecha terminación actual	31/08/2030
Valor inicial contrato de obra	\$310.625.154.993,00
Adiciones	\$14.002.090.382,00
Valor actual contrato de obra	\$324.627.245.375,00
Meta física contratada	Pavimentación 25 KM Mejoramiento de 68 KM Mantenimiento parcheo/bacheo: 48 KM Mantenimiento rutinario: 134 KM Atención sitios críticos: 3 Estudios y diseños de 134 KM

No. contrato de interventoría	1015/2021
Contratista	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT. No. 901.481.447-1
Fecha de suscripción	18/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2030
Fecha terminación actual	31/08/2030
Valor inicial contrato de interventoría	\$27.599.988.100,00
Adiciones	\$997.909.618,00
Valor actual contrato de interventoría	\$28.597.897.718,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del **27,74%** a fecha **27/05/2025**

El proyecto 3932-Duitama - Charalá - San Gil se encuentra en ejecución. El proyecto se encuentra con un avance físico del 27,74% de acuerdo a la información reportada por la entidad ejecutora el 27 de mayo de 2025.

Pavimentación : meta 25Km-ejecutado 1.2Km; Sitios Inestables: 4 und-ejecutado 3und; Alcantarillas: 126 und -ejecutado 28und; Box Culvert: 9 und.

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de **\$87.776.592.731,00**

La obra espera finalizar el **31/08/2030**

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo

Mejoramiento y/o pavimentación: 46 Km; Gestión predial, social y ambiental y mantenimiento del corredor

Información general del contrato

BPIN	2017011000301
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$370.249.700.000,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$370.249.700.000,00	\$0,00	\$0,00	370.249.700.000,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	978/2021
Contratista	CONSORCIO VIAS NACIONALES NIT. 901.474.028-8
Fecha de suscripción	13/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2029
Fecha terminación actual	31/08/2029
Valor inicial contrato de obra	\$322.790.128.920,00
Adiciones	\$20.059.840.972,00
Valor actual contrato de obra	\$342.849.969.892,00
Meta física contratada	46 KM PAVIMENTACIÓN, 136 KM MANTENIMIENTO PERIÓDICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. contrato de interventoría	1038/2021
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA NIT. No. 901.479.577-2
Fecha de suscripción	21/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2029
Fecha terminación actual	31/08/2029
Valor inicial contrato de interventoría	\$27.399.730.108,00
Adiciones	\$0,00
Valor actual contrato de interventoría	\$27.399.730.108,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 31,01% a fecha 27/05/2025

El proyecto 3930-Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo se encuentra en ejecución. El proyecto se encuentra con un avance físico del 31,01% y financiero del 28,22% reportado el 27 de mayo de 2025 por la entidad ejecutora.

Metas físicas: mantenimiento periódico-Parqueo técnico en pavimentos asfálticos (alcance: 58,94 Km -ejecutado: 37,52%); mantenimiento periódico -conformación de la calzada existente en afirmado 115,5 km-ejecutado 84,17%; Estructura de pavimento 46Km, 23 Km Boyacá, 23 km Casanare -ejecutado 31,22%; Sectores atípicos: Pr18+170 RN 6404 - Muro de contención (ejecutado 100%) , Pr30+300 RN 6404 - Muro El Boche (ejecutado 100%), Pr30+300 RN 6404 - Nuevo puente El Boche (ejecutado 20%), Pr32+600 RN 6404 - Muro El Estanquito (ejecutado 95%) , Pr37+650 RN 6404 - Muro Sector El Alto (ejecutado 85%) , Pr2+530 RN 6405 - Puente San Pascual (ejecutado 15%), Pr16 RN 6405 - Muro de contención (ejecutado 30%); Atención de emergencias (ejecutado 100%).

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de \$43.935.748.182,00

La obra espera finalizar el 31/08/2029

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito - Aguazul)

via primaria mejorada

Información general del contrato

BPIN	2018011000497
Ejecutor	INVIAS
Estado	Terminado
Valor Contrato	\$172.312.001.710,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$172.312.001.709,50	\$0,00	\$0,00	172.312.001.710,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	1858/2020
Contratista	CONSORCIO VIAL MHC 056 NIT 901.442.945-1
Fecha de suscripción	27/12/2020
Fecha terminación inicial	31/12/2022
Fecha terminación actual	31/01/2025
Valor inicial contrato de obra	\$109.589.909.864,00
Adiciones	\$49.065.888.532,00
Valor actual contrato de obra	\$158.655.798.396,00
Meta física contratada	7,3 KM PAVIEMENTACIÓN, 43 KM REHABILITACIÓN, 3 REHABILITACIÓN PUENTES, 5 ATENCIÓN DE SITIO CRÍTICO 118 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO, ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. contrato de interventoría	1860/2020
Contratista	CONSORCIO TERRA CGS NIT 901.442.378-3
Fecha de suscripción	24/12/2020
Fecha terminación inicial	31/12/2022
Fecha terminación actual	31/01/2025
Valor inicial contrato de interventoría	\$6.199.585.880,00
Adiciones	\$7.456.617.433,50
Valor actual contrato de interventoría	\$13.656.203.313,50

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 100,00% a fecha 7/05/2025

El proyecto 3935-Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul) se encuentra terminado. El proyecto cuenta un avance físico del 99,53% y financiero del 98,76% de acuerdo con la información reportada por la entidad ejecutora el 7 de mayo de 2025.

Meta física: Atención de sitios críticos PR 87+000- Sector la Granja (ejecutado: se realizaron obras de mitigación en los dieciséis sitios críticos; Intervención de puentes, Hoyo caliente (ejecutado); Mantenimiento de 44 Km (ejecutado)

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el 31/01/2025

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá

via primaria mejorada

Información general del contrato

BPIN	2018011000507
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$439.966.981.716,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$439.966.981.716,00	\$0,00	\$0,00	439.966.981.716,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	973/2021
Contratista	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES "SUDINCO" S.A. SUCURSAL COLOMBIANA con NIT. 900.815.676-1 (CESIÓN CONSORCIO GROSUD NIT. 901.474.570 -9)
Fecha de suscripción	20/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2029
Fecha terminación actual	31/08/2029
Valor inicial contrato de obra	\$358.871.764.334,00
Adiciones	\$48.095.323.054,00
Valor actual contrato de obra	\$406.967.087.388,00
Meta física contratada	0,7 KM SEGUNDA CALZADA, 48 KM PAVIMENTACIÓN, 33 KM REHSBILITACIÓN, 27 SITIOS CRÍTICOSM 378 KM MANTENIMIENTO PERIODICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. contrato de interventoría	962/2021
Contratista	CONSORCIO ECOVISION-188
Fecha de suscripción	5/08/2021
Fecha terminación inicial	14/08/2029
Fecha terminación actual	31/08/2029
Valor inicial contrato de interventoría	\$29.999.894.328,00
Adiciones	\$3.000.000.000,00
Valor actual contrato de interventoría	\$32.999.894.328,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 39,53% a fecha 27/05/2025

El proyecto 3931-Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá se encuentra en ejecución. De acuerdo con comunicación de la entidad ejecutora INVIAS, el proyecto se encuentra con un avance físico del 39,53% y financiero del 44,31% a corte de abril de 2025. El proyecto actualmente se desarrolla dentro de los plazos establecidos, por lo que se mantiene la fecha de finalización del 31 de agosto de 2029.

En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento a Proyectos Pacto Bicentenario que adelanta la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el sector infraestructura al INVIAS, realizó visita los días 26 y 27 de marzo de 2025 a los sitios de ejecución de obras correspondientes al Contrato 973 de 2021. El proyecto no ha presentado retrasos.

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el 31/08/2029

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal

via secundaria mejorada

Información general del contrato

BPIN	2019011000264
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$206.747.038.206,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$173.084.038.206,00	\$33.663.000.000,00	\$0,00	206.747.038.206,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	986/2021
Contratista	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 NIT. 901.476.869-4
Fecha de suscripción	18/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2030
Fecha terminación actual	31/08/2030
Valor inicial contrato de obra	\$137.479.407.106,00
Adiciones	\$20.699.394.560,00
Valor actual contrato de obra	\$158.178.801.666,00
Meta física contratada	Pavimentación de 21 km Alcantarillas 150 und Boxculvert 58 und Muros de contención 76 und

No. contrato de interventoría	996/2021
Contratista	CONSORCIO SAINT NIT. 901.479.369-7
Fecha de suscripción	18/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2030
Fecha terminación actual	31/08/2030
Valor inicial contrato de interventoría	\$14.704.631.100,00
Adiciones	\$200.605.440,00
Valor actual contrato de interventoría	\$14.905.236.540,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 27,38% a fecha 27/05/2025

El proyecto 3933- Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal se encuentra en ejecución. El proyecto se encuentra con un avance físico del 26,78%. El proyecto se ejecuta conforme a lo programado.

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de \$38.231.975.813,00

La obra espera finalizar el 31/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa

Via primaria mejorada Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa

Información general del contrato

BPIN	2018011000034
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$557.367.998.991,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$557.367.998.991,00	\$0,00	\$0,00	557.367.998.991,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	989/2021
Contratista	CONSORCIO VIAL MHC 063 NIT 901.475.859-6
Fecha de suscripción	13/05/2021
Fecha terminación inicial	30/08/2030
Fecha terminación actual	30/08/2030
Valor inicial contrato de obra	\$465.288.090.475,00
Adiciones	\$58.580.051.078,00
Valor actual contrato de obra	\$523.868.141.553,00
Meta física contratada	Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45A CND, 6,58Km. Construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05, 12 Km Mantenimiento del corredor vial Zipaquirá- Barbosa-Bucaramanga 344Km Atención a emergencia Cerros el Picacho 1 0,38 Km

No. contrato de interventoría	971/2021
Contratista	CONSORCIO ICEACSA -TPF NIT No. 901.480.695-5
Fecha de suscripción	5/12/2021
Fecha terminación inicial	30/08/2030
Fecha terminación actual	30/08/2030
Valor inicial contrato de interventoría	\$33.499.857.438,00
Adiciones	\$0,00
Valor actual contrato de interventoría	\$33.499.857.438,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del **50,73%** a fecha **27/05/2025**

Avance físico acumulado del 50,73% reportado por la entidad ejecutora el 27 de mayo del 2025. Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45A CND (Alcance:6,58Km. Ejecutado total: 6,50Km).
 Construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05 (Alcance: 12 Km aproximadamente. Ejecutado total: 0,08 Km).
 Mantenimiento del corredor vial Zipaquirá- Barbosa-Bucaramanga (Alcance: 344 Km. Ejecutado total: 149,23 Km).
 Atención a emergencia Cerros el Picacho 1(Alcance: 0,38 Km. Ejecutado total: 0,38 km).

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el **30/08/2030**

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>
