

## Pacto Territorial Bicentenario

26/06/2019 <small>Fecha suscripción</small>	10 <small>Plazo en años</small>	26/06/2029 <small>Fecha de Terminación</small>	38 <small>Meses para vencimiento</small>	68% <small>% Tiempo Transcurrido</small>
71 <small>Total Proyectos</small>	0 <small>Proyectos FRPT</small>	71 <small>Proyectos Nación territorio</small>	\$3.654.888 <small>Valor Indicativo (Millones)</small>	
\$2.446.680 <small>Aporte indicativo nación (Millones)</small>	\$1.208.209 <small>Aporte indicativo territorio (Millones)</small>		\$0 <small>Aporte indicativo otros (Millones)</small>	

### Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Comercio, Industria y Turismo	\$224.888	\$65.680	\$159.209	\$0
Transporte	\$3.430.000	\$2.381.000	\$1.049.000	\$0
<b>Total</b>	<b>\$3.654.888</b>	<b>\$2.446.680</b>	<b>\$1.208.209</b>	<b>\$0</b>

### Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Comprometido Total	Comprometido Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Comercio, Industria y Turismo	\$92.010	\$42.262	\$49.368	\$380
Transporte	\$2.635.037	\$2.601.374	\$33.663	\$0
<b>Total</b>	<b>\$2.727.047</b>	<b>\$2.643.636</b>	<b>\$83.031</b>	<b>\$380</b>

### Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nación y Otros

Pacto Territorial	Entidad Nación aportante	Entidad Otros aportante	Presupuesto Comprometido Nación	Presupuesto Comprometido Aporte Otros
Pacto Territorial Bicentenario			\$0	\$0
	INVIAS		\$2.601.374	\$0
	MinCIT		\$41.112	\$0
		ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GASTRONÓMICA - ACODRÉS	\$1.150	\$380

### Compromisos de Recursos por Parte de la Nación y el Territorio

Pacto Territorial	Aporte Indicativo Nación	Presupuesto Comprometido Nación	% Avance Nación
Pacto Territorial Bicentenario	\$2.446.680	\$2.643.636	108,05%

Pacto Territorial	Aporte Indicativo Territorio	Presupuesto Comprometido Territorio	% Avance Territorio
Pacto Territorial Bicentenario	\$1.208.209	\$83.031	6,87%


### Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

74,61%

\$2.727.047

Valor Comprometido = En Ejecución + Ejecutado

### Número de Proyectos por Estado

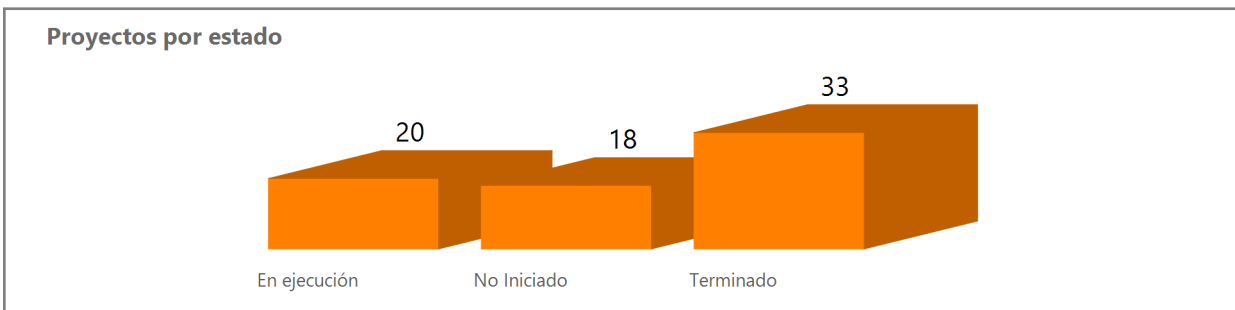


### Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

Año	Trimestre	Trimestre	Presupuesto Comprometido Total	% Avance Consolidado	Proyectos En Ejecución	Proyectos Terminados
2024	1. Trim. 04	1. Trim. 04 - 2024	\$2.525.333	69,09%	10	23
2025	2. Trim. 01	2. Trim. 01 - 2025	\$2.525.333	69,09%	10	23
	3. Trim. 02	3. Trim. 02 - 2025	\$2.621.119	71,72%	18	34
	4. Trim. 03	4. Trim. 03 - 2025	\$2.677.139	73,25%	19	34
	5. Trim. 04	5. Trim. 04 - 2025	\$2.685.480	73,48%	21	33
2026	6. Trim. 01	6. Trim. 01 - 2026	\$2.727.047	74,61%	20	33

### Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)

### Aportes por Fuente de Financiación

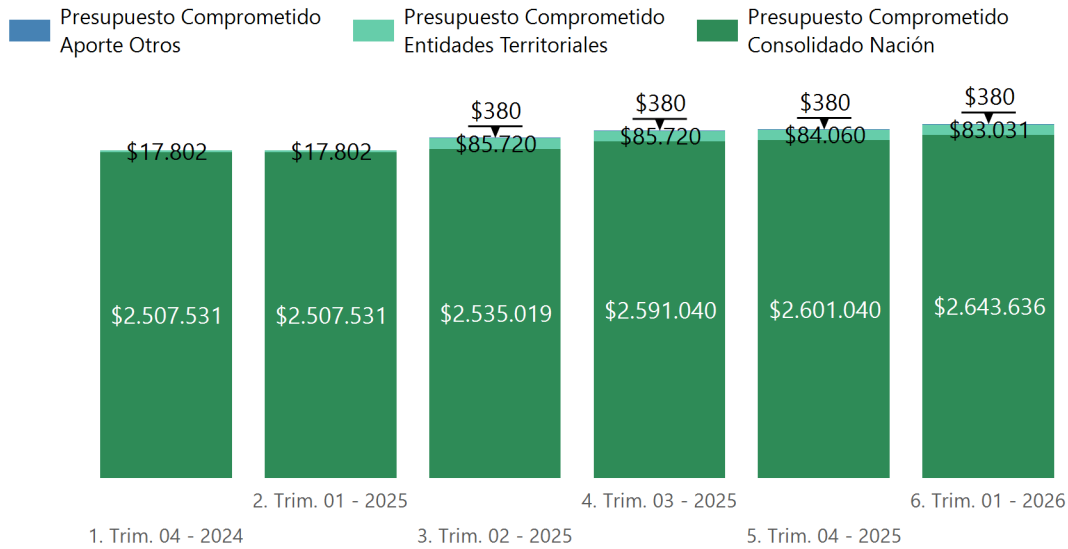

### Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En ejecución	Zipacquirá - Chiquinquirá-Barbosa	\$750.000	\$525.000	\$225.000	\$0
En ejecución	Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche - Chiquinquirá	\$620.000	\$434.000	\$186.000	\$0
En ejecución	Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena	\$600.000	\$420.000	\$180.000	\$0
En ejecución	Ruta de los Libertadores: Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo	\$520.000	\$364.000	\$156.000	\$0
En ejecución	Duitama - Charalá - San Gil	\$500.000	\$350.000	\$150.000	\$0
En ejecución	Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal	\$230.000	\$161.000	\$69.000	\$0
En ejecución	BTS: Tibasosa - Sogamoso	\$110.000	\$77.000	\$33.000	\$0
En ejecución	Centro interinstitucional y embarcadero de Topocoro fase II	\$31.000	\$8.370	\$22.630	\$0
En ejecución	Mejoramiento sitio histórico Puente de Boyacá	\$30.000	\$0	\$30.000	\$0

En ejecución	Centro interinstitucional y embarcadero de Topocoro fase I	\$18.000	\$0	\$18.000	\$0
En ejecución	Construcción del parque temático lineal alusivo a la Batalla de Pienta.	\$12.826	\$12.826	\$0	\$0
En ejecución	Casona de San Gil fase I	\$10.425	\$10.425	\$0	\$0
En ejecución	Restauración y reforzamiento estructural de la Hacienda El Salitre	\$7.693	\$0	\$7.693	\$0
En ejecución	Estudios, diseños y construcción Megaparque Nimaima - Gualivá	\$4.000	\$1.080	\$2.920	\$0
En ejecución	Construcción parques temáticos de La Ruta Libertadora (Pore - Nunchía - Tamara - Paz de Ariporo - Hato Corozal)	\$3.675	\$0	\$3.675	\$0
En ejecución	Gestión para el fortalecimiento de las conexiones de conectividad terrestre a sitios de interés turístico y a atractivos (mejoramientos y construcción de infraestructura en miradores)	\$2.940	\$0	\$2.940	\$0
En ejecución	Estructuración de rutas y circuitos del Bicentenario y temáticas complementarias	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0
En ejecución	Desarrollo de productos turísticos	\$1.200	\$1.200	\$0	\$0
En ejecución	Identificación y fortalecimiento de 40 experiencias de turismo creativo, asociado a la economía naranja (proyecto con impacto nacional, seis experiencias de los departamentos del Pacto Bicentenario)	\$147	\$147	\$0	\$0
En ejecución	Estrategia de comercialización turística diseñada para los corredores turísticos de Colombia y los destinos Bicentenario	\$69	\$69	\$0	\$0
No Iniciado	Casona de San Gil fase II	\$30.000	\$8.100	\$21.900	\$0
No Iniciado	Producto ecoturístico de senderismo campaña Ruta Libertadora	\$8.800	\$0	\$8.800	\$0

No Iniciado	Mirador ecoturístico de la Peña del Cabro del municipio de Málaga, Santander	\$5.000	\$1.350	\$3.650	\$0
No Iniciado	Construcción nodo turístico Puente del Común	\$4.800	\$0	\$4.800	\$0
No Iniciado	Parque turístico Piedras del Tunjo - conexión con Regiotram	\$3.500	\$945	\$2.555	\$0
No Iniciado	Diseño y construcción de senderos representativos en los atractivos turísticos del departamento de Casanare (Laguna del Tinije, San Miguel de Farallones, Wisirare, Lagunazo)	\$2.940	\$794	\$2.146	\$0
No Iniciado	Remodelación del parque principal del casco urbano del municipio de Coromoro de Santander	\$2.785	\$0	\$2.785	\$0
No Iniciado	Identificación y conceptualización del Paisaje Cultural Llanero de Colombia PCLC de Casanare	\$2.500	\$675	\$1.825	\$0
No Iniciado	Construcción mirador Guane en el municipio de Zapatoca departamento de Santander	\$2.338	\$0	\$2.338	\$0
No Iniciado	Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame.	\$2.000	\$540	\$1.460	\$0
No Iniciado	Misiones académicas para conocer la estructuración del producto bicentenario en México	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0
No Iniciado	Misiones comerciales para la oferta de rutas y circuitos resultantes	\$1.500	\$1.500	\$0	\$0
No Iniciado	Diseño, fabricación, suministro e instalación de señalización vial, peatonal e interpretativa que oriente el acceso a los municipios, y en los principales atractivos turísticos en los 10 Municipios del Corredor de los Llanos del Departamento de Casanare	\$1.200	\$324	\$876	\$0
No Iniciado	Estrategia de internacionalización para destinos maduros con apoyo de Procolombia	\$1.200	\$1.200	\$0	\$0

No Iniciado	Constitución de la red turística del Bicentenario	\$800	\$800	\$0	\$0
No Iniciado	Implementación de señalización turística de los centros históricos de Suesca, Chía y Tame.	\$800	\$800	\$0	\$0
No Iniciado	Participación de la Red en eventos turísticos nacionales	\$500	\$500	\$0	\$0
No Iniciado	Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander	\$250	\$68	\$183	\$0
Terminado	Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul)	\$100.000	\$50.000	\$50.000	\$0
Terminado	Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca	\$8.020	\$0	\$8.020	\$0
Terminado	Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander	\$5.540	\$0	\$5.540	\$0
Terminado	1 estudio de mercados para Bicentenario	\$2.500	\$2.500	\$0	\$0
Terminado	Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.	\$1.646	\$1.246	\$400	\$0
Terminado	Revitalización Puente del Común	\$1.415	\$0	\$1.415	\$0
Terminado	Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional	\$1.150	\$1.150	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander	\$946	\$0	\$946	\$0
Terminado	Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario	\$946	\$0	\$946	\$0

Terminado	Plan de Promoción y Fortalecimiento Turístico – “turismo 200” en la vitrina turística de ANATO 2020, 2021 y 2022.	\$680	\$680	\$0	\$0
Terminado	Programa de Formación Exportadora	\$600	\$600	\$0	\$0
Terminado	Plan de Promoción Nacional del Bicentenario	\$600	\$600	\$0	\$0
Terminado	Programa de formación en inglés para actores de la cadena de valor del sector turístico en Colombia	\$500	\$500	\$0	\$0
Terminado	Rutas de aviturismo de los Llanos y Selvas de transición hacia la Amazonía	\$433	\$433	\$0	\$0
Terminado	Programa de Formación Exportadora Capítulos “Pacto Bicentenario” y “Ruta Cusiana”	\$390	\$390	\$0	\$0
Terminado	Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico “Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena”	\$350	\$0	\$350	\$0
Terminado	Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.	\$316	\$0	\$316	\$0
Terminado	Elaboración del inventario turístico de los 30 municipios que hacen parte del Pacto Bicentenario	\$283	\$283	\$0	\$0
Terminado	Programa de capacitación empresarial “Experiencia del producto turístico Ruta Leyenda El Dorado”	\$220	\$220	\$0	\$0
Terminado	Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario	\$200	\$200	\$0	\$0
Terminado	Fortalecimiento del producto turístico de biciturismo en municipios del bicentenario	\$200	\$100	\$100	\$0

Terminado	Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander.	\$200	\$200	\$0	\$0
Terminado	Fomento a la cultura turística de los actores de la cadena del turismo de los municipios de Pore, Socorro, Tame, Paipa y Chía	\$198	\$198	\$0	\$0
Terminado	Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.	\$141	\$141	\$0	\$0
Terminado	Promoción del Bicentenario a través de la campaña nacional #yovoy.	\$100	\$100	\$0	\$0
Terminado	Promoción del municipio de Suesca, haciendo referencia al producto turístico deportivo de escalada en roca, en el marco de un evento deportivo.	\$100	\$100		\$0
Terminado	Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa.	\$69	\$69	\$0	\$0
Terminado	Manual de avistamiento responsable de fauna silvestre en la Orinoquía colombiana (Arauca, Casanare, Vichada y Meta)	\$60	\$60	\$0	\$0
Terminado	Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander.	\$50	\$50	\$0	\$0
Terminado	Becas para diplomado en Agroturismo.	\$48	\$48	\$0	\$0
Terminado	Programa de Formación Exportadora Cápsulas de formación en ventas, comercialización y estrategias digitales dirigidas a actores de la cadena de valor del sector	\$44	\$44	\$0	\$0

Terminado	Fortalecimiento de capacidades en experiencia al cliente de la cadena de valor del sector turismo	\$37	\$37	\$0	\$0
Terminado	Fortalecimiento de los emprendimientos turísticos comunitarios con un enfoque competitivo dirigido hacia la comercialización y promoción.	\$19	\$19	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>\$3.654.888</b>	<b>\$2.446.680</b>	<b>\$1.208.209</b>	<b>\$0</b>

### Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

<b>0</b> Total Proyectos	Valor Indicativo (Millones)
-----------------------------	-----------------------------

Aporte indicativo DNP FRPT	Aporte indicativo territorio	Aporte indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
----------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------

<b>0</b> Proyectos En Ejecución /Ejecutados	Presupuesto Comprometido (Millones)
--	-------------------------------------

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
<b>Total</b>						

### Notas Aclaratorias

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Bicentenario.aspx>

# **ANEXO**

Proyectos de INVIAS en ejecución y ejecutados

## Pacto Territorial Bicentenario

Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito - Aguazul)

via primaria mejorada

### Información general del contrato

BPIN	2018011000497
Ejecutor	INVIAS
Estado	Terminado
Valor Contrato	\$172.312.001.710,00

### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$172.312.001.709,50	\$0,00	\$0,00	172.312.001.710,00

### Contratación derivada

## Ficha Proyectos Otras Fuentes de Financiación

<b>No. contrato de obra</b>	1858/2020
<b>Contratista</b>	CONSORCIO VIAL MHC 056 NIT 901.442.945-1
<b>Fecha de suscripción</b>	27/12/2020
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/07/2022
<b>Fecha terminación actual</b>	31/01/2025
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$109.589.909.864,00
<b>Adiciones</b>	\$49.065.888.532,00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$158.655.798.396,00
<b>Meta física contratada</b>	Atención de sitios inestables y/o críticos de catorce (14) puntos: PR63+300, PR66+000, PR79+800, PR80+100, PR82+150, PR82+600, PR83+300, PR83+600, PR85+100, PR86+550, PR105+900, PR114+700, y "La Chichacá" PR103+600, remoción de derrumbes en todo el corredor. Intervención puente: Hoyo caliente. Mantenimiento y/o rehabilitación: 44km. Atención de nueve (9) emergencias presentadas en la Transversal del Cusiana.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sector La Granja - PR 87+000 – Estabilización de talud inferior y superior (2 emergencias).</li> <li>• Sector Quebrada Negra – PR 83+600 – Obras de mitigación descargue talud.</li> <li>• Sector puente Quebrada Negra – PR 84+200 – Instalación puente metálico.</li> <li>• Sector Grillos – PR 81+200 – Variante de grillos (fallo puente grillos).</li> <li>• Sector Las Lajas – PR 117+350 – Enrocado y recuperación de calzada.</li> <li>• Sector Las Lajas – PR 117+500 - Enrocado y recuperación de calzada.</li> <li>• Sector 105+900 – Estabilización de talud inferior y recuperación de banca.</li> <li>• Sector 86+500 Orquídea – Instalación 2 puentes metálicos.</li> </ul>

<b>No. contrato de interventoría</b>	1860/2020
<b>Contratista</b>	CONSORCIO TERRA CGS NIT 901.442.378-3
<b>Fecha de suscripción</b>	27/12/2020
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/07/2022
<b>Fecha terminación actual</b>	31/01/2025
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$6.199.585.880,00
<b>Adiciones</b>	\$7.456.617.433,50
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$13.656.203.313,50

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del

100,00% a fecha

27/05/2025

Proyecto finalizado.

Considerando las condiciones geomorfológicas, hidráulicas y sísmicas, se tiene que el corredor vial Sogamoso-Aguazul es afectado por situaciones naturales que generan inestabilidad geológica, acentuado con un alto e importante riesgo y amenaza en el sector entre PR77+000 (Curisí)-PR90+000 (pajarito), en donde se presenta un movimiento en masa, por causa de: (i) formaciones de suelos muy frágiles (lutitas de Macanal), las cuales, al entrar en interacción con el agua proveniente de las precipitaciones, se desintegran fácilmente, (ii) alta sismicidad en la zona y (iii) por las afectaciones ocasionadas por el Río Cusiana, ya que el mismo ocasionan socavación en la pata del talud, factores que sumado a las altas precipitaciones, generan que el corredor sea altamente vulnerable a eventos naturales como procesos de remoción en masa, derrumbes, caída de rocas, entre otras situaciones, que requieren de atención prioritaria para poder garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios a lo largo de la Transversal del Cusiana.

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el 31/01/2025

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

### Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal

via secundaria mejorada

#### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2019011000264
<b>Ejecutor</b>	INVIAS
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$206.747.038.206,00

#### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor total</b>	<b>\$173.084.038.206,00</b>	<b>\$33.663.000.000,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>206.747.038.206,00</b>

#### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	986/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 NIT. 901.476.869-4
<b>Fecha de suscripción</b>	18/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$134.479.407.106,00
<b>Adiciones</b>	\$53.456.094.560,00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$187.935.501.666,00
<b>Meta física contratada</b>	Pavimentación de 26km Puente: 1 und Alcantarillas 150 und Boxculvert 58 und Muros de contención 76 und

<b>No. contrato de interventoría</b>	996/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO SAINT NIT. 901.479.369-7
<b>Fecha de suscripción</b>	18/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$14.704.631.100,00
<b>Adiciones</b>	\$3.506.905.440,00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$18.211.536.540,00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 31,94% a fecha 18/02/2026

La obra espera finalizar el 31/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

### Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal

via secundaria mejorada

#### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2019011000264
<b>Ejecutor</b>	INVIAS
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$206.747.038.206,00

#### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor total</b>	<b>\$173.084.038.206,00</b>	<b>\$33.663.000.000,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>206.747.038.206,00</b>

#### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	986/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 NIT. 901.476.869-4
<b>Fecha de suscripción</b>	18/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$134.479.407.106,00
<b>Adiciones</b>	\$53.456.094.560,00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$187.935.501.666,00
<b>Meta física contratada</b>	Pavimentación de 26km Puente: 1 und Alcantarillas 150 und Boxculvert 58 und Muros de contención 76 und

<b>No. contrato de interventoría</b>	996/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO SAINT NIT. 901.479.369-7
<b>Fecha de suscripción</b>	18/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$14.704.631.100,00
<b>Adiciones</b>	\$3.506.905.440,00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$18.211.536.540,00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 31,94% a fecha 18/02/2026

La obra espera finalizar el 31/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

Duitama – Charalá - San Gil

via secundaria mejorada

### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2019011000264
<b>Ejecutor</b>	INVIAS
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$353.225.143.093,00

### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor total</b>	<b>\$353.225.143.093,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>353.225.143.093,00</b>

### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	987/2021
<b>Contratista</b>	MINICIVIL S.A. con NIT. 890.930.545-1 (CESIÓN DE CONSORCIO PCT SAN-BOY NIT. 901.474.415-5)
<b>Fecha de suscripción</b>	14/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$310.625.154.993,00
<b>Adiciones</b>	\$14.002.090.382,00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$324.627.245.375,00
<b>Meta física contratada</b>	Pavimentación 25 KM Alcantarillas: 126 Box Culvert: 17 Atención sitios críticos: 8

<b>No. contrato de interventoría</b>	1015/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT. No. 901.481.447-1
<b>Fecha de suscripción</b>	18/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$27.599.988.100,00
<b>Adiciones</b>	\$997.909.618,00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$28.597.897.718,00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 32,22% a fecha 19/02/2026

La obra espera finalizar el 31/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

**Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo**

Mejoramiento y/o pavimentación: 46 Km; Gestión predial, social y ambiental y mantenimiento del corredor

### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2017011000301
<b>Ejecutor</b>	INVIAS
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$370.249.700.000,00

### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor total</b>	<b>\$370.249.700.000,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>370.249.700.000,00</b>

### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	978/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO VIAS NACIONALES NIT. 901.474.028-8
<b>Fecha de suscripción</b>	13/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2029
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2029
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$322.790.128.920,00
<b>Adiciones</b>	\$20.059.840.972,00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$342.849.969.892,00
<b>Meta física contratada</b>	58 KM PAVIMENTACIÓN, 115 KM MANTENIMIENTO PERIÓDICO, 46 KM ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

<b>No. contrato de interventoría</b>	1038/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA NIT. No. 901.479.577-2
<b>Fecha de suscripción</b>	21/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2029
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2029
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$27.399.730.108,00
<b>Adiciones</b>	\$0,00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$27.399.730.108,00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 43,76% a fecha 27/02/2026

La obra espera finalizar el 31/08/2029

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá

via primaria mejorada

### Información general del contrato

BPIN	2018011000507
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$468.001.705.342,00

### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$468.001.705.342,00	\$0,00	\$0,00	468.001.705.342,00

### Contratación derivada

No. contrato de obra	973/2021
Contratista	T. BOYACÁ LCP
Fecha de suscripción	20/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2029
Fecha terminación actual	31/08/2029
Valor inicial contrato de obra	\$358.871.764.334,00
Adiciones	\$75.020.046.680,00
Valor actual contrato de obra	\$433.891.811.014,00
Meta física contratada	0,7 KM SEGUNDA CALZADA, 48 KM PAVIMENTACIÓN, 33 KM REHABILITACIÓN, 27 SITIOS CRÍTICOSM 378 KM MANTENIMIENTO PERIODICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS

<b>No. contrato de interventoría</b>	962/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO ECOVISION-188
<b>Fecha de suscripción</b>	5/08/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	14/08/2029
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2029
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$29.999.894.328,00
<b>Adiciones</b>	\$4.110.000.000,00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$34.109.894.328,00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 43,08% a fecha 25/02/2026

La obra espera finalizar el 31/08/2029

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

### Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena

Mejoramiento del corredor vial en pavimento flexible, en una longitud total de 85.85 kilómetros, mediante intervención por tramos.

Tramos a intervenir: PR8+250 al PR19+100 (Pamplona y Labateca) PR21+000 al PR58+000 (Labateca y Toledo) PR77+000 al PR115+000 (Toledo)

#### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2018011000444
<b>Ejecutor</b>	INVIAS
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$426.550.465.706,00

#### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor total</b>	<b>\$426.550.465.706,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>426.550.465.706,00</b>

#### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	0988/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063 NIT. 901.476.429-7
<b>Fecha de suscripción</b>	21/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	30/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$362.133.900.815,00
<b>Adiciones</b>	\$34.431.480.639,00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$396.565.381.454,00
<b>Meta física contratada</b>	47 KM PAVIMENTACIÓN, 3 ATENCIÓN DE SITIO CRÍTICO, 185 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO, ESTUDIOS Y DISEÑOS

<b>No. contrato de interventoría</b>	1013/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188 NIT. No. 901.479.769-1
<b>Fecha de suscripción</b>	21/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	30/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$28.799.979.413,00
<b>Adiciones</b>	\$1.185.104.839,00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$29.985.084.252,00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 28,10% a fecha 18/02/2026

La obra espera finalizar el 31/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

### Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa

Via primaria mejorada Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa

#### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2018011000034
<b>Ejecutor</b>	INVIAS
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$581.930.164.184,00

#### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor total</b>	<b>\$581.930.164.184,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>581.930.164.184,00</b>

#### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	989/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO VIAL MHC 063 NIT 901.475.859-6
<b>Fecha de suscripción</b>	13/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	30/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	30/08/2030
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$465.288.090.475,00
<b>Adiciones</b>	\$81.219.803.174,00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$546.507.893.649,00
<b>Meta física contratada</b>	Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45A CND, 6.58Km. Construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05, 12 Km Mantenimiento del corredor vial Zipaquirá- Barbosa-Bucaramanga 344Km Atención a emergencia Cerros el Picacho 1 0,38 Km

<b>No. contrato de interventoría</b>	971/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO ICEACSA - TPF NIT No. 901.480.695-5
<b>Fecha de suscripción</b>	5/12/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	30/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	30/08/2030
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$33.499.857.438,00
<b>Adiciones</b>	\$1.922.413.097,00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$35.422.270.535,00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 56,18% a fecha 19/02/2026

La obra espera finalizar el 30/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>
