

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

14/01/2021 <small>Fecha suscripción</small>	5 <small>Plazo en años</small>	14/01/2026 <small>Fecha de Terminación</small>	13 <small>Meses para vencimiento</small>	79% <small>% Tiempo Transcurrido</small>
104 <small>Total Proyectos</small>	23 <small>Proyectos FRPT</small>	81 <small>Proyectos Otras Fuentes</small>	\$3.515.203 <small>Valor Indicativo (Millones)</small>	
\$2.365.998 <small>Aporte indicativo nación (Millones)</small>		\$1.124.872 <small>Aporte indicativo territorio (Millones)</small>		\$24.333 <small>Aporte indicativo otros (Millones)</small>

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	\$138.191	\$128.651	\$9.540	\$0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$114.686	\$60.056	\$54.630	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$163.000	\$126.500	\$36.500	\$0
Cultura	\$160.458	\$0	\$160.458	\$0
Defensa y Policía	\$74.560	\$74.560	\$0	\$0
Deporte y Recreacion	\$100.405	\$99.604	\$801	\$0
Educacion	\$230.339	\$56.000	\$150.005	\$24.333
Inclusion Social y Reconciliacion	\$66.049	\$66.049	\$0	\$0
Justicia y Del_Derecho	\$222.786	\$222.786	\$0	\$0
Minas y Energia	\$229.890	\$139.076	\$90.814	\$0
Salud y Proteccion Social	\$32.834	\$0	\$32.834	\$0
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$132.696	\$132.696	\$0	\$0
Transporte	\$1.516.011	\$1.007.496	\$508.515	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$308.914	\$252.524	\$56.390	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$0	\$24.385	\$0
Total	\$3.515.203	\$2.365.998	\$1.124.872	\$24.333

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Comprometido Total	Consolidado Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	\$31.191	\$21.651	\$9.540	\$0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$71.922	\$48.932	\$22.990	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$101.764	\$101.764	\$0	\$0

Cultura	\$190.194	\$0	\$190.194	\$0
Defensa y Policía	\$74.560	\$74.560	\$0	\$0
Deporte y Recreacion	\$106.632	\$81.273	\$25.359	\$0
Educacion	\$213.742	\$56.000	\$133.408	\$24.333
Inclusion Social y Reconciliacion	\$66.082	\$66.049	\$33	\$0
Justicia y Del_Derecho	\$208.456	\$208.456	\$0	\$0
Minas y Energia	\$147.075	\$86.017	\$48.328	\$12.730
Salud y Proteccion Social	\$32.834	\$0	\$32.834	\$0
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$143.540	\$143.540	\$0	\$0
Transporte	\$1.728.508	\$1.129.338	\$599.170	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$154.635	\$72.272	\$82.363	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$24.385	\$0	\$24.385	\$0
Total	\$3.295.518	\$2.089.851	\$1.168.604	\$37.063


Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

93,75%

\$3.295.518

Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado

Número de Proyectos por Estado

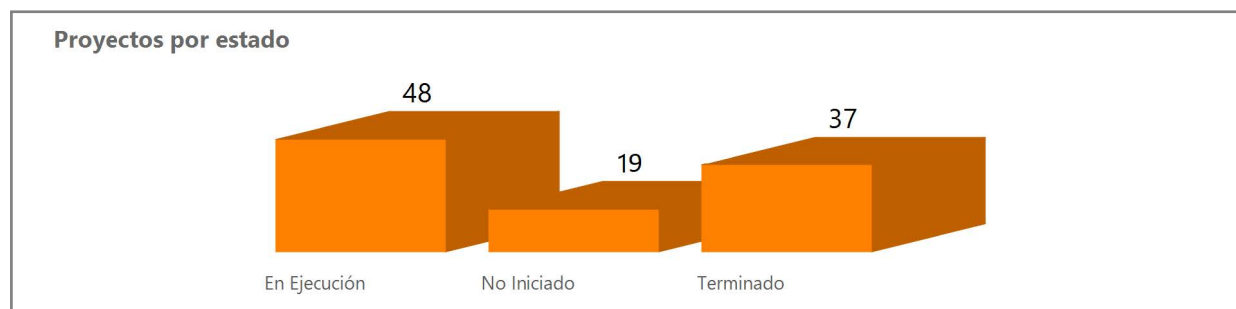

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)	\$302.328	\$189.804	\$112.524	\$0
En Ejecución	Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu)	\$284.974	\$284.974	\$0	\$0

En Ejecución	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar (Grupo I)	\$195.642	\$144.867	\$50.775	\$0
En Ejecución	Cárcel de Riohacha	\$184.786	\$184.786	\$0	\$0
En Ejecución	Infraestructura educativa	\$150.005	\$0	\$150.005	\$0
En Ejecución	Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar	\$146.458	\$0	\$146.458	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo III)	\$94.684	\$87.847	\$6.837	\$0
En Ejecución	Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar	\$80.333	\$56.000		\$24.333
En Ejecución	Tramo Florida - Cuestecitas	\$75.000	\$0	\$75.000	\$0
En Ejecución	Policía Metropolitana de Valledupar	\$74.560	\$74.560	\$0	\$0
En Ejecución	Proyecto solar Uribia	\$72.121	\$72.121	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción Adecuación y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecón, Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira	\$70.000	\$70.000	\$0	\$0
En Ejecución	Conectividad y transformación digital Departamento de Cesar	\$69.487	\$69.487	\$0	\$0
En Ejecución	Conectividad y transformación digital departamento de La Guajira	\$63.209	\$63.209	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar	\$50.000	\$50.000	\$0	\$0

En Ejecución	Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar	\$45.720	\$45.720	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello	\$43.212	\$0	\$43.212	\$0
En Ejecución	Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira	\$32.928	\$0	\$32.928	\$0
En Ejecución	Atención extramural	\$32.834	\$0	\$32.834	\$0
En Ejecución	Construcción de una Marina Multipropósito en Riohacha, Distrito Especial Turístico y Cultural, La Guajira	\$32.000	\$32.000	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar	\$30.407	\$30.407	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento vial de la ruta folclórica mediante la construcción de pavimento en asfalto entre el Municipio de Villanueva y la zona agrícola de Veracruz, Municipio de San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira	\$28.885	\$28.885	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.	\$28.562	\$28.562	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento Aeropuerto Hacaritama	\$28.000	\$21.000	\$7.000	\$0

En Ejecución	Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	\$24.859	\$24.859	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramamiento urbanístico y obras complementarias en los municipios de hatonuevo y el molino departamento de La Guajira	\$24.385	\$0	\$24.385	\$0
En Ejecución	Mejoramamiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure BC	\$19.846	\$0	\$19.846	\$0
En Ejecución	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	\$19.036	\$19.036	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramamiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo Llerasca del municipio de Agustín Codazzi	\$18.298	\$0	\$18.298	\$0
En Ejecución	Ejecución de estudios, diseños construcción y apuesta en funcionamiento del proyecto de abastecimiento de agua mediante el esquema de pilas publicas, en el sector de La Guajira zona industrial-municipio de Uribia	\$16.339	\$11.283	\$5.057	\$0
En Ejecución	Mejoramamiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego	\$15.541	\$0	\$15.541	\$0
En Ejecución	Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	\$15.225	\$15.225	\$0	\$0
En Ejecución	Energía convencional Cabo	\$14.000	\$7.000	\$7.000	\$0
En Ejecución	Mejoramamiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira	\$12.797	\$0	\$12.797	\$0

En Ejecución	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	\$12.012	\$12.012	\$0	\$0
En Ejecución	Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar	\$10.496	\$0	\$10.496	\$0
En Ejecución	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	\$10.210	\$10.210	\$0	\$0
En Ejecución	Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaoero del Municipio de San Diego	\$9.540	\$0	\$9.540	\$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de sichichon, municipio de Manaure, La Guajira	\$5.543	\$3.827	\$1.715	\$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de puerto estrella municipio de Uribia	\$5.336	\$3.499	\$1.837	\$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de punta espada municipio de Uribia	\$5.227	\$5.227	\$0	\$0

En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de flor de La Guajira, municipio de Uribia, La Guajira	\$5.105	\$5.105	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira	\$4.669	\$4.669	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de la gloria, municipio de Manaure, La Guajira	\$4.552	\$3.143	\$1.409	\$0
En Ejecución	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	\$4.036	\$4.036	\$0	\$0
En Ejecución	Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el Departamento del del Cesar.	\$3.764	\$2.232	\$1.532	\$0
En Ejecución	Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey	\$3.498	\$2.116	\$1.383	\$0
En Ejecución	Construcción de puente vehicular sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva – Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0
No Iniciado	Distrito de Riego San Juan	\$107.000	\$107.000	\$0	\$0

No Iniciado	Ampliación PTAR sobre río Cesar. Valledupar	\$100.000	\$100.000	\$0	\$0
No Iniciado	Erosión Costera Dibulla	\$41.729	\$0	\$41.729	\$0
No Iniciado	Energía Solar del Sur	\$40.000	\$40.000	\$0	\$0
No Iniciado	Segunda Torre del Palacio de Justicia de Valledupar	\$38.000	\$38.000	\$0	\$0
No Iniciado	Centro de Energía Renovables	\$30.000	\$0	\$30.000	\$0
No Iniciado	Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores del distrito de Riohacha	\$28.251	\$18.363	\$9.888	\$0
No Iniciado	Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi	\$23.027	\$0	\$23.027	\$0
No Iniciado	Amoblamiento de Espolones	\$18.000	\$18.000	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de la junta, la peña y curazao, en el municipio de san juan (departamento de La Guajira)	\$15.152	\$10.152	\$5.000	\$0
No Iniciado	Mercados de Maicao	\$15.000	\$0	\$15.000	\$0
No Iniciado	Mercados de Riohacha	\$15.000	\$0	\$15.000	\$0
No Iniciado	Archivo departamental	\$14.000	\$0	\$14.000	\$0
No Iniciado	Muelles de Cabotaje (4 municipios sin Riohacha, Dibulla, Manaure y dos en Uribia)	\$13.000	\$6.500	\$6.500	\$0
No Iniciado	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de El Molino-departamento de La Guajira	\$6.260	\$6.260	\$0	\$0
No Iniciado	Optimización hidráulica acueducto Hatonuevo	\$4.822	\$2.893	\$1.929	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San Diego	\$2.664	\$2.664	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción De Pavimento En Concreto Rígido De Las Calles Y Carreras Del Municipio De Pueblo Bello - Cesar	\$2.030	\$2.030	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumani, Departamento del del Cesar.	\$2.559	\$1.517	\$1.041	\$0

Terminado	Mejoramiento a través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada Valledupar-Puente Rafael Escalona-La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Paz-Cuestecitas, en los departamentos del Cesar y La Guajira	\$108.013	\$108.013	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Cuatro vientos Codazzi en el Departamento de Cesar, en marco del Programa de Obras Publica "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Modulo 2.	\$53.185	\$53.185	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira	\$33.353	\$0	\$33.353	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi	\$33.241	\$0	\$33.241	\$0
Terminado	Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril	\$24.501	\$0	\$24.501	\$0
Terminado	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	\$19.955	\$19.955	\$0	\$0
Terminado	Juegos Bolivarianos - Coliseo Multifuncional Oscar Muñoz Oviedo.	\$18.331	\$18.331	\$0	\$0
Terminado	Construcción De Patinódromo En El Municipio De La Jagua De Ibirico, Departamento Del Cesar	\$18.219	\$18.219	\$0	\$0

Terminado	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera El Carmen - Valledupar - Maicao. Transversal Carmen - Bosconia - Valledupar - Maicao. Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira	\$13.885	\$13.885	\$0	\$0
Terminado	Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - Departamento del del Cesar	\$13.707	\$8.129	\$5.578	\$0
Terminado	Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi	\$13.079	\$0	\$13.079	\$0
Terminado	Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en la zona rural de diferentes municipios del Departamento de Cesar	\$12.900	\$0	\$12.900	
Terminado	Construcción De Estadio Municipal Edison Mejia En El Municipio De La Paz, Departamento Del Cesar	\$12.694	\$12.000	\$694	\$0
Terminado	Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.	\$11.226	\$11.226	\$0	\$0
Terminado	Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar	\$11.211	\$7.738	\$3.473	\$0
Terminado	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar	\$10.995	\$10.995	\$0	\$0

Terminado	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, Departamento del Cesar	\$10.211	\$6.055	\$4.155	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril	\$9.848	\$0	\$9.848	\$0
Terminado	Construcción de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento del Cesar	\$9.600	\$9.600	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira	\$9.570	\$0	\$9.570	\$0
Terminado	Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar	\$9.365	\$9.365	\$0	\$0
Terminado	Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar	\$7.807	\$0	\$7.807	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira	\$6.855	\$0	\$6.855	\$0
Terminado	Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure	\$6.290	\$0	\$6.290	\$0
Terminado	Construcción del parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.	\$5.707	\$5.600	\$107	\$0

Terminado	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, Departamento del Cesar	\$4.659	\$2.763	\$1.896	\$0
Terminado	Construcción de obras para el control de inundación y erosión en los arroyos Kutanamana y Chemerrain en el municipio de Uribia departamento de La Guajira	\$4.397	\$4.397	\$0	\$0
Terminado	Desarrollo de acciones para la protección y recuperación de la biodiversidad del ecosistema de la Serranía del Perijá en el municipio de Codazzi, Cesar	\$3.846	\$3.846	\$0	\$0
Terminado	Construcción de canal abierto en concreto rígido para evitar las inundaciones en el sector nororiental del casco urbano de San Juan del Cesar - La Guajira	\$3.323	\$3.323	\$0	\$0
Terminado	Recuperación hidrodinámica y ambiental del caño Paraluz como estrategia de recuperación de la ciénaga mata de palma, en el municipio de El Paso y Chiriguaná, Cesar	\$3.310	\$3.310	\$0	\$0
Terminado	Actualización Estudios y Diseños Distrito de Riego San Juan y Ranchería	\$2.615	\$2.615	\$0	\$0
Terminado	Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca 2802-03 del río Chiriaimo y Manaure en el Departamento de Cesar	\$2.165	\$2.165	\$0	\$0
Terminado	Estudios y diseños mejoramiento pavimentación carretera Cuatro Vientos Codazzi Dto. Cesar	\$2.035	\$2.035	\$0	\$0
Terminado	Restauración de áreas degradadas en las microcuencas del río Magiriaimo, jurisdicción de CorpoCesar	\$1.862	\$1.862	\$0	\$0
Terminado	Construcción de 121 unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa del municipio de Gamarra	\$1.834	\$1.834	\$0	\$0

Terminado	Implementación de acciones de adaptación al cambio climático en el edificio bioclimático y el CAVFFS, sedes de CorpoCesar en el marco del PIGCCT del Departamento de Cesar	\$1.381	\$1.381	\$0	\$0
Terminado	Estudios y diseños fase 3 para la construcción de terminales, torre de control, base SEI y obras complementarias del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, Cesar	\$1.086	\$1.086	\$0	\$0
Total		\$3.515.203	\$2.365.998	\$1.124.872	\$24.333

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

23 Total Proyectos	\$1.050.059 Valor Indicativo (Millones)		
\$854.789 Aporte indicativo DNP FRPT	\$170.937 Aporte indicativo territorio	\$0 Aporte indicativo Sector	\$24.333 Aporte indicativo Otros
15 Proyectos En Ejecución /Ejecutados	\$1.162.523 Presupuesto Comprometido (Millones)		

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar	En Ejecución	\$80.333	\$56.000		\$0	\$24.333
Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar	En Ejecución	\$50.000	\$50.000	\$0	\$0	\$0
Construcción de una Marina Multipropósito en Riohacha, Distrito Especial Turístico y Cultural, La Guajira	En Ejecución	\$32.000	\$32.000	\$0	\$0	\$0
Construcción de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento del Cesar	Terminado	\$9.600	\$9.600	\$0	\$0	\$0

Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar	Terminado	\$10.995	\$10.995	\$0	\$0	\$0
Construcción Adecuación y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecón, Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$70.000	\$70.000	\$0	\$0	\$0
Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	En Ejecución	\$24.859	\$24.859	\$0	\$0	\$0
Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	En Ejecución	\$4.036	\$4.036	\$0	\$0	\$0
Construcción De Estadio Municipal Edison Mejia En El Municipio De La Paz, Departamento Del Cesar	Terminado	\$12.694	\$12.000	\$694	\$0	\$0
Construcción del parque recreacional-cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.	Terminado	\$5.707	\$5.600	\$107	\$0	\$0
Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	Terminado	\$19.955	\$19.955	\$0	\$0	\$0

Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	En Ejecución	\$12.012	\$12.012	\$0	\$0	\$0
Construcción De Patinódromo En El Municipio De La Jagua De Ibirico, Departamento Del Cesar	Terminado	\$18.219	\$18.219	\$0	\$0	\$0
Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar	En Ejecución	\$30.407	\$30.407	\$0	\$0	\$0
Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar	Terminado	\$9.365	\$9.365	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar (Grupo I)	En Ejecución	\$195.642	\$144.867	\$50.775	\$0	\$0
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo III)	En Ejecución	\$94.684	\$87.847	\$6.837	\$0	\$0
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)	En Ejecución	\$302.328	\$189.804	\$112.524	\$0	\$0

Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	En Ejecución	\$10.210	\$10.210	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.	Terminado	\$11.226	\$11.226	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.	En Ejecución	\$28.562	\$28.562	\$0	\$0	\$0
Construcción de puente vehicular sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva – Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira	En Ejecución	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0	\$0
Etapas II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	En Ejecución	\$15.225	\$15.225	\$0	\$0	\$0
Total		\$1.050.059	\$854.789	\$170.937	\$0	\$24.333

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Cesar-La-Guajira.aspx>

ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción del parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$5.707

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En Liquidación

Estado Detallado

\$5.600

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$107

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	Pueblo Bello
BPIN	2021205700033	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	069-2210652	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	59	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	27/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción parque recreacional con área a intervenir de 12.857m2 que consta de una cancha de futbol de 6.174 m2, con grama natural y graderías con capacidad para 363 personas aproximadamente, gimnasio biosaludable, juegos de niños, andenes de circulaciones peatonal, zonas verdes, parqueaderos, infraestructura para servicios complementarios como: Baterías sanitarias, oficina administrativa, camerinos, cuarto técnico o de bombas, cuarto eléctrico y deposito.	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	1
		Número de personas

Información específica de ejecución contrato específico

13/10/2021

Fecha de Suscripción

5/01/2022

Fecha de Inicio

19

Plazo en Meses

5/08/2023

Fecha Terminación

1.459

Número de Beneficiarios

\$5.600

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$107

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$5.707

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

5/08/2023


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%


% Ejecutado

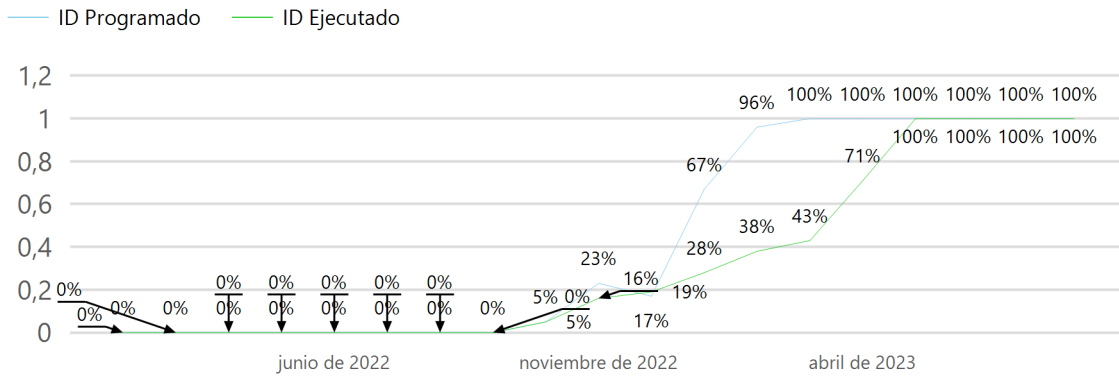

Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$5.600 Valor Programado (mill)	100% % Programado
\$5.568 Valor Ejecutado (mill)	99% % Ejecutado

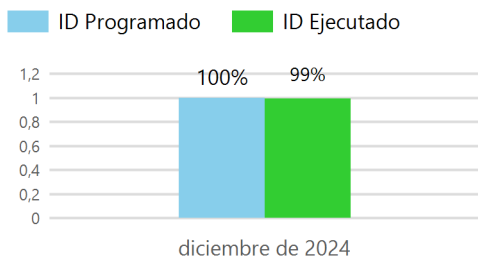

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar
(Grupo I)

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$195.642

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$144.867

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$50.775

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Departamento de Cesar
BPIN	2021002200118	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	070-2210657	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	98	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	11/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar las condiciones de rodadura en ocho (8) vías terciarias de siete (7) municipios de la zona norte y centro del departamento, equivalentes a 88.49 km intervenidos	Vía terciaria mejorada	88,49 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

13/10/2021

Fecha de Suscripción

1/04/2022

Fecha de Inicio

38

Plazo en Meses

1/06/2025

Fecha Terminación

329.245

Número de Beneficiarios

\$144.867

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$63.422

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$208.289

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

1/10/2024


Fecha de Corte Avance

97%

% Programado

92%

% Ejecutado

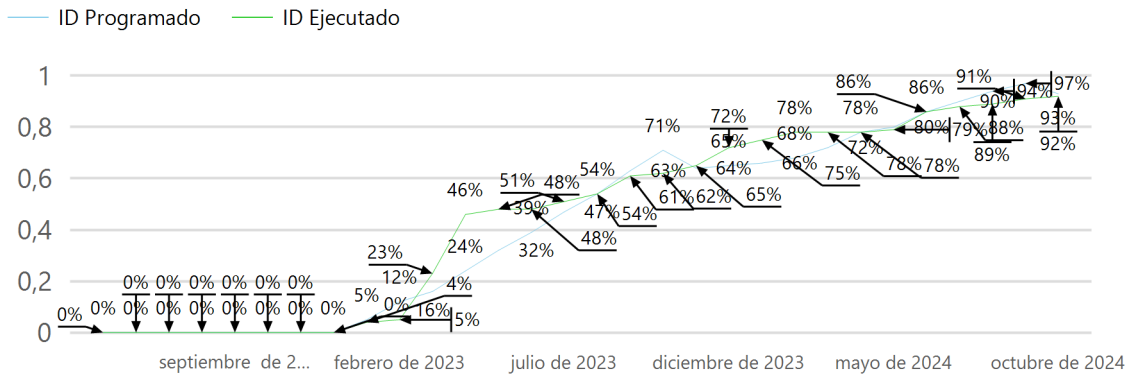

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción De Estadio Municipal Edison Mejia En El Municipio De La Paz,
Departamento Del Cesar**

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$12.694

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$12.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$694

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	La Paz
BPIN	2021206210028	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	075-2210678	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	61	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	16/07/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un estadio de futbol con la intervención de áreas libres 26.580,52 metros cuadrados, áreas cubiertas 889.97 metros cuadrados y tribunas con un aforo para 1.170 personas aproximadamente, para beneficiar a 21.391 personas.	Cancha construida	1
		Número de canchas

Información específica de ejecución contrato específico

21/10/2021

Fecha de Suscripción

6/05/2022

Fecha de Inicio

29

Plazo en Meses

6/10/2024

Fecha Terminación

29.603

Número de Beneficiarios

\$12.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$4.358

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$16.358

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/10/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

98%

% Ejecutado

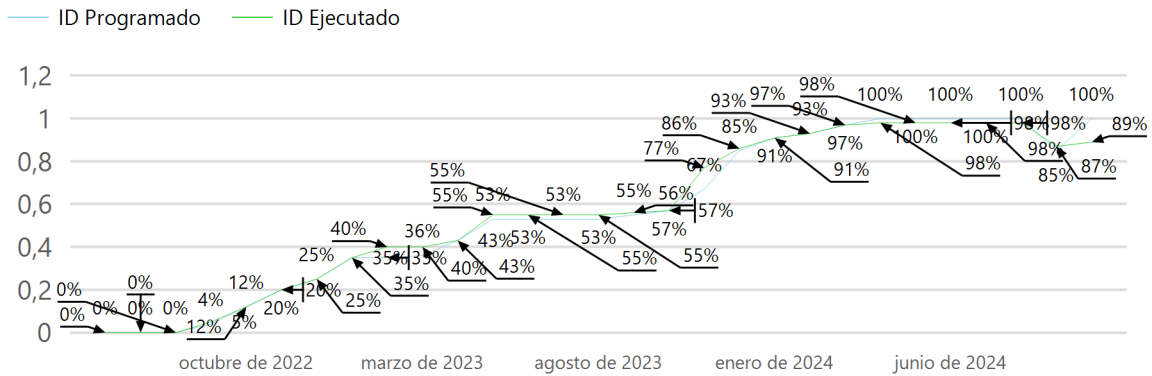

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$10.995

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$10.995

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	Chimichagua
BPIN	2021201750026	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	078-2210702	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	60	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	20/10/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de escenarios deportivos en 25.797,68 m2 que consta de cancha de futbol en grama sintética, pista de patinaje de velocidad ruta con sus respectivas graderías, áreas de integración de los escenarios deportivos, juegos infantiles y gimnasio biosaludable al aire libre, parqueadero	Parque recreo-deportivo construido y dotado	1
		Número de parques recreo-deportivos

Información específica de ejecución contrato específico

2/11/2021

Fecha de Suscripción

26/11/2021

Fecha de Inicio

33

Plazo en Meses

31/08/2024

Fecha Terminación

14.530

Número de Beneficiarios

\$10.995

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$10.995

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

26/07/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

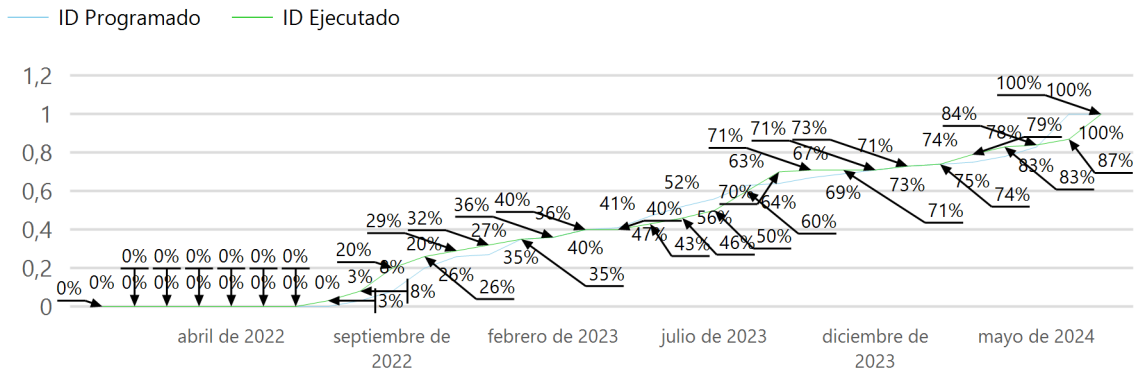


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$10.995
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

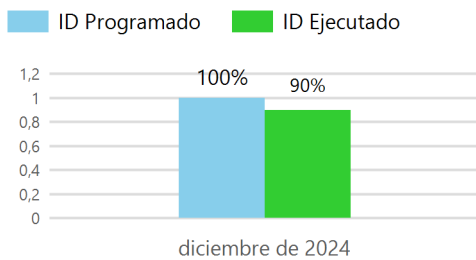

\$9.895
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción de escenarios deportivos en el municipio de El Paso,
departamento del Cesar**

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$9.600

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$9.600

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	El Paso
BPIN	2021202500031	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	082-2210723	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	62	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	27/09/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un escenario deportivo el cual consta de un (1) patinódromo y gradería, una (1) cancha de fútbol y gradería, instalaciones eléctricas e iluminación zonas exteriores – andenes, juego de niños, gimnasio bio-saludable, zonas verdes, cerramiento exterior, para beneficiar a 5.379 habitantes.	Parque recreo-deportivos construidos	1
		Número de parques recreo-deportivos

Información específica de ejecución contrato específico

9/11/2021

Fecha de Suscripción

29/12/2021

Fecha de Inicio

34

Plazo en Meses

15/10/2024

Fecha Terminación

7.422

Número de Beneficiarios

\$9.600

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$32

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$9.632

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

29/09/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

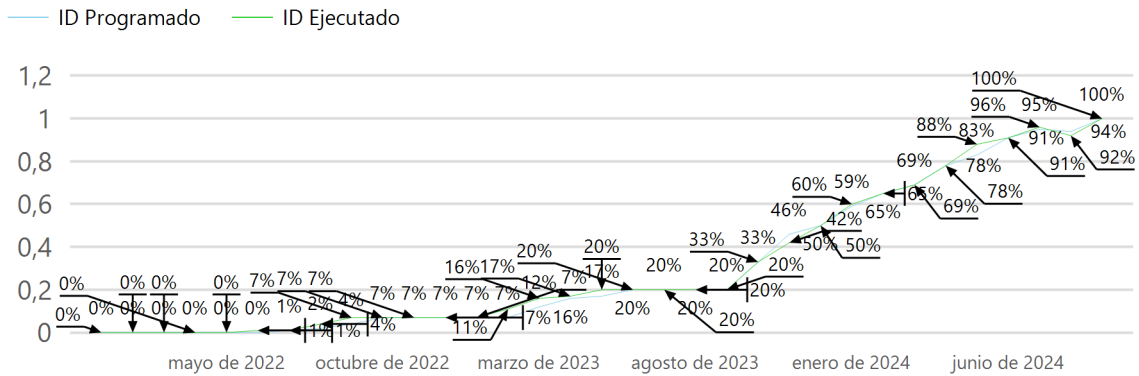

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico


\$19.955 Valor Indicativo del Proyecto (millones)		En Liquidación Estado Detallado	
\$19.955 Aporte DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte Territorio (millones)	\$0 Otros Aporte (millones)
Sector de Inversión	Minas y Energia	Municipio Intervención	Uribia(La Guajira), Riohacha(La Guajira), Maicao(La Guajira), Manaure (La Guajira)
BPIN	2020002440062	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	093-2210739	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	87	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	06/08/2021
Alcance	Suministro instalación y puesta en funcionamiento de 1.122 soluciones de energía solar fotovoltaica en los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia, para beneficiar a 4.488 habitantes.	Producto Principal	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas
		Meta del Producto	1122 unidades

Información específica de ejecución contrato específico


11/11/2021 Fecha de Suscripción	3/01/2022 Fecha de Inicio	19 Plazo en Meses	3/08/2023 Fecha Terminación	4.488 Número de Beneficiarios
\$19.955 Pto Comprometido DNP FRPT	\$0 Pto Comprometido Sector	\$0 Pto Comprometido Territorio	\$0 Pto Comprometido Otros	
\$19.955 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

3/08/2023 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	100% % Ejecutado
------------------------------------	----------------------	---------------------

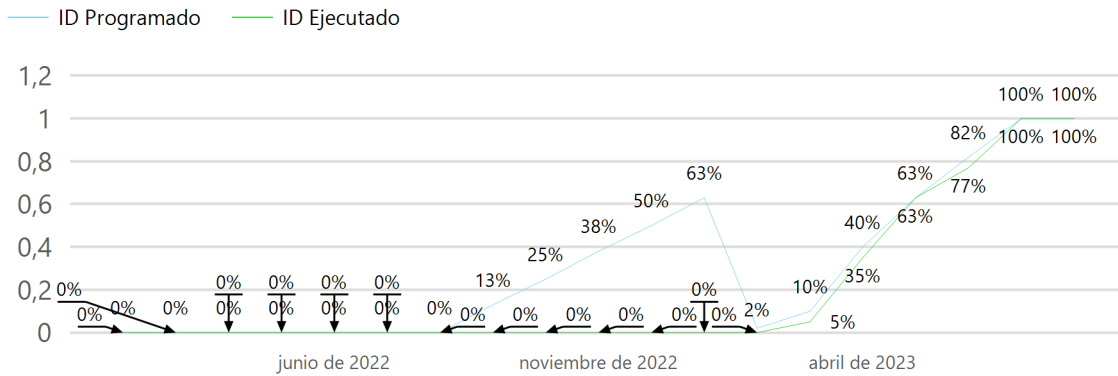

Avance Financiero del proyecto

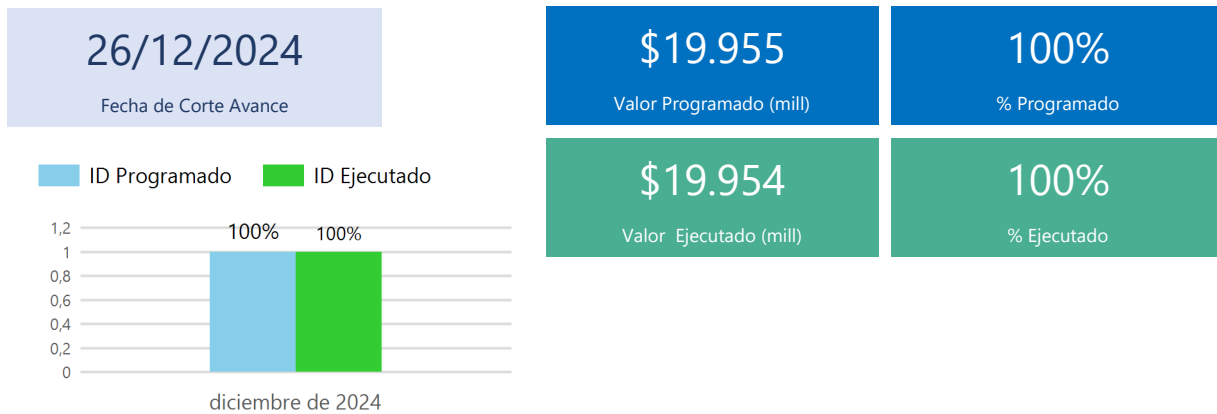

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$302.328

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$189.804

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$112.524

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Departamento de Cesar
BPIN	2021002200129	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	094-2210740	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	99	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	11/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar seis corredores viales con una longitud total de 127.74	Vía terciaria mejorada	127,74 Kilometros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

11/11/2021

Fecha de Suscripción

1/04/2022

Fecha de Inicio

38

Plazo en Meses

1/06/2025

Fecha Terminación

329.245

Número de Beneficiarios

\$189.804

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$208.936

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$398.740

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

1/10/2024


Fecha de Corte Avance

95%

% Programado

75%

% Ejecutado

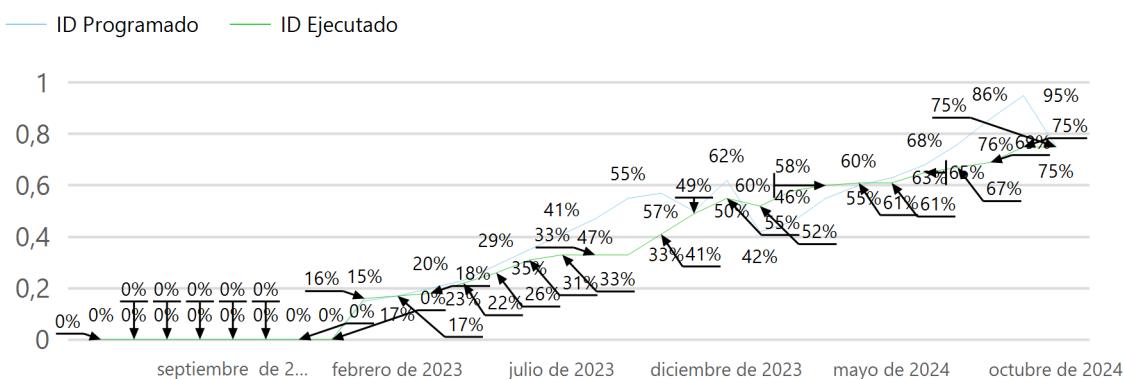


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$189.804
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

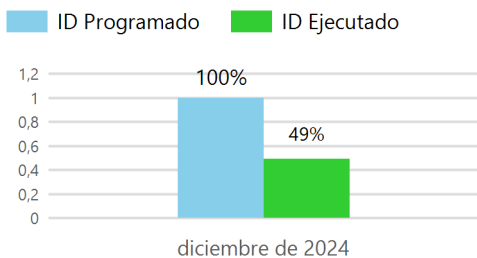

\$93.669
Valor Ejecutado (mill)

49%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$80.333

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$56.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

Aporte Territorio (millones)

\$24.333

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Educacion	Municipio Intervención	La Paz
BPIN	2021206210067	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	105-2210716	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	75	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	12/10/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz", se ejecutará un (1) bloque de aulas laboratorio para imagen y sonido, un (1) bloque de aulas laboratorio para visualización, análisis de datos y GIScience, un (1) bloque de aulas laboratorio para inteligencia artificial y percepción remota; la construcción de estos bloques incluye la generación de los siguientes espacios: 30 salas de estudio, 1 restaurante con capacidad para 240 personas, 1 cocina, 6 puntos fijos con cuartos técnicos y zonas de servicio y Áreas comunes y zonas de circulación, para beneficiar a 1.112 habitantes.	Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas (Producto principal del proyecto)	1 unidades

Información específica de ejecución contrato específico

2/12/2021

Fecha de Suscripción

4/02/2022

Fecha de Inicio

36

Plazo en Meses

19/02/2025

Fecha Terminación

1.053.000

Número de Beneficiarios

\$56.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$24.333

Pto Comprometido Otros

\$80.333

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

4/10/2024


Fecha de Corte Avance

99%

% Programado

81%

% Ejecutado

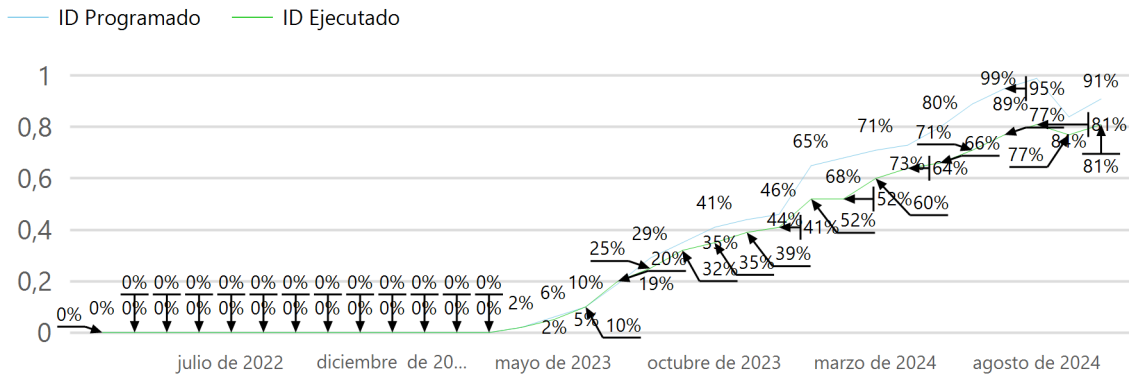

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$24.859

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$24.859

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	Urumita
BPIN	2021448550077	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	119-2220696	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	72	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	11/11/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construir los espacios deportivos que constan de: Construcción de 1 pista del patinaje, 1 cancha de futbol, 1 pista de atletismo, 1 cancha multifuncional para básquet, voleibol, cancha futbol sala y 1 cancha futbol cinco; senderos de caminata, plazas de reunión, jardines arborizados y áreas comerciales para la autosostenibilidad. Área a intervenir aproximada de 52.483,26 m2	Parques recreativos construidos y dotados	1 Número de parques

Información específica de ejecución contrato específico

18/07/2022

Fecha de Suscripción

12/08/2022

Fecha de Inicio

29

Plazo en Meses

12/01/2025

Fecha Terminación

6.887

Número de Beneficiarios

\$24.859

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$24.859

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

12/11/2024


Fecha de Corte Avance

72%

% Programado

71%

% Ejecutado

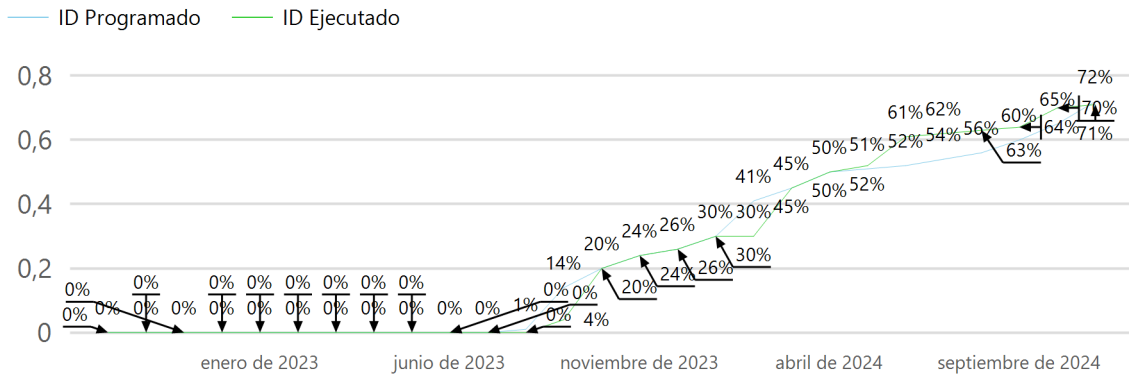

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción De Patinódromo En El Municipio De La Jagua De Ibirico,
Departamento Del Cesar

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$18.219

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$18.219

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	La Jagua de Ibirico
BPIN	2022204000035	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	131-2220889	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	63	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	29/06/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un Patinódromo Profesional y cancha de futbol 5 con área deportiva, área de servicios y área recreativa, para beneficiar a 329.245 habitantes	Pistas construidas (Producto principal del proyecto)	1
		unidades

Información específica de ejecución contrato específico

17/08/2022

Fecha de Suscripción

2/12/2022

Fecha de Inicio

22

Plazo en Meses

2/10/2024

Fecha Terminación

50.946

Número de Beneficiarios

\$18.219

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$18.219

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

2/09/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

97%

% Ejecutado

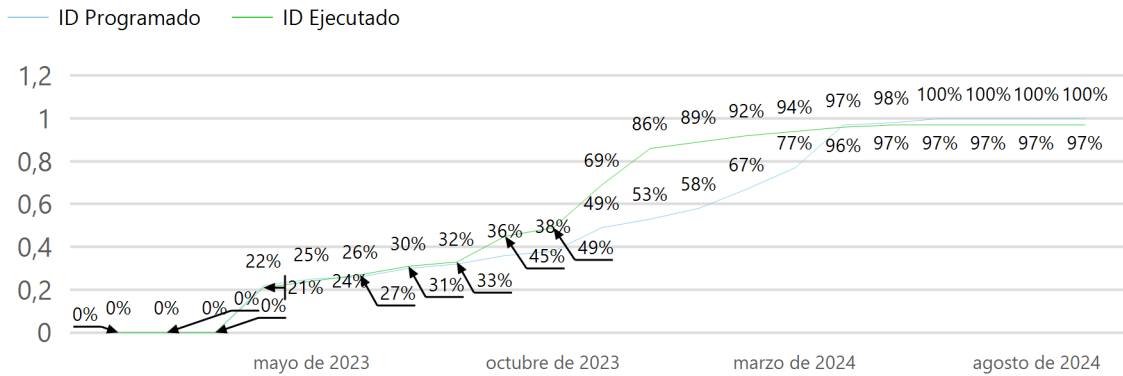


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$18.219
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

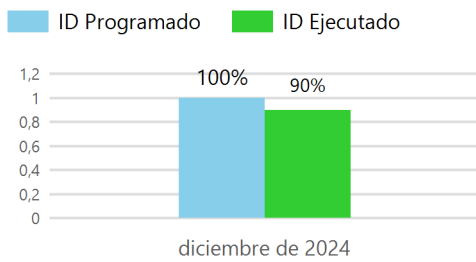

\$16.400
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$10.210

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$10.210

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Departamento de La Guajira
BPIN	2022448550050	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	132-2220890	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	94	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	10/03/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>El proyecto consiste en la construcción de 6.67 km de tramos viales en los municipios de Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva Y San Juan Del Cesar, en el departamento de La Guajira específicamente en:</p> <p>URUMITA: 1 K6+254.12 K6+383.39 129.270 2 K6+603.79 K6+863.34 259.550 3 K7+655.92 K8+832.91 1176.990 TOTAL 1565.810</p> <p>LA JAGUA DEL PILAR: 1 K0+000.00 K1+236.28 1236.280 TOTAL 1236.280</p> <p>EL MOLINO: 1 K0+000.00 K1+284.39 1284.390 TOTAL 1284.390</p> <p>VILLANUEVA: 1 K0+000.00 K1+560.09 1560.090 TOTAL 1560.090</p> <p>SAN JUAN DEL CESAR: 1 K0+000.00 K1+025.30 1025.300 TOTAL 1025.300</p> <p>El proyecto en cuestión incluye las siguientes actividades: *CONTROL Y MEDICIÓN PERMANENTE (COMISIÓN DE TOPOGRÁFICA). *ESTRUCTURAS DE DRENAJE. *PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO. *PLACA HUELLA</p>	Vía terciaria mejorada	6,67 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

17/08/2022

Fecha de Suscripción

10/10/2022

Fecha de Inicio

28

Plazo en Meses

24/02/2025

Fecha Terminación

101.180

Número de Beneficiarios

\$10.210

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

Pto Comprometido Sector

\$10.210

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

10/12/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

23%

% Ejecutado

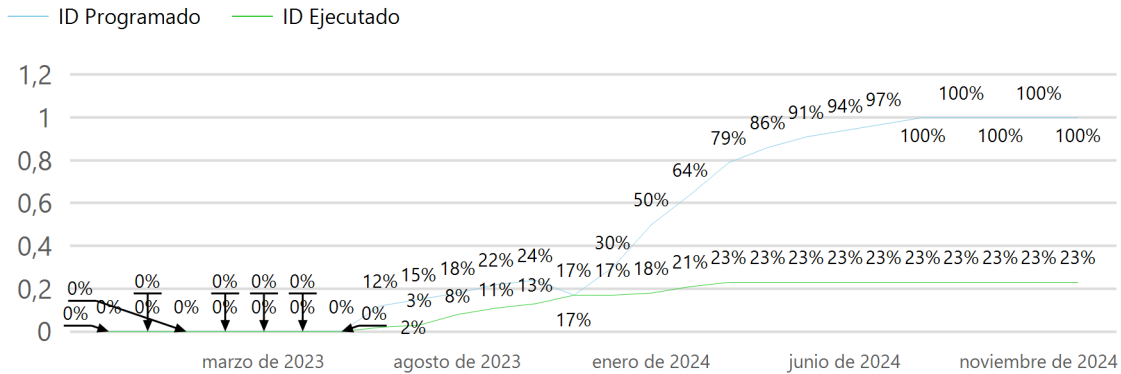

Avance Financiero del proyecto

26/12/2024

Fecha de Corte Avance

\$10.210

Valor Programado (mill)

100%


% Programado

\$4.063

Valor Ejecutado (mill)

40%

% Ejecutado

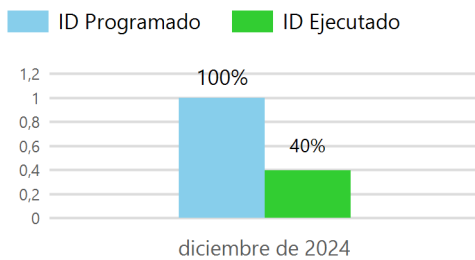

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$15.225

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$15.225

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Villanueva
BPIN	2022448740020	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	134-2220940	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	147	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	28/07/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 5,730 kilómetros de pavimento en Asfalto en el tramo Veracruz - corregimiento de San Juan del Cesar y Badillo - corregimiento de Valledupar. Para ello se ejecutaran las siguientes actividades: 1- EXPLANACIONES Y PRELIMINARES. 2- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT 1,5X1,5 3- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT 1X1 4- CANAL SEMICIRCULAR 5- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT DOBLE DE 2X3 6- PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO 7- OBRAS DE PROTECCIÓN 8- SEÑALIZACIÓN	Vía terciaria mejorada	5,73 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

19/08/2022

Fecha de Suscripción

31/10/2022

Fecha de Inicio

27

Plazo en Meses

1/01/2025

Fecha Terminación

29.704

Número de Beneficiarios

\$15.221

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$15.221

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

1/10/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

5%

% Ejecutado

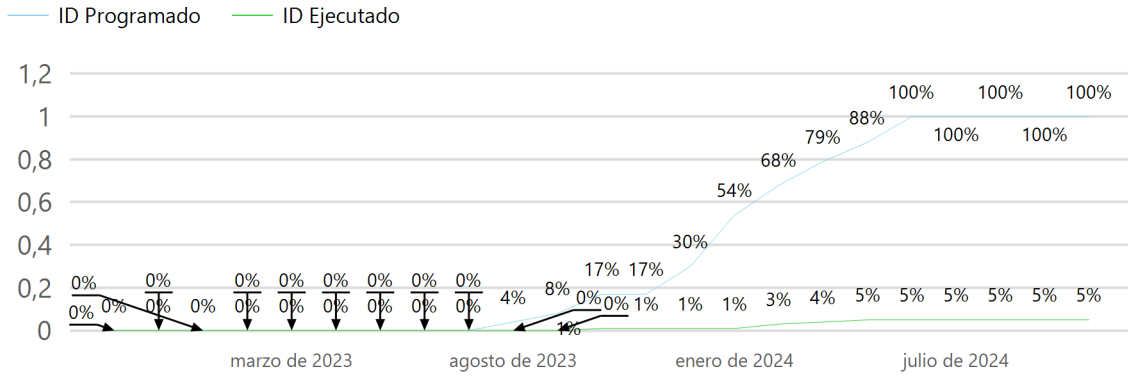

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$4.036

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$4.036

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Inclusion Social y Reconciliacion	Municipio Intervención	Valledupar
BPIN	2021200010085	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	135-2220939	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	82	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	27/09/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un centro de desarrollo infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar, que albergará 250 niños entre 0 y 5 años en los estratos 0, 1 y 2 de la comuna 4 y que beneficiará a 3.000 habitantes.	Centros regionales de atención a víctimas restaurados (Producto principal del proyecto)	1
		Número de centros

Información específica de ejecución contrato específico

22/08/2022

Fecha de Suscripción

4/11/2022

Fecha de Inicio

27

Plazo en Meses

4/02/2025

Fecha Terminación

3.000

Número de Beneficiarios

\$4.036

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$4.036

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

4/10/2024


Fecha de Corte Avance

91%

% Programado

91%

% Ejecutado

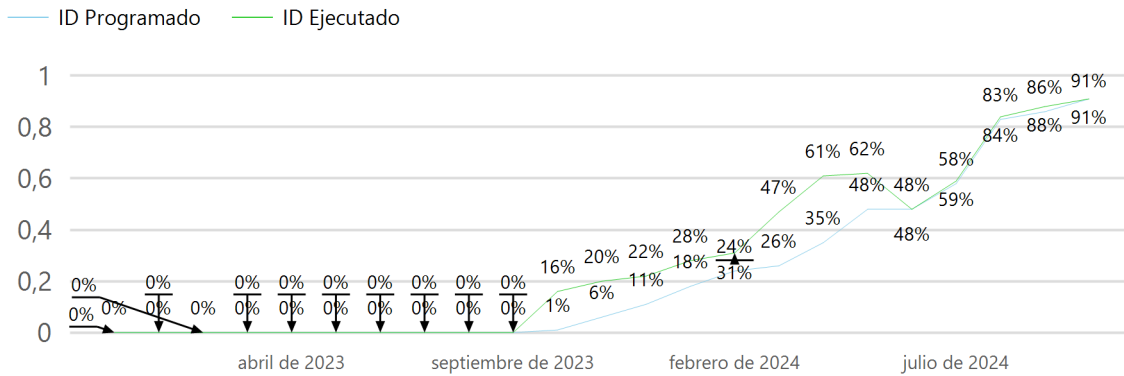

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$9.365

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$9.365

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	La Gloria
BPIN	2021203830069	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	139-2221129	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	39	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	18/02/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Fortalecer el talud y proteger contra el riesgo de inundación, contemplando la construcción de 430 metros lineales de estructura en concreto de 4000 PSI para proteger contra inundación.	Obras para la prevención y control de inundaciones	430
		Metros lineales de estructura

Información específica de ejecución contrato específico

24/10/2022

Fecha de Suscripción

9/12/2022

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

30/05/2024

Fecha Terminación

15.543

Número de Beneficiarios

\$9.365

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$9.365

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

9/05/2024


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

100%

% Ejecutado

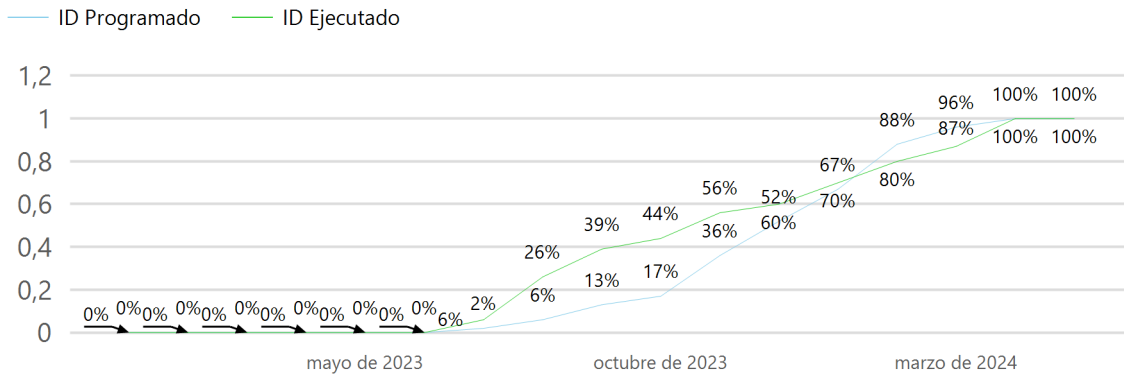

Avance Financiero del proyecto

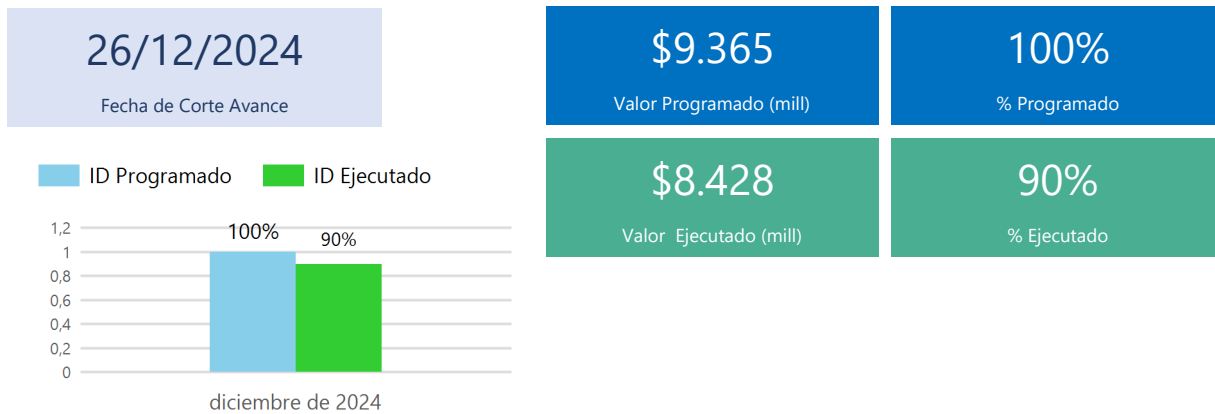

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$30.407

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$30.407

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	La Gloria
BPIN	2021203830068	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	140-2221130	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	40	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	19/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 6.180,00 ml de dique como estructura de protección del casco urbano del municipio de la Gloria y de 200,00 m de muro en geocontenedor como protección de la orilla derecha del cauce del río Simaña. Obras de dragado a lo largo de los 6.180,00 m objeto de intervención.	Obras para la prevención y control de inundaciones	6180
		Longitud de sección hidráulica

Información específica de ejecución contrato específico

24/10/2022

Fecha de Suscripción

6/12/2022

Fecha de Inicio

28

Plazo en Meses

6/04/2025

Fecha Terminación

6.596

Número de Beneficiarios

\$30.407

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$30.407

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/12/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

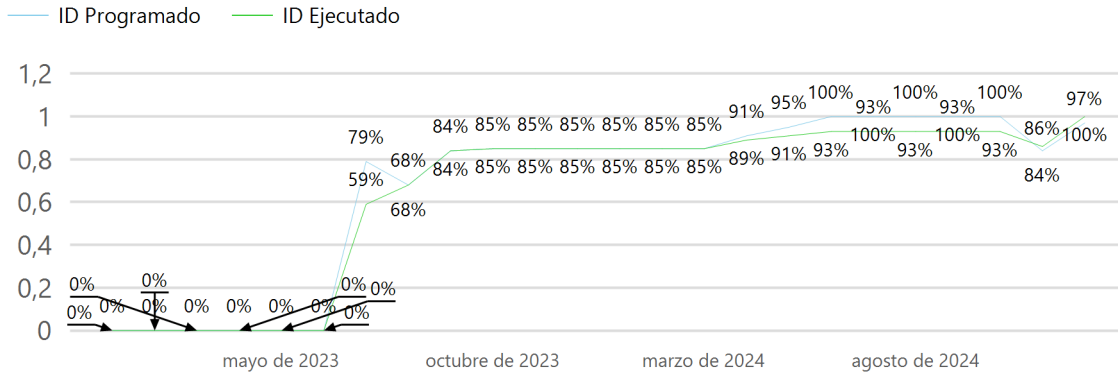


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$30.407
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

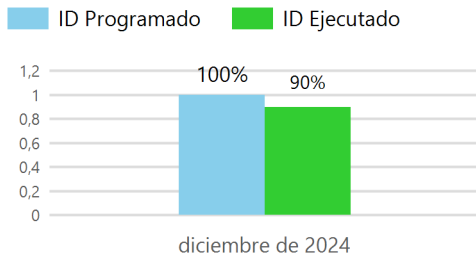

\$27.367
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo III)

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$94.684

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$87.847

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$6.837

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Departamento de Cesar
BPIN	2021002200141	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	144-2221131	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	100	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	04/06/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar la condiciones de rodadura de sietes vías terciarias en seis municipios con un total de longitud de 64.84 km	Vía terciaria mejorada	64,84 Kilometros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

24/10/2022

Fecha de Suscripción

6/02/2023

Fecha de Inicio

23

Plazo en Meses

6/01/2025

Fecha Terminación

329.245

Número de Beneficiarios

\$87.847

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$6.837

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$94.684

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/12/2024


Fecha de Corte Avance

96%

% Programado

77%

% Ejecutado

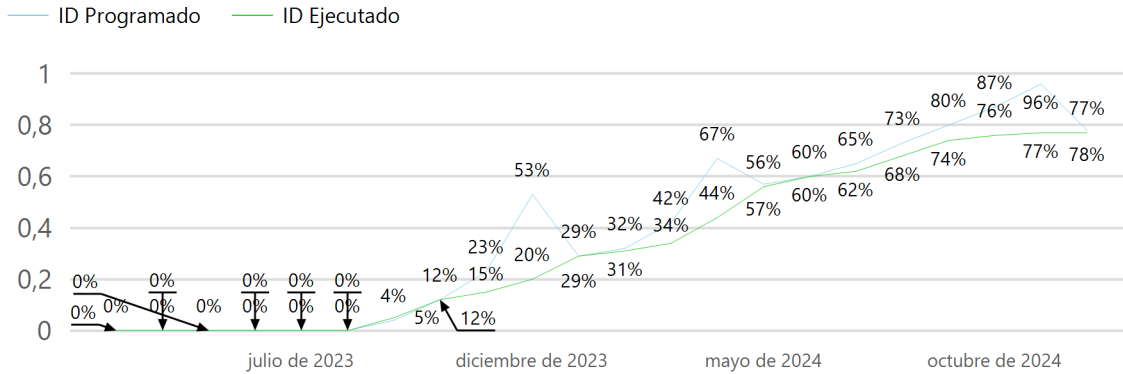

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$11.226

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$11.226

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Departamento de La Guajira
BPIN	2022442790035	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	146-2221136	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	95	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	10/03/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>El proyecto consiste en la construcción de 6,36 km de tramos viales en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo Y Albania, en el departamento de La Guajira específicamente en:</p> <p>Barrancas- Fonseca: K0+000.00 - K2+590 Distracción: K0+0.00 - K1+020.00 Hatonuevo: K0+000.00 - K1+391 Albania: K0+000.00 - K1+353</p> <p>El proyecto en cuestión incluye las siguientes actividades: CONTROL Y MEDICIÓN PERMANENTE (COMISIÓN DE TOPOGRÁFICA). ESTRUCTURAS DE DRENAJE. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO. PLACA HUELLA</p>	Vía terciaria mejorada	6,37 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

27/10/2022

Fecha de Suscripción

11/01/2023

Fecha de Inicio

24

Plazo en Meses

11/01/2025

Fecha Terminación

157.188

Número de Beneficiarios

\$11.226

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$11.226

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

11/08/2024


Fecha de Corte Avance

99%

% Programado

100%

% Ejecutado

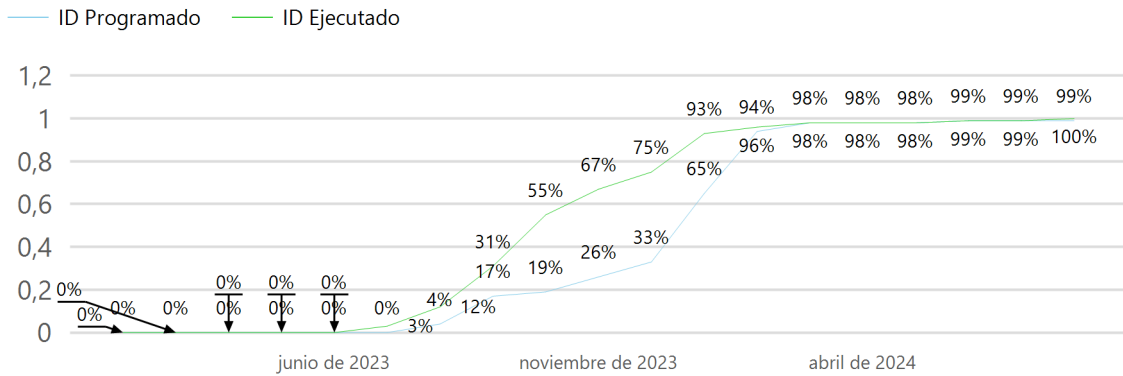

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes
Valledupar**

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$50.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$50.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Inclusion Social y Reconciliacion	Municipio Intervención	Valledupar
BPIN	2022200010097	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	147-2221139	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	83	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	01/07/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una galería de vendedores con 354 locales , zona de parqueaderos, bloque administrativo y plazoleta para beneficiar a 484.453 habitantes	Plaza de mercado construida. 354 LOCLAES, con más de 9200 m2 construidos	1 unidades

Información específica de ejecución contrato específico

27/10/2022

Fecha de Suscripción

30/12/2022

Fecha de Inicio

31

Plazo en Meses

30/07/2025

Fecha Terminación

484.453

Número de Beneficiarios

\$50.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$50.000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

30/10/2024


Fecha de Corte Avance

70%


% Programado

69%

% Ejecutado

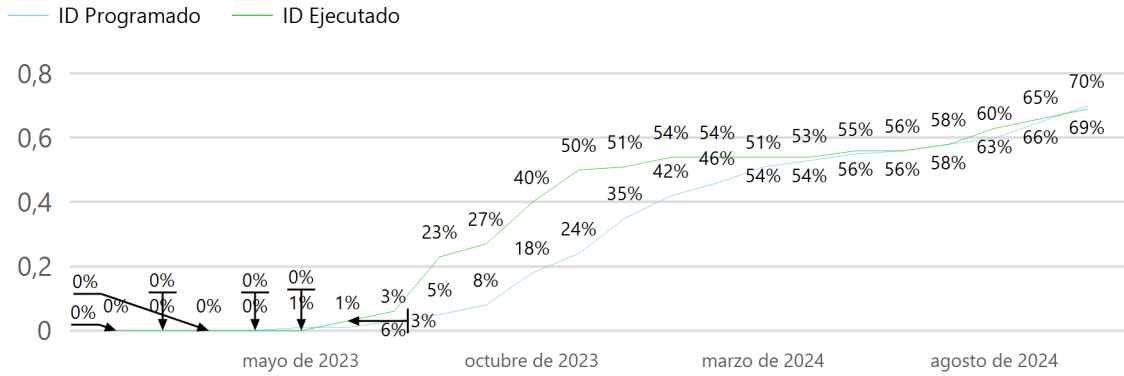

Avance Financiero del proyecto

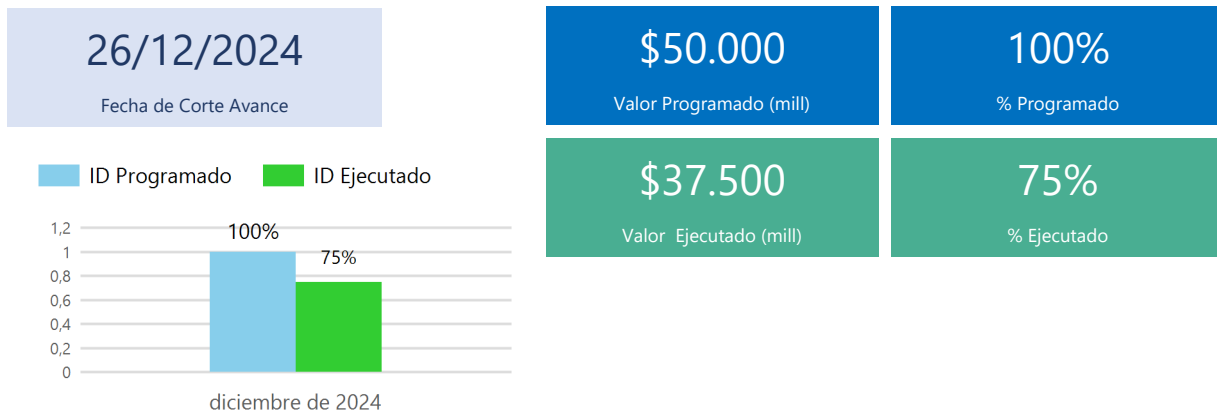

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$28.562

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$28.562

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Departamento de La Guajira
BPIN	2021002200141	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	153-2221173	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	96	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	24/10/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>El proyecto consiste en la construcción de 13,74 km de tramos viales en los Municipios de Maicao, Riohacha, Dibulla y Uribia, en el departamento de La Guajira, específicamente en:</p> <p>Maicao: alcance de 4.72 K.M Riohacha: - Las Palmas: alcance de 0.942 K.M. - La Gloria: alcance de 0.706 K.M. - Mongui: alcance de 2.991 K.M. Dibulla: alcance de 0.983 K.M. Uribia: Poportin: alcance de 3.4 K.M.</p> <p>El proyecto en cuestión incluye las siguientes actividades: *CONTROL Y MEDICIÓN PERMANENTE (COMISION DE TOPOGRAFIA). *ESTRUCTURAS DE DRENAJE. *PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO. *PLACA HUELLA.</p>	Vía terciaria mejorada	13,74 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

6/12/2022

Fecha de Suscripción

4/05/2023

Fecha de Inicio

28

Plazo en Meses

4/09/2025

Fecha Terminación

445.236

Número de Beneficiarios

\$28.562

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$28.562

Presupuesto Comprometido Total (millones)


Avance físico del proyecto

4/11/2024

40%

22%

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado
-----------------------	--------------	-------------

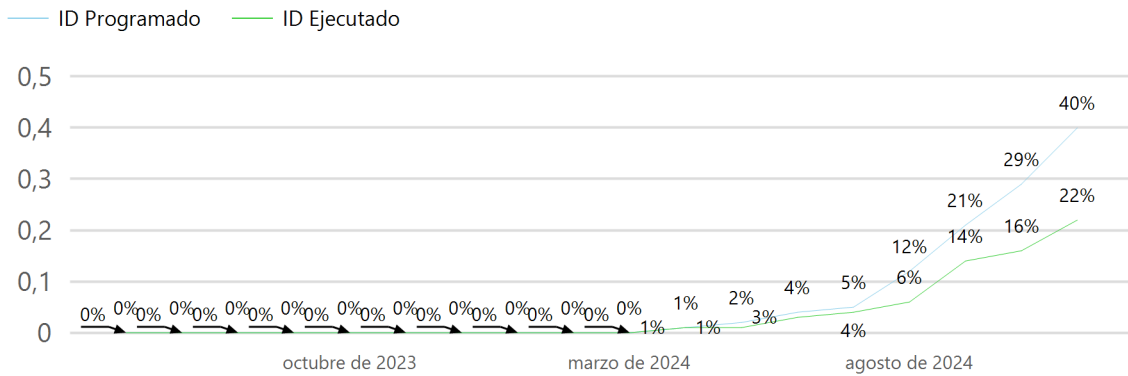

Avance Financiero del proyecto

<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">26/12/2024</p> <p>Fecha de Corte Avance</p>	<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">\$28.562</p> <p>Valor Programado (mill)</p>	<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">100%</p> <p>% Programado</p>
	<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">\$8.568</p> <p>Valor Ejecutado (mill)</p>	<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">30%</p> <p>% Ejecutado</p>

ID Tipo	Porcentaje
ID Programado	100%
ID Ejecutado	30%

diciembre de 2024

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$12.012

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$12.012

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Inclusion Social y Reconciliacion	Municipio Intervención	Pueblo Bello(Cesar), La Paz(Cesar), Manaure(Cesar), San Diego(Cesar)
BPIN	202000020045	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	161-2221182	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	54	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	Fecha viabilidad	17/12/2020

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Fortalecer la oferta institucional de estrategias de innovación empresarial en los municipios de Manaure, Pueblo Bello, Sandiego y La Paz en el Departamento de Cesar mediante resultados como: a) 2.000 personas sensibilizadas y capacitadas en talleres de competencia emprendedora, competencia empresarial y educación financiera; b) inyección de capital semilla que arrojará como resultado 120 empresas creadas, 600 empresas fortalecidas, 40 empresas asociativas creadas; c) 760 planes comerciales formulados; d) participación en 5 ferias y 1 rueda de negocio; y e) seguimiento y monitoreo a las 760 empresas apoyadas.	Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos	760 unidades

Información específica de ejecución contrato específico

21/12/2022

Fecha de Suscripción

13/03/2023

Fecha de Inicio

24

Plazo en Meses

13/03/2025

Fecha Terminación

2.000

Número de Beneficiarios

\$12.012

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$33

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$12.046

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

13/09/2024


Fecha de Corte Avance

97%

% Programado

79%

% Ejecutado

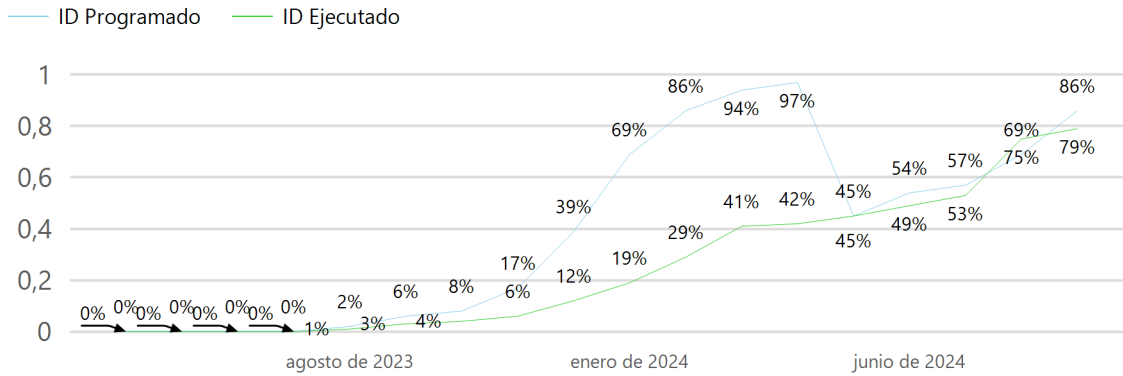


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$12.012
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

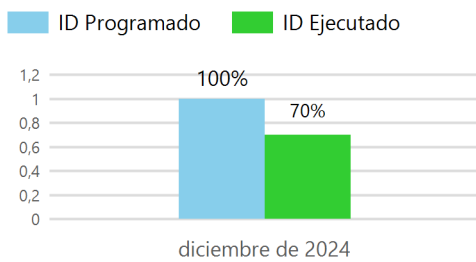

\$8.409
Valor Ejecutado (mill)

70%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de puente vehicular sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva – Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$2.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En legalización de permisos,

Estado Detallado

obra

\$2.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Villanueva
BPIN	2022448740016	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	182-2230150	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	146	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	22/06/2022

Alcance

Producto Principal

Meta del Producto

Puente construido en vía terciaria

1

Número de puentes


Construcción de un (1) puente vehicular L=25M sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva-Veracruz.
 La alternativa propuesta contempla la realización de las siguientes actividades: -EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA
 -RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 (Incluye suministro y transporte)
 -DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
 -PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA
 -CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU, PARA ZAPATAS
 -CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU, PARA TABLERO, VIGAS Y RIOSTRAS.
 -CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU, PARA ESTRIBOS, BORDILLO, ALETAS Y LOSA DE APROXIMACION.
 -CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PARA SOLADO
 -ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa, PARA ZAPATAS, ESTRIBOS, BORDILLO, LOSA DE APROXIMACION, TABLEROS Y VIGAS Y RIOSTRAS.
 -APOYO ELASTOMÉRICO REFORZADO
 -RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
 -GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N
 -BARANDA DE CONCRETO DE 28 MPA
 -PRUEBA DE CARGA
 -GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC
 -LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA CARRILES: 2 ANCHO DE CARRILES 3 M
 NO TIENE BERNA. NO TIENE ANDENES. NO TIENE BARRERA VEHICULAR

Información específica de ejecución contrato específico

23/06/2023 Fecha de Suscripción	4/09/2023 Fecha de Inicio	22 Plazo en Meses	5/07/2025 Fecha Terminación	28.346 Número de Beneficiarios
\$1.914 Pto Comprometido DNP FRPT	\$0 Pto Comprometido Sector	\$0 Pto Comprometido Territorio	\$0 Pto Comprometido Otros	
\$1.914 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

4/01/2024 Fecha de Corte Avance	0% % Programado	0% % Ejecutado
------------------------------------	--------------------	-------------------

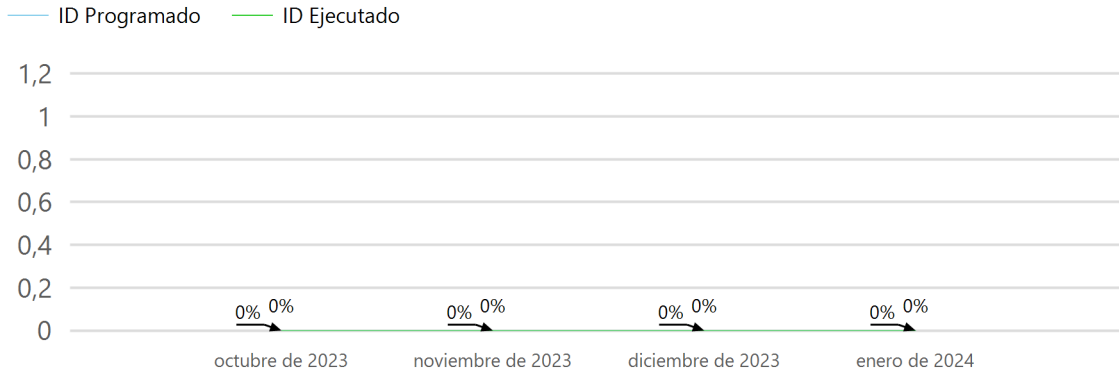

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción Adecuación y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecón,
Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira**

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$70.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$70.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Comercio Industria y Turismo	Municipio Intervención	Riohacha
BPIN	2022002440012	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	191-2230172	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	57	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	5	Fecha viabilidad	16/06/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
La propuesta urbana de la se diseñó bajo los criterios de desarrollo sostenible (social, económico, cultural y ambiental), enfocados en la recuperación y complementación de la infraestructura existente. Se planteó una propuesta general del proyecto en diferentes zonas, delimitadas específicamente por una red articuladora que integre escenarios múltiples preservando el entorno natural y resaltando el carácter histórico y cultural en su misma forma. la construcción adecuación y mejoramiento del urbanismo en un área de 79500 m2 y una longitud de 2.5 kilómetros en una sola planta, que incluirá zonas de deportes, restaurantes, tarima, ciclo ruta, kioscos y parques infantiles, entre otros, ideal para disfrutar de los mágicos atardeceres que ofrece Riohacha.	Espacio publico construido	79500 Metros Cuadrados

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

11/03/2024

Fecha de Inicio

31

Plazo en Meses

11/10/2026

Fecha Terminación

212.314

Número de Beneficiarios

\$69.970

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$69.970

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Fecha de Corte Avance

% Programado

% Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción de una Marina Multipropósito en Riohacha, Distrito Especial
Turístico y Cultural, La Guajira**

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$32.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$32.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Comercio Industria y Turismo	Municipio Intervención	Riohacha
BPIN	2022002440009	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	193-2230174	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	56	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	5	Fecha viabilidad	16/06/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Realizar los estudios requeridos y la preparación del terreno en la playa para desarrollar el proyecto de construcción de La Marina(Prospección arqueológica y ensayos) Realizar el dragado y construcción de 3 espolones de contención en piedra que garantice el funcionamiento de La Marina en esa zona.(Excavaciones y Dragado, espolón de contención, luminaria solar para espolones)Construcción de un muelle fijo de 714 M2 compuesto por rampas de acceso, plataformas y espacios de prestación de servicios y baños que sirvan a los turistas que accedan a la marina ya sea por tierra o por mar.</p> <p>(Cimentación por medio de pilotes, Fabricación de plataforma,acabado, edificación en estructura metálica, fabricación e instalación de rampas de acceso a muelle fijo y barandas en plataforma). Construir muelle flotante que sirva de atracadero a las embarcaciones que arriben a La Marina multipropósito, con un área total de 8.630 m2 con 3 líneas de atraque de embarcaciones o fingers y torretas de servicios para las embarcaciones, cornamusas de amarre e iluminación. Realizar el montaje de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias que permitan garantizar la electricidad, iluminación, baños y agua potable para brindar servicios óptimos a turistas y personal de funcionamiento de La Marina multipropósito. Propender por el buen desarrollo, seguimiento, control y vigilancia de las obras de construcción de la Marina multipropósito garantizando los recursos para realizar la interventoría y cubrir gastos administrativos y otros componentes necesarios para su ejecución (PMA, Bioseguridad Covid, licencia ambiental, Interventoría del proyecto y gastos administrativos y demás tramites técnicos y legales.</p>	Marina construida	1
		UND

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

11/03/2024

Fecha de Inicio

21

Plazo en Meses

11/12/2025

Fecha Terminación

212.314

Número de Beneficiarios

\$31.794

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$31.794

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Fecha de Corte Avance

% Programado

% Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

26/12/2024

Fecha de Corte Avance

\$31.794

Valor Programado (mill)

100%

% Programado


\$6.400

Valor Ejecutado (mill)

20%

% Ejecutado

ID Programado ID Ejecutado



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
