

 Departamento Nacional de Planeación	FICHA TRIMESTRAL PACTOS TERRITORIALES	Página 1 De 10
---	---	----------------

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

7/02/2020 Fecha suscripción	5 Plazo en años	7/02/2025 Fecha de Terminación	1 Meses para vencimiento	98% % Tiempo Transcurrido
75 Total Proyectos	18 Proyectos FRPT	57 Proyectos Otras Fuentes	\$1.394.155 Valor Indicativo (Millones)	
\$1.169.248 Aporte indicativo nación (Millones)	\$224.906 Aporte indicativo territorio (Millones)	\$0 Aporte indicativo otros (Millones)		

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$121.933	\$120.933	\$1.000	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$182.781	\$91.872	\$90.909	\$0
Deporte y Recreacion	\$38.550	\$13.200	\$25.350	\$0
Educacion	\$29.230	\$21.000	\$8.230	\$0
Interior	\$22.509	\$20.928	\$1.581	\$0
Salud y Proteccion Social	\$50.628	\$45.555	\$5.072	\$0
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$5.361	\$0	\$0
Trabajo	\$34.437	\$22.221	\$12.217	\$0
Transporte	\$789.323	\$732.681	\$56.642	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$115.861	\$95.498	\$20.363	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$0	\$3.542	\$0
Total	\$1.394.155	\$1.169.248	\$224.906	\$0

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Comprometido Total	Consolidado Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$110.882	\$109.882	\$1.000	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$122.628	\$72.900	\$49.728	\$0
Deporte y Recreacion	\$40.189	\$8.000	\$32.189	\$0
Educacion	\$28.411	\$21.745	\$6.667	\$0
Interior	\$19.633	\$18.552	\$1.082	\$0
Salud y Proteccion Social	\$46.106	\$41.097	\$5.009	\$0
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$5.361	\$0	\$0

Trabajo	\$1.583	\$1.583	\$0	\$0
Transporte	\$670.286	\$594.852	\$58.994	\$16.440
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$109.962	\$79.984	\$26.497	\$3.481
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.538	\$0	\$3.538	\$0
Total	\$1.158.580	\$953.956	\$184.703	\$19.921


Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

83,10%

\$1.158.580

Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado

Número de Proyectos por Estado

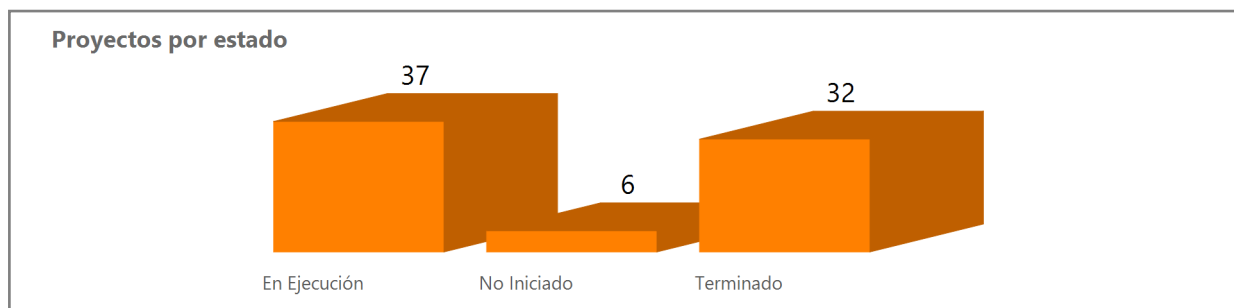

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Construcción para el mejoramiento y ampliación de del aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre.	\$273.745	\$273.745	\$0	\$0
En Ejecución	Corredor Santa Lucía - Moñitos	\$190.000	\$190.000	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre	\$43.000	\$43.000	\$0	\$0
En Ejecución	Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre	\$41.494	\$41.494	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento en pavimento flexible de la vía Tolviejo - San Antonio de Palmito, departamento de Sucre. OCAD PAZ	\$37.431	\$0	\$37.431	\$0

En Ejecución	Construcción de Malecón Turístico de la Segunda Ensenada Fase I en el Municipio de Coveñas	\$31.946	\$29.998	\$1.948	\$0
En Ejecución	Construcción de malecón ecoturístico en la Bahía de Cispatá, municipio de San Antero, departamento de Córdoba	\$26.000	\$26.000	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba	\$24.298	\$24.298	\$0	\$0
En Ejecución	Recuperación ambiental y paisajística de la cuenca del río Sinú y obras para la mitigación de inundaciones y control de procesos erosivos en el municipio de San Bernardo del Viento	\$23.823	\$0	\$23.823	\$0
En Ejecución	Mejoramiento y mantenimiento de la vía que conduce del municipio de Tuchín hasta el límite del municipio de Palmito (Sucre) en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.	\$22.224	\$22.224	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción del complejo deportivo en el municipio de Santa Cruz de Lorica, Departamento de Córdoba	\$21.000	\$0	\$21.000	\$0
En Ejecución	Construcción de obras de recolección y manejo de aguas residuales y optimización del sistema de abastecimiento de agua, construcción de obras para las conexiones hidrosanitarias intradomiciliarias, en las localidades de la Libertad y Sabanetica del municipio de San Onofre, Sucre	\$20.830	\$20.830	\$0	\$0
En Ejecución	Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta el corregimiento del Porvenir, San Antero, Córdoba	\$18.002	\$8.000	\$10.002	\$0

En Ejecución	Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Antonio de palmito Departamento de Sucre del programa Colombia rural – nacional. Vía que conduce del municipio de San Antonio de Palmito al corregimiento Algodoncillo ruta del sombrero vueltaio	\$18.000	\$18.000	\$0	\$0
En Ejecución	Optimización hidráulica y operativa del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de San Bernardo del Viento	\$14.592	\$14.592	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	\$14.549	\$14.549	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor departamental Aguas Negras – Berlín (90CS01)	\$13.000	\$13.000	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Tolú - El francés - Guacamayas	\$10.000	\$10.000	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de parador turístico, en el municipio de San Antero, Departamento de Córdoba	\$9.771	\$7.817	\$1.954	\$0
En Ejecución	Construcción de Unidad Recreo-deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba	\$9.585	\$8.000	\$1.585	\$0
En Ejecución	Estructuración y Compra de Lote Centro Multipropósito en Sucre	\$9.424	\$0	\$9.424	\$0
En Ejecución	Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	\$8.792	\$8.792	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Corregimiento los Gomez	\$8.657	\$8.657	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción Sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre	\$7.818	\$0	\$7.818	\$0

En Ejecución	Construcción y Dotación de una Estación de Bomberos en el Municipio de Tolú	\$7.524	\$7.524	\$0	\$0
En Ejecución	Culminación del mercado público del municipio de San Antero, departamento de Córdoba	\$7.000	\$0	\$7.000	\$0
En Ejecución	Construcción de 261 Unidades Sanitarias dispersas en zona rural del municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba	\$6.666	\$6.666	\$0	\$0
En Ejecución	CAM Santiago de Tolú	\$6.105	\$5.605	\$500	\$0
En Ejecución	Construcción de pavimento rígido en la vía Vereda Nuevo Mundo y Corregimiento Caño Grande en el municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba	\$6.000	\$0	\$6.000	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor departamental Guayabal - Parcelas de Algarrobo y desvío hacia el sector represa de Villeros	\$4.392	\$4.392	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Porvenir - Peñón-Cerro- Petrona- Aserradero	\$3.024	\$3.024	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción del centro de comercio rural zenú, en el municipio de Tuchín córdoba	\$3.000	\$0	\$3.000	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Aserradero - Coveñas	\$2.693	\$2.693	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Villa Fátima - Perpetuo Socorro	\$2.469	\$2.469	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Palmira - Gualon	\$1.267	\$1.267	\$0	\$0
En Ejecución	Centro Sacúdete (1) en San Antero.	\$1.250	\$1.250	\$0	\$0
En Ejecución	Centro Sacúdete (1) en Tolviejo.	\$1.250	\$1.250	\$0	\$0
No Iniciado	Marina del Golfo de Morrosquillo	\$40.000	\$0	\$40.000	\$0
No Iniciado	Ampliación de la sede del SENA en Tolú, Sucre	\$32.637	\$20.637	\$12.000	\$0
No Iniciado	Proyectos de acueducto y alcantarillado para el municipio de Coveñas	\$20.000	\$20.000	\$0	\$0
No Iniciado	Proyectos de prevención y mitigación de erosión costera para el Golfo de Morrosquillo	\$18.520	\$18.520	\$0	\$0

No Iniciado	Construcción del Centro Multipropósito en Sucre.	\$18.000	\$18.000	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de Parque Recreo deportivo en el municipio San Bernardo del Viento Departamento de Córdoba	\$7.965	\$5.200	\$2.765	\$0
Terminado	Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento del puente la Doctrina, departamento de Córdoba.	\$45.072	\$45.072	\$0	\$0
Terminado	Vía Moñitos - San Bernardo del viento y Lorica – Chinú	\$43.198	\$43.198	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y tolú en el departamento de Sucre.	\$41.972	\$41.972	\$0	\$0
Terminado	Megacolegio Heriberto García Garrido en Tolviejo, Sucre	\$29.230	\$21.000	\$8.230	\$0
Terminado	Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, Córdoba.	\$20.482	\$19.482	\$1.000	\$0
Terminado	Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo	\$14.173	\$14.173	\$0	\$0
Terminado	Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera	\$10.123	\$10.123	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Sabaneta – Coveñas	\$10.000	\$10.000	\$0	\$0
Terminado	Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba.	\$8.476	\$5.933	\$2.543	\$0
Terminado	Vía Santiago de Tolú – Coveñas	\$8.000	\$8.000	\$0	\$0
Terminado	Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero	\$7.909	\$6.319	\$1.590	\$0
Terminado	Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento	\$7.524	\$7.524	\$0	\$0

Terminado	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín	\$7.015	\$7.015	\$0	\$0
Terminado	Proyecto Min Tic - Conectividad - Zona digital	\$5.361	\$5.361	\$0	\$0
Terminado	Estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas	\$5.303	\$5.303	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento vías Tolú - El Frances - OCAD PAZ	\$4.911	\$0	\$4.911	\$0
Terminado	Estructuración y compra de lote Hospital Coveñas	\$4.440	\$2.555	\$1.884	\$0
Terminado	Construcción de pavimento rígido en los barrios: Getsemaní, San Pedro, Barrio Nuevo, Las Palmeras y los olivos de la zona urbana del municipio de Tuchín	\$4.300	\$0	\$4.300	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía que comunica la transversal del caribe sector Moñitos San Bernardo del Viento en el sector La Rada municipio de Moñitos Departamento de Córdoba	\$4.000	\$0	\$4.000	\$0
Terminado	Construcción de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en Sucre	\$3.542	\$0	\$3.542	\$0
Terminado	Centro Sacúdete (1) en Tuchín.	\$3.322	\$2.862	\$460	\$0
Terminado	Cofinanciación de Auditorías de cuenta de salud de punto final	\$3.188	\$0	\$3.188	\$0
Terminado	Construcción bulevar Jesús María Lugo, en el municipio de Santa Cruz de Lorica - Córdoba	\$2.778	\$2.222	\$556	\$0
Terminado	Remodelación plaza monumento - Santa Cruz de Lorica	\$1.896	\$1.516	\$381	\$0
Terminado	Estructuración y compra de lote Estación de Bomberos	\$1.808	\$1.187	\$621	\$0
Terminado	Estructuración y compra de lote Ampliación de la sede del SENA en Tolú, Sucre	\$1.800	\$1.583	\$217	\$0
Terminado	Mejoramiento corredor terciario Murcielagal - El Tigre- San Patricio- Mangle**	\$1.603	\$1.603	\$0	\$0

Terminado	Estudios y Diseños para el mejoramiento y ampliación de del aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre.	\$1.430	\$1.430	\$0	\$0
Terminado	Centro Sacúdete No 1 Barrio Los Andes en Lorica.	\$1.250	\$1.250	\$0	\$0
Terminado	Estudios y diseños Puente la Doctrina	\$1.069	\$1.069	\$0	\$0
Terminado	Estructuración Malecón de Coveñas (Segunda Ensenada)	\$915	\$0	\$915	\$0
Terminado	Estructuración Marina del Golfo de Morrosquillo	\$318	\$0	\$318	\$0
Total		\$1.394.155	\$1.169.248	\$224.906	\$0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

18 Total Proyectos	\$311.747 Valor Indicativo (Millones)		
\$285.315 Aporte indicativo DNP FRPT	\$11.432 Aporte indicativo territorio	\$15.000 Aporte indicativo Sector	\$0 Aporte indicativo Otros
10 Proyectos En Ejecución /Ejecutados	\$259.920 Presupuesto Comprometido (Millones)		

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción de Malecón Turístico de la Segunda Ensenada Fase I en el Municipio de Coveñas	En Ejecución	\$31.946	\$29.998	\$1.948	\$0	\$0
Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre	En Ejecución	\$43.000	\$28.000	\$0	\$15.000	\$0
Construcción y Dotación de una Estación de Bomberos en el Municipio de Tolú	En Ejecución	\$7.524	\$7.524	\$0	\$0	\$0
Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero	Terminado	\$7.909	\$6.319	\$1.590	\$0	\$0

Construcción de Unidad Recreo-deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$9.585	\$8.000	\$1.585	\$0	\$0
Construcción de Parque Recreo deportivo en el municipio San Bernardo del Viento Departamento de Córdoba	No Iniciado	\$7.965	\$5.200	\$2.765	\$0	\$0
Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$8.792	\$8.792	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$14.549	\$14.549	\$0	\$0	\$0
Proyectos de acueducto y alcantarillado para el municipio de Coveñas	No Iniciado	\$20.000	\$20.000	\$0	\$0	\$0
Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba	En Ejecución	\$24.298	\$24.298	\$0	\$0	\$0
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín	Terminado	\$7.015	\$7.015	\$0	\$0	\$0

Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento	Terminado	\$7.524	\$7.524	\$0	\$0	\$0
Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Loricá, Córdoba.	Terminado	\$20.482	\$19.482	\$1.000	\$0	\$0
Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre	En Ejecución	\$41.494	\$41.494	\$0	\$0	\$0
Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba.	Terminado	\$8.476	\$5.933	\$2.543	\$0	\$0
Construcción de malecón ecoturístico en la Bahía de Cispatá, municipio de San Antero, departamento de Córdoba	En Ejecución	\$26.000	\$26.000	\$0	\$0	\$0
Construcción de 261 Unidades Sanitarias dispersas en zona rural del municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$6.666	\$6.666	\$0	\$0	\$0
Proyectos de prevención y mitigación de erosión costera para el Golfo de Morrosquillo	No Iniciado	\$18.520	\$18.520	\$0	\$0	\$0
Total		\$311.747	\$285.315	\$11.432	\$15.000	\$0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Golfo-de-Morrosquillo.aspx>

ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de Unidad Recreo-deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$9.585

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$8.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$1.585

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	Moñitos
BPIN	2021235000018	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	079-2210703	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	65	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	27/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un área de 13.380,25 m2. Un espacio destinado a una zona deportiva y recreativa que incluye la construcción de graderías, placa polideportiva, cancha de futbol en arena, cancha de softbol, plaza de acceso principal, locales comerciales y cafetería, baterías sanitarias, zonas verdes y circulaciones.	Centros de recreación construidos y dotados	1
		Número de centros de recreación

Información específica de ejecución contrato específico

2/11/2021

Fecha de Suscripción

18/01/2022

Fecha de Inicio

37

Plazo en Meses

18/02/2025

Fecha Terminación

25.095

Número de Beneficiarios

\$8.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$2.219

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$10.219

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

18/09/2024


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

88%

% Ejecutado

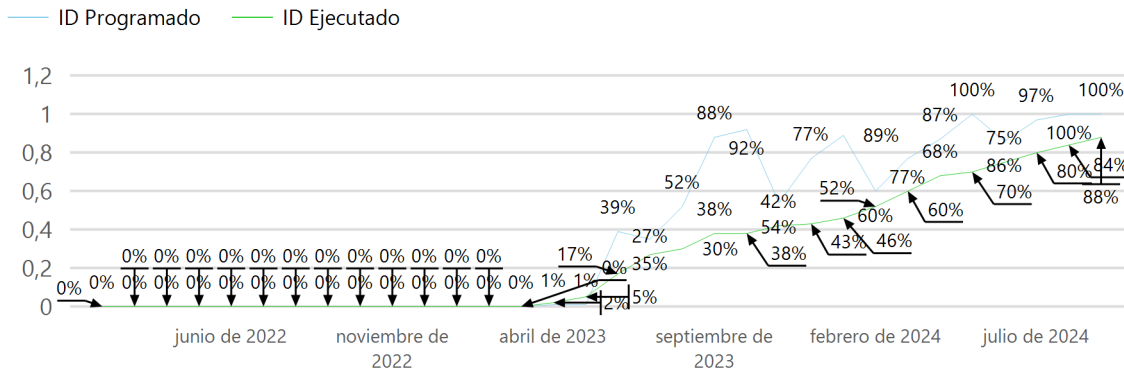

Avance Financiero del proyecto

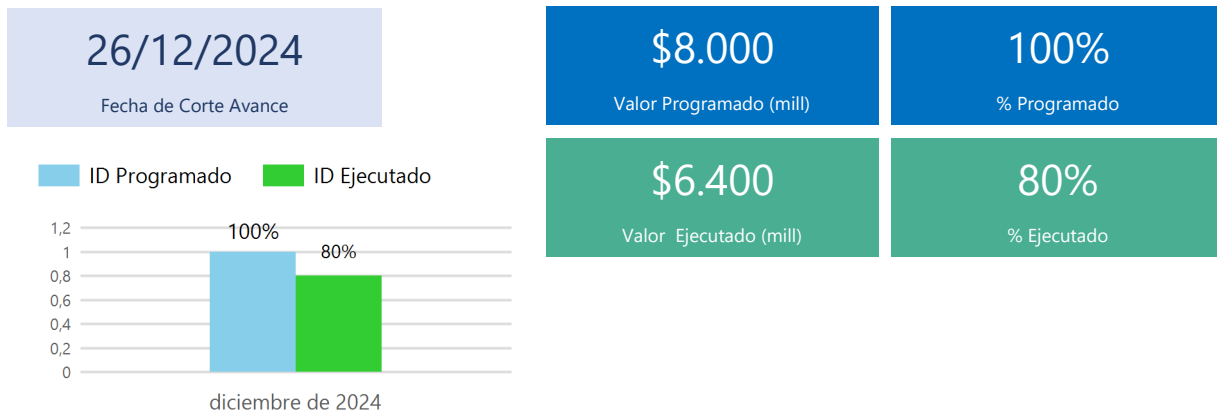

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba.

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$8.476

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$5.933

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$2.543

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Municipio Intervención	Moñitos
BPIN	2021235000010	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	080-2210717	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	108	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	31/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos, departamento de Córdoba, con el siguiente alcance: suministro e instalación de 7.258 ml de tubería PVC sanitario para el alcantarillado de aguas residuales, distribuidos en 6.926 ml de tubería de 8" y 332 ml de tubería de 14", suministro e instalación de 724 acometidas domiciliarias, las cuales están comprendidas por 2.896 ml de tubería en PCV Sanitario de 6", construcción de estación de bombeo de aguas residuales EBAR en el barrio Alfonso López del municipio de Moñitos, línea de impulsión de 30 ml de tubería PEAD DN75mm RED 17 PN 10 desde el EBAR hasta el punto de conexión, 106 pozos de inspección hasta H2.00m, 26 pozos de inspección H 2,0 -3.5m, 2 cámaras de caída, paso subfluvial – cruce de tubería de 8" bajo caño 11,50 ml, a una profundidad de 2,70m; perforación dirigida camisa de 12" en acero Shu. 40, accesorios, paso elevado – cercha metálica para cargue de tubería de impulsión.</p>		

Información específica de ejecución contrato específico

9/11/2021

Fecha de Suscripción

17/12/2021

Fecha de Inicio

33

Plazo en Meses

17/09/2024

Fecha Terminación

25.095

Número de Beneficiarios

\$5.933

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

Pto Comprometido Territorio

\$3.481

Pto Comprometido Otros

\$9.414

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/09/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

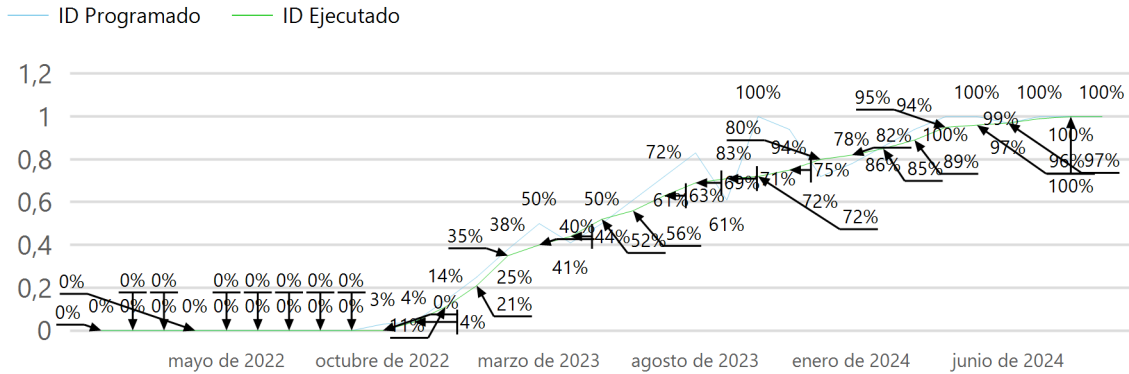

Avance Financiero del proyecto

26/12/2024

Fecha de Corte Avance


\$5.933

Valor Programado (mill)

100%

% Programado

ID Programado ID Ejecutado



\$5.340

Valor Ejecutado (mill)

90%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$7.909

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En Liquidación

Estado Detallado

\$6.319

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$1.590

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Comercio Industria y Turismo	Municipio Intervención	San Antero
BPIN	2021236720128	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	085-2210730	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	55	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	10/01/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto tiene un área total de 4455,83 M2 y consta de dos componentes Construcción de zona cubierta (526,83 M2): incluye baños (28,85 M2), cocina (30,00 M2), zona de administración y oficina (13,80 M2), y Construcción de parqueaderos, accesos y andenes (3929,28 M2): incluye zonas verdes (105,37 M2), pavimento (1495,05 M2), andenes (1047 M2), plazas (73,61 M2), zona de parqueadero (404,40 M2), Rampas (136,46 M2), cicloruta (554 M2), Gimnasio biosaludables (61 M2), Escaleras de Acceso deposito (23,78 M2), plazoleta de comidas (276,40 M2), zona Mirador 2 piso (154,00 M2).	Mirador Turístico Construido	1
		UND

Información específica de ejecución contrato específico

10/11/2021

Fecha de Suscripción

21/01/2022

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

5/06/2023

Fecha Terminación

131.529

Número de Beneficiarios

\$6.319

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$1.580

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$7.899

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

21/06/2023


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

100%

% Ejecutado

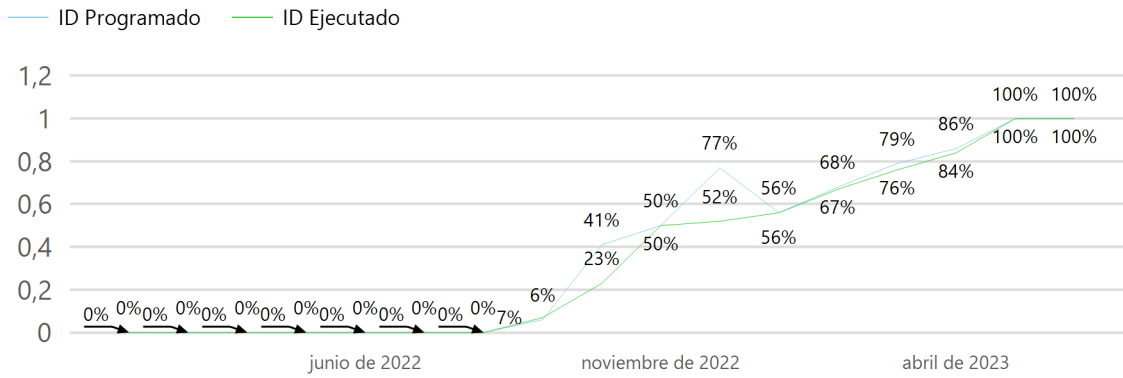

Avance Financiero del proyecto

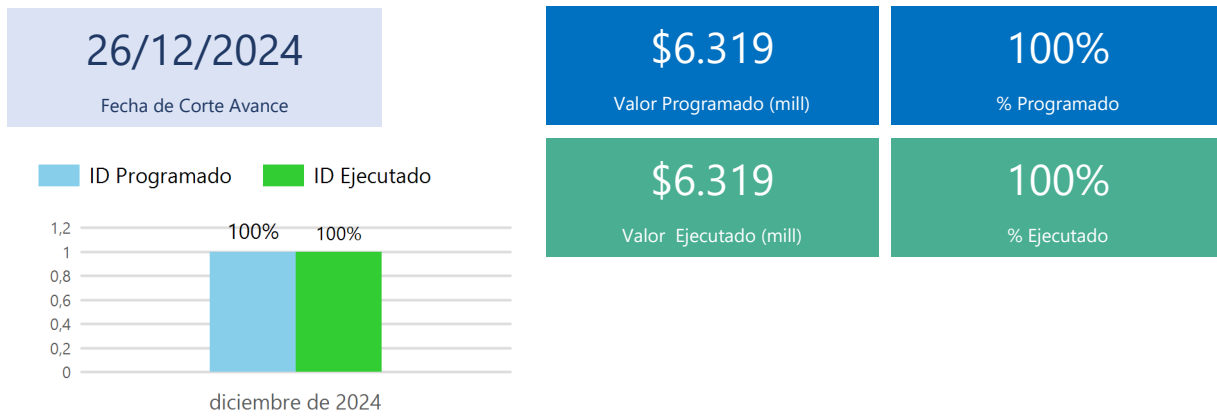

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$14.549

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$14.549

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	San Antero
BPIN	2021236720178	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	089-2210735	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	91	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/08/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 3.925,65 metros de pavimento concreto rígido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de vía de 10.7 metros con una calzada de 6.40 metros de ancho incluye señalización vertical y horizontal, anden con bordillo de 1.80 metros de ancho y una ciclo ruta con bordillo de 2.50 metros de ancho.	Vía urbana construida	3,926
		Kilómetros de vías urbanas

Información específica de ejecución contrato específico

10/11/2021

Fecha de Suscripción

18/02/2022

Fecha de Inicio

39

Plazo en Meses

18/05/2025

Fecha Terminación

131.529

Número de Beneficiarios

\$14.549

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$14.549

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

18/09/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

58%

% Ejecutado

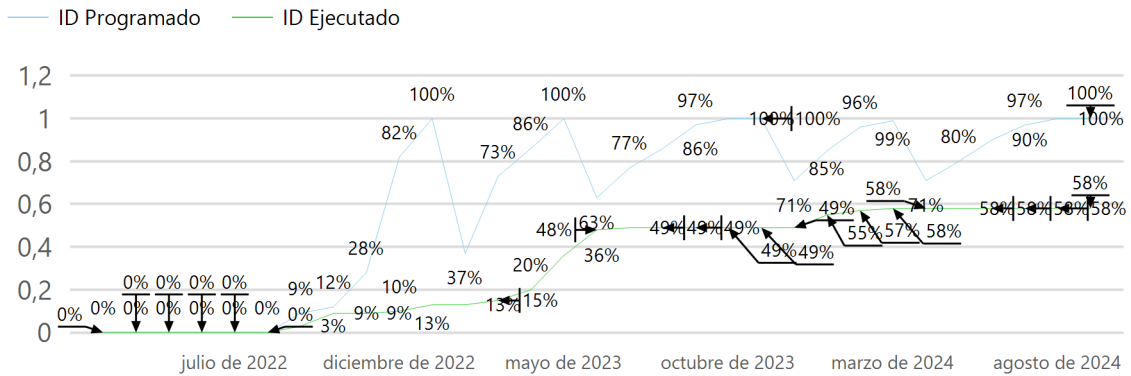

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$8.792

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$8.792

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	San Antero
BPIN	2021236720179	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	090-2210736	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	90	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	08/10/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 2.030,00 metros de pavimento concreto rígido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de vía de 10,00 metros con una calzada de 6,00 metros de ancho, andén con bordillo de 1.50 m y una ciclorruta con bordillo de 2.50 m. incluye señalización vertical y horizontal.	Vía urbana construida	2,07
		Kilómetros de vías urbanas

Información específica de ejecución contrato específico

11/11/2021

Fecha de Suscripción

18/02/2022

Fecha de Inicio

35

Plazo en Meses

26/01/2025

Fecha Terminación

131.529

Número de Beneficiarios

\$8.792

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$8.792

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

18/07/2024


Fecha de Corte Avance

95%

% Programado

3%

% Ejecutado

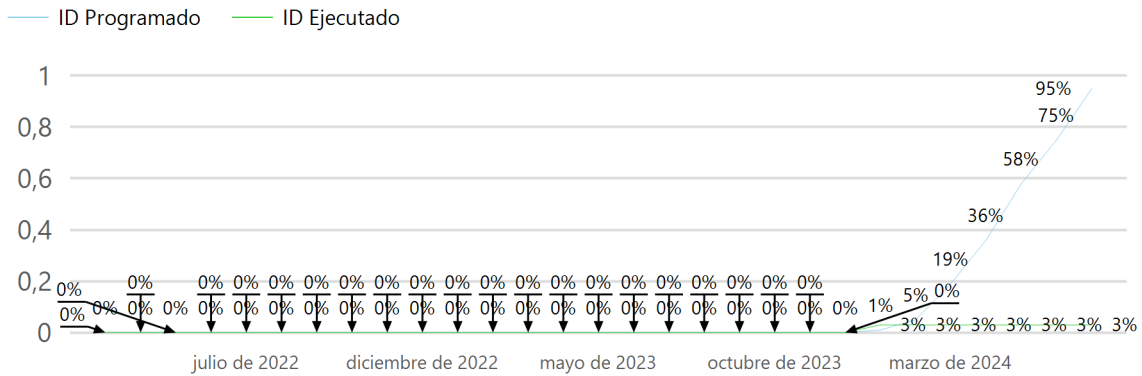

Avance Financiero del proyecto


26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$8.792
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

\$1.587
Valor Ejecutado (mill)

18%
% Ejecutado

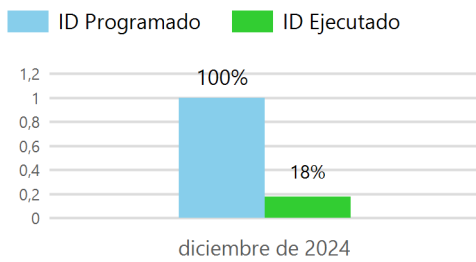

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$7.524

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$7.524

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	San Bernardo del Viento
BPIN	2021236750026	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	115-2220691	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	105	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	5	Fecha viabilidad	26/11/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de pavimento Rígido de longitud 4.10 km en concreto Hidráulico de espesor 21 cm, Subbase Granular e15 cm, incluye cunetas de 80 cm a cada lado y bordillo de e= 15 cms Construcción de un box coulvert doble de 3.0 x 3.0 m, localizado en el K3+363, en donde se encontraba un puente artesanal de madera, el cual no garantiza la funcionalidad durante la vida útil del proyecto. Caracterización vial de la longitud intervenida (4,1 Km)	Vía terciaria mejorada	4,1 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

18/07/2022

Fecha de Suscripción

6/09/2022

Fecha de Inicio

24

Plazo en Meses

6/09/2024

Fecha Terminación

37.782

Número de Beneficiarios

\$7.524

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$7.524

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/09/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

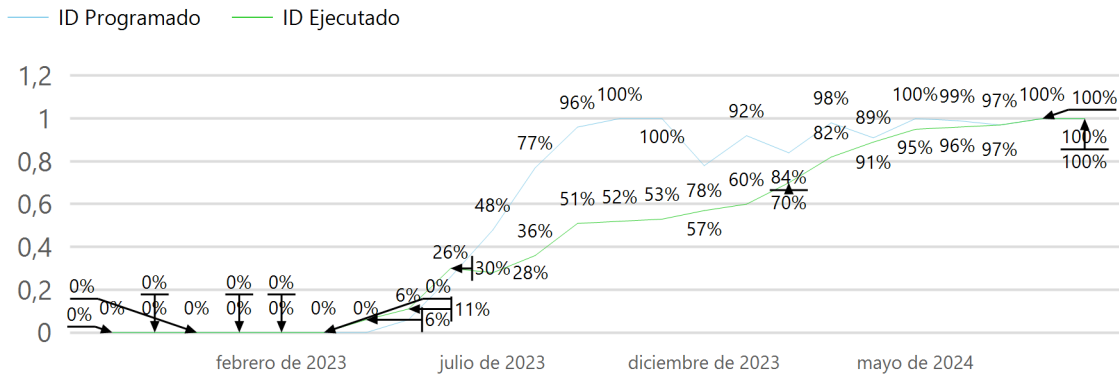


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$7.524
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

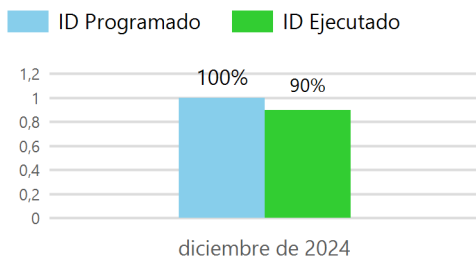

\$6.771
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$24.298

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$24.298

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Regional
BPIN	2021002230200	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	128-2220843	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	41	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	4	Fecha viabilidad	16/06/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto consiste en la Construcción de las obras de mitigación para la estabilización por amenazas e inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento en el Departamento de Córdoba, el alcance del contrato incluye el perfilamiento de los taludes, construcción de muro en gaviones, construcción de terraplen y cunetas en los sectores de Remolino y Trementino; terraplen y cunetas en el sector de Leopoldo.		

Información específica de ejecución contrato específico

12/08/2022

Fecha de Suscripción

30/03/2023

Fecha de Inicio

27

Plazo en Meses

30/06/2025

Fecha Terminación

157.726

Número de Beneficiarios

\$24.298

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$24.298

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

30/09/2024


Fecha de Corte Avance

49%

% Programado

0%

% Ejecutado

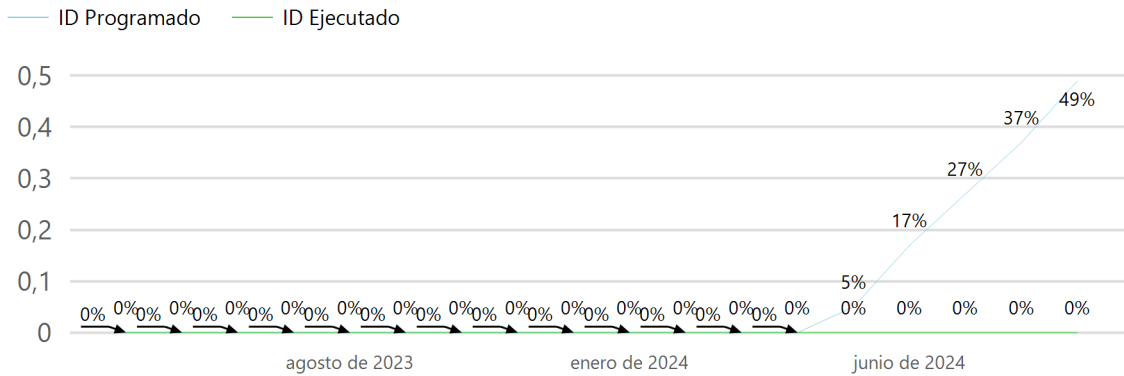

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$7.015

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En Liquidación

Estado Detallado

\$7.015

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Tuchín
BPIN	2021238150094	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	133-2220915	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	42	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	4	Fecha viabilidad	13/10/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Recuperación de la cuenca hidrográfica en el resguardo indígena zenú de córdoba-sucre, mediante la canalización y encauce de 1200 ml de canal en revestimiento de concreto y perfilado de 700 ml en canal de tierra del arroyo "las pavas", localizado en la zona urbana del municipio de Tuchin, Departamento de Córdoba.		

Información específica de ejecución contrato específico

19/08/2022

Fecha de Suscripción

20/10/2022

Fecha de Inicio

13

Plazo en Meses

20/11/2023

Fecha Terminación

37.716

Número de Beneficiarios

\$7.015

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$7.015

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

20/11/2023


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

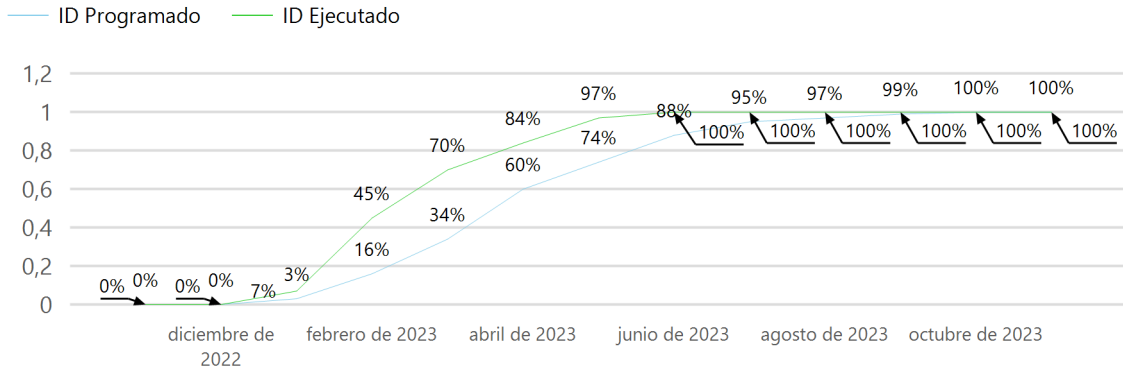

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, Córdoba.

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$20.482

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$19.482

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$1.000

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Santa Cruz de Lorica
BPIN	2021002230127	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	151-2221171	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	106	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	5	Fecha viabilidad	09/08/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>La alternativa seleccionada del proyecto 3CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA RIBERA DEL CAÑO CHIMALITO, MUNICIPIO DE LORICA, CÓRDOBA</p> <p>Basados en el análisis de vulnerabilidad en la zona de influencia del caño Chimalito, se han identificado varios escenarios con riesgo alto y medio de afectación por el riesgo de efectos del cambio climático, para estos escenarios se han determinado la líneas de proyectos basadas en las estrategias del PNACC acorde a los lineamientos y marcos normativos del proyecto y los indicadores del plan de desarrollo del municipio de lorica, los cuales son:</p> <p>RESTAURACIÓN DE BOSQUES RIPARIOS- 10 Hectáreas CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE VEGETACIÓN FLOTANTE ±17 Hectáreas PATIOS PRODUCTIVOS RESILIENTES ±4000 metros cuadrado CONSTRUIR RELLENOS PARA CONTROL DE INUNDACIÓN= 12025.2 metros cúbicos CONTRUIR Y REALZAR MURO DE CONTENCIÓN (863 M)= 863 metros CONSTRUIR OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL= 1038.83 metros CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA FISICA URBANA= 5496 metros cuadrados</p>		

Información específica de ejecución contrato específico

6/12/2022

Fecha de Suscripción

20/01/2023

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

20/06/2024

Fecha Terminación

121.214

Número de Beneficiarios

\$19.482

\$0

\$1.000

\$0

Pto Comprometido DNP FRPT

Pto Comprometido Sector

Pto Comprometido Territorio

Pto Comprometido Otros

\$20.482

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

20/06/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

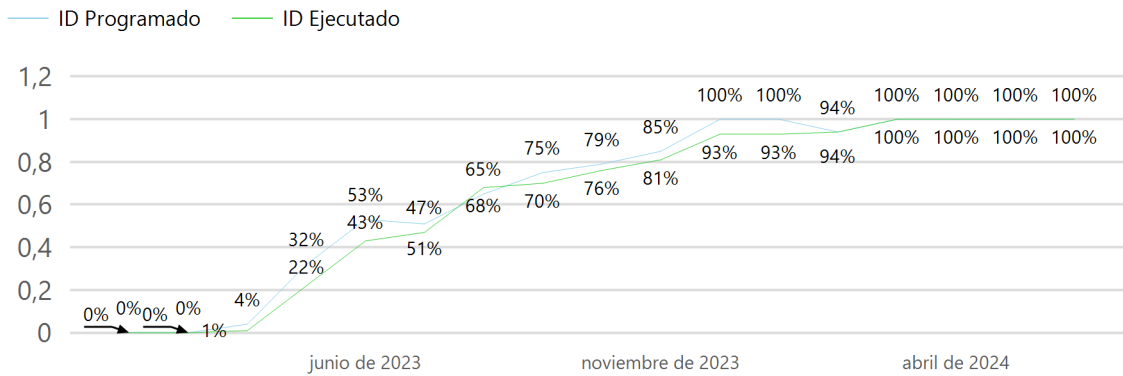

Avance Financiero del proyecto

26/12/2024

Fecha de Corte Avance


\$19.482

Valor Programado (mill)

100%

% Programado

ID Programado ID Ejecutado



\$19.482

Valor Ejecutado (mill)

100%

% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$41.494

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$41.494

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Santiago de Tolú
BPIN	20221301010001	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	152-2221172	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	107	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	5	Fecha viabilidad	17/06/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 1540 m del Canal hidráulico Rectangular en concreto rígido para la evacuación de aguas lluvias, para una longitud total de 2.876 m a intervenir; Además se contempla el paso de la comunidad de un lado a otro, mediante la construcción de 4 puentes metálicos peatonales y dos puentes vehiculares.	Obras para la prevención y control de inundaciones	2876
		Kilómetros de obras de prevención y control hidráulico

Información específica de ejecución contrato específico

6/12/2022

Fecha de Suscripción

27/01/2023

Fecha de Inicio

23

Plazo en Meses

27/12/2024

Fecha Terminación

11

Número de Beneficiarios

\$41.468

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$41.468

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

27/07/2024

Fecha de Corte Avance

55%

% Programado

15%

% Ejecutado




Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$41.468
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

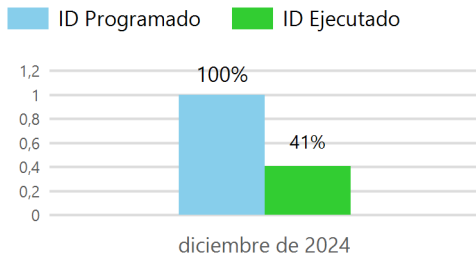

\$16.822
Valor Ejecutado (mill)

41%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de Malecón Turístico de la Segunda Ensenada Fase I en el Municipio de Coveñas

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$31.946

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$29.998

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$1.948

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Comercio Industria y Turismo	Municipio Intervención	Coveñas
BPIN	2021002700374	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	168-2221234	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	150	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	06/07/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Intervención de un espacio público en el Municipio de Coveñas, adecuándolo para la circulación en el corredor de la playa de la segunda ensenada, contempla la pavimentación de vías, construcción de andenes, cicloruta y creación de espacios para el comercio de productos turísticos (restaurantes - locales comerciales), elementos para la organización del área de la playa (zonas verdes, caseta de vigilancia y zona de primeros auxilios, baterías de baños, zonas de ducha, Mobiliario urbano, instalación de luminaria) con un área total de 23528.52 M2 y una longitud de 983.86 M, que va de la ABS k0+000 a la abscisa k0+983.86, en dicho recorrido la pavimentación de la vía inicia en el K0+350 hasta el K0+983.86 es decir tendrá una longitud de 633.86 M	Malecón construido	1
		UND

Información específica de ejecución contrato específico

30/12/2022

Fecha de Suscripción

14/04/2023

Fecha de Inicio

20

Plazo en Meses

14/12/2024

Fecha Terminación

687.419

Número de Beneficiarios

\$29.427

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$570

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$29.998

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

14/09/2024


Fecha de Corte Avance

67%

% Programado

1%

% Ejecutado

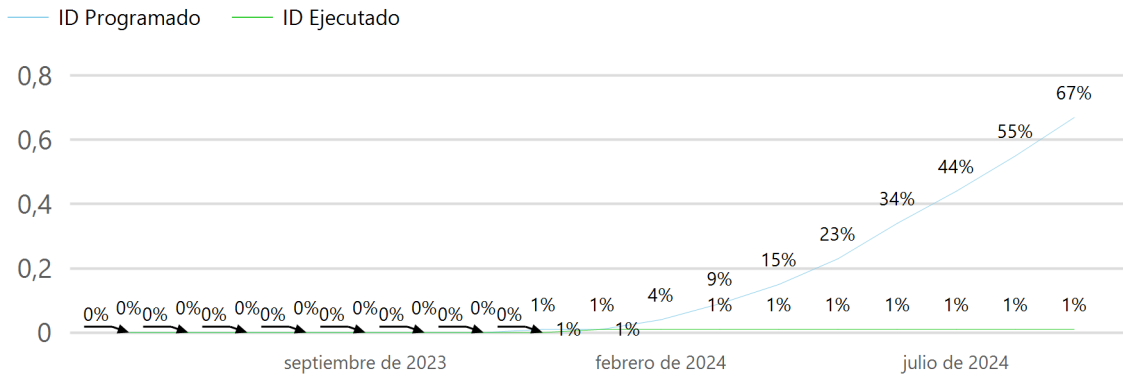

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción y Dotación de una Estación de Bomberos en el Municipio de Tolú

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$7.524

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$7.524

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Interior	Municipio Intervención	Santiago de Tolú
BPIN	2022002700102	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	178-2230152	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	86	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	09/11/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
	Estaciones de Bomberos Construidas	1
		Muneo de Estaciones de bomberos

El proyecto cuenta con dos etapas, la primera es la construcción de infraestructura nueva y la segunda consiste en la dotación de la estación con vehículos, dotación al personal con equipos tecnológicos modernos.

La estimación de los costos obedece a un análisis de prefactibilidad y factibilidad cuyos valores son producto inicialmente del análisis de algunas experiencias similares de construcción y posteriormente de cotizaciones recibidas (tanto de insumos como de dotación y equipamiento), que permite la elaboración de un estudio de mercado para la construcción, así como para equipamiento y dotación.

La construcción y dotación de la probable Estación de Bomberos está proyectada para implantarse al suroeste del Municipio de Santiago de Tolú, mediante la unión de 9 predios ubicados en la Urbanización Tolú Nuevo. El área intervención se encuentra señalada dentro de los predios ubicados en la urbanización Tolú nuevo en el municipio de Santiago de Tolú con un área de 2,883.78 m², en 9 lotes declarados de utilidad pública o interés social mediante ordenanza. No.036 de 2020 del Departamento de Sucre. Se incluyen de manera general áreas de recepción, sala de máquinas, vestiré, estación de transferencia de uniformes, salón auditorio, oficinas administrativas, zona de cafetería, área de sanitarios, sala de estar, oficina de comando, gimnasio, salón consejo de oficiales, alojamientos, zonas verdes y duras exteriores, entre otros, además de dotación de máquinas, equipos y dotación personal con los insumos necesarios para atender emergencias.

El tiempo de ejecución de todas las actividades cuenta con un cronograma de 10 meses y los costos del proyecto son los siguientes:

ETAPA I
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA: \$ 5.609.050.826,10
COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA: \$ 368.613.523,59



ETAPA II
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE DOTACIÓN: \$1.459.564.850,46
COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE DOTACION: \$ 68.399.734,49

TOTAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: \$ 7.522.011.672,50


Información específica de ejecución contrato específico

15/06/2023 Fecha de Suscripción	24/10/2023 Fecha de Inicio	18 Plazo en Meses	24/04/2025 Fecha Terminación	36.475 Número de Beneficiarios
\$7.522 Pto Comprometido DNP FRPT	\$0 Pto Comprometido Sector	\$0 Pto Comprometido Territorio	\$0 Pto Comprometido Otros	
\$7.522 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

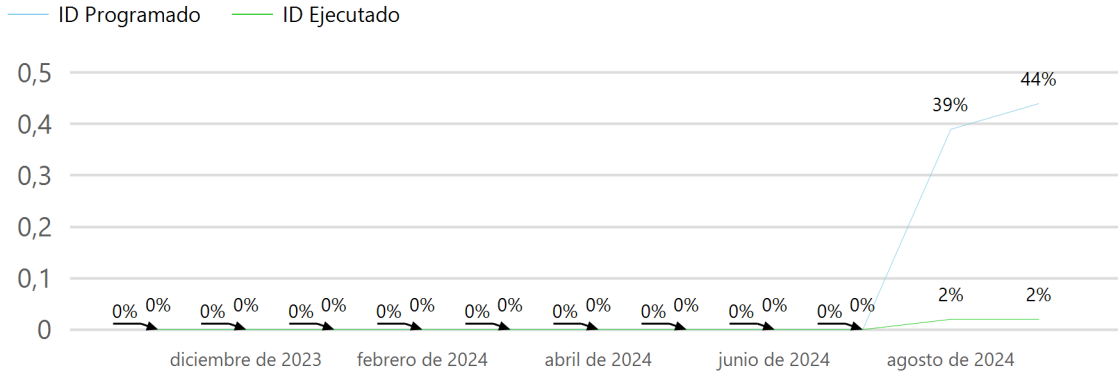

Avance Financiero del proyecto

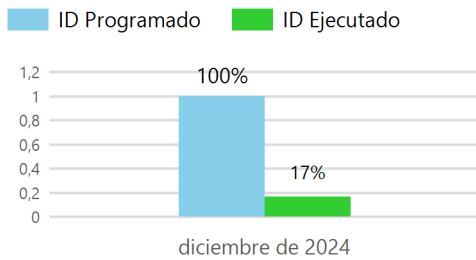

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$43.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$28.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$15.000

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Salud y Protección Social	Municipio Intervención	Coveñas
BPIN	2023002700021	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	189-2230170	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	145	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	30/11/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
La alternativa propuesta comprende la CONSTRUCCIÓN , EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE 1. Área Administrativa: 255,11 mts2 2. Área Consulta externa: 618,46 mts2 3. Área de Urgencias: 708,24 mts2 4. Área Apoyo Diagnóstico: 661,53 mts2 5. Área Hospitalización: 488,70 mts2 6. Área de Cirugía, atención de parto y esterilización: 809,81 mts2 7. Área Servicios Generales y complementarios: 1240,60 mts2 8. Otras Áreas: 1117,47 mts2 9. Aleros: 583,72 mts2 Área Total: 6483,64 mts2	Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados	1 Número de Hospitalises

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

2/11/2023

Fecha de Inicio

26

Plazo en Meses

2/01/2026

Fecha Terminación

17.000

Número de Beneficiarios

\$28.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$10.542

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$38.542

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

2/07/2024


3%

3%

Fecha de Corte Avance

% Programado

% Ejecutado

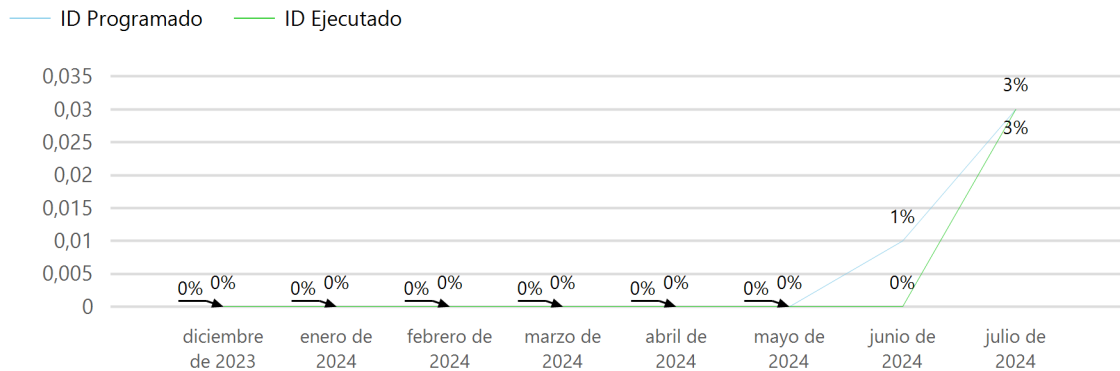

Avance Financiero del proyecto

26/12/2024

Fecha de Corte Avance

\$28.000

Valor Programado (mill)

100%


% Programado

\$8.400

Valor Ejecutado (mill)

30%

% Ejecutado

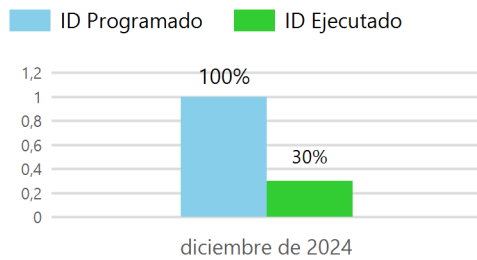

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de malecón ecoturístico en la Bahía de Cispatá, municipio de San Antero, departamento de Córdoba

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$26.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$26.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Comercio Industria y Turismo	Municipio Intervención	San Antero
BPIN	2022236720080	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	194-2230175	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	149	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	06/08/2023


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Construcción de espacios de estancia, senderos peatonales cubiertos naturalmente y también con cubiertas artificiales, plazoletas que integren la biodiversidad tanto con el habitante del sector como con los turistas que visitan la zona; muelles turísticos y para pescadores del sector, zonas donde se puedan desarrollar manifestaciones culturales del sector, pasajes comerciales donde se puedan comercializar los productos y artesanías propias de la región y así hacer autosostenible el proyecto diseñado, vías que le den continuidad a la malla vial existente y obligue a recorrer el proyecto en su totalidad, estructuras en concreto y acero, zonas exteriores, redes hidráulicas y sanitarias, redes eléctricas, zonas de parqueaderos, módulos de ventas, espacios cubiertos y lugares de trabajo para los habitantes existentes en la zona de influencia.</p> <p>1. Pavimento propuesto (4558.89 m2) que incluye vía de dos carriles con un ancho de 6 metros y andenes de 1 metro que conecta con pavimentos existente.</p> <p>2. Malecón y andenes (9033.28 m2) que contempla una plazoleta cultural, muelle embarcadero, un faro mirador, plazoleta de juegos de ajedrez y plazoleta del pelicano, juegos infantiles, una plazoleta de comidas, baños, locales y zonas verdes, accesos especiales para personas con movilidad reducidas, pasillos de con losetas táctiles para personas con discapacidad visuales, parque biosaludables.</p> <p>3. Zonas para parqueaderos (1251.79 m2) que cuanta con parqueadero para discapacitados.</p> <p>4. Muelles propuestos (1353.55 m2) incluye muelles para embarcaciones menores, la ampliación del muelle existente y la construcción de un nuevo muelle.</p>	Malecón Construido	1 UND

Información específica de ejecución contrato específico


28/06/2023 Fecha de Suscripción	6/10/2023 Fecha de Inicio	17 Plazo en Meses	6/03/2025 Fecha Terminación	127 Número de Beneficiarios
\$25.600 Pto Comprometido DNP FRPT	\$0 Pto Comprometido Sector	\$0 Pto Comprometido Territorio	\$0 Pto Comprometido Otros	
\$25.600 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

6/01/2024 Fecha de Corte Avance	0% % Programado	0% % Ejecutado
------------------------------------	--------------------	-------------------



Avance Financiero del proyecto

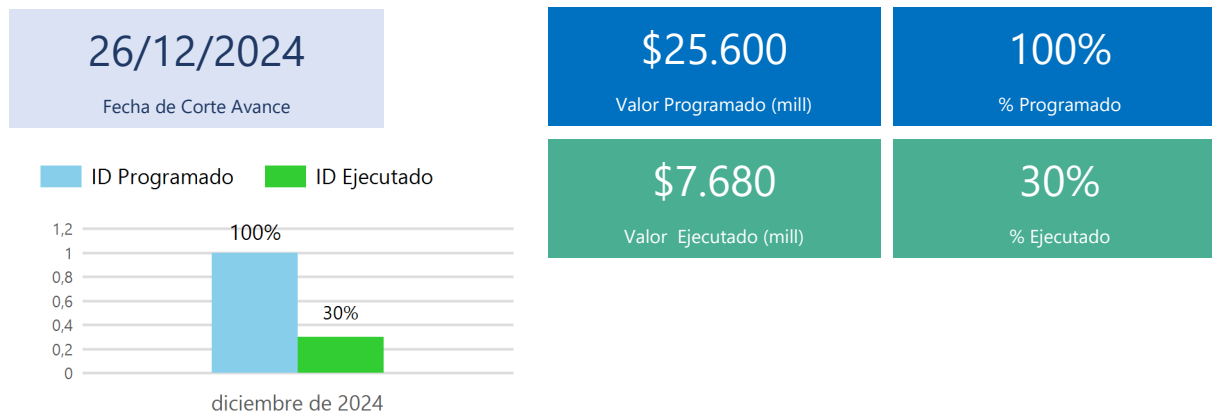

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de 261 Unidades Sanitarias dispersas en zona rural del municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$6.666

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En legalización de permisos,

Estado Detallado

obra

\$6.666

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Municipio Intervención	Tuchín
BPIN	2021238150080	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	195-2230387	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	109	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 261 Unidades Sanitarias, se permitirán disponer de módulos especiales para satisfacer a la comunidad y ayudar a disminuir la contaminación por el mal manejo de las aguas residuales y por ende disminuir la contaminación al medio ambiente, mejorando la calidad de vida 1.305 habitantes		

Información específica de ejecución contrato específico

22/12/2023

Fecha de Suscripción

12/03/2024

Fecha de Inicio

13

Plazo en Meses

12/04/2025

Fecha Terminación

38.000

Número de Beneficiarios

\$6.599

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$6.599

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

12/06/2024


Fecha de Corte Avance

0%


% Programado

0%

% Ejecutado

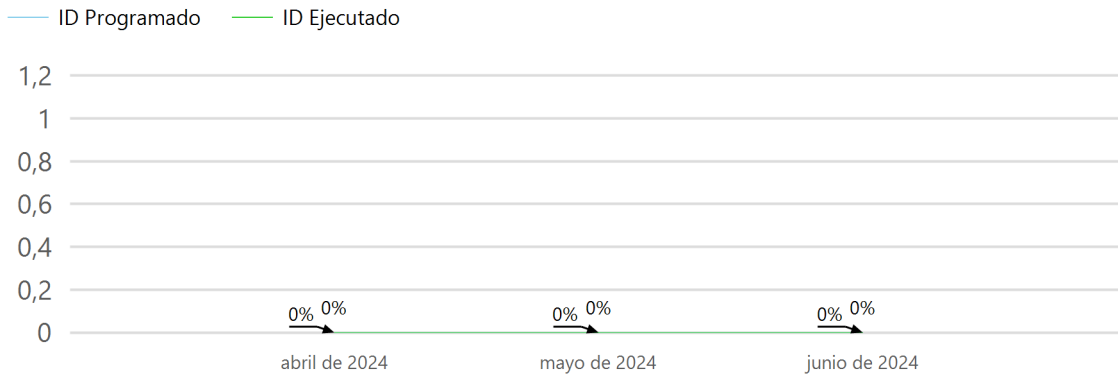

Avance Financiero del proyecto

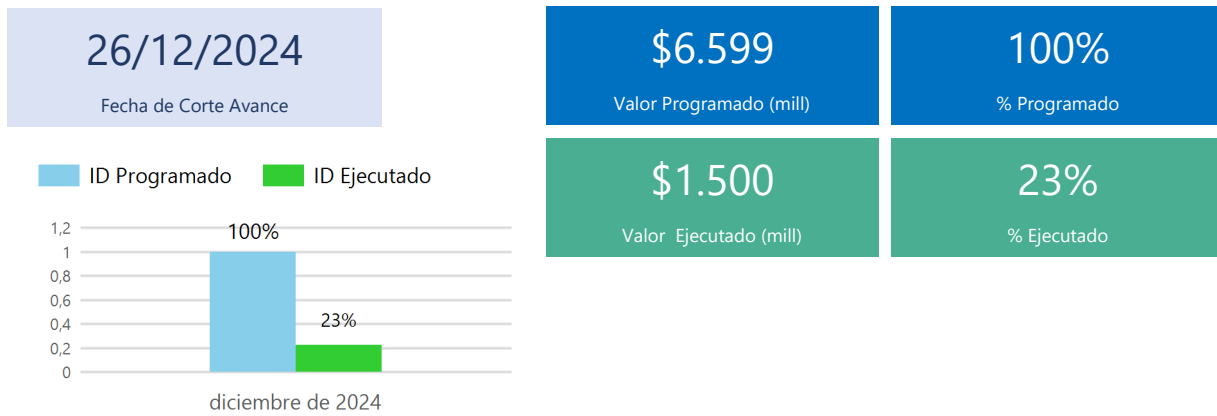

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
