

Pacto Territorial Bicentenario

26/06/2019 <small>Fecha suscripción</small>	10 <small>Plazo en años</small>	26/06/2029 <small>Fecha de Terminación</small>	43 <small>Meses para vencimiento</small>	65% <small>% Tiempo Transcurrido</small>
71 <small>Total Proyectos</small>	0 <small>Proyectos FRPT</small>	71 <small>Proyectos Otras Fuentes</small>	\$3.654.888 <small>Valor Indicativo (Millones)</small>	
\$2.446.680 <small>Aporte indicativo nación (Millones)</small>	\$1.208.209 <small>Aporte indicativo territorio (Millones)</small>		\$0 <small>Aporte indicativo otros (Millones)</small>	


Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Comercio, Industria y Turismo	\$224.888	\$65.680	\$159.209	\$0
Transporte	\$3.430.000	\$2.381.000	\$1.049.000	\$0
Total	\$3.654.888	\$2.446.680	\$1.208.209	\$0

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Comprometido Total	Consolidado Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Comercio, Industria y Turismo	\$93.040	\$42.262	\$50.397	\$380
Transporte	\$2.592.440	\$2.558.777	\$33.663	\$0
Total	\$2.685.480	\$2.601.040	\$84.060	\$380

Número de Proyectos por Estado

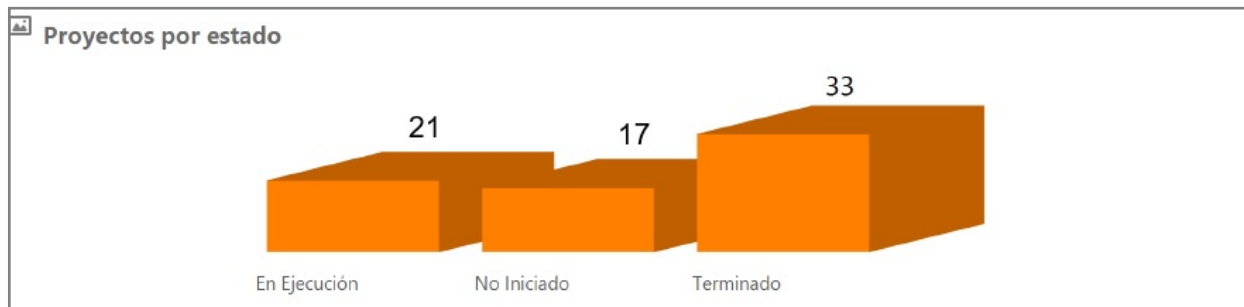

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa	\$750.000	\$525.000	\$225.000	\$0
En Ejecución	Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá	\$620.000	\$434.000	\$186.000	\$0
En Ejecución	Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena	\$600.000	\$420.000	\$180.000	\$0
En Ejecución	Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo	\$520.000	\$364.000	\$156.000	\$0
En Ejecución	Duitama – Charalá - San Gil	\$500.000	\$350.000	\$150.000	\$0
En Ejecución	Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal	\$230.000	\$161.000	\$69.000	\$0
En Ejecución	BTS: Tibasosa - Sogamoso	\$110.000	\$77.000	\$33.000	\$0
En Ejecución	Centro interinstitucional y embarcadero de Topocoro fase II	\$31.000	\$8.370	\$22.630	\$0
En Ejecución	Mejoramiento sitio histórico Puente de Boyacá	\$30.000	\$0	\$30.000	\$0
En Ejecución	Centro interinstitucional y embarcadero de Topocoro fase I	\$18.000	\$0	\$18.000	\$0
En Ejecución	Construcción del parque temático lineal alusivo a la Batalla de Pienta.	\$12.826	\$12.826	\$0	\$0
En Ejecución	Casona de San Gil fase I	\$10.425	\$10.425	\$0	\$0
En Ejecución	Restauración y reforzamiento estructural de la Hacienda El Salitre	\$7.693	\$0	\$7.693	\$0
En Ejecución	Estudios, diseños y construcción Megaparque Nimaima - Gualivá	\$4.000	\$1.080	\$2.920	\$0
En Ejecución	Construcción parques temáticos de La Ruta Libertadora (Pore - Nunchia - Tamara - Paz de Ariporo - Hato Corozal)	\$3.675	\$0	\$3.675	\$0

En Ejecución	Gestión para el fortalecimiento de las conexiones de conectividad terrestre a sitios de interés turístico y a atractivos (mejoramientos y construcción de infraestructura en miradores)	\$2.940	\$0	\$2.940	\$0
En Ejecución	Estructuración de rutas y circuitos del Bicentenario y temáticas complementarias	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0
En Ejecución	Desarrollo de productos turísticos	\$1.200	\$1.200	\$0	\$0
En Ejecución	Identificación y fortalecimiento de 40 experiencias de turismo creativo, asociado a la economía naranja (proyecto con impacto nacional, seis experiencias de los departamentos del Pacto Bicentenario)	\$147	\$147	\$0	\$0
En Ejecución	Estrategia de comercialización turística diseñada para los corredores turísticos de Colombia y los destinos Bicentenario	\$69	\$69	\$0	\$0
No Iniciado	Casona de San Gil fase II	\$30.000	\$8.100	\$21.900	\$0
No Iniciado	Producto ecoturístico de senderismo campaña Ruta Libertadora	\$8.800	\$0	\$8.800	\$0
No Iniciado	Mirador ecoturístico de la Peña del Cabro del municipio de Málaga, Santander	\$5.000	\$1.350	\$3.650	\$0
No Iniciado	Construcción nodo turístico Puente del Común	\$4.800	\$0	\$4.800	\$0
No Iniciado	Parque turístico Piedras del Tunjo - conexión con Regiotram	\$3.500	\$945	\$2.555	\$0
No Iniciado	Diseño y construcción de senderos representativos en los atractivos turísticos del departamento de Casanare (Laguna del Tinije, San Miguel de Farallones, Wisirare, Lagunazo)	\$2.940	\$794	\$2.146	\$0

No Iniciado	Remodelación del parque principal del casco urbano del municipio de Coromoro de Santander	\$2.785	\$0	\$2.785	\$0
No Iniciado	Identificación y conceptualización del Paisaje Cultural Llanero de Colombia PCLC de Casanare	\$2.500	\$675	\$1.825	\$0
No Iniciado	Construcción mirador Guane en el municipio de Zapatoca departamento de Santander	\$2.338	\$0	\$2.338	\$0
En Ejecución	Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame.	\$2.000	\$540	\$1.460	\$0
No Iniciado	Misiones académicas para conocer la estructuración del producto bicentenario en México	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0
No Iniciado	Misiones comerciales para la oferta de rutas y circuitos resultantes	\$1.500	\$1.500	\$0	\$0
No Iniciado	Diseño, fabricación, suministro e instalación de señalización vial, peatonal e interpretativa que oriente el acceso a los municipios, y en los principales atractivos turísticos en los 10 Municipios del Corredor de los Llanos del Departamento de Casanare	\$1.200	\$324	\$876	\$0
No Iniciado	Estrategia de internacionalización para destinos maduros con apoyo de Procolombia	\$1.200	\$1.200	\$0	\$0
No Iniciado	Constitución de la red turística del Bicentenario	\$800	\$800	\$0	\$0
No Iniciado	Implementación de señalización turística de los centros históricos de Suesca, Chía y Tame.	\$800	\$800	\$0	\$0
No Iniciado	Participación de la Red en eventos turísticos nacionales	\$500	\$500	\$0	\$0
No Iniciado	Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander	\$250	\$68	\$183	\$0
Terminado	Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito - Aguazul)	\$100.000	\$50.000	\$50.000	\$0

Terminado	Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca	\$8.020	\$0	\$8.020	\$0
Terminado	Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander	\$5.540	\$0	\$5.540	\$0
Terminado	1 estudio de mercados para Bicentenario	\$2.500	\$2.500	\$0	\$0
Terminado	Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.	\$1.646	\$1.246	\$400	\$0
Terminado	Revitalización Puente del Común	\$1.415	\$0	\$1.415	\$0
Terminado	Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional	\$1.150	\$1.150	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander	\$946	\$0	\$946	\$0
Terminado	Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario	\$946	\$0	\$946	\$0
Terminado	Plan de Promoción y Fortalecimiento Turístico – "turismo 200" en la vitrina turística de ANATO 2020, 2021 y 2022.	\$680	\$680	\$0	\$0
Terminado	Programa de Formación Exportadora	\$600	\$600	\$0	\$0
Terminado	Plan de Promoción Nacional del Bicentenario	\$600	\$600	\$0	\$0
Terminado	Programa de formación en inglés para actores de la cadena de valor del sector turístico en Colombia	\$500	\$500	\$0	\$0

Terminado	Rutas de aviturismo de los Llanos y Selvas de transición hacia la Amazonía	\$433	\$433	\$0	\$0
Terminado	Programa de Formación Exportadora Capítulos "Pacto Bicentenario" y "Ruta Cusiana"	\$390	\$390	\$0	\$0
Terminado	Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena"	\$350	\$0	\$350	\$0
Terminado	Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.	\$316	\$0	\$316	\$0
Terminado	Elaboración del inventario turístico de los 30 municipios que hacen parte del Pacto Bicentenario	\$283	\$283	\$0	\$0
Terminado	Programa de capacitación empresarial "Experiencia del producto turístico Ruta Leyenda El Dorado"	\$220	\$220	\$0	\$0
Terminado	Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario	\$200	\$200	\$0	\$0
Terminado	Fortalecimiento del producto turístico de biciturismo en municipios del bicentenario	\$200	\$100	\$100	\$0
Terminado	Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander.	\$200	\$200	\$0	\$0
Terminado	Fomento a la cultura turística de los actores de la cadena del turismo de los municipios de Pore, Socorro, Tame, Paipa y Chía	\$198	\$198	\$0	\$0
Terminado	Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.	\$141	\$141	\$0	\$0

Terminado	Promoción del Bicentenario a través de la campaña nacional #yovoy.	\$100	\$100	\$0	\$0
Terminado	Promoción del municipio de Suesca, haciendo referencia al producto turístico deportivo de escalada en roca, en el marco de un evento deportivo.	\$100	\$100		\$0
Terminado	Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa.	\$69	\$69	\$0	\$0
Terminado	Manual de avistamiento responsable de fauna silvestre en la Orinoquía colombiana (Arauca, Casanare, Vichada y Meta)	\$60	\$60	\$0	\$0
Terminado	Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander.	\$50	\$50	\$0	\$0
Terminado	Becas para diplomado en Agroturismo.	\$48	\$48	\$0	\$0
Terminado	Programa de Formación Exportadora Cápsulas de formación en ventas, comercialización y estrategias digitales dirigidas a actores de la cadena de valor del sector	\$44	\$44	\$0	\$0
Terminado	Fortalecimiento de capacidades en experiencia al cliente de la cadena de valor del sector turismo	\$37	\$37	\$0	\$0
Terminado	Fortalecimiento de los emprendimientos turísticos comunitarios con un enfoque competitivo dirigido hacia la comercialización y promoción.	\$19	\$19	\$0	\$0
Total		\$3.654.888	\$2.446.680	\$1.208.209	\$0

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

73,48%

\$2.685.480

Valor En Ejecución + Ejecutado

Estado de proyectos	Número de proyectos	Valor Indicativo
En Ejecución	21	\$2.482.580
Terminado	33	\$202.900
Total		\$2.685.480

Estado de proyectos	Número de proyectos	Valor Indicativo
No Iniciado	17	\$70.913
Total		\$70.913

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

0 Total Proyectos	Valor Indicativo (Millones)
-----------------------------	-----------------------------

Aporte indicativo DNP FRPT	Aporte indicativo territorio	Aporte indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
----------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------

0 Proyectos En Ejecución /Ejecutados	Presupuesto Comprometido (Millones)
--	-------------------------------------

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte Indicativo Otros
Total						

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Bicentenario.aspx>

ANEXO

Proyectos de INVIAS en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Bicentenario

Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal

via secundaria mejorada

Información general del contrato

BPIN	2019011000264
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$206.747.038.206,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$173.084.038.206,00	\$33.663.000.000,00	\$0,00	206.747.038.206,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	986/2021
Contratista	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 NIT. 901.476.869-4
Fecha de suscripción	18/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2030
Fecha terminación actual	31/08/2030
Valor inicial contrato de obra	\$134.479.407.106,00
Adiciones	\$53.456.094.560,00
Valor actual contrato de obra	\$187.935.501.666,00
Meta física contratada	Pavimentación de 21 km Alcantarillas 150 und Boxculvert 58 und Muros de contención 76 und

No. contrato de interventoría	996/2021
Contratista	CONSORCIO SAINT NIT. 901.479.369-7
Fecha de suscripción	18/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2030
Fecha terminación actual	31/08/2030
Valor inicial contrato de interventoría	\$14.704.631.100,00
Adiciones	\$3.506.905.440,00
Valor actual contrato de interventoría	\$18.211.536.540,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 30% a fecha 28/11/2025

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

BTS: Tibasosa - Sogamoso

Información general del contrato

BPIN	
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$56.020.923.753,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$56.020.923.753,00	\$0,00	\$0,00	56.020.923.753,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	499-2025
Contratista	CONSORCIO VIAL RUTA 55 identificado con el NIT. 901.903.391-9 (Integrado por EXPLANACIONES DEL SUR S.A. con NIT. 890.921.363-1 con un porcentaje de participación del 45%; TRAINCO S.A.S. con NIT 890.902.674-4 con un porcentaje de participación del 45% y HAG S.A. en reorganización con NIT. 800.198.573-0 con un porcentaje de participación del 10%).
Fecha de suscripción	31/01/2025
Fecha terminación inicial	31/07/2026
Fecha terminación actual	31/07/2026
Valor inicial contrato de obra	\$49.020.923.753,00
Adiciones	\$0,00
Valor actual contrato de obra	\$49.020.923.753,00
Meta física contratada	76 km

No. contrato de interventoría	500-2025
Contratista	CONSORCIO INTER CORREDOR BTS 96, identificado con NIT No. 901902803-7, consorcio integrado por COBA CONSULTORES DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S A SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT 900.657.214-4 con una participación del 30%; B&C S.A., identificada con NIT 800.015.774-1 con una participación del 30%; y ALDEIC SAS BIC identificada con el NIT 901.529.306-9 con una participación del 40%
Fecha de suscripción	3/02/2025
Fecha terminación inicial	31/07/2026
Fecha terminación actual	31/07/2026
Valor inicial contrato de interventoría	\$7.000.000.000,00
Adiciones	\$42.020.923.753,00
Valor actual contrato de interventoría	\$49.020.923.753,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 0,3% a fecha 30/05/2025

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito - Aguazul)

via primaria mejorada

Información general del contrato

BPIN	2018011000497
Ejecutor	INVIAS
Estado	Terminado
Valor Contrato	\$172.312.001.710,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$172.312.001.709,50	\$0,00	\$0,00	172.312.001.710,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	1858/2020
Contratista	CONSORCIO VIAL MHC 056 NIT 901.442.945-1
Fecha de suscripción	27/12/2020
Fecha terminación inicial	31/12/2022
Fecha terminación actual	31/01/2025
Valor inicial contrato de obra	\$109.589.909.864,00
Adiciones	\$49.065.888.532,00
Valor actual contrato de obra	\$158.655.798.396,00
Meta física contratada	7,3 KM PAVIEMENTACIÓN, 43 KM REHABILITACIÓN, 3 REHABILITACIÓN PUENTES, 5 ATENCIÓN DE SITIO CRÍTICO 118 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO, ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. contrato de interventoría	1860/2020
Contratista	CONSORCIO TERRA CGS NIT 901.442.378-3
Fecha de suscripción	24/12/2020
Fecha terminación inicial	31/12/2022
Fecha terminación actual	31/01/2025
Valor inicial contrato de interventoría	\$6.199.585.880,00
Adiciones	\$7.456.617.433,50
Valor actual contrato de interventoría	\$13.656.203.313,50

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 100,00% a fecha 28/11/2025

Proyecto finalizado.

Considerando las condiciones geomorfológicas, hidráulicas y sísmicas, se tiene que el corredor vial Sogamoso-Aguazul es afectado por situaciones naturales que generan inestabilidad geológica, acentuado con un alto e importante riesgo y amenaza en el sector entre PR77+000 (Curisí)-PR90+000 (pajarito), en donde se presenta un movimiento en masa, por causa de: (i) formaciones de suelos muy frágiles (lutitas de Macanal), las cuales, al entrar en interacción con el agua proveniente de las precipitaciones, se desintegran fácilmente, (ii) alta sismicidad en la zona y (iii) por las afectaciones ocasionadas por el Río Cusiana, ya que el mismo ocasionan socavación en la pata del talud, factores que sumado a las altas precipitaciones, generan que el corredor sea altamente vulnerable a eventos naturales como procesos de remoción en masa, derrumbes, caída de rocas, entre otras situaciones, que requieren de atención prioritaria para poder garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios a lo largo de la Transversal del Cusiana.

I

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa

Via primaria mejorada Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa

Información general del contrato

BPIN	2018011000034
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$567.367.998.991,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$567.367.998.991,00	\$0,00	\$0,00	567.367.998.991,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	989/2021
Contratista	CONSORCIO VIAL MHC 063 NIT 901.475.859-6
Fecha de suscripción	13/05/2021
Fecha terminación inicial	30/08/2030
Fecha terminación actual	30/08/2030
Valor inicial contrato de obra	\$465.288.090.475,00
Adiciones	\$67.580.051.078,00
Valor actual contrato de obra	\$532.868.141.553,00
Meta física contratada	Construcción de la segunda calzada de la variante de Zipaquirá, Ruta 45A CND, 6.58Km. Construcción de la segunda calzada desde el Peaje Casablanca hacia Ubaté, Ruta 45 A 05, 12 Km Mantenimiento del corredor vial Zipaquirá- Barbosa-Bucaramanga 344Km Atención a emergencia Cerros el Picacho 1 0,38 Km

No. contrato de interventoría	971/2021
Contratista	CONSORCIO ICEACSA -TPF NIT No. 901.480.695-5
Fecha de suscripción	5/12/2021
Fecha terminación inicial	30/08/2030
Fecha terminación actual	30/08/2030
Valor inicial contrato de interventoría	\$33.499.857.438,00
Adiciones	\$1.000.000.000,00
Valor actual contrato de interventoría	\$34.499.857.438,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 54,07% a fecha 28/11/2025

Avance meta física del 54,07%

Avance financiero 45,13%

A la fecha no ha sido aprobada la actualización EIA por parte de ANLA.

El traslado de redes secas de ENEL se encuentra en proceso de forma de pago por parte del contratista.

A la fecha se encuentra por definir por parte de INVIAS la adición de recursos para la presente vigencia dado que el mantenimiento del corredor es muy extenso, 344km y teniendo en cuenta estado de deterioro del mismo lo cual ha generado que los recursos inicialmente presupuestados sean insuficientes.

La obra espera finalizar el 30/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Duitama – Charalá - San Gil

via secundaria mejorada

Información general del contrato

BPIN	2019011000264
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$353.225.143.093,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$353.225.143.093,00	\$0,00	\$0,00	353.225.143.093,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	987/2021
Contratista	MINICIVIL S.A. con NIT. 890.930.545-1 (CESIÓN DE CONSORCIO PCT SAN-BOY NIT. 901.474.415-5)
Fecha de suscripción	14/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2030
Fecha terminación actual	31/08/2030
Valor inicial contrato de obra	\$310.625.154.993,00
Adiciones	\$14.002.090.382,00
Valor actual contrato de obra	\$324.627.245.375,00
Meta física contratada	Pavimentación 25 KM Mejoramiento de 68 KM Mantenimiento parcheo/bacheo: 48 KM Mantenimiento rutinario: 134 KM Atención sitios críticos: 3 Estudios y diseños de 134 KM

No. contrato de interventoría	1015/2021
Contratista	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT. No. 901.481.447-1
Fecha de suscripción	18/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2030
Fecha terminación actual	31/08/2030
Valor inicial contrato de interventoría	\$27.599.988.100,00
Adiciones	\$997.909.618,00
Valor actual contrato de interventoría	\$28.597.897.718,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del **27,74%** a fecha **27/05/2025**

El proyecto 3932-Duitama - Charalá - San Gil se encuentra en ejecución. El proyecto se encuentra con un avance físico del 27,74% de acuerdo a la información reportada por la entidad ejecutora el 27 de mayo de 2025.

Pavimentación : meta 25Km-ejecutado 1.2Km; Sitios Inestables: 4 und-ejecutado 3und; Alcantarillas: 126 und -ejecutado 28und; Box Culvert: 9 und.

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de **\$87.776.592.731,00**

La obra espera finalizar el **31/08/2030**

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá

via primaria mejorada

Información general del contrato

BPIN	2018011000507
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$439.966.981.261,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$439.966.981.261,00	\$0,00	\$0,00	439.966.981.261,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	973/2021
Contratista	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES "SUDINCO" S.A. SUCURSAL COLOMBIANA con NIT. 900.815.676-1 (CESIÓN CONSORCIO GROSUD NIT. 901.474.570 -9)
Fecha de suscripción	20/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2029
Fecha terminación actual	31/08/2029
Valor inicial contrato de obra	\$358.871.764.334,00
Adiciones	\$48.095.322.599,00
Valor actual contrato de obra	\$406.967.086.933,00
Meta física contratada	0,7 KM SEGUNDA CALZADA, 48 KM PAVIMENTACIÓN, 33 KM REHABILITACIÓN, 27 SITIOS CRÍTICOSM 378 KM MANTENIMIENTO PERIODICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. contrato de interventoría	962/2021
Contratista	CONSORCIO ECOVISION-188
Fecha de suscripción	5/08/2021
Fecha terminación inicial	14/08/2029
Fecha terminación actual	31/08/2029
Valor inicial contrato de interventoría	\$29.999.894.328,00
Adiciones	\$3.000.000.000,00
Valor actual contrato de interventoría	\$32.999.894.328,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 43,86% a fecha 28/11/2025

Avance físico: 43,86%

Avance financiero: 49,95%

El contrato de obra a la fecha no presenta atrasos en su ejecución.

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el 31/08/2029

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena

Mejoramiento del corredor vial en pavimento flexible, en una longitud total de 85.85 kilómetros, mediante intervención por tramos.

Tramos a intervenir: PR8+250 al PR19+100 (Pamplona y Labateca) PR21+000 al PR58+000 (Labateca y Toledo) PR77+000 al PR115+000 (Toledo)

Información general del contrato

BPIN	2018011000444
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$426.550.465.706,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$426.550.465.706,00	\$0,00	\$0,00	426.550.465.706,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	0988/2021
Contratista	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063 NIT. 901.476.429-7
Fecha de suscripción	21/05/2021
Fecha terminación inicial	30/08/2030
Fecha terminación actual	30/08/2030
Valor inicial contrato de obra	\$362.133.900.815,00
Adiciones	\$34.431.480.639,00
Valor actual contrato de obra	\$396.565.381.454,00
Meta física contratada	47 KM PAVIMENTACIÓN, 3 ATENCIÓN DE SITIO CRÍTICO, 185 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO, ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. contrato de interventoría	1013/2021
Contratista	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188 NIT. No. 901.479.769-1
Fecha de suscripción	21/05/2021
Fecha terminación inicial	30/08/2030
Fecha terminación actual	30/08/2030
Valor inicial contrato de interventoría	\$28.799.979.413,00
Adiciones	\$1.185.104.839,00
Valor actual contrato de interventoría	\$29.985.084.252,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 25,40% a fecha 28/11/2025

Avance físico: 25,40%

Avance financiero: 24,91%

Atención de emergencias provadas por invierno, se provee de maquinaria en el corredor para la atención inmediata de las emergencias.

Se han identificado multiples sitios criticos asociados a fallas geologicas. Se realizan obras de mitigación para garantizar transitabilidad.

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de \$59.122.000.000,00

La obra espera finalizar el 30/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

Pacto Territorial Bicentenario

Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo

Mejoramiento y/o pavimentación: 46 Km; Gestión predial, social y ambiental y mantenimiento del corredor

Información general del contrato

BPIN	2017011000301
Ejecutor	INVIAS
Estado	En Ejecución
Valor Contrato	\$370.249.700.000,00

Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
Valor total	\$370.249.700.000,00	\$0,00	\$0,00	370.249.700.000,00

Contratación derivada

No. contrato de obra	978/2021
Contratista	CONSORCIO VIAS NACIONALES NIT. 901.474.028-8
Fecha de suscripción	13/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2029
Fecha terminación actual	31/08/2029
Valor inicial contrato de obra	\$322.790.128.920,00
Adiciones	\$20.059.840.972,00
Valor actual contrato de obra	\$342.849.969.892,00
Meta física contratada	46 KM PAVIMENTACIÓN, 136 KM MANTENIMIENTO PERIÓDICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. contrato de interventoría	1038/2021
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA NIT. No. 901.479.577-2
Fecha de suscripción	21/05/2021
Fecha terminación inicial	31/08/2029
Fecha terminación actual	31/08/2029
Valor inicial contrato de interventoría	\$27.399.730.108,00
Adiciones	\$0,00
Valor actual contrato de interventoría	\$27.399.730.108,00

Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del **37,19%** a fecha **28/11/2025**

Avance físico: 37,19%

Avance financiero: 35,24%

Se han presentado emergencias que han dificultado las labores en varios frentes de obra, como la ocurrida en el PR30+300 ruta 6404, sector el Boche, como medida de mitigación se amplió el puente metálico modular instalado en sitio para garantizar la transitabilidad en el sector, se avanza con la construcción del puente nuevo como medida definitiva.

Actualmente, se están adelantando laborales de construcción de pavimento nuevo en el sector del Páramo de Pisba, donde las constantes lluvias han dificultado continuar de manera óptima y continua los tramos intervenidos y culminar con la demarcación y señalización, como medida adoptada por el contratista, se abrieron nuevos frentes de trabajo con la construcción de pavimento nuevo, con el fin de dar cumplimiento a la meta física del año 2025.

Se han identificado atrasos de obra en las labores de pavimentación en el departamento de Casanare por las demoras en expedición de permisos ambientales por parte de Corporinoquia, para lo cual el contratista continua adelantando los trámites correspondientes y abriendo nuevos frentes de trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las metas físicas.

Por parte de las Entidades se han realizado desembolsos por valor de **\$43.935.748.182,00**

La obra espera finalizar el **31/08/2029**

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>
