



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL SUR DEL TOLIMA**

<b>Fecha de actualización:</b>	Día / Mes / Año 17/10/2017	<b>Fecha de corte de la información:</b>	Día / Mes / Año 30/09/2017
<b>Nombre del Gerente:</b>	Wilber Jairo Vallejo Bocanegra	Numero Celular: 318 4 30 04 21	Correo Electrónico: <a href="mailto:wvallejo@dnpp.gov.co">wvallejo@dnpp.gov.co</a>

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**ÁREA DE INTERVENCIÓN**

Sur del Tolima




<b>Departamento:</b>	<b>Tolima</b>
<b>No. de Municipios en el Contrato Plan:</b>	9 (Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, San Antonio)
<b>Fecha de Inicio de Negociación:</b>	01/06/2012
<b>Fecha de Suscripción:</b>	12/01/2013
<b>Año de inicio:</b>	2013
	<b>Inicial</b>
<b>Plazo de ejecución:</b>	8 años
<b>Año de terminación:</b>	2021

**ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA:**

<b>Objeto:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las de las entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y a la disminución de las brechas territoriales y los niveles de pobreza de las comunidades que habitan este territorio.</li> <li>El “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial” se entiende como un proceso continuo y ordenado de transformaciones económicas, sociales, ambientales e institucionales, cuya finalidad es mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades que ocupan y aprovechan un espacio rural determinado con el fin de impulsar su desarrollo y competitividad.</li> </ul>
<b>Eje Central:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El desarrollo rural para incrementar los ingresos de las familias campesinas y contribuir a mejorar su calidad de vida.</li> </ul>

**VALOR TOTAL (Millones \$ COP):**

**Total: \$900.000**

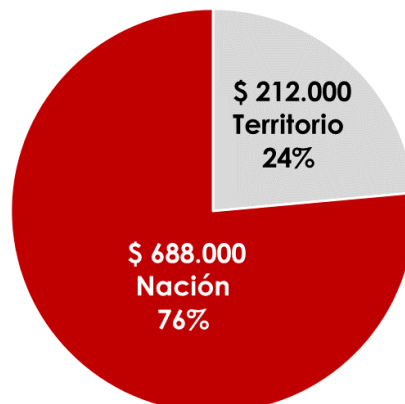



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL SUR DEL TOLIMA**

**SECTORES INVOLUCRADOS**

Sector	No. Proyectos Vigentes	No. Proyectos con Ejecución
Agricultura y Desarrollo Rural – (PDRIET)	11	10
Ambiente y Desarrollo Sostenible	7	6
Educación	20	20
Fortalecimiento institucional	1	1
Minas y Energía – Electrificación	16	16
Salud	16	16
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	7	7
Transporte	6	5
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico	12	11
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda	4	4
<b>TOTAL: 10 Sectores</b>	<b>100</b>	<b>96</b>

**2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN**

**PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL** (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales) (A)	%	Compromisos DNP (B)	% Aporte DNP (B/A)
Agricultura y Desarrollo Rural – (PDRIET)	110.000	25.000	22,7%	85.000	77,3%	35.000	41%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	67.000	62.000	92,5%	5.000	7,5%	3.000	60%
Educación	83.000	11.000	13,3%	72.000	86,7%	7.000	10%
Minas y Energía – Electrificación	147.000	5.000	3,4%	142.000	96,6%	30.000	21%
Salud	92.000	22.000	23,9%	70.000	76,1%	15.000	21%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	62.000	4.000	6,5%	58.000	93,5%	0	0%
Transporte	206.000	32.000	15,5%	174.000	84,5%	100.000	58%
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico	99.000	47.000	47,5%	52.000	52,5%	20.000	39%
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda	34.000	4.000	11,8%	30.000	88,2%	10.000	33%
<b>TOTAL</b>	<b>900.000</b>	<b>212.000</b>	<b>23,6%</b>	<b>688.000</b>	<b>76,4%</b>	<b>220.000</b>	<b>32%</b>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL SUR DEL TOLIMA**

**AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

**EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**48%**



**Total Ejecución 2013 – 2017**  
(Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas (A)	Programado 2017 (B)	Comprometido (C)	% Avance Financiero 2013-2017 (C/B)	% Avance Financiero 2013-2017 (C/A)	% Avance Físico Compromisos 2013-2017
Agricultura y Desarrollo Rural – (PDRJET)	110.000	76.903	78.606	102%	71%	25%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	67.000	22.991	10.215	44%	15%	14%
Educación	83.000	34.342	16.811	49%	20%	20%
Institucional	0	0	4.488	-	-	100%
Minas y Energía – Electrificación	147.000	43.313	42.168	97%	29%	22%
Salud	92.000	34.638	13.923	40%	15%	15%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	62.000	23.481	42.561	100%	69%	65%
Transporte	206.000	144.852	199.512	100%	97%	88%
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico	99.000	43.105	23.563	55%	24%	9%
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda	34.000	10.196	6.709	66%	20%	19%
<b>TOTAL</b>	<b>900.000</b>	<b>433.821</b>	<b>438.561</b>	<b>101%</b>	<b>48%</b>	<b>38%</b>

**3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR**

**2017**

**Acumulado (2013-2017)**

**PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS\***

**44,0%**



**49,9%**




**Fecha de corte: Septiembre 30, 2017**

**\*Nota:** El avance se calcula con base en la información reportada por la Gerencia Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte (bimensual, trimestral, semestral).



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL SUR DEL TOLIMA**




**Prioridad Estratégica 1**

**Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial**

**INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS**

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Déficit de vivienda rural (Semestral)	86,0%	81,0%	84,0	40,0%		Rojo	79,0	84,0	28,6%		Rojo	30-06-17
Soluciones de vivienda rural entregadas mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Semestral)	0	2.233	1.073	48,0%		Rojo	3.140	1.996	63,6%		Rojo	30-06-17
Familias con proyectos productivos implementados mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	0	1.390	-	-		Reporte anual Gris	1.390	390	28,0%		Rojo	31-12-16

SEMÁFORO



**AVANCES ACUMULADOS, 2013-2017**

Sector	Avances
<b>Agricultura – Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial- (PDRIET)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 390 familias tuvieron apoyo para la implementación de proyectos productivos por valor de \$3.537 millones a través del Incoder. Se encuentran en ejecución dichos proyectos en los municipios beneficiarios.</li> <li>✓ En el Municipio de Chaparral el programa de seguridad alimentaria RESA atendió por valor de \$1.494 millones, a 1.490 familias, de las cuales, 260 se incorporaron al programa de Asistencia Técnica Especial, en coordinación con la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial; y 200 familias se vincularon al programa de implementación de proyectos de desarrollo rural del Incoder.</li> <li>✓ Finalizado el convenio con Cámara de Comercio de Ibagué por valor de \$1.150 millones, para realizar la Fase I del programa de generación de ingresos que comprende la caracterización comercial de las principales cadenas productivas, análisis de asociaciones, alianzas comerciales, y estudios y diseños que se requieren para adecuar espacios en los nueve municipios incluidos en el Contrato Plan, para implementar Centros de Valor Agregado.</li> <li>✓ Para fortalecer la cultura y las capacidades comerciales y de generación de los ingresos de la población campesina del municipio de Natagaima, se invirtieron recursos por \$2.854 millones para la construcción de 4.980,33 m2 de la plazoleta de eventos y mercado campesino, la cual a la fecha se encuentra en funcionamiento, beneficiando aproximadamente a 23.000 personas.</li> <li>✓ Asignación de 3.140 subsidios de vivienda rural en los municipios de Chaparral, Coyaima, San Antonio, Planadas, Roncesvalles, Ataco, Rioblanco, Natagaima y Ortega, con una inversión total de \$53.426 millones. A la fecha se cuenta con 1.073 viviendas terminadas en los municipios de Coyaima, San Antonio, Planadas, Roncesvalles; y se viabilizaron un total de 418 hogares en los municipios de Ataco, Rioblanco, Natagaima y Ortega por parte de Banco Agrario, para iniciar obras antes de finalizar el 2017 por parte de la GI Prohaciendo; y se inició la fase de diagnóstico para 907 hogares de los municipios de Ataco, Rioblanco, y Ortega, a cargo de la GI Fiduagraria.</li> <li>✓ Por parte de la Gobernación del Tolima se realizaron inversiones por \$850 millones para la realización de la feria de cafés especiales en el municipio de Planadas y la participación de productores y asociaciones de café en la feria “Colombia Tierra de Diversidad” realizada en Corferias.</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL SUR DEL TOLIMA**



**Prioridad Estratégica 2**

**Infraestructura**

**INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS**

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Porcentaje de kilómetros del anillo vial del Sur del Tolima en buen estado (Anual)	51,0%	85,0%	-	-	Reporte anual	Gris	94,0%	65,0%	69,1%		Rojo	31-12-16
Número de personas beneficiadas con proyectos de acueducto (Anual)	0	52.127	-	-	Reporte anual	Gris	69.127	26.000	37,6%		Rojo	31-12-16
Número de personas beneficiadas con proyectos de alcantarillado (Anual)	0	6.730	-	-	Reporte anual	Gris	19.530	-	-	Meta programada para 2018	Gris	31-12-16
Municipios conectados a la red de fibra óptica nacional (Anual)	0	-	-	-	Sin meta para 2017	Gris	9	9	100,0%		Verde	31-12-16
Cobertura de energía eléctrica en vivienda rural lograda por medio del Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	72,0%	92,0%	-	-	Reporte anual	Gris	92,0%	80,0%	40,0%		Rojo	31-12-16

SEMÁFORO



<80%

>90%

**AVANCES ACUMULADOS, 2013-2017**

Sector	Avances
<b>Minas y Energía</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A través del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, se han invertido un total de \$34.721 millones de pesos para la electrificación de 3.633 usuarios en los 9 municipios del CP Tolima. A la fecha las obras se encuentran terminadas y a cargo del Operador de Red.</li> <li>✓ Culminado el convenio entre la Gobernación del Tolima y EGETSA para la “actualización y formulación de nuevos estudios y diseños de proyectos de electrificación rural” por valor de \$446 millones.</li> <li>✓ Se realizaron las obras de electrificación rural en 14 veredas de los 9 municipios para beneficiar 402 familias por valor de \$5.264 millones. A la fecha los convenios se encuentran suspendidos por trámites de pagos pendientes por la Gobernación del Tolima.</li> <li>✓ En el marco del convenio N°760 y 972 suscrito entre la Gobernación del Tolima y EGETSA, este último realizó la contratación de las obras e interventorías para realizar la ejecución de las obras de electrificación de las veredas Las Orquídeas (Roncesvalles), San Pablo (Planadas), Chenche Buenos Aires, Bocas de Babi y Rosario III (Coyaima), Beltrán y Betania (Ataco) y Guineal Horizonte (Ortega), con una inversión de \$2.200 millones para beneficiar 227 familias.</li> <li>✓ En ejecución a cargo del Operador de Red Enertolima las obras aprobadas en CAFAER 2016 para la electrificación rural de las veredas Apone y La Florida (Ataco), La Hacienda, La Floresta, Aguas Blancas, Los Guayabos, Marquetalia, Palomas, Primavera Alta, San Joaquín, San Miguel, Topacio, y Altamira (Planadas) y Rioverde parte baja y alta, La Palma, La Laguna, El Moral, El Triunfo, La Catalina, El Diamante, El Canelo, El Bosque, Alpes, Alfonso Carrillo parte baja – alta, y Palma Horizonte (Rioblanco), por valor de \$8.803 millones.</li> <li>✓ Se están realizando las gestiones necesarias para lograr la viabilidad técnica de 15 proyectos de electrificación rural que se encuentran radicados en la UPME para posteriormente presentarlos al CAFAER.</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL SUR DEL TOLIMA**

Sector	Avances
<p><b>Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El Ministerio de TIC ha ejecutado \$38.560 millones en sus programas de Conectividad, Computadores para Educar, Gobierno en Línea. Se han entregado 6.858 computadores, se han conectado gratuitamente 244 sedes educativas, se ha habilitado el uso de la herramienta de Gobierno en Línea para las nueve Alcaldías del Contrato Plan y se han capacitado a 7.100 personas como ciudadanos digitales.</li> <li>✓ Se realizó la implementación de seis aulas musicales digitales en el marco del Programa Tolima Vive Digital en los municipios de Planadas, Coyaima y Roncesvalles, Ataco, Rioblanco y Natagaima. \$2.000 millones.</li> <li>✓ Se encuentra en proceso de contratación el proyecto Nativos Digitales a cargo de la Universidad del Tolima para entregar aulas digitales a las instituciones educativas</li> </ul>
<p><b>Transporte</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Entregadas las obras de mejoramiento y rehabilitación en la fase inicial de la vía Chaparral – Rioblanco, por valor de \$7.724 millones. Alcance: pavimentación de 1,5 km y construcción de 3 muros de contención en los puntos críticos. La fase de la vía Chaparral – Rioblanco que comprende la rehabilitación de 5 puntos críticos y un alcance real de pavimentación de 8,8 kilómetros, se le adicionaron recursos por \$15.646 millones para una inversión total de \$47.766 millones, que a la fecha presenta un avance de obra de 91% (*teniendo en cuenta la adición de recursos).</li> <li>✓ Se encuentran terminadas las obras de mejoramiento y rehabilitación en la vía Ataco – Planadas, con una inversión total de \$35.978 millones, para la construcción de 17 espolones y realizar las obras de control en atención en puntos críticos sobre la vía.</li> <li>✓ Se encuentran terminadas las obras de rehabilitación de la vía Castilla – Coyaima, por valor de \$20.059 millones, con un alcance total pavimentado de 13,26km.</li> <li>✓ Se suspendieron las obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía Coyaima – Ataco fase1, por motivos del proceso de aprobación de los recursos adicionales solicitados al Fondo Regional. La obra actualmente tiene una inversión de \$15.834 millones y un avance de obra de 97%.</li> <li>✓ En ejecución las obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía Chaparral-Tuluní por valor de \$63.540 millones. Avance de obra de 87%.</li> <li>✓ Los estudios y diseños de la vía Señoritas – Palmichal – Rioblanco que tuvieron una inversión de \$1.004 millones fueron aprobados por la interventoría. La Gobernación del Tolima solicitó a INVIAS y DNP la redistribución de los recursos de obra de esta vía para adicionar a las vías Chaparral-Rioblanco y Ataco-Planadas, con mayor prioridad de intervención por ser vías secundarias; la solicitud fue aprobada a inicios de diciembre y en este mismo mes se realizaron los trámites de adición.</li> </ul>
<p><b>Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En ejecución la obra de construcción del alcantarillado de la vereda Maracaibo del Municipio de Rioblanco por \$327 millones, que beneficiará a 2.000 habitantes.</li> <li>✓ Entregadas las obras de construcción de la celda de residuos sólidos del municipio de Chaparral por \$160 millones que beneficia a más de 26.000 habitantes.</li> <li>✓ Ejecutadas las obras para el mejoramiento del acueducto urbano del municipio de Chaparral por \$2.477 millones, para beneficiar más de 5.000 habitantes – Avance de obra 100%.</li> <li>✓ Se aprobó el inicio de la fase 3 por parte de MVCT del proyecto para el mejoramiento del sistema de acueducto urbano del municipio de Rioblanco y presenta un avance de obra del 13%, con una inversión de \$2.131 millones.</li> <li>✓ Se aprobó por parte del MVCT la adición de recursos solicitada y el inicio de la fase 3 del proyecto de mejoramiento del sistema de acueducto urbano del municipio de San Antonio; a la fecha se encuentra en trámite de legalización las actas de inicio; este proyecto tiene una inversión de \$2.661 millones.</li> <li>✓ En ejecución las obras para el mejoramiento del acueducto del casco urbano del Municipio de Planadas por un total de \$1.578 millones. Avance de obra del 56%.</li> <li>✓ En ejecución consultoría de estudios y diseños para 24 Acueductos y Alcantarillados Rurales y Urbanos por valor de \$1.600 millones, que beneficiarán a más de 27.000 habitantes en los nueve municipios vinculados al Contrato Plan.</li> <li>✓ Luego de aprobada la reformulación del proyecto “Saneamiento Básico Rural” se reiniciaron los convenios de los municipios de Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, San Antonio y Coyaima y a la fecha se tiene un avance</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL SUR DEL TOLIMA**

Sector	Avances
	de obra de 336 unidades sanitarias construidas, y se encuentra en trámite de contratación los proyectos de los municipios de Roncesvalles y Ataco.



**Prioridad Estratégica 3**

**Desarrollo Social**

**INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA**

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Soluciones de vivienda urbana entregadas mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	0	463	-	-	Reporte anual	Gris	463	253	54,6%		Rojo	31-12-16
Sedes educativas intervenidas, mejoradas o construidas mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	0	270	-	-	Reporte anual	Gris	270	151	55,9%		Rojo	31-12-16
Instalaciones hospitalarias construidas y adecuadas mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	0	7	-	-	Reporte anual	Gris	14	1	7,1%		Rojo	31-12-16

SEMÁFORO



<80%

>90%

**AVANCES ACUMULADOS, 2013-2017**

Sector	Avances
<b>Educación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se adelantaron mejoramientos en infraestructura educativa, con una inversión de \$9.588 millones, logrando el mejoramiento estructural, construcción de aulas, cerramientos y adecuación de baterías sanitarias en más de 95 instituciones y sedes educativas.</li> <li>✓ A través del Ministerio de Educación Nacional se hizo la compra de equipos tecnológicos y mobiliario para el Centro Regional de Educación Superior (CERES) del municipio de Planadas y mejoramiento de la infraestructura tecnológica y construcción de unidades sanitarias en el CERES de Chaparral, con una inversión total de \$257 millones beneficiando a 1.000 estudiantes.</li> <li>✓ En 44 sedes educativas de los nueve municipios del Contrato Plan, se implementó el Programa Educativo Rural con una inversión de \$460 millones, beneficiando a más de 2.000 estudiantes. Las principales acciones fueron: Dotación de kits de materiales y modelos educativos flexibles, Implementación de la estrategia flexible Pos primaria, Implementación de la estrategia flexible Media Rural, Adquisición de Bibliotecas para las estrategias educativas, Adquisición de Centros de Recursos del Aprendizaje, Adquisición de laboratorios para Pos primaria, Consultoría para apoyo y acompañamiento a los Círculos de calidad, Red docentes y/o Microcentros de la zona rural.</li> <li>✓ Implementado el Programa Todos a Aprender en 47 sedes educativas, beneficiando a más de 2.500 estudiantes, poniendo en marcha prácticas de aprendizaje en lenguaje y matemáticas que redundan en mejores resultados en las pruebas Saber, con una inversión de \$2.790 millones.</li> <li>✓ Ejecutado el Programa Educativo Regional con PNUD para beneficiar 50 instituciones y sedes educativas en los nueve municipios incluidos en el Contrato Plan, por valor de \$512 millones.</li> <li>✓ Terminadas las obras para la terminación la planta física de la Institución Educativa José María Carbonell y se encuentran en ejecución las obras de las IE's Domingo Savio y Pablo VI en el municipio de San Antonio, con una</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL SUR DEL TOLIMA**

Sector	Avances
	<p>inversión de \$2.200 millones y la IE La Voz de la Tierra del municipio de Roncesvalles con una inversión de \$150 millones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se invirtieron recursos de regalías para la consultoría e interventoría de los estudios y diseños para la construcción de la institución educativa Bilbao en el municipio de Planadas, con una inversión de \$335 millones.</li> <li>✓ Se postularon 44 instituciones educativas a la convocatoria Ley 21 del Ministerio de Educación Nacional II semestre de las cuales se encuentran viables técnicamente 25 IE's para la intervención de 191 aulas nuevas y 2013 aulas mejoradas con una inversión proyectada de \$59.424 millones.</li> <li>✓ Ejecutado el convenio suscrito entre DNP y Gobernación del Tolima para cofinanciar el programa de alimentación escolar, para beneficiar con almuerzos y raciones alimenticias a 15.017 estudiantes de las Instituciones Educativas de los municipios del Tolima, con una inversión de \$1.417 millones.</li> </ul>
<p><b>Salud y Protección Social</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Entregadas las ambulancias a 9 hospitales de los municipios del sur del Tolima por un valor de \$1.120 millones, con el fin de mejorar la prestación del servicio en los municipios, beneficiando más de 200.000 habitantes.</li> <li>✓ Se realizó la dotación de una planta generadora de gas para el Hospital de Chaparral con el fin de disminuir los costos de la prestación de servicios de salud por \$255 millones, beneficiando a 153.710 habitantes de este Municipio.</li> <li>✓ Compra de equipos biomédicos para los Hospitales de Coyaima y Chaparral por \$213 y \$333 millones respectivamente, buscando fortalecer la capacidad instalada para la prestación de servicios de salud a nivel nacional, beneficiando a los habitantes de estos municipios.</li> <li>✓ Saneamiento fiscal del Hospital de Chaparral por \$2.600 millones, permitiendo pagar sus pasivos y logrando su re categorización.</li> <li>✓ Finalizada ejecución de los convenios suscritos entre la Gobernación del Tolima y los Hospitales de Ataco, Natagaima, Ortega, Rioblanco, Planadas y San Antonio para la implementación del programa de seguridad alimentaria, beneficiando a 1.440 niños, niñas de 0-5 años, madres gestantes y lactantes con una inversión de \$2.345 millones.</li> <li>✓ En ejecución la consultoría para realizar los estudios y diseños del nuevo Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral, Hospital San Roque E.S.E. Coyaima y Hospital San José E.S.E. de Ortega, con una inversión de \$1.900 millones. Los estudios y diseños se encuentran en ajustes según las solicitudes realizadas por la Secretaría de Salud y Ministerio de Salud.</li> <li>✓ Terminada y entregada a la comunidad la obra de adecuación de la infraestructura del Centro de Salud de Velú (Natagaima) con una inversión total de \$251 millones para beneficiar más de 10.000 habitantes.</li> <li>✓ Liquidado el convenio mediante el cual se financiaron las obras de sustitución de la cubierta del Hospital Santa Lucía de Roncesvalles por valor de \$267 millones.</li> <li>✓ En proceso de liquidación el proyecto "Mejoramiento de la capacidad instalada de las IPS públicas de los municipios del Contrato Plan", a través del cual los hospitales de los municipios de Ataco, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio realizaron la adquisición de equipos médicos, con una inversión de \$3.143 millones.</li> <li>✓ Se realizaron las obras de adecuación de la sala de partos del hospital La Misericordia, con una inversión de \$351 millones, a cargo del municipio.</li> </ul>
<p><b>Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Entregadas 101 viviendas gratis urbanas en el municipio de Chaparral por valor de \$4.098 millones.</li> <li>✓ Se terminaron y entregaron 69 viviendas de la urbanización Luis Carlos Galán del municipio de Natagaima, con una inversión de \$777 millones.</li> <li>✓ Se realizó la adición de recursos solicitados y a la fecha se encuentran en ejecución las obras de construcción de 50 viviendas de la urbanización Jorge Andrade del municipio de Natagaima por valor de \$1.368 millones, el cual presenta un avance del 80%.</li> <li>✓ Terminadas los mejoramientos de 43 viviendas de la zona urbana, con una inversión de la Gobernación del Tolima y el municipio de Natagaima por valor de \$446 millones.</li> </ul>







**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL SUR DEL TOLIMA**



**Prioridad Estratégica 4**

**Sostenibilidad Ambiental**

**INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA**

Indicador	Línea Base	2017					Acumulado (2013-2017)			Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance		
Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	0	650	-	-	 Reporte anual Gris	650	421	64,8%	 Rojo	31-12-16

SEMÁFORO



<80%

>90%

**AVANCES ACUMULADOS, 2013-2017**

Sector	Avances
<b>Ambiente y Desarrollo Sostenible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se firmaron contratos de cooperación con Cortolima, los cuales a la fecha se encuentran ejecutados en su totalidad con actas de liquidación que reposan en los archivos de la Corporación:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manejo de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques en 37 hectáreas de Chaparral por \$61,5 millones, de los cuales Cortolima aporta \$53 millones.</li> <li>- Establecimiento y aislamiento de 20 hectáreas de reforestación protectora en Chaparral por \$57 millones, de los cuales Cortolima aporta \$49 millones.</li> <li>- Mantenimiento de 2 reservorios en resguardos indígenas en Guipa (Ortega) y Rincón Velú (Natagaima) por \$326 millones.</li> <li>- Optimización de acueductos en las comunidades indígenas Totarco Tamarindo y Totarco Dinde, en Coyaima por \$184 millones, de los cuales Cortolima aporta \$166 millones.</li> <li>- Actividades de sensibilización y recuperación ambiental en el Barrio Edén (Chaparral) y la Quebrada La Sopera por valor de \$17 millones, de los cuales Cortolima aporta \$15 millones.</li> </ul> </li> <li>✓ Se ejecutó el convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y Cortolima por \$550 millones, para la implementación de una estrategia para la prevención y reducción del impacto de la actividad minera en el Departamento, proyecto que se ejecutó en su totalidad.</li> <li>✓ Se ejecutó al 100% el contrato de cooperación entre Cortolima y Corcuencas para la protección de la cuenca del Río Saldaña y de la Quebrada La Platina, por valor de \$132 millones.</li> <li>✓ Se ejecutó en su totalidad el contrato de cooperación entre Cortolima, Ecopetrol y la Fundación del Alto Magdalena por \$306 millones para la formulación e implementación de 5 y 10 Proyectos Ambientales Ciudadanos de Educación Ambiental –Procedas– respectivamente, capacitaciones de manejo de recursos y residuos y talleres de formación ambiental.</li> <li>✓ Se ejecutaron en su totalidad once contratos de prestación de servicios para la elaboración de los Planes Básicos de Restauración Ambiental en Predios Adquiridos por los Municipios del Contrato Plan (Art. 111 Ley 99 de 1993) – por valor de \$217 millones.</li> <li>✓ Ejecutado el convenio de cooperación para desarrollar la factibilidad del proyecto REED (reducción de emisiones por deforestación y degradación) corredor PNN Las Hermosas parque nacional natural Los Nevados. (Chaparral - San Antonio - Roncesvalles) – Valor \$20 millones.</li> <li>✓ Se ejecutó al 100% el contrato para realizar labores de 1er y 2do mantenimiento de 37 hectáreas de reforestación protectora, establecida en la vereda El Maito del municipio de Chaparral, por valor de \$35 millones.</li> <li>✓ En ejecución la fase de mantenimiento 1 de las restauraciones ecológicas ejecutadas en el marco del proyecto “Implementación de iniciativas para adelantar e iniciar procesos de restauración ambiental de áreas estratégicas en el</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL SUR DEL TOLIMA**

Sector	Avances
	<p>marco del Contrato Plan Sur del Tolima” financiado con recursos del DNP por \$2.935 millones. Los recursos para el mantenimiento 2 para ejecutar en la vigencia 2017, fueron solicitados al Fondo Regional de Contratos Plan.</p> <p>✓ Ejecutado el convenio suscrito entre la Gobernación del Tolima y CORTOLIMA para implementar el programa de educación ambiental y gestión del riesgo, en el marco del cual se han realizado: jornadas de sensibilización al manejo de residuos sólidos, jornadas de ornato, jornadas de siembra, formulación de proyectos, entre otros. Inversión \$1.150 millones.</p>
