



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA

Fecha de actualización:	Día / Mes / Año 23/05/2018	Fecha de corte de la información:	Día / Mes / Año 31/03/2018
Nombre del Gerente:	Wilber Jairo Vallejo Bocanegra	Numero Celular: 318 4 30 04 21	Correo Electrónico: wvallejo@dnpc.gov.co

1. INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA DE INTERVENCIÓN

Sur del Tolima



Departamento:	Tolima
No. de Municipios en el Contrato Plan:	14 (Alpujarra, Ataco, Chaparral, Coyaima, Dolores, Natagaima, Ortega, Planadas, Prado, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y Villarrica)
Fecha de Inicio de Negociación:	01/06/2012
Fecha de Suscripción:	12/01/2013
Año de inicio:	2013
Fecha de Suscripción Otro Sí I:	09/11/2017


	Inicial	Después Otro Sí I
Plazo de ejecución:	5 años	7 años
Año de terminación:	2018	2020

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA:

Objeto:	<ul style="list-style-type: none"> Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las de las entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y a la disminución de las brechas territoriales y los niveles de pobreza de las comunidades que habitan este territorio. El “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial” se entiende como un proceso continuo y ordenado de transformaciones económicas, sociales, ambientales e institucionales, cuya finalidad es mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades que ocupan y aprovechan un espacio rural determinado con el fin de impulsar su desarrollo y competitividad.
Eje Central:	<ul style="list-style-type: none"> El desarrollo rural para incrementar los ingresos de las familias campesinas y contribuir a mejorar su calidad de vida.

VALOR TOTAL (Millones \$ COP):

Total: \$900.000

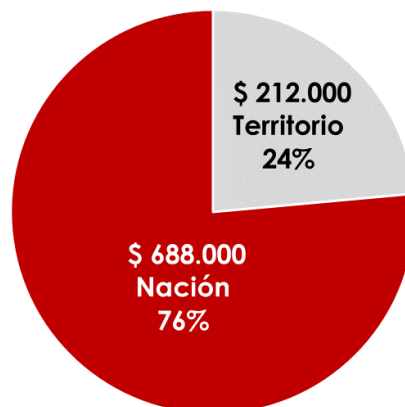



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Vigentes	No. Proyectos con Ejecución
Agricultura y Desarrollo Rural – (PDRIET)	11	4
Ambiente y Desarrollo Sostenible	6	2
Educación	18	1
Fortalecimiento institucional	1	0
Minas y Energía – Electrificación	17	2
Salud	17	4
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3	1
Transporte	6	2
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico	12	9
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda	4	1
TOTAL: 10 Sectores	95	26

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$ Cop)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales) (A)	%	Compromisos DNP (B)	% Aporte DNP (B/A)
Agricultura y Desarrollo Rural – (PDRIET)	110.000	25.000	22,7%	85.000	77,3%	35.000	41%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	67.000	62.000	92,5%	5.000	7,5%	3.000	60%
Educación	83.000	11.000	13,3%	72.000	86,7%	7.000	10%
Minas y Energía – Electrificación	147.000	5.000	3,4%	142.000	96,6%	30.000	21%
Salud	92.000	22.000	23,9%	70.000	76,1%	15.000	21%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	62.000	4.000	6,5%	58.000	93,5%	0	0%
Transporte	206.000	32.000	15,5%	174.000	84,5%	100.000	58%
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico	99.000	47.000	47,5%	52.000	52,5%	20.000	39%
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda	34.000	4.000	11,8%	30.000	88,2%	10.000	33%
TOTAL	900.000	212.000	23,6%	688.000	76,4%	220.000	32%



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA

AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO 31 DE 2018

EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

52%



Total Ejecución 2013 – 2018
(Millones de \$ Cop)

Sector	Inversiones Programadas (A)	Comprometido (B)	% Avance Financiero 2013-2018 (C/B)	% Avance Físico Compromisos 2013-2018
Agricultura y Desarrollo Rural – (PDRIET)	110.000	78.606	71%	27%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	67.000	10.139	15%	14%
Educación	83.000	30.565	35%	20%
Institucional	0	4.488	-	100%
Minas y Energía – Electrificación	147.000	48.041	33%	22%
Salud	92.000	14.966	16%	15%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	62.000	42.561	69%	65%
Transporte	206.000	208.012	101%	89%
Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico	99.000	23.566	24%	9%
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda	34.000	6.708	20%	19%
TOTAL	900.000	467.656	52%	38%

3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR

2018**

Acumulado (2013-2018)

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS*



54,5%



Fecha de corte: Marzo 31, 2018

***Nota:** El avance se calcula con base en la información reportada por la Gerencia Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte (bimensual, trimestral, semestral).

****Ningún indicador con periodicidad trimestral, por lo cual no se reportan datos cuantitativos para el primer trimestre del año.**



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA



Prioridad Estratégica 1

Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2018					Acumulado (2013-2018)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Déficit de vivienda rural (Semestral)	86,0%	79,0%	-	-	Sin avance a la fecha	Gris	79,0	84,0	100%		Verde	31-03-18
Soluciones de vivienda rural entregadas mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Semestral)	0	3.140	-	-	Sin avance a la fecha	Gris	3.140	1.096	34,9%		Rojo	31-03-18
Familias con proyectos productivos implementados mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	0	1.390	-	-	Sin avance a la fecha	Gris	1.390	390	28,1%		Rojo	31-03-18

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018

Sector	Avances
Agricultura – Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (PDRIET)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 390 familias del Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial -PDRIET- tuvieron apoyo para la implementación de proyectos productivos por valor de \$3.537 millones a través del INCODER. ✓ En el Municipio de Chaparral el programa de seguridad alimentaria RESA atendió a 1.490 familias con una inversión de \$1.494 millones; 260 familias se incorporaron al programa de Asistencia Técnica Especial, en coordinación con la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial; y 200 familias se vincularon al programa de implementación de proyectos de desarrollo rural del INCODER. ✓ Finalizado el convenio suscrito entre la Gobernación del Tolima y Cámara de Comercio de Ibagué por valor de \$1.150 millones, para realizar la fase I del programa de generación de ingresos que comprendió la caracterización comercial de las principales cadenas productivas, análisis de asociaciones, alianzas comerciales, y estudios y diseños que se requieren para adecuar espacios en los nueve municipios incluidos en el Contrato Plan, para implementar los proyectos de Centros de Valor Agregado. ✓ Para fortalecer la cultura y las capacidades comerciales y de generación de los ingresos de la población campesina del municipio de Natagaima, se invirtieron recursos por \$2.854 millones para la construcción de 4.980,33 m2 de la plazoleta de eventos y mercado campesino, la cual a la fecha se encuentra en funcionamiento, beneficiando aproximadamente a 23.000 personas. ✓ Se asignaron 3.140 subsidios de vivienda rural en los municipios de Chaparral, Coyaima, San Antonio, Planadas, Roncesvalles, Ataco, Rioblanco, Natagaima y Ortega, con una inversión total de \$53.426 millones. A la fecha se tienen construidas 1.141 viviendas en los municipios de Chaparral, Coyaima, San Antonio, Roncesvalles, Planadas, Ataco, Rioblanco, Natagaima y Ortega. Se continúa con la ejecución de 586 viviendas y en proceso de formulación, diagnóstico y viabilización 1.413. ✓ Por parte de la Gobernación del Tolima se realizaron inversiones por \$850 millones para la realización de la feria de cafés especiales en el municipio de Planadas y la participación de productores y asociaciones de café en la feria “Colombia Tierra de Diversidad” realizada en Corferias. ✓ Se encuentra en ejecución las obras de construcción de 261 mejoramientos de vivienda rural en el municipio de Ataco, con una inversión de \$6.243 millones.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA




Prioridad Estratégica 2

Infraestructura

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2018					Acumulado (2013-2018)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Porcentaje de kilómetros del anillo vial del Sur del Tolima en buen estado (Anual)	51,0%	94,0%	-	-	Sin avance a la fecha	Gris	94,0%	69,0%	73,4%		Rojo	31-03-18
Número de personas beneficiadas con proyectos de acueducto (Anual)	0	69.127	-	-	Sin avance a la fecha	Gris	69.127	26.000	37,6%		Rojo	31-03-18
Número de personas beneficiadas con proyectos de alcantarillado (Anual)	0	19.530	-	-	Sin avance a la fecha	Gris	19.530	0	0,0%		Rojo	31-03-18
Municipios conectados a la red de fibra óptica nacional (Anual)	0	-	-	-	Sin meta para 2018	Gris	9	9	100,0%		Verde	31-03-18
Cobertura de energía eléctrica en vivienda rural lograda por medio del Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	72,0%	-	-	-	Sin meta para 2018	Gris	92,0%	80,0%	47,82%		Rojo	31-03-18

SEMÁFORO



AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018

Sector	Avances
Minas y Energía	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A través del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, se han invertido un total de \$34.721 millones de pesos para la electrificación de 3.633 usuarios en los 9 municipios del CP Tolima. A la fecha las obras se encuentran terminadas y a cargo del Operador de Red. ✓ Culminado el convenio entre la Gobernación del Tolima y EGETSA para la “actualización y formulación de nuevos estudios y diseños de proyectos de electrificación rural” por valor de \$446 millones. ✓ Se realizaron las obras de electrificación rural en 14 veredas de los 9 municipios para beneficiar 402 familias por valor de \$5.264 millones. A la fecha los convenios se encuentran suspendidos por trámites de pagos pendientes por la Gobernación del Tolima. ✓ Se ejecutaron las obras de electrificación rural de las veredas Las Orquídeas (Roncesvalles), San Pablo (Planadas), Chenche Buenos Aires, Bocas de Babi y Rosario III (Coyaima), Beltrán y Betania (Ataco) y Guineal Horizonte (Ortega), con una inversión de \$2.200 millones para beneficiar 227 familias, en el marco del convenio N°760 y 972 suscrito entre la Gobernación del Tolima y EGETSA. ✓ En ejecución a cargo del Operador de Red Enertolima las obras aprobadas en CAFAER 2016 para la electrificación rural de las veredas Apone y La Florida (Ataco), La Hacienda, La Floresta, Aguas Blancas, Los Guayabos, Marquetalia, Palomas, Primavera Alta, San Joaquín, San Miguel, Topacio, y Altamira (Planadas) y Rioverde parte baja y alta, La Palma, La Laguna, El Moral, El Triunfo, La Catalina, El Diamante, El Canelo, El Bosque, Alpes, Alfonso Carrillo parte baja – alta, y Palma Horizonte (Rioblanco), por valor de \$8.803 millones. ✓ Aprobados recursos del CAFAER realizado en el mes de diciembre de 2017 por \$5.872 millones para la electrificación de las veredas Carrusel, La Rivera, Las Brisas, El Pescado, Campo Hermoso, Convenio, Holanda, Versalles (Ataco),



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA

Sector	Avances
<p>Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p>	<p>Alemania (Chaparral), Santa Helena parte baja, parte alta, Escobales (Ortega) y La Argentina, Mesas de Palmichal, Belalcazar y Santana (Rioblanco), para beneficiar 458 usuarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El Ministerio de TIC ha ejecutado \$38.560 millones en sus programas de Conectividad, Computadores para Educar, Gobierno en Línea. Se han entregado 6.858 computadores, se han conectado gratuitamente 244 sedes educativas, se ha habilitado el uso de la herramienta de Gobierno en Línea para las nueve Alcaldías del Contrato Plan y se han capacitado a 7.100 personas como ciudadanos digitales. ✓ Se realizó la implementación de seis aulas musicales digitales en el marco del Programa Tolima Vive Digital en los municipios de Planadas, Coyaima y Roncesvalles, Ataco, Rioblanco y Natagaima. \$2.000 millones. ✓ Se encuentra en proceso de contratación el proyecto Nativos Digitales a cargo de la Universidad del Tolima para entregar aulas digitales a las instituciones educativas
<p>Transporte</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En el marco del convenio 2879 de 2013 suscrito entre INVIAS y la Gobernación del Tolima, se han adelantado obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación en los 6 tramos viales que comprenden el Anillo Vial del Sur del Tolima, con una intervención total de 48,29 km y una inversión de \$208.012 millones. A continuación, se describen las intervenciones realizadas: <ul style="list-style-type: none"> – Chaparral-Limón-Rioblanco: En la vía se realizaron obras de estabilización de taludes, control de erosión, manejo de aguas lluvias, construcción de 3 muros de contención, atención de 5 puntos críticos y rehabilitación de 9,18 km a nivel de pavimento asfáltico. El tramo vial tuvo una inversión total de obra e interventoría de \$55.491 millones. – Ataco-Planadas: Se realizó la construcción de 17 espolones con el objeto de controlar el cauce del río Atá y evitar los daños en la calzada del tramo vial. Se realizó una inversión total en obra e interventoría por \$35.978 millones. – Castilla-Coyaima: Se realizaron obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de 13,26 km, con una inversión total de estudios-diseños, obra e interventoría por \$20.059 millones. – Coyaima-Ataco: Se adelantaron obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de 5,45 km, con una inversión total en estudios-diseños, obra e interventoría de \$16.439 millones. – Chaparral-Tuluní-Señoritas: Terminadas las obras de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación en 17,1 km. Se realizó adición de recursos por parte de la Gobernación del Tolima para adelantar la pavimentación de 2,4 km adicionales con un avance de obra del 30%, para completar una intervención total de 19,5 km. El tramo vial ha tenido una inversión en estudios-diseños, obra e interventoría de \$75.499 millones. – Señoritas-Palmichal-Rioblanco: En ejecución las obras de construcción 900 m de placa huella, con una inversión de \$1.993 millones.
<p>Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Suspendida la obra de construcción del alcantarillado de la vereda Maracaibo del Municipio de Rioblanco, debido a los problemas estructurales que presenta el puente Cambrial, que ha impedido el paso de material para la obra. La inversión equivale a \$327 millones, que beneficiará a 2.000 habitantes. ✓ Entregadas las obras de construcción de la celda de residuos sólidos del municipio de Chaparral por \$160 millones que beneficia a más de 26.000 habitantes. ✓ Ejecutadas las obras para el mejoramiento del acueducto urbano del municipio de Chaparral por \$2.477 millones, para beneficiar más de 5.000 habitantes – Avance de obra 100%. ✓ En ejecución la fase 3 del proyecto para el mejoramiento del sistema de acueducto urbano del municipio de Rioblanco y presenta un avance de obra del 97%, con una inversión de \$2.131 millones. ✓ En ejecución la fase 3 del proyecto de mejoramiento del sistema de acueducto urbano del municipio de San Antonio y presenta un avance de obra de 20%, con una inversión de \$2.661 millones. ✓ Se encuentra en proceso de ajustes las observaciones a la fase II del proyecto de mejoramiento de acueducto urbano del municipio de Coyaima por parte de FINDETER, con el fin de dar trámite a la reformulación N°4.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En ejecución las obras para el mejoramiento del acueducto del casco urbano del Municipio de Planadas por un total de \$1.578 millones. Avance de obra del 80%. ✓ En ejecución consultoría de estudios y diseños para 24 Acueductos y Alcantarillados Rurales y Urbanos por valor de \$1.600 millones, que beneficiarán a más de 27.000 habitantes en los nueve municipios vinculados al Contrato Plan. ✓ En el marco del proyecto “Saneamiento Básico Rural”, se ha logrado a la fecha liquidar el convenio con el municipio de Planadas y realizar el pago del 90%; se reiniciaron los convenios con el municipio de Coyaima, San Antonio, Natagaima, Rioblanco y Ortega, para dar terminación a las obras pendientes y realizar los pagos pactados. Se suscribió convenio con el municipio de Roncesvalles y se está tramitando el levantamiento de suspensión del proyecto. En general el proyecto tiene un avance de obra de 336 unidades sanitarias construidas.



Prioridad Estratégica 3

Desarrollo Social

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS

Indicador	Línea Base	2018					Acumulado (2013-2018)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Soluciones de vivienda urbana entregadas mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	0	-	-	-	Sin meta para 2018	Gris	463	258	55,7%		Rojo	31-03-18
Sedes educativas intervenidas, mejoradas o construidas mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	0	-	-	-	Sin meta para 2018	Gris	270	154	57,0%		Rojo	31-03-18
Instalaciones hospitalarias construidas y adecuadas mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	0	9	-	-	Sin avance a la fecha	Gris	14	3	21,4%		Rojo	31-03-18

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018

Sector	Avances
Educación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se adelantaron mejoramientos en infraestructura educativa, con una inversión de \$9.588 millones, logrando el mejoramiento estructural, construcción de aulas, cerramientos y adecuación de baterías sanitarias en más de 95 instituciones y sedes educativas. ✓ A través del Ministerio de Educación Nacional se hizo la compra de equipos tecnológicos y mobiliario para el Centro Regional de Educación Superior (CERES) del municipio de Planadas y mejoramiento de la infraestructura tecnológica y construcción de unidades sanitarias en el CERES de Chaparral, con una inversión total de \$257 millones beneficiando a 1.000 estudiantes. ✓ En 44 sedes educativas de los nueve municipios del Contrato Plan, se implementó el Programa Educativo Rural con una inversión de \$460 millones, beneficiando a más de 2.000 estudiantes. Las principales acciones fueron: Dotación de kits de materiales y modelos educativos flexibles, Implementación de la estrategia flexible Pos primaria, Imple-



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA

Sector	Avances
	<p>mentación de la estrategia flexible Media Rural, Adquisición de Bibliotecas para las estrategias educativas, Adquisición de Centros de Recursos del Aprendizaje, Adquisición de laboratorios para Pos primaria, Consultoría para apoyo y acompañamiento a los Círculos de calidad, Red docentes y/o Microcentros de la zona rural.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementado el Programa Todos a Aprender en 47 sedes educativas, beneficiando a más de 2.500 estudiantes, poniendo en marcha prácticas de aprendizaje en lenguaje y matemáticas que redundan en mejores resultados en las pruebas Saber, con una inversión de \$2.790 millones. ✓ Ejecutado el Programa Educativo Regional con PNUD para beneficiar 50 instituciones y sedes educativas en los nueve municipios incluidos en el Contrato Plan, por valor de \$512 millones. ✓ Terminadas las obras para la terminación la planta física de la Institución Educativa José María Carbonell y se encuentran en ejecución las obras de las IE's Domingo Savio y Pablo VI en el municipio de San Antonio, con una inversión de \$2.200 millones y la IE La Voz de la Tierra del municipio de Roncesvalles con una inversión de \$150 millones. ✓ Ejecutado el convenio suscrito entre DNP y Gobernación del Tolima para cofinanciar el programa de alimentación escolar y beneficiar con almuerzos y raciones alimenticias a 15.017 estudiantes de las Instituciones Educativas de los municipios del Tolima, con una inversión de \$1.417 millones. ✓ Ejecutados los estudios y diseños para la construcción para la construcción de la institución educativa Bilbao en el municipio de Planadas, con una inversión de \$331 millones. ✓ Aprobados recursos por OCAD Departamental para la construcción de la institución educativa Bilbao en el municipio de Planadas, con una inversión de \$13.758 millones.
<p>Salud y Protección Social</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entregadas ambulancias tipo TAB y TAM a 9 hospitales de los municipios del sur del Tolima por un valor de \$1.120 millones, con el fin de mejorar la prestación del servicio en los municipios, beneficiando más de 200.000 habitantes. ✓ Se realizó la dotación de una planta generadora de gas para el Hospital de Chaparral con el fin de disminuir los costos de la prestación de servicios de salud por \$255 millones, beneficiando a 153.710 habitantes de este Municipio. ✓ Se realizó la compra de equipos biomédicos para los Hospitales de Coyaima y Chaparral por \$213 y \$333 millones respectivamente, buscando fortalecer la capacidad instalada para la prestación de servicios de salud a nivel nacional, beneficiando a los habitantes de estos municipios. ✓ El Hospital San Juan Bautista de Chaparral realizó el saneamiento fiscal de la entidad por \$2.600 millones, permitiendo pagar sus pasivos y logrando su re-categorización. ✓ Finalizada ejecución de los convenios suscritos entre la Gobernación del Tolima y los Hospitales de Ataco, Natagaima, Ortega, Rioblanco, Planadas y San Antonio para la implementación del programa de seguridad alimentaria, beneficiando a 1.440 niños, niñas de 0-5 años, madres gestantes y lactantes con una inversión de \$2.345 millones. ✓ En ejecución la consultoría para realizar los estudios y diseños del nuevo Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral, Hospital San Roque E.S.E. Coyaima y Hospital San José E.S.E. de Ortega, con una inversión de \$1.900 millones. Los estudios y diseños se encuentran en ajustes según las solicitudes realizadas por la Secretaría de Salud y Ministerio de Salud. ✓ Terminada y entregada a la comunidad la obra de adecuación de la infraestructura del Centro de Salud de Velú (Natagaima) con una inversión total de \$251 millones para beneficiar más de 10.000 habitantes. ✓ Liquidado el convenio mediante el cual se financiaron las obras de sustitución de la cubierta del Hospital Santa Lucía de Roncesvalles por valor de \$267 millones. ✓ En proceso de liquidación el proyecto "Mejoramiento de la capacidad instalada de las IPS públicas de los municipios del Contrato Plan", a través del cual los hospitales de los municipios de Ataco, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio realizaron la adquisición de equipos médicos, con una inversión de \$3.143 millones. ✓ Se realizaron obras de adecuación en la sala de partos del hospital La Misericordia, con una inversión de \$351 millones, a cargo del municipio.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En contratación a cargo del Hospital la Misericordia de San Antonio los recursos aprobados por el Ministerio de Salud para la obra de adecuación de la sala de hospitalización, con una inversión de \$1.042 millones.
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entregadas 101 viviendas gratis urbanas en el municipio de Chaparral por valor de \$4.098 millones. ✓ Se terminaron y entregaron 69 viviendas de la urbanización Luis Carlos Galán del municipio de Natagaima, con una inversión de \$777 millones. ✓ Terminados los mejoramientos de 43 viviendas de la zona urbana, con una inversión de la Gobernación del Tolima y el municipio de Natagaima por valor de \$446 millones. ✓ Se suspendieron las obras de construcción de 50 viviendas de la urbanización Jorge Andrade del municipio de Natagaima por valor de \$1.368 millones, debido al trámite de giro de recursos pendientes por parte de la Gobernación del Tolima.




Prioridad Estratégica 4

Sostenibilidad Ambiental

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2018					Acumulado (2013-2018)			Fecha de Corte		
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección mediante el Contrato Plan Sur del Tolima (Anual)	0	-	-	-		-	650	421	64,8%		Rojo	31-03-18

SEMÁFORO



AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018

Sector	Avances
Ambiente y Desarrollo Sostenible	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se firmaron contratos de cooperación con Cortolima, los cuales a la fecha se encuentran ejecutados en su totalidad con actas de liquidación que reposan en los archivos de la Corporación: ✓ Manejo de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques en 37 hectáreas de Chaparral por \$61,5 millones, de los cuales Cortolima aporta \$53 millones. ✓ Establecimiento y aislamiento de 20 hectáreas de reforestación protectora en Chaparral por \$57 millones, de los cuales Cortolima aporta \$49 millones. ✓ Mantenimiento de 2 reservorios en resguardos indígenas en Guipa (Ortega) y Rincón Velú (Natagaima) por \$326 millones. ✓ Optimización de acueductos en las comunidades indígenas Totarco Tamarindo y Totarco Dinde, en Coyaima por \$184 millones, de los cuales Cortolima aporta \$166 millones. ✓ Actividades de sensibilización y recuperación ambiental en el Barrio Edén (Chaparral) y la Quebrada La Sopera por valor de \$17 millones, de los cuales Cortolima aporta \$15 millones. ✓ Se ejecutó el convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y Cortolima por \$550 millones, para la implementación de una estrategia para la prevención y reducción del impacto de la actividad minera en el Departamento, proyecto que se ejecutó en su totalidad.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL TOLIMA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none">✓ Se ejecutó al 100% el contrato de cooperación entre Cortolima y Corcuencas para la protección de la cuenca del Río Saldaña y de la Quebrada La Platina, por valor de \$132 millones.✓ Se ejecutó en su totalidad el contrato de cooperación entre Cortolima, Ecopetrol y la Fundación del Alto Magdalena por \$306 millones para la formulación e implementación de 5 y 10 Proyectos Ambientales Ciudadanos de Educación Ambiental –Procedas– respectivamente, capacitaciones de manejo de recursos y residuos y talleres de formación ambiental.✓ Se ejecutaron en su totalidad once contratos de prestación de servicios para la elaboración de los Planes Básicos de Restauración Ambiental en Predios Adquiridos por los Municipios del Contrato Plan (Art. 111 Ley 99 de 1993) – por valor de \$217 millones.✓ Ejecutado el convenio de cooperación para desarrollar la factibilidad del proyecto REED (reducción de emisiones por deforestación y degradación) corredor PNN Las Hermosas parque nacional natural Los Nevados. (Chaparral - San Antonio - Roncesvalles) – Valor \$20 millones.✓ Se ejecutó al 100% el contrato para realizar labores de 1er y 2do mantenimiento de 37 hectáreas de reforestación protectora, establecida en la vereda El Maito del municipio de Chaparral, por valor de \$35 millones.✓ Ejecutado el convenio suscrito entre la Gobernación del Tolima y CORTOLIMA para implementar el programa de educación ambiental y gestión del riesgo, en el marco del cual se han realizado: jornadas de sensibilización al manejo de residuos sólidos, jornadas de ornato, jornadas de siembra, formulación de proyectos, entre otros. Inversión \$1.150 millones.✓ Ejecutada la fase de mantenimiento N°1 de las restauraciones ecológicas ejecutadas en el marco del proyecto “Implementación de iniciativas para adelantar e iniciar procesos de restauración ambiental de áreas estratégicas en el marco del Contrato Plan Sur del Tolima” financiado con recursos del DNP por \$2.935 millones. Se están gestionando los recursos para cofinanciar el mantenimiento N°2 y se encuentra en contratación con recursos de CORTOLIMA las actividades programadas para el mantenimiento N°3.✓ Se encuentra en ejecución a cargo de RAPE el proyecto ‘Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de paramo bosque alto andino y servicios eco sistemáticos de la región central, con una inversión total para los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta y Huila de \$32.499 millones de los cuales son aportados por el SGR del departamento del Tolima \$1.000 millones.
