 <p>El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación</p>	FICHA INFORMATIVA CONTRATOS PLAN	Contratos Plan Subdirección General Territorial Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		

Fecha de actualización:	Día / Mes / Año 31/12/2018	Fecha de corte de la información:	Día / Mes / Año 31/12/2018
Nombre del Gerente:	Eliana Andrea Plaza Vásquez	Numero Celular: 301-6174154	Correo Electrónico: eplaza@dnpp.gov.co

1. INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA DE INTERVENCIÓN

Cauca



Departamento:	Cauca
No. de Municipios en el Contrato Plan:	42 (Popayán, Cajibío, El tambo, Timbío, La Sierra, Morales, Piendamó, Rosas, Sotaró, Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, La vega, Mercaderes, Patía, Guapí, López de micay, Timbiquí, Caldon, Inzá, Jambaló, Páez, Puracé, Silvia, Toribío, San Sebastián, Piamonte, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, Guachene, Villarrica, Buenos Aires, Suarez, Puerto Tejada, Padilla, Suarez, Totoro, Sucre)
Fecha de Inicio de Negociación:	12/03/2012
Fecha de Suscripción:	19/01/2013
Año de inicio:	2012


	Inicial	Después de 2 otrosíes
Plazo de ejecución:	3 años	7 años
Año de terminación:	2017	2023

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA:

Objeto:	<ul style="list-style-type: none"> Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y al bienestar de las comunidades y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Cauca.
Eje Central:	<ul style="list-style-type: none"> El Contrato Plan se articula alrededor del desarrollo rural integral con enfoque territorial, el mejoramiento del bienestar de las personas y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Cauca, que permita el fortalecimiento de instituciones y comunidades, y la consolidación de un territorio integralmente seguro, capaz de responder creativamente a nuevos desafíos.

VALOR TOTAL (Millones \$ COP):

Valor Total: \$622.684 Millones

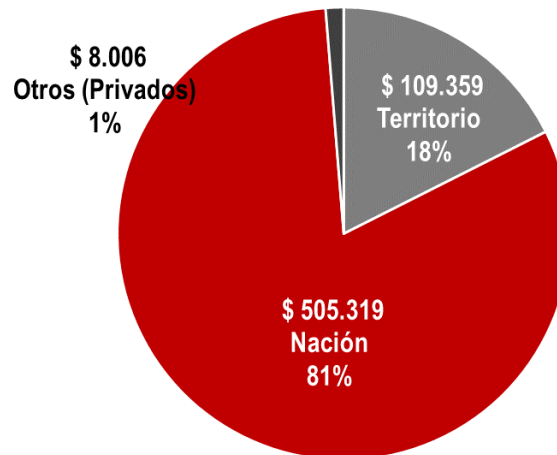

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Vigentes	No. Proyectos Terminados	No. Proyectos con Ejecución	No. Proyectos Gestión	No. Proyectos Descartados
Agricultura y Desarrollo Rural PDRIET	11	5	2	4	0
Ciencia y Tecnología		1			0
Comercio Industria y Turismo	5	1	1	3	0
Cultura	3	3			0
Educación	7	3	3	1	0
Inclusión Social y Reconciliación	3	1	1	1	0
Minas y Energía	1	1			0
Salud y Protección Social	8	1	2	5	0
Trabajo	1			1	0
Transporte	10	7	3		0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	37	21	15	1	0
TOTAL: 11 Sectores	87	44	24	16	0

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES (Millones de \$COP)

Sector	Acuerdo Estratégico	Territorio y Otros	% aporte territorio	Sector (A)	% aporte sector	DNP (B)	% Aporte DNP (B/A)
PDIET	107.200	17.200	15%	90.000	18%	30.000	33%
Ciencia y Tecnología	33.848	2.126	2%	31.722	6%	2.000	6%
Turismo y Cultura	7.285	1.449	1%	5.836	1%	4.536	78%
Empleo e Ingresos	4.841	380	0%	4.461	1%	3465	78%
Educación	40.123	15.123	13%	25.000	5%	19.800	79%
Inclusión Social y Reconciliación	5.364	1.754	1%	3.610	1%	2.510	70%
Minas y Energía	3.898	0	0%	3.898	1%	0	0%
Salud y Protección Social	51.292	20.500	17%	30.792	6%	12.692	41%
Transporte	172.720	2.720	2%	170.000	34%	100.000	59%
Agua Potable y Saneamiento Básico	196.113	56.113	48%	140.000	28%	40.000	29%
Total	622.684	117.365	19%	505.319	81%	215.003	43%

AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL



Total ejecución 2013 – 2018
(Millones de \$ COP)

Sector	Presupuesto Indicativo (A)	Recursos Comprometidos (B)	% Avance Financiero (B/A)
PDIET - Agricultura	107.200	79.002	74%
Educación	40.123	42.827	107%
Salud	51.292	43.366	85%
Inclusión Social	5.364	6.273	117%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA INFORMATIVA CONTRATOS PLAN

Contratos Plan
Subdirección General Territorial
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sector	Presupuesto Indica- tivo (A)	Recursos Comprome- tidos (B)	% Avance Financiero (B/A)
SUB TOTAL SOCIAL	96.779	92.466	96%
Comercio y Turismo	1.737	1.737	100%
Cultura	8.987	4.777	53%
Trabajo	1.402	2.609	186%
SUB TOTAL PRODUCTIVO	12.126	9.123	75%
Vías	172.720	198.307	115%
Agua Potable Saneamiento Basico	196.113	110.451	56%
Energia	3.898	3.898	100%
Tics	33.848	33.848	100%
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA	406.579	346.504	85%
TOTAL CP CAUCA	622.684	527.095	85%

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR

2018

Acumulado (2013-2018)

PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS*

48,05%

67,73%

Fecha de corte: Diciembre, 2018







***Nota:** El avance se calcula con base en la información reportada por la Gerencia Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.




Prioridad Estratégica 1

Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2018					Acumulado (2013-2018)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance			Meta	Avance	% avance			
Porcentaje de ingreso agrícola familiar (Anual)	35%	2,5%	5,0%	100%		Verde	10%	10%	100%		Verde	31-12-18
Familias con proyecto productivo implementado (Semestral)	0	1.080	0	0%		Rojo	2.650	2.774	100%		Verde	31-12-18
Hectáreas intervenidas con proyectos productivos (Semestral)	0	-	-	-		Gris	1.335	1.896	100%		Verde	31-12-18

SEMÁFORO





CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018

Sector	Avances
Agricultura y Desarrollo Rural (PDRIET)	<p>Se ejecutaron los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la vigencia 2014, a través de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) se ejecutaron 216 millones para el ordenamiento productivo y de la propiedad en 7 municipios del norte del Cauca, beneficiando a más de 150.000 habitantes, ejecutado dentro del año en un 100%. El INCODER se vinculó en 2014 al Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial - PDRIET con la asignación de 151 subsidios IPDR una inversión aproximada de 1.922 Millones. En junio de 2015, con recursos Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural-DNP se asignó recursos por \$8.006 Millones para la implementación de 2.334 proyectos productivos para la generación de ingresos a la región norte del departamento del Cauca, la ejecución fue realizada por el operador "Asociación de Municipios del Norte del Cauca – AMUNORCA", entregada en el mes de diciembre de 2016. El Municipio de Santander de Quilichao recibió los estudios y diseños para las obras adicionales a realizar en el lote de la Plataforma o Parque Agroindustrial MILAGRO, proyecto por valor de 59 millones que permite la implantación de los proyectos que componen el parque. Se entregaron Vivienda Interés Social Rural con recursos de DNP y Banco Agrario (2013) por valor de \$17.538 millones los cuales fueron operados por COMFACAUCA se adjudicaron desde octubre de 2016 subsidios de vivienda en los municipios de Buenos Aires (669), Caldono (180) y Padilla (201). <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vivienda Interés Social Rural: con recursos de DNP y Banco Agrario para la vigencia 2014, se adjudicó los subsidios de vivienda al operador Universidad AUTÓNOMA el cual viene trabajando desde octubre de 2017 a entregado con corte a julio de 2018, 295 viviendas nuevas en los municipios de Guachené y 319 en el municipio de Suarez, quedando cerca de 17 viviendas en Guachene y 58 viviendas en Suarez por entregar. Avance de obra 83,5%. Para la vigencia 2015, el Banco Agrario definió como operador de la ejecución a Fiduagraria se entregarán subsidios de vivienda a los municipios de Caloto (530) y Corinto (438), Avance del 19% en diagnóstico y estructuración. Inversión total por valor de \$47.733 millones. <p>Se avanza con la estructuración de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> El proyecto "Centro de Acopio y Transformación Agroindustrial de piña en el Norte del Cauca" proyecto que beneficia a más de 500 productores de piña y otras frutas (banano, mango, cítricos) de los municipios: Buenos Aires, Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Guachene, Suarez por valor de \$3.217 Millones. Se realizó alianza con la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle para estructurar el proyecto fecha de entrega enero de 2019. La Gerencia Territorial, en coordinación con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, estructuró el proyecto "Construcción y dotación de una planta para elaboración de Harina y Almidón de yuca en el Norte del Cauca" por valor de \$4.719 Millones que beneficia a más de 650 productores de yuca y ralladeros de los municipios: Buenos Aires, Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Guachene y Suarez. El proyecto tiene una financiación a través de recursos de la Gobernación del Cauca - Sistema General de Regalías, al cual se presentó en el mes de agosto 2018. Actualmente se encuentra en ajustes conforme a las observaciones del DNP-SGR y el Ministerio de agricultura. Se ha subsanado lo concerniente al permiso de vertimientos (radicado en CRC) y













Sector	Avances
	<p>la estrategia de producción de semilla mejorada que va a ser suministrada por CORPOICA-CLAYUCA, así como la conformación de la Federación de productores y ralladeros de la yuca del Norte del Cauca -YUCANORCA-. El ministerio de agricultura realizó observaciones al componente técnico a la entrega de la materia vegetal de las 2.800.000 de estacas de yuca que se va a suministrar para el establecimiento de 280 hectáreas proyectadas con las variedades mejoradas en los municipios beneficiarios se presenta a mesa técnica del SGR enero de 2019.</p>




Prioridad Estratégica 2

Desarrollo Social

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2018				Acumulado (2013-2018)			Fecha de Corte	
		Meta	Avance	% avance	Meta	Avance	% avance			
Nuevos cupos en educación Técnica profesional y Tecnológica en el norte del departamento del Cauca (Semestral)	0	270	225	83,3%	 Naranja	1.035	1.035	100%	 Verde	31-12-18
Porcentaje de colegios con clasificación A+ A B en los resultados de las pruebas SABER 11 para los municipios beneficiados por el Contrato Plan Cauca (Anual)	2%	5%	4%	80%	 Naranja	5%	4%	80%	 Naranja	31-12-18
Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS (Anual)	90%	91%	92%	100%	 Verde	92%	92%	100%	 Verde	31-12-18
Infraestructura de la red Publica hospitalaria de servicios de salud construida (Anual)	0	13	13	100%	 Verde	13	13	100%	 Verde	31-12-18
Bibliotecas Construidas (Anual)	0	-	-	-	 Gris	5	5	100%	 Verde	31-12-18
Personas víctimas de la violencia atendidas en el Centro de Atención a Víctimas (Trimestral)	0	4.000	4.095	100%	 Verde	10.000	6.354	63,5%	 Rojo	31-12-18



AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018

Sector	Avances
Cultura	Se ejecutaron los siguientes proyectos:



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> • Con recursos del Ministerio de Cultura por \$3.790 millones y DNP \$600 millones se logró la construcción y entrega de las Bibliotecas Públicas de los Municipios de Miranda (2013), Guachené y Caloto (2014), Corinto, Puerto Tejada, Buenos Aires, Toribio (2016), y la casa de la Cultura del Municipio de Corinto (2016) beneficiando a más de 100.000 habitantes • Mediante la alianza, Instituto Nacional de Vías -INVIAS- (\$600 millones), DNP-Contratos Plan (\$400 millones) y Gobernación del Cauca (\$150 millones), se entregó la obra de adecuación de la antigua Estación del Ferrocarril del Municipio de Suarez como Casa de la Cultura, beneficiando a más de 400 actores culturales del Municipio. • En coordinación con Gobernación del Cauca, en 2015 se desarrollaron 23 propuestas de manifestaciones culturales dentro de la oferta nacional del Ministerio de Cultura por valor de \$387 millones en 8 municipios de la Subregión norte del Cauca (Caldono, Corinto, Caloto, Guachene, Jámalo, Miranda, Santander de Quilichao y Villarrica). Se beneficiaron más de 150 actores culturales.
Educación	<p>Se ejecutaron los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se construyó el Bloque 1, primera fase del CERES municipio de Miranda. Obra contratada por valor de \$1.037 millones, beneficia a 1.000 jóvenes de la región. • Se construyó el Centro de Formación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- Norte del Cauca, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, con una inversión de \$18.111 millones la cual beneficiará a más de 4.000 estudiantes/año en un área 15.000 m2 una oportunidad de incrementar la oferta de carreras tecnológicas en el Norte del Cauca, se cofinanció con recursos del DNP-Contratos Plan y SENA. • Para incrementar los cupos del programa de Alimentación Escolar PAE en el departamento del Cauca, con recursos de DNP-Contratos Plan, se firmó con la Gobernación el contrato específico derivado el mes de junio de 2016 por valor de \$3.634 millones beneficiando a 57.681 niños y niñas del departamento, se dio ampliación en tiempo para la ejecución, proyecto terminado 100%. <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desde el mes de noviembre de 2017 avanza la ejecución de la Construcción primera etapa de la Ciudadela Universitaria-Sede Norte de la UNICAUCA, por valor de \$9.300 millones con aportes de DNP-Contratos Plan 2.200 millones Gobernación del Cauca-SGR \$3.300 millones y UNICAUCA \$3.800 millones, beneficiando a mas de 5.000 estudiantes de la región. La ejecución de la obra tiene un avance del 46,7%. • Fue suspendida la ejecución del proyecto de acceso y permanencia a la educación superior técnica y tecnológica, firmado en noviembre de 2013 por la Gobernación del Cauca-SGR y UNICOMFACAUCA, el cual ha otorgado 810 becas a jóvenes en condición de vulnerabilidad en los 13 municipios por valor de \$6.322 millones, presenta un avance en su ejecución del 93%. La Gobernación del Cauca viene adelantando las gestiones administrativas para el levantamiento de giros por parte del DNP-SGR, en el mes de noviembre se envió informe con actividades de cumplimiento a los compromisos del plan de mejora impuesto por DNP. • Fue Suspendida la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la calidad de la educación básica y media en 64 instituciones educativas de bajo logro en trece (13) municipios del norte del Cauca” obra financiada con recursos de Gobernación del Cauca-SGR, Empresarios por la Educación y UNICAUCA, por valor de \$4.422 millones, presenta un avance es su ejecución del 42%. La Gobernación del Cauca y la Universidad del Cauca vienen adelantando las



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sector	Avances
Inclusión Social y Reconciliación	<p>gestiones administrativas para el levantamiento de giros por parte del DNP-SGR, a la fecha no se dado cumplimiento al plan de mejoramiento e intervención por parte del Departamento Nacional de Planeación-DNP.</p> <p>Se ejecutó el siguiente proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Con recursos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y del Municipio de Santander de Quilichao (\$1.050 millones incluida su dotación), terminó la construcción del Centro Regional de Atención a las Víctimas que atenderá a más de 12.000 víctimas del conflicto en el Norte del Cauca. <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Con aportes por \$4.504 millones (DNP-Contratos Plan) y el aporte del lote por el Municipio de Puerto Tejada, se logró iniciar la Construcción del Centro de Atención Integral a la Familia - CAIF- que atenderá más de 300 familias en situación de vulnerabilidad del Municipio de Puerto Tejada, con servicios sociales como: atención a la primera infancia, salud, recreación y formación, Se aprobó en el mes de julio el otro si, en tiempo y en recursos, adicionándole al presupuesto un valor de \$ 618 millones y una adición en el tiempo de 4 meses y 15 días, para un total de \$ 5.122 millones como presupuesto actualizado y 18 mese 15 días como el tiempo total de duración de la obra actualmente se tiene un avance de obra física del 99%.
Salud y Protección Social	<p>Se ejecutaron los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En 2014, el Municipio de Santander de Quilichao adquiere y cede a la ESE Francisco de Paula Santander el lote para la reubicación del Hospital de Nivel II con inversión de 1.500 millones, los estudios y diseños fueron financiados con recursos del Municipio y la ESE por valor de \$400 millones. Se benefician más de 385.000 habitantes Con aportes de la Gobernación del Cauca, las ESEs 1,2 y 3 del Norte del Cauca y los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Santander de Quilichao, Caldono, Buenos Aires, Toribio, Padilla, se logró, la dotación de 9 Ambulancias para los hospitales de la región por valor de \$1.527 millones. <p>En el desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través del mejoramiento de la Red de Salud Pública del Norte del Cauca se vienen adelantado los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el mes de agosto de 2017 Inició la obra para la "Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE - Santander de Quilichao - Departamento del Cauca" por un valor de \$35.489 millones, Esfuerzo tripartita entre el DNP Contratos Plan (\$15.000 millones), Ministerio de Salud y Protección Social (\$8.629 millones), Gobernación del Cauca-SGR (\$12.060 millones) y la ESE Francisco de Paula Santander (aporta el lote) beneficiando a más de 385.000 habitantes de la región. Avance de obra física 21,00%. El pasado 15 de agosto inicio la ejecución para la entrega de equipamiento medico del proyecto denominado "Dotación Hospitalaria en 9 municipios de la región norte del Cauca" por valor de \$3.323 millones recursos en su totalidad con dineros del SGR de la Gobernación del Cauca, se benefician más de 285.000 habitantes avance de entrega a las ESE del departamento 85%. El pasado viernes 3 de agosto de 2018 el OCAD Región Pacifico del SGR, en la ciudad de Popayán aprobó el proyecto: "Reposición (Reubicación) Hospital Nivel I de Villa Rica" que beneficiará a mas de 16.781 personas del norte del Cauca, Inversión por valor de \$7.738 millones,



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sector	Avances
	<p>con aportes de Ministerio de Salud \$2.738 millones y la Gobernación del Cauca-GR \$5.000 millones este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de salud de la población del municipio de Villarica y sus alrededores propiciando el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, equidad y sostenibilidad, actualmente se encuentra en la asamblea departamental para su aprobación de incorporación de recursos al presupuesto de la gobernación.</p> <p>Actualmente, se adelanta la estructuración de cuatro proyectos en el sector salud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reubicación, Construcción del Hospital del municipio de Miranda. Se aprobó el documento de red de prestación de servicios enviado por la secretaria de salud departamental al Ministerio de Salud y Protección Social, el cual permite tener la tipología C pertinente a la prestación del servicio hospitalario en el municipio. Fue aprobada la capacidad instalada del hospital por parte del Ministerio de Salud lo que permite la presentación del Programa Medico Arquitectónico, actualmente la consultoría de la ESE Norte 2 trabaja en el diseño de la planta arquitectónica, se espera entrega de propuesta en el mes de enero de 2019. el proyecto beneficia a mas de 37.000 habitantes. • Se contrató estudios y diseños por valor de \$30 millones para la Construcción del Centro de Salud Corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, El ministerio de Salud y Protección Social aprobó el Programa Medico Arquitectónico, capacidad instalada y la planimetría de las ingenierías que soportan los estudios de la planta arquitectónica planos estructurales, Hidráulicos, voz, datos y red contra incendios, pendiente la aprobación de presupuesto final por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la obra permite beneficiar a mas de 29.900 habitantes, en el mes de enero de 2019 se espera la aprobación del presupuesto, se programa mesa técnica en el Ministerio de Salud y protección social. • Reubicación, Construcción del Centro Hospital del municipio de Padilla. El Concejo Municipal del municipio de Padilla aprobó la cesión del lote en el mes de octubre donde se construirá el hospital a la ESE Norte 3. Actualmente se realizan ajustes a la capacidad instalada del hospital por parte del Ministerio la cual espera su aprobación en enero de 2019 que permite la presentación del Programa Medico Arquitectónico.



Prioridad Estratégica 3

Desarrollo Productivo y Turismo

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS

Indicador	Línea Base	2018					Acumulado (2013-2018)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Familias vinculadas a la cadena turística (Semestral)	0	50	100	100%		Verde	165	165	100%		Verde	31-12-18




El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA INFORMATIVA CONTRATOS PLAN

Contratos Plan
Subdirección General Territorial
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA



AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018

Sector	Avances
<p>Comercio, Industria y Turismo</p>	<p>Se ejecutó el siguiente proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Con recursos de la Gobernación del Cauca-SGR (2013), los 13 Municipios y la Corporación de Turismo del Cauca, se ejecutó el proyecto “Turismo Posible y Deseable en el Norte del Cauca”, por valor de \$1.737 millones, que benefició a más de 300 familias bajo el modelo de turismo comunitario, con duración de 18 meses. El proyecto entregó resultados como: la creación de 3 rutas turísticas; la construcción del Plan Regional de Turismo para el Norte del Cauca, página web con información de productos y atractivos turísticos, la constitución de una Corporación para la gestión del Turismo Comunitario en el Norte del Cauca. <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos</p> <ul style="list-style-type: none"> En el mes de diciembre de 2016 inició la ejecución del proyecto denominado “Implementación de negocios inclusivos en la región norte del Cauca, como estrategia para la inclusión productiva y social de microempresarios con la gran industria”, por valor de \$2.609 millones y beneficia a 158 microempresas de la región. El proyecto es ejecutado por la Gobernación del Cauca a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, avance de ejecución física 38%. <p>Se avanzó con la viabilización de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se viabilizó por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el proyecto “Fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento Innovador en la región Norte del departamento del Cauca ” por valor de \$1.442 Millones, actualmente se encuentra radicado en la Gerencia Nacional de Contratos Plan con concepto favorable para iniciar el proceso de revisión ante el Fondo Regional de Contratos Plan en julio 2018. El proyecto beneficia directamente a 60 emprendimientos, 10 Instituciones del ecosistema de emprendimiento del norte del Cauca y 2.000 capacitados en temas relacionados, fue radicado en la Gerencia nacional de Contratos Plan para gestión de recursos. Se logró la viabilidad técnica del proyecto “Operación del Centro de Desarrollo Empresarial - CDE- en la región norte del departamento del Cauca” por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Proyecto que inicia la búsqueda de cierre financiero por valor de \$1.500 Millones que hacen parte del CDE mediante Acuerdo firmado: Gobernación del Cauca, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, Cámara de Comercio Cauca, Universidad del Cauca, Universidad del Valle, Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena Regional Cauca, Corporación Universitaria UNICOMFACAUCA y la Asociación de Municipios del Norte del Cauca -AMUNORCA, se avanza con la Directora del Centro de Desarrollo Empresarial en el plan estratégico y el plan de acción. El MinCIT envía documento del acuerdo marco para la operatividad del centro de desarrollo empresarial a la Gobernación



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA INFORMATIVA CONTRATOS PLAN

Contratos Plan
Subdirección General Territorial
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sector	Avances
	del Cauca para su aprobación por la oficina jurídica y con ello la formalización con las firmas de las partes se espera tener su legalización en enero de 2019.
Trabajo	<p>Se avanzó con la viabilización de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Gerencia Territorial en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, la Oficina Asesora de Planeación, el Comité Intergremial del Cauca, el SENA y la Cámara de Comercio del Cauca, lograron la estructuración del proyecto "Fomento de la Empleabilidad y el emprendimiento en el Norte del Cauca" por valor de \$1.488 Millones. En el mes de septiembre se radico el proyecto al Ministerio de Trabajo al Dr. Miguel Ángel Cardozo, director de Empleo con los ajustes subsanados se espera que en el mes de octubre de 2018 obtenga la viabilización. El 29 de noviembre se realizó mesa técnica con el Ministerio de Trabajo (Sonia Romo y Emilse Camacho), junto con el DNP con el fin de revisar el avance del proyecto, se realizaron observaciones, entrega de compromisos, 22 de enero de 2019.




Prioridad Estratégica 4

Infraestructura y Gestión Ambiental

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS

Indicador	Línea Base	2018				Acumulado (2013-2018)			Fecha de Corte	
		Meta	Avance	% avance	Meta	Avance	% avance			
Número de personas beneficiadas con proyectos de alcantarillado (Anual)	0	50.000	49.000	98%	Amarillo	100.000	59.000	59,0%	Rojo	31-12-18
Número de personas beneficiadas con proyectos de acueducto (Anual)	0	50.000	48.000	96%	Amarillo	100.000	67.000	67,0%	Rojo	31-12-18
Kilómetros intervenidos en las vías secundarias en marco de la ejecución del CP Norte del Cauca (Anual)	0	-	-	-	Sin meta 2018	105	136	100%	Verde	31-12-18
Hogares beneficiados con la construcción redes eléctricas de alta o media tensión (Anual)	0	-	-	-	Sin meta 2018	380	374	98,4%	Amarillo	31-12-18
Establecimientos Educativos beneficiados por los programas de MinTIC (Semestral)	0	336	336	100 %	Verde	336	336	100%	Verde	31-12-18

SEMÁFORO





CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

AVANCES ACUMULADOS, 2013-2018

Sector	Avances
Minas y Energía	<ul style="list-style-type: none"> Se ejecutó el proyecto de ampliación en cobertura de energía rural en el municipio de Buenos Aires por valor de \$3.898 millones, obra financiada en su totalidad con recursos de Ministerio de Minas, se benefició a más de 374 familias.
Transporte	<p>Se realizaron y entregaron estudios y diseños viales los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudios y diseños para la pavimentación de la Vía Silvia – Jambaló por \$785 millones. (Ejecutado) beneficiando aprox. 41.000 habitantes. Estudios y Diseños para la Rehabilitación y Pavimentación de la Vía Puerto Tejada-La Sofía-Guachené - Crucero Gualí Incluye Estudios Rehabilitación Puente Rio Palo por valor de \$ 497 millones. (Ejecutado) La obra beneficia a más de 22.000 habitantes. Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía 3 Caloto- La Placa por \$375 millones. (Ejecutado). beneficiando a una población 23.009 habitantes. Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Suarez - Timba y rehabilitación por valor de \$233 millones. (Ejecutado). beneficia a una población de 31.000 habitantes. Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Morales – Suarez por \$137 millones. (Ejecutado) beneficia una población de 19.244 habitantes. Estudios y Diseños de Estructuras para la Atención de Sitios Críticos en la Vía Toribio-Rio Negro-El Palo por valor de \$54 millones. (Ejecutado) Beneficiarios 2098 habitantes. Estudios y Diseños para la Ampliación y/o Rehabilitación del Puente Menor Ubicado en la Ruta Puerto Tejada - Puente Hormiguero Municipio de Puerto Tejada, por valor de \$ 71,6 millones (Ejecutado). La obra beneficia una población de 144.220 habitantes. Estudios y diseños para pavimentación de la vía Morales - La Toma - Suarez en los sectores PR09+545 (80m) y PR 16+507 al PR 20+000 Departamento del Cauca. Proyecto ejecutado 100% y recibido por parte de la interventoría. Beneficia una población de 19.244 habitantes. <p>Se ejecutaron los siguientes proyectos viales:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Rehabilitación de la vía Puerto Tejada - Puente El Hormiguero, financiada con recursos del DNP-Contratos Plan por \$15.732 millones, permite rehabilitar 10 km y beneficia una población de 144.220 habitantes que transitan en esta importante vía que comunica al Norte del Departamento del Cauca con el Valle y centro del país. Proyecto ejecutado y Liquidado. Construcción del Pavimento de la Vía La Balsa-Buenos Aires, obra financiada con recursos del DNP-Contratos Plan por valor de \$21.256 millones, iniciada en agosto de 2014, beneficia a una Población de 29.267 habitantes. Proyecto Liquidado. Construcción de Pavimento de la vía la Toma-Suarez, Municipio de Suarez, obra financiada por la nación recursos INVIAS y DNP-Contratos Plan, por valor de \$20.085 millones, obra iniciada en enero de 2015, beneficia una población de 19.244 habitantes. Proyecto Adicionado en recurso y plazo. Ejecutado 100% en liquidación. Mejoramiento de la seguridad vial en la vía Santander de Quilichao - La Balsa - Timba, Departamento del Cauca, Occidente en marco del Contrato Plan Norte Del Cauca, por valor de \$339 millones, beneficia una población aprox. de 29.267 habitantes. Ejecutado 100% en liquidación. Construcción de Pavimento y Rehabilitación de la Vía Siberia- Caldono, Municipio de Caldono, Obra financiada por la nación recursos INVIAS y DNP-Contratos Plan por valor de \$22.980 millones, obra iniciada en enero 2015, Población beneficiada 25.864 habitantes. Proyecto Ejecutado 100% y liquidado.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> • Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se contrató el Mejoramiento y Pavimentación de 13 km de la Vía Caloto - La Placa, por valor de \$18.271 millones, beneficiando a una población 23.009 habitantes, ejecución inició el 30 de junio de 2015. Proyecto Ejecutado 100%. En liquidación. • Rehabilitación de la vía Suárez-Asnazú-Timba entre el PR0+919 AL PR5+330 por valor de \$ 4.705 millones, financiados con recursos del Ministerio de Transporte. Contrato firmado el 13 de agosto de 2015 y beneficia a una población de 31.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 100% Liquidado. • Se avanza en Mejoramiento y Pavimentación de la vía 26CC01-1 Suarez - Asnazú - Timba en el tramo comprendido entre el Pr5+330 y el Pr9+582,8 por valor de \$ 5.330 millones. Proyecto Adicionado en recurso y plazo. Ejecutado 100%. En liquidación. beneficia a una población de 31.000 habitantes. • La Rehabilitación y Pavimentación de la vía 25CC27 Puerto Tejada- La Sofía – Obando – Guachené - Crucero De Gualí - Sector 3 - Tramo Comprendido entre el Pr15+060 Al Pr21+711, por valor de \$ 5.647 millones. Proyecto Ejecutado 100% En liquidación. La obra beneficia a más de 22.000 habitantes. • Rehabilitación del Puente sobre el río Palo en la vía 25CC27 Puerto Tejada - La Sofía – Obando –Guachené - El Crucero Gualí con una inversión de \$ 1.464 millones. La obra beneficia a más de 22.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 100%. En liquidación. • En el Municipio de Miranda se interviene en la vía Miranda-Santa Ana, con pavimento en un tramo de 7 Kms, con una inversión inicial de \$10.208 millones. La obra beneficia cerca de 15.000 habitantes Proyecto Ejecutado 100%. En recibo y liquidación. • Se autorizó al departamento, el uso de los recursos excedentes de contratación del proyecto de Estudios de Infraestructura Logística Especializada ILE, para la terminación de la pavimentación de esta vía, con el compromiso que el Departamento gestione ante INVIAS los recursos para interventoría. • Se entregó el estudio Fase 2 de Infraestructura Logística Especializada -ILE- en la subregión Norte del Cauca, que busca determinar la factibilidad técnica, económica, social, ambiental y financiera de construir una infraestructura para brindar servicios de logística a las empresas e industrias ubicadas en esta región. La Gobernación del Cauca adelanta dicho estudio con una inversión de \$ 637 millones. • En el tramo el Palo-Toribio se recuperan 3 sitios críticos de los que presenta esta vía que permita mejorar la seguridad en el tránsito, cuenta con una inversión de \$977 millones. Proyecto Ejecutado 100%. Liquidado. Beneficiarios 2098 habitantes. Se avanza con el Mejoramiento y pavimentación de la vía 26CC01 Morales - Suárez en el Municipio de Suárez Cauca. Pavimentación de 1.6 km. Proyecto Ejecutado 100%. En liquidación. Valor de \$3.209 Millones beneficia una población de 19.244 habitantes. <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se adjudicó la pavimentación de 17,4 Km de la vía Silvia - Jambaló, por valor de \$32.534 millones beneficiando a más de 41.000 habitantes, ejecución iniciada en diciembre de 2015. Estuvo Suspendido por licencia de aprovechamiento forestal. La sustracción de Áreas de Reserva Forestal se obtuvo el 27 de Julio mediante resolución del Ministerio, sustracción definitiva zona de reserva forestal central establecida en la Ley 2° de 1959, se avanza en los procesos de compra de terrenos y se radicó al MADS el plan de



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sector	Avances
	<p>restauración y rehabilitación. Avance de obra física 99.88%. El proyecto será Suspendido porque aún no se tiene respuesta del Ministerio de Ambiente en relación con el Plan de manejo ambiental propuesto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Departamento del Cauca con recursos de regalías, contrató la Rehabilitación y Pavimentación de la vía Puerto Tejada – La Sofía – Obando – Guachené – Crucero Gualí, Sector 2 entre El Pr 7+400-13+555 por valor de \$5.355 millones. Inicio obra el 28 de febrero de 2018. Avance de obra física 55%. • Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte, el Departamento del Cauca contrató el Mejoramiento y Pavimentación de la vía 31CC05 Miranda-Santa Ana-El Ortigal para el tramo Comprendido entre el Pr 00+000 Al Pr0+700, Departamento del Cauca por valor de \$ 2,756 millones. Se dio inicio el 30 de agosto, su avance es 6,68%. Se tramita la resolución de cierre temporal de la vía
<p>Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico</p>	<p>Se han ejecutado los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminó la ejecución de la primera fase del Proyecto Acueducto Regional del Norte del Cauca con cobertura en los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Villarica y Guachené y zona rural de Caloto, por valor de \$27.835 millones. Se benefician más de 180.000 habitantes. • Findeter contrató la Consultoría Especializada para el acompañamiento a la puesta en marcha del Acueducto Regional del Norte del Cauca, por valor de \$201.449 millones y la interventoría por valor de \$46.143 millones. Se benefician más de 180.000 habitantes • Con el propósito de beneficiar a 95.207 habitantes, en 2013-2014 se financiaron 3 proyectos a través de EMCASERVICIOS por valor de \$3.419 millones: Alcantarillado Asnazú, Municipio de Suárez \$1.514 millones, Acueducto Interveredal Isabelillas, Municipio de Toribio \$1.235 millones y alcantarillado Corregimiento Chamizo por valor de \$670 millones. • Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento Acueducto Interveredal Quinamayó Alegrías (Santander de Quilichao) por valor de \$ 1.561 millones y la interventoría por valor de \$119 millones. El proyecto se ejecutó 100%. Beneficiarios 5.600 habitantes. • Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER se adelantó la contratación del proyecto “Construcción y optimización del sistema de alcantarillado 2da etapa en la cabecera Municipal de Guachené”, por valor de \$1.073 millones, beneficiando a 6.892 habitantes. En junio de 2017 inicio la fase III del proyecto, obra física terminada en un 100%. • Recibido el proyecto Alcantarillado Cabecera Municipal de Padilla por valor de \$5.823 millones financiado con recursos del Contratos Plan-DNP y EMCASERVICIOS, Se hizo Reformulación aprobada en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Se beneficia más de 9.776 habitantes. • Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se realizó la Construcción obras de optimización y ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Cabecera Municipal de Caloto Fase I, por valor de 5.067 millones beneficiando aproximadamente a 5.096 usuarios. El proyecto esta terminado y en recibo por la interventoría. • Con recursos de Ministerio- PDA- Gobernación del Cauca, se contrató por EMCASERVICIOS la Construcción de las obras de rehabilitación y Optimización Sistema de Acueducto del Municipio de Puerto Tejada fase I por valor de \$3,479 millones e interventoría por \$259 millones. Población Beneficiada 12.000 habitantes. Obra física ejecutada 100%. • EMCASERVICIOS mediante convenio con la APC Acueducto Piendamó - Morales, contrato la estructuración para realizar los estudios y diseños para la Ampliación del Acueducto Regional que



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sector	Avances
	<p>incluye la Vereda La Toma del Municipio de Suarez por valor de \$821 millones. Proyecto terminado 100%, en recibo por la interventoría. Beneficiarios 1.980 habitantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción del Alcantarillado Pluvial en la Cabecera Municipal de Caldoño, por valor de \$1.668 millones más la interventoría de \$196 millones. Con el desarrollo del proyecto, 1.400 habitantes de la cabecera municipal contarán con un sistema de alcantarillado pluvial. Para la Fase III del proyecto el Municipio de Caldoño aportó \$205 Millones resultantes de la reformulación. Proyecto Ejecutado 100%. Se adelanta el recibo final. • Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER, se contrataron las obras mejoramiento y optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Miranda, proyecto con una inversión de \$3.113 millones más la interventoría por valor de \$290 millones, beneficiando a 29.290 habitantes aproximadamente. El 9 de junio fue aprobada la reformulación No.3. El 9 de octubre de 2017 se inició Fase III ejecución de las obras en la planta de tratamiento de agua potable e instalación de tubería en la línea de aducción. La obra física terminada en 100%. • EMCASERVICIOS mediante convenio con la APC Acueducto Piendamó -Morales, contrato la estructuración para realizar los estudios y diseños para la Ampliación del Acueducto Regional que incluye la Vereda La Toma del Municipio de Suarez por valor de \$821 millones. Proyecto terminado 100%, en recibo por la interventoría. Beneficiarios 1.980 habitantes. • Con recursos de Gobernación del Cauca-SGR, terminó el proyecto “Plan básico de recuperación y restauración de la función ecológica en cuencas abastecedoras de acueductos de los 13 municipios del Norte del Departamento del Cauca” a través de la Corporación Ambiental CRC por valor de \$925 millones y una duración de 9 meses. El proyecto incluye actividades de reforestación, aislamiento y capacitación ambiental, entre otros beneficiarios 161.790 habitantes. <p>Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ejecución por parte del DNP-SGR, FONADE, la Estructuración Integral de 11 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Municipios de Jambaló, Caloto, Guachené, Toribío y Puerto Tejada. El 24 de septiembre se llevó a cabo una mesa técnica en Santander de Quilichao con los Municipios, Emcaservicios (PDA y Municipios), Secretaria de Planeación Departamental y Contrato Plan, con el fin de socializar el alcance del proyecto. A la fecha la estructuración de los proyectos se encuentra en ajustes y revisión por la Entidad Contratante. Se benefician más de 34.000 habitantes. • Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Optimización sistema acueducto cabecera municipal municipio de Corinto, por valor de \$1.544 millones, beneficiando a más de 18.500 habitantes. Este proyecto terminó Fase 2. Se suscribieron las actas de recibo final de fase II de Obra e Interventoría. Requirió reformulación. El 29 de octubre de 2018 se dio inicio de Obra e Interventoría. Avance de Obra 5% • Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la consultoría de “Ajuste y complemento de los estudios y diseños para la Construcción de la Planta de Potabilización Interveredal Vereda Isabelillas - Municipio de Toribio, Cauca” por valor \$176.494.944,00, incluido IVA. Igualmente se contrató la interventoría por valor de \$67.078.817. FINDETER en el mes de octubre de 2017 suscribió el contrato de interventoría, Acta de Inicio: 18 de diciembre de 2017, se firmó acta de inicio tanto de los contratos de interventoría como de consultoría. Beneficiarios proyectados 6.465 habitantes. Findeter encuentra una inviabilidad del proyecto y considera pertinente no continuar con la ejecución de la Etapa II, considera necesario realizar una consultoría completa a la



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sector	Avances
	<p>optimización de todo el sistema de acueducto, el diseño en varios de los componentes de este y no solo a la planta de tratamiento de agua potable, para lograr la funcionalidad del sistema en términos de cobertura, continuidad y calidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con recursos DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Zona Urbana del Municipio de Santander de Quilichao – Cauca por valor de \$7.580 millones y la interventoría por valor de \$484 millones. Beneficiará una población de 47.666 habitantes. Este proyecto terminó Fase 2. El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT aprobó la reformulación. En ejecución de Fase III. El avance de obra es de 34.78%. Se implementó un plan de contingencia con lo cual se espera superar los atrasos. • Con recursos DNP-Contrato Plan, FINDETER contrató la Construcción de la planta de tratamiento PTAP Quitapereza, cabecera municipal de Santander de Quilichao por valor de \$3.990 Millones. Beneficiados 10.059 usuarios. El proyecto Inició fase I en junio de 2017, en octubre de 2017 se firmó el acta de entrega y recibo a satisfacción de la Fase I por parte de la interventoría se remitió al municipio en medio físico junto con los productos finales de la Fase I, para su revisión y aprobación, el 5 de marzo se recibe versión final de ajustes del municipio e inicia revisión de FINDETER. Fase II: La Realiza EMQUILICHAO. El 06 de marzo de 2018, se realizó reunión con EMQUILICHAO para entrega definitiva de productos, radicados en Findeter el 12 de marzo de 2018. Se avanza en las gestiones pertinentes requeridas para el inicio de la Fase III. • Con recursos DNP-Contrato Plan, FINDETER contrató la construcción de Obras de Optimización del Sistema de Alcantarillado del Municipio de Jambaló por valor de \$ 2.240 Millones, la obra tiene un valor de \$1.999 Millones, inicio en diciembre de 2016 y la interventoría en febrero de 2017 por valor de \$241 Millones. Beneficiarios 1.208 habitantes. Se terminó la Fase II. Pendiente el Inicio de la fase III. • Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se contrató por EMCASERVICIOS la construcción obras de optimización sistema de acueducto Vereda Palo Blanco y Nueve Veredas Tercera Etapa (Buenos Aires) que beneficia aproximadamente 3.000 habitantes, tiene un avance de ejecución de obra del 61% • Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se contrató por EMCASERVICIOS la Construcción de Sistema Interveredal y Obras de Optimización Tanques de Almacenamiento Zona Baja del Municipio de Jambaló por valor de \$2.682 millones, más la interventoría por valor de \$187.5 millones. El Ministerio aprobó la reformulación. Avance de ejecución en la obra del 96%. Beneficiarios actual 1.282 habitantes y proyectada 1.780 habitantes. • Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca se adjudicó la Construcción y Optimización Sistema De Acueducto Veredas La Playa, Soto, La Luz, Buenavista y La Laguna (Toribio), por valor de \$5.154 millones más la interventoría por valor de \$418 millones, proyecto que beneficia a una población de 16.213 habitantes. Se reformuló y se viabilizó. Se adicionó y se reinició. Presenta un avance de obra física del 72%. • Con aportes por valor \$17.939 millones (DNP-Contratos Plan), se logró la financiación del proyecto denominado “Optimización sistema de acueducto del Municipio de Puerto Tejada, Fase II Redes de distribución” que busca cambiar 12.000 acometidas domiciliarias en la cabecera municipal. Se inició ejecución en marzo 2017. Se reprogramó y tiene un avance de ejecución en la obra física reprogramada del 86%. • Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca se adjudicó la Optimización del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Carlos Alberto Guzmán, Municipio de Puerto Tejada Departamento del Cauca,



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA INFORMATIVA CONTRATOS PLAN

Contratos Plan
Subdirección General Territorial
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sector	Avances
	<p>por valor aprox. de \$ 1786 millones incluida la interventoría, proyecto que beneficia a una población de 4.368 habitantes. Presenta un avance del 31,2%.</p> <ul style="list-style-type: none">• Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca se realiza la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Sector Carretera y Optimización de La Planta de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento de Yarumales en el Municipio de Padilla Cauca, proyecto que beneficia a una población de 1.101 habitantes y presenta un avance físico de obra del 31%. Suspendido
