



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
07/07/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/06/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.

Líneas Temáticas:

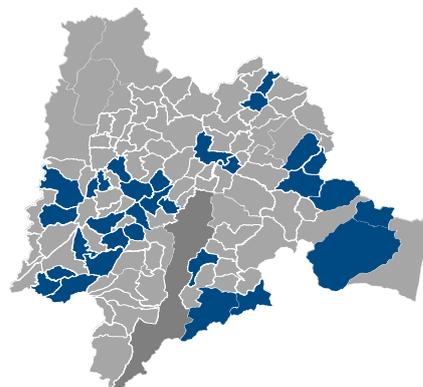
- Infraestructura para la integración social
- Gestión ambiental y saneamiento básico

TEMAS ESTRATEGICOS

A la fecha se encuentra en proceso de elaboración el Plan Estratégico de Inversiones con las entidades territoriales, identificando un total de 36 iniciativas estratégicas, alineadas con el objetivo y líneas temáticas del Pacto, por un valor indicativo de \$394.151.470.890.

Línea Temática	Nº iniciativas	Costo total
Infraestructura para la integración social	34	\$ 268.483.171.605
Gestión ambiental y saneamiento básico	2	\$ 125.668.299.285
Total identificado	36	\$ 394.151.470.890

Se están adelantando mesas de trabajo para la validación del estado de las iniciativas y la concertación de los esquemas de financiación para su ejecución.

Área de Intervención: Cundinamarca**Departamento:**

Cundinamarca Municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Chipaque, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, Fúquene, Gachetá, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Pulí, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Tocancipá, Ubalá, Ubaté, Viotá y Zipaquirá

Fecha de suscripción:

19/02/2021

Fecha de terminación:

19/02/2024

Plazo:

3 años

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**Construcción ciclorruta de la sabana.**

- **Estado:** en estructuración.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión de indicativa de \$83.380 millones y su estructuración está a cargo de la Gobernación de Cundinamarca, quien se encuentra adelantando el proceso de contratación de una consultoría para el ajuste del diseño del alumbrado que contemple energías alternativas. Se espera la entrega de los resultados de este diseño en el mes de julio 2021, que permita la consolidación y cumplimiento de los demás requisitos para el trámite de recursos



ante el Fondo Regional de Pactos Territoriales. La Gobernación presentó la documentación parcial del proyecto al DNP y se está adelantando la revisión.

Construcción Coliseo municipio de Funza.

- **Estado:** en estructuración.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$34.000 millones. Por parte de la Gobernación y Municipio se adelantaron los ajustes a las observaciones del Ministerio del Deporte y se fueron ajustados en su totalidad el 23 de junio. A la fecha se están validando por parte del Ministerio del Deporte para expedir el concepto de viabilidad.

Adecuación estadio Villa San Diego municipio de Ubaté.

- **Estado:** en proceso de ajuste.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión de indicativa \$7.600 millones para la construcción de un escenario recreo-deportivo. El Min deporte informa que el componente de suelos cumple y que el componente arquitectónico tiene observaciones, las cuales fueron notificadas al consultor para su ajuste. El Min deporte está revisando los componentes estructurales, eléctrico e hidráulico presentados por municipio en la carpeta drive habilitada. Por su parte, el municipio se avanza en el componente presupuestal.

Construcción Estadio Zipaquirá.

- **Estado:** en estructuración.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión de indicativa \$21.000 millones y se encuentra en estructuración a cargo del municipio. Min deporte informa que los componentes técnicos cumplen y solo estaría pendiente la entrega de la documentación predial para validar el componente jurídico y expedir concepto de viabilidad. Se prevé su financiación entre el Fondo Regional de Pactos Territoriales, Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Zipaquirá.

Mejoramiento del parque recreo deportivo Los Patos del municipio de Tocancipá.

- **Estado:** en estructuración.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$20.000 millones y se encuentra en proceso de reformulación que permita tener un complejo deportivo con áreas aptas para el desarrollo de diferentes actividades recreo-deportivas como patinaje, BMX, Hockey y tenis. Se realizó reunión de seguimiento el 11 de junio en la cual la Alcaldía informa que entregará para revisión parcial del Min deporte el componente arquitectónico y estructural. Para los demás componentes, se encuentra en proceso de contratación una consultoría la cual se prevé esté contratada a finales de junio y tiene un plazo de ejecución de mes y medio para entregar los estudios contratados. Se prevé su financiación a través del Fondo Regional de Pactos Territoriales.

Construcción plaza de mercado municipio de Viotá.

- **Estado:** estructurado.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$8.548 millones y a la fecha se encuentra estructurado. El 31 de mayo la Alcaldía presentó a Min Agricultura las subsanaciones solicitadas y se espera verificación del Ministerio para adelantar mesa de trabajo con el municipio.

Proyectos construcción /adecuación plazas de mercado.

- **Estado:** en revisión técnica DPS
- **Avance:** la Gobernación de Cundinamarca presentó a la convocatoria 0001 de DPS un total de 27 proyectos para la construcción o adecuación de plazas de mercado y centros de acopio en los municipios de Agua de Dios, Apulo, Bojacá, El Colegio, El Rosal, Guayabetal, Machetá, Madrid, Nilo, Pulí, Ricaurte, Bituima, Chipaque, Gacheta, Guayabal de Siquima, Gutierrez, La Mesa, Manta, Medina, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Ubalá y Zipaquirá, que tienen una inversión indicativa de \$82.405 millones.



Se han realizado reuniones con las alcaldías para validar el estado de avance en los procesos de subsanación de las observaciones presentadas por DPS a los 17 proyectos que se contemplan tengan financiación 100% DNP. En las mesas de trabajo se conoció que varias alcaldías ya habían presentado subsanaciones y otras tenían dudas sobre las observaciones, por lo que se gestionó con DPS espacios de revisión individuales con los municipios, las cuales se están adelantando con el objetivo de aclarar con los consultores o estructuradores de los proyectos las observaciones que aún persisten y la generación de compromisos para la entrega de los ajustes solicitados.

Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Facatativá.

- **Estado:** en ajustes
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$100.668 millones y a la fecha el Viceministerio de Aguas realizó una revisión preliminar del proyecto y se encontraron observaciones a los diseños. Por tanto, está pendiente la entrega de los ajustes solicitados por parte de la consultoría y Empresas Públicas de Facatativá. Se prevé su financiación a través del Fondo Regional de Pactos Territoriales.

Construcción Centro de Desarrollo Integral Cajicá.

- **Estado:** en revisión.
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión estimada de \$6.000 millones. Por parte del municipio de Cajicá se presentó la documentación del proyecto de acuerdo con la lista de chequeo solicitada por el ICBF, quien está adelantando la revisión documental presentada.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

**FICHA TRIMESTRAL
PACTO TERRITORIAL CUNDINAMARCA**

PÁGINA: 4 de 4
