



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
26/10/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/09/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre y los municipios signatarios, las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de la región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento y ordenamiento institucional.
- Infraestructura para la disminución de las NBI.
- Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.

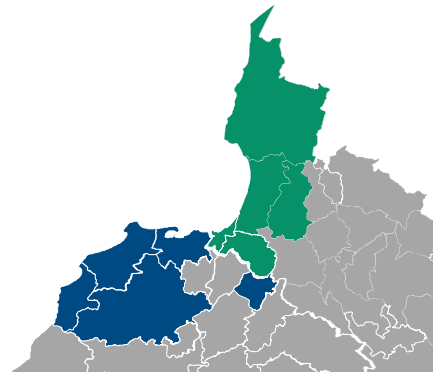
TEMAS ESTRATEGICOS

➤ Compromisos instancias administración:

- Revisión de la inclusión de la estructuración de la nueva sede del Hospital de Lorica al Plan Estratégico de Inversiones.
- Solicitar reunión con el INVIAS para el municipio de Lorica para la vía municipal central.
- Reunión de articulación con DIMAR, CVS, CARSUCRE y entidades territoriales para el proyecto de erosión costera.
- Revisión de la propuesta de creación de la RPG del Golfo de Morrosquillo.

➤ Impactos esperados

- Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Golfo de Morrosquillo generará cerca de 18.411 empleos directos y 30.402 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 415.000 habitantes del área de influencia del Pacto Golfo de Morrosquillo.

Área de Intervención: Pacto Golfo de Morrosquillo

Departamentos:	Córdoba y Sucre
No. de Municipios en el Pacto Territorial:	Departamento de Córdoba: (5) Departamento de Sucre (5)
Fecha de suscripción:	07/02/2020
Fecha de terminación:	07/02/2025
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$1.315.045 (100%)
Nación (%)	\$1.116.740 (85%)
Territorio y otros (%)	\$198.305 (15%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$428.368 (32,6%)
Compromiso Nación	\$389.549
Compromiso Territorio	\$38.819

Proyectos en ejecución	\$428.368 (29 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Vía Santa Lucía – Moñitos, Córdoba.

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - El proyecto tiene una inversión de \$190.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad' para la intervención de 55 km. Vía adjudicada el 9 de abril de 2021 por \$171.472 millones por el INVIAS, el inicio de obra se estima para mayo de 2021, con un plazo de ejecución de 54 meses, este proyecto hace parte del Programa de "Vías para la Legalidad". A la fecha el contrato se encuentra en ejecución en mejoramiento de los puntos críticos.
 - El 16 de septiembre se asistió a mesa de socialización con la comunidad del inicio de obras en compañía del Gobernador de Córdoba, los Alcaldes de Lorica, Moñitos y San Bernardo del Viento y de la Gerente de Grandes Proyectos del INVIAS.

Vía El Delirio - Puerto Viejo.

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - La vía comprende el tramo entre Palmito, Coveñas y Tolú para el cual se suscribió convenio el 6 de octubre de 2020 por valor de \$37.790 millones con recursos Nación, la interventoría fue contratada por INVIAS por \$4.182 millones, para un total de 41.972 millones. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de ejecución del contrato en el marco del convenio suscrito entre la Gobernación de Sucre y FINDETER.
 - Se suscribió contrato No. 3-1-97902 de 2021-1 (PAF-SUCRE-0-051-2021) el 8 de septiembre de 2021 por valor de \$35.578.255.324 pesos, el 15 de septiembre de 2021 se firmó el Acta de inicio de obra con un plazo estimado de 12 meses. Al respecto, se realizó seguimiento con FINDETER sobre siete situaciones particulares que deberán ser aclaradas antes del inicio de obras, las cuales deberán ser atendidas o sujeto de seguimiento por parte de la Gobernación, para lo cual desde la GNPT se dio inicio a verificación desde el 27 de septiembre. Actualmente se encuentra en fase de revisión, ajuste, actualización y complementación para la ejecución del proyecto por parte del contratista.

Vía Moñitos-San Bernardo del Viento-Lorica-Chinú.

- **Estado:** Proyecto en ejecución por INVIAS que hace parte del Programa de "Concluir - Concluir".
- **Avance:**
 - Fue adjudicado en diciembre del 2020 mediante proceso licitatorio No. LP-DT-045-2020 al KMA CONSTRUCCIONES SAS contrato de Obra No. 1591 del 2020 por valor de \$ 26.678.206.634. Mediante proceso CMA-DT-172-2020 se adjudicó la interventoría al CONSORCIO SUPERVISIÓN CORREDORES VIALES contrato No. 1791 del 2020 por valor de \$ 2.249.645.855. Se comprometieron recursos por \$ 28.927.852.489 para una ejecución estimada de 60 meses, contados a partir del 2 de marzo del 2021.

Estación de Bomberos – Santiago de Tolú, Sucre.

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - Se adelanta la estructuración integral técnica, legal, financiera y social en las fases de prefactibilidad, factibilidad y acompañamiento para el proyecto de construcción y dotación de una estación de bomberos en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre. Esta estructuración está siendo desarrollada a través de contrato con Findeter por un valor de \$546.419.376 pesos, incluyendo la interventoría. La prefactibilidad, factibilidad y gestión predial se espera finalice en los últimos meses del 2021. En el mes de septiembre se concretó la adquisición del lote por el departamento con recursos de regalías
 - Se legalizaron los contratos de consultoría el 8 de septiembre de 2021 al Consorcio Caribe y el contrato de interventoría el 22 de septiembre de 2021 al consorcio JCB. La firma del acta de inicio se realizó el 24 de septiembre de 2021 con fecha estimada de finalización el 24 de febrero de 2021.



Hospital – Coveñas, Sucre

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - Findeter adjudicó contratos de Consultoría e interventoría el 2 de junio de 2021, la primera a CURE Y CIA SAS, por valor de \$1.639 millones la segunda a INVER MIL GROUP SAS, por valor de \$329 millones. Con esta contratación se pretende estructurar la prefactibilidad y factibilidad de este proyecto, con lo cual se tendrán los resultados finales en noviembre / diciembre de 2021. De manera paralela, se suscribirá el convenio entre MinSalud, DNP y Findeter para la construcción, proceso que contempla asistencia técnica de Ecopetrol para la gerencia y administración. A la fecha, se han adelantado mesas de trabajo para poder articular el convenio interinstitucional y la Gerencia de esta construcción. En caso en que Ecopetrol no pueda ejecutar, lo hará Findeter.
 - Para la última semana de septiembre se espera tener aprobada la prefactibilidad por parte del Comité Técnico, teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones realizadas por el DNP a los documentos de esta etapa. Con el producto final de esta fase, se iniciará la distribución al MinSalud por \$7.000 millones y se soportará la elaboración del CONPES de importancia estratégica, el cual contará con vigencias futuras por \$15.000 y \$10.000 millones en el 2022 y 2023, respectivamente.
 - Se sostuvo mesa técnica de trabajo virtuales No. 10 con el Ministerio de Salud, DNP, Findeter, Consultores del proyecto, Municipio de Coveñas y Gobernación de Sucre para el avance de la estructuración del proyecto por parte de la consultoría.
 - La adquisición del predio por parte de la Gobernación de Sucre se concretará con recursos propios tanto del Departamento como del municipio de Coveñas. El municipio aportará \$1.000 millones y la Gobernación \$900 millones (la totalidad de estos recursos ya están disponibles en cuenta bancaria del departamento). La titularidad del lote se materializará por un proceso de sucesión a través de un Juzgado de Familia. Actualmente se está realizando seguimiento al proceso judicial, el cual se espera que para el 19 de octubre ya se haya formalizado la aceptación por parte del Juez de la oferta de compra por parte del departamento. Igualmente, se viene verificando que la administración municipal emita las declaraciones de impuesto predial para que los propietarios procedan a cancelar este tributo al municipio y por otra parte, para que el Concejo municipal le otorgue facultades al Alcalde para la adjudicación de baldíos. Ambos procesos son requisitos para avanzar en el objetivo de obtener la titularidad del predio.
 - El proyecto tiene un avance programado de 47% vs 48.5% de ejecución. Se remitió el resultado de la Prefactibilidad que se encuentra en revisión del DNP.
 - Se realizó la socialización del proyecto el 3 de septiembre de 2021 en el municipio de Coveñas, con presencia del DNP, Gobernación, contratistas y comunidad en general.

Marina - Municipio de Tolú, Sucre

- **Estado:** En estructuración
- **Avance:**
 - La gobernación de Sucre junto con el municipio de Tolú avanza en la estructuración de una obra pública. El Vice-ministerio de Turismo y el DNP han brindado asistencia técnica a ambas entidades territoriales para definiciones de la estructuración y de la ubicación, la cual podría darse en el predio de propiedad del municipio en el sector de Manhattan.
 - El municipio de Santiago de Tolú el 25 de agosto adjudicó el contrato ST-CM-021-2021 al consultor Consorcio Santa Marta cuyo objeto es “ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MARINA DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE” por valor de \$317.550.072 pesos, se espera que el 25 de octubre sea entregado el producto final para posteriormente proceder a la contratación para la ejecución de obras.



- El DNP contempló \$40.000 millones en el reciente CONPES de Pactos Territoriales para este proyecto.

Infraestructuras de acueducto y saneamiento básico en los Municipios del PTGM

Esta iniciativa incluida en la versión No. 2 en el PEI del pacto golfo de Morrosquillo aprobado en el 2021 en el tercer Consejo Directivo plantea los siguientes proyectos: Segunda etapa del alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba, Soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas, Construcción Sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre y Acueducto de San Antero hasta el corregimiento del Porvenir. A continuación, se describe el avance:

Acueducto de San Antero hasta el corregimiento del Porvenir

- **Estado:** En Ejecución
- **Avance:**
 - El Plan Departamental de Aguas de Córdoba firmó convenio No. 014 de 2020 entre Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. y la empresa de servicios públicos AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P. para la ejecución del proyecto. El 12 de abril se adjudicó el proceso por parte del AQUALIA el proceso No. SCO-AQLATAM-ACU-002-2021, de igual forma el 4 de mayo fue adjudicada la interventoría del proyecto. El proyecto se encuentra en ejecución desde el 25 de mayo de 2021.
 - A la fecha se ha recibido información sobre la posible necesidad de una revisión técnica al proyecto por parte del MVCT, dado que se han presentado inconvenientes topográficos en la ejecución del proyecto, lo que llevaría a un replanteamiento de la viabilidad inicial.

Soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:**
 - El 31 de marzo se suscribió el acta de inicio del Contrato suscrito con FINDETER por \$4.821 millones para la estructuración de:
 1. Optimización y ampliación de las redes de acueducto del casco urbano del municipio de Coveñas y programa de reducción de pérdidas.
 2. Optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Coveñas.
 3. Drenaje pluvial del casco urbano del municipio de Coveñas.
 4. Optimización de los sistemas de abastecimiento y de las plantas de tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio de Coveñas.

Esta estructuración será entregada en octubre y ejecutado por FINDETER.

- Se sostuvieron mesas de trabajo los días 3, 10, 17 y 24 de septiembre con el municipio de Coveñas, Findeter y los Consultores que se encuentran realizando las cuatro consultorías contratadas. Se presentaron los avances en las consultorías acorde al cronograma de actividades inicial.

Erosión Costera

- **Estado:** En estructuración.
- **Avance:**



- Se está adelantando con FINDETER el análisis para estructurar los puntos críticos priorizados que se identificaron, así como el licenciamiento ambiental y arqueológico. El departamento de Sucre iniciará intervenciones por \$17.099 millones en Tolú y Berrugas (San Onofre) en 1.4 kms de línea costera.
- Está listo el proceso para contratar a FINDETER como estructurador del proyecto, para los componentes técnico, legal, ambiental y financiero de obras de prevención y mitigación de la erosión costera para 10 puntos críticos en la costa del Golfo de Morrosquillo y cuyos resultados se esperan tener finalizados en julio de 2022. El proceso de licenciamiento continuará a cargo de las Gobernaciones de Córdoba y Sucre en conjunto con las Corporaciones autónomas regionales a partir de agosto de 2022.
- Las Gobernaciones de Córdoba y Sucre, FINDETER, la ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales deben realizar el proceso de licenciamiento a través de FINDETER, quien deberá garantizar la continuidad del mismo consultor de la fase de estructuración. Se gestionó en septiembre la suscripción de una Carta de Intención por parte de los Gobernadores de Sucre y Córdoba, en la que se comprometen a destinar los recursos económicos para el licenciamiento de este proceso, que incluyen el acompañamiento de Findeter y el costo de las respectivas licencias.

Acueducto Regional Golfo de Morrosquillo

- **Estado:** En estructuración
- **Avance:**
 - En el mes de diciembre de 2020 se entregó el perfilamiento del proyecto.
 - Se suscribió contrato interadministrativo entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio No. DNP- 869-2021 / ENT 221010 cuyo objeto es "DESARROLLAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LAS SOLUCIONES DE AGUA Y/O SANEAMIENTO PARA EL GOLFO DE MORROSQUILLO" por valor de \$14.126.691.926 pesos que contempla los siguientes alcances:

GRUPO I: "Estructuración integral para los proyectos de agua potable y saneamiento básico en los municipios de San Bernardo del viento, San Antero, Moñitos y Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba".

GRUPO II: "Estructuración integral para la solución de abastecimiento de agua en los municipios de Coveñas, Santiago de Tolú, Toluviejo y San Onofre, y entrega de agua en bloque en el departamento de Sucre".
 - Se socializó con los departamentos de Córdoba y Sucre y los municipios signatarios del Pacto Golfo de Morrosquillo, el alcance de contrato interadministrativo de la estructuración del acueducto regional los días 28 y 29 de septiembre.

Malecón Segunda Ensenada de Coveñas

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - La Gobernación de Sucre aportará los estudios y diseños de este proyecto en el mes de agosto y se podrá radicar en FONTUR para la respectiva viabilidad. FONTUR, el departamento, DNP (CONPES 4037 por \$8.000 millones) y el municipio aportarán los recursos para el cierre financiero de esta obra.
 - El 27 de agosto de 2021 se publicó en SECOP I por parte de la Gobernación de Sucre el CM-SID-006-2021 cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PARQUE LINEAL RECREO-DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE". Se estima como fecha de adjudicación del contrato el 28 de septiembre de 2021.

Megacolegio Heriberto García Toluviejo, Sucre

- **Estado:** En Ejecución
- **Avance:**
 - El 27 de abril en el marco de la visita del Señor Presidente a Toluviejo se instaló la primera piedra de esta obra y en este momento el proyecto se encuentra en la ejecución de la fase de inversión. Este proyecto contempla una ejecución de 18 meses, a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), se espera haber



terminado en 14 meses el edificio principal para la inauguración del Señor Presidente. El Megacolegio Heriberto García Garrido en Tolúviejo, Sucre, atenderá 2.160 estudiantes con una inversión total de \$29.365 millones.

- La construcción del Megacolegio Heriberto García Garrido presenta un avance del 23% de ejecución.

Ampliación sede del SENA

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - Para la ampliación de la sede del SENA en Tolú, esta institución ya adquirió todos los lotes necesarios con un área de 2.200 m² por \$1.354 millones. El último lote está en trámite de adquisición por parte del municipio por \$273 millones de 400 m² para octubre de 2021. Los estudios y diseños serán aportados en diciembre de 2021 por el SENA, a través de un convenio suscrito con Findeter y la construcción estará a cargo del departamento de Sucre, que iniciará en el primer trimestre de 2022.
 - Se adelanta el contrato de consultoría No. 3-1-96322- (PAF-SENASUCRE-C-009-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA REGIONAL SUCRE Y CONSORCIO SZSTUDIO+CONSOLTEC cuyo objeto es realizar los “ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES, EN LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO DEL SENA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE” por valor de \$225.873.478 pesos incluido IVA y se estima que se entreguen los productos en el mes de diciembre de 2021.

Construcción de Centro SACUDETE

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Actualmente están viabilizados por \$2.325.900 millones los SACUDETE Lorica (2), y por aprobación los de Coveñas, Tolú, San Onofre y Tuchín. Según conversaciones con el Ministerio del Interior, se espera que los centros SACUDETE de Lorica, viabilizados a la fecha, inicien su ejecución en el tercer trimestre de 2021.

Auditorías de cuentas de punto final Salud

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** Los departamentos de Sucre y Córdoba financian con recursos propios las auditorías a las cuentas de salud, en el marco de la Ley de Punto Final por \$3.124.150.580 millones, ya que ambos manifestaron por escrito el desistimiento a la financiación con recursos del DNP. El Departamento de Sucre adelanta las auditorías por valor de \$1.128.366.839 y el Departamento de Córdoba por un valor de \$1.995.783.741.

Fortalecimiento Institucional

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** en el marco de la implementación del PTGM, la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales diseñó una estrategia de capacitación dirigida a fortalecer las competencias y conocimientos del recurso humano de las 12 entidades territoriales participantes de este Pacto, con el objetivo de fortalecer los procesos de planificación territorial y del ciclo de la inversión pública, que permitan elevar la calidad y productividad de las entidades participantes.

Estrategia de Ecodesarrollo

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** se está adelantando el proceso de concertación para la financiación del proyecto con los departamentos de Córdoba y Sucre. En el desarrollo del Consejo Directivo No. 3 del Pacto Golfo de Morrosquillo desarrollado en Lorica, Córdoba el 16 de abril, el Gobernador de Sucre y el Gobernador de Córdoba manifestaron la intención de realizar los aportes económicos para el desarrollo del proceso de estructuración del proyecto.

Centro multipropósito



- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** La Gobernación de Sucre realizó el estudio de mercado para sustentar la viabilidad de este proyecto. Actualmente el departamento se encuentra elaborando el documento técnico para contratar la estructuración con Puerta de Oro y la adquisición del predio con recursos de regalías, documento que deberá ser viabilizado por el Viceturismo, iniciativa que se ubicará en el sector de Manhattan, al lado de donde se está estructurando la Marina.

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - En el 2020 la AEROCIVIL contrató los estudios y diseños por \$1.329 millones, para la ampliación a 2.200 mts la pista. Los estudios y diseños para la ampliación del aeropuerto de Tolú están en 85% de avance, faltan resolver temas ambientales con CARSUCRE, el resto de los componentes están listos. El costo de la ampliación incluyendo la interventoría es de \$132.000 millones y podrían iniciar ejecución en 2022. La nueva vía hacia Coveñas inicia obras por la concesión en 2022 y duran un año.
 - Para el inicio de obras en el 2022 fue presentado proyecto de artículo en el que se contemplan \$50.000 millones para esta iniciativa en el PGN del 2022. Se deberá presentar solicitud de CONPES para la continuidad de este proyecto, el cual deberá contar con vigencias futuras durante el 2023 y 2024.

Es importante este proyecto para el futuro de la región, con el objetivo de convertir al Golfo de Morrosquillo en un destino turístico de primer nivel en Colombia.

Conectividad – Zona digital

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** el MINTIC se encuentra desarrollando cinco proyectos en zonas rurales y urbanas: 1) Acceso Universal Sostenible - Zonas digitales rurales, 2) Centros digitales, 3) Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional, 4) Incentivos a la Oferta de Internet Fijo y 5) zonas digitales urbanas. Proyectos con año de inicio en 2019 y año de finalización en el 2031, de los cuales 15 se encuentran ejecutados, 3 en aprobación, 4 en ejecución, 10 en operación, 3 en instalación y 9 en planeación, ubicados en los municipios definidos en el Pacto del Golfo de Morrosquillo.

Vías terciarias

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:** En el marco de la visita del Señor Presidente, el 27 de abril se firmaron los convenios para las siguientes intervenciones en vías terciarias:

Departamento	Municipio	Corredor vial	Tipo de Vía	Postulado a Colombia Rural	Longitud (Km)	Inversión estimada
Sucre	Tolúviejo	Palmira - Gualón	Terciaria Municipio	Si	3.95	\$ 1.265.549.461
Sucre	Coveñas	Guayabal - parcelas de Algarrobo y desvío hacia el sector represa Villeros	Terciaria Municipio	No	18,79	\$ 4.392.234.201
Sucre	Coveñas	Aserradero - Coveñas	Terciaria Municipio	No	8.40	\$ 2.693.421.595
Sucre	Santiago de Tolú	Tolú - El francés	Terciaria Municipio	No	4.70	\$ 10.000.000.000
Sucre	San Onofre	Aguas Negras – Berlín (90CS01)	Terciaria Departamental	No	5,5	\$ 13.000.000.000
Inversión red terciaria Sucre						\$ 31.351.205.257
Córdoba	Moñitos	Murcielagal - El Tigre- San Patricio- Mangle**	Terciaria Municipio	Si	5	\$ 1.603.227.140
Córdoba	San Bernardo del viento	Villa Fátima - Perpetuo Socorro	Terciaria Municipio	Si	7,7	\$ 2.468.969.796



Córdoba	San Antero	Porvenir - Peñón- Cerro- Pe-trona- Aserradero	Terciaria Municipio	Si	9,4	\$ 3.023.686.386
Córdoba	Lorica	Corregimiento los Gómez	Terciaria Municipio	Si	27	\$ 8.657.426.556
Inversión red terciaria Córdoba						\$ 15.753.309.878
TOTAL						\$ 47.104.515.135

Se adelanta por parte de la Gobernación de Córdoba las aprobaciones para las vigencias futuras ante la Asamblea Departamental para la ejecución de los tramos de vías terciarias. Por parte de la Gobernación de Sucre se aprobaron por parte de la Asamblea Departamental las vigencias futuras para la ejecución de los tramos de vías a ejecutar en el departamento. Los departamentos serán los encargados de licitar (octubre de 2021) y adjudicar en diciembre de 2021 en sus respectivas jurisdicciones.

Construcción vía paralela al mar desde el sector la viuda hasta el sector Bucaneros en la zona turística de playa blanca, San Antero.

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** Por parte del municipio y consultor del proyecto se trabaja en la estructuración del proyecto, el cual es susceptible de financiación a través de los recursos del FRPT. En el mes de septiembre se sostuvo mesa de trabajo con el municipio en la cual se informó que se han realizado las gestiones prediales de los 35 predios requeridos para el desarrollo del proyecto, el municipio cuenta con los avalúos de los terrenos y se acordó con los propietarios los tramites de compra. El municipio estableció que aproximadamente el 13 de octubre de 2021 tendrá la documentación legal de los predios.

Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el Cangrejo - Playa Blanca, San Antero.

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - Se sostuvieron mesa de trabajo con el municipio e Invias para la subsanación de las observaciones realizadas al proyecto. El proyecto fue enviado con las correcciones y se encuentra a la espera de la respuesta de la viabilidad por el INVIAS.

Proyecto construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero, Departamento de Córdoba.

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:** El municipio hizo el envío de la documentación del proyecto al DNP y ViceTurismo el 24 de septiembre con las observaciones y requerimientos subsanados encontrados en las mesas de trabajo, se procederá por parte de las entidades a realizar la revisión de la documentación enviada.

Proyecto Construcción unidad recreodeportiva Moñitos, Córdoba.

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - Se realizó el envío del proyecto por parte del municipio de Moñitos, al grupo sectorial del DNP para la revisión de este. A la fecha, se encuentra pendiente la revisión de las subsanaciones enviadas en ENTerritorio.
 - El 24 de agosto se realizó la entrega de la subsanación al Concepto de Verificación de los requisitos generales que corresponden a presupuesto general, análisis de precios unitarios, certificación de estampillas pro-deporte y pro-universidad, especificaciones técnicas y cronograma con su respectivo flujo de fondos, MGA y Carta de presentación ajustadas a las modificaciones de cofinanciación y demás.

Proyecto Construcción unidad recreodeportiva San Bernardo del Viento, Córdoba

- **Estado:** en estructuración



- **Avance:** Se realizó mesa de trabajo con el municipio y DNP para hacerle seguimiento a la subsanación de la documentación del proyecto radicado el 5 de agosto de 2021 al Ministerio del Deporte. Actualmente el municipio se encuentra en proceso de nuevos ajustes solicitados por el Ministerio y el cual deben enviarse subsanados.

Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Loricá y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba.

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** se realizó mesa de trabajo con la Gobernación de Córdoba para el avance de la lista de requisitos del FRPT de ENTerritorio con el fin de ir avanzando en la documentación que debe presentar la entidad territorial para la financiación del proyecto. Actualmente la Gobernación se encuentra armando las carpetas acordes a lo exigido por el Fondo Regional de Pactos Territoriales.

Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** Proyecto viabilizado por la UNGRD en el año 2020, se debe obtener la viabilidad año 2021 para iniciar el proceso de articulación entre el FRPT y la entidad territorial, la firma del convenio de ejecución se realizará de manera concertada con la UNGRD.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	6	-	1	5
Comercio Industria y Turismo	7	-	-	7
Deporte y Recreación	3	-	-	3
Educación	1	-	1	-
Interior	4	-	2	2
Salud y Protección Social	3	-	2	1
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	-	1	-
Trabajo	1	-	1	-
Transporte	23	-	16	7
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	6	-	4	2
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	1	-	1	-
Total, general	56	-	29	27

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)



Sector	Valor Total Indicativo	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$177.395	\$18.099	10%	\$159.296	90%
Comercio Industria y Turismo	\$121.074	\$48.713	40%	\$72.361	60%
Deporte y Recreación	\$34.200	\$21.000	61%	\$13.200	39%
Educación	\$29.230	\$8.230	28%	\$21.000	72%
Interior	\$18.107	\$621	3%	\$17.486	97%
Salud y Protección Social	\$59.283	\$5.088	9%	\$54.195	91%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$0	0%	\$5.361	100%
Trabajo	\$20.000	\$16.000	80%	\$4.000	20%
Transporte	\$602.547	\$56.642	9%	\$545.905	91%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$244.306	\$20.370	8%	\$223.936	92%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$3.542	100%	\$0	0%
TOTAL	\$1.315.045	\$198.305	15%	\$1.116.740	85%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2021

32,6%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2020 – 2025
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$177.395	\$495	0%	\$495	0%
Comercio Industria y Turismo	\$121.074	\$0	0%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$34.200	\$0	0%	\$0	0%
Educación	\$29.230	\$5.000	17%	\$29.231	100%
Interior	\$18.107	\$813	4%	\$5.136	28%
Salud y Protección Social	\$59.283	\$2.555	4%	\$7.628	13%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$0	0%	\$5.361	100%
Trabajo	\$20.000	\$0	0%	\$977	5%
Transporte	\$602.547	\$41.972	7%	\$331.010	55%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$244.306	\$19.925	8%	\$45.161	18%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$0	0%	\$3.369	95%
TOTAL	\$1.315.045	\$70.761	5%	\$428.368	32,6%



3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP

N/A*

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

N/A*

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

N/A*

*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en revisión técnica por parte de la DSEPP, la cual una vez sea avalada y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 7 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 70.761 millones equivalente al 5% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera	En Ejecución	\$0	\$495	\$495	\$495
Educación	Megacolegio Heriberto García Garrido en Toluviéjo, Sucre	En Ejecución	\$8.230	\$21.000	\$5.000	\$29.231
Interior	Estructuración de Estación de Bomberos	En Ejecución	\$0	\$813	\$813	\$813
Salud y Protección Social	Estructuración Hospital Coveñas	En Ejecución	\$1.884	\$2.555	\$2.555	\$4.440
Transporte	Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y tolú en el departamento de Sucre.	En Ejecución	\$0	\$41.972	\$41.972	\$41.972
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo	En Ejecución	\$0	\$14.622	\$14.622	\$14.622
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Proyectos de acueducto y alcantarillado para el municipio de Coveñas	En Ejecución	\$0	\$5.304	\$5.304	\$5.304
Total, general			\$10.115	\$86.761	\$70.761	\$96.876

Millones de \$ COP
