



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
12/04/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre y los municipios signatarios, las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de la región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país.

Líneas Temáticas:

- Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.
- Infraestructura para la disminución de las NBI.
- Fortalecimiento y ordenamiento institucional.


TEMAS ESTRATEGICOS

- En la sesión N° 2 del Consejo Directivo se estableció el compromiso, por parte del DNP, de realizar en el mes de febrero de 2021 la socialización de los resultados de los perfilamientos de los proyectos de erosión costera, estación de bomberos, hospital y acueducto regional realizados por ENTerritorio a las entidades territoriales, el cual fue cumplido el 9 de febrero de 2021.
- Presentación en el Comité Técnico y Consejo Directivo del estado de los proyectos de vías terciarias incluidos en el PEI. Este compromiso se cumplirá en la sesión programada en el mes de abril de 2021.
- Aprobación a la modificación del PEI y del Plan de Acción 2021. Este compromiso se cumplirá en la sesión programada en el mes de abril de 2021.

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

- **Vía Santa Lucía – Moñitos, Córdoba.**
Estado: en proceso de licitación
Avance: el proyecto tiene una inversión de \$190.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad' para la intervención de 55 km. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación se encontraba programada para el 24 de marzo de 2021, se revisó el estado el 25 de marzo del 2021 del desarrollo del proceso y establece que se encuentra en evaluación de propuestas. Así la cosas, la fecha probable según el sistema para la adjudicación del proceso es el 13 de abril de 2021.
- **Vía El Delirio - Puerto Viejo.**
Estado: convenio suscrito entre el Departamento de Sucre y el INVIAS.
Avance: el 6 de octubre de 2020 se suscribió convenio N°1235 entre INVIAS y la Gobernación de Sucre, por \$41.972 millones, financiados por la Nación, para la intervención de 13,2 km entre los municipios de Palmito, Coañías y Tolú.

Área de Intervención: Pacto Golfo de Morrosquillo

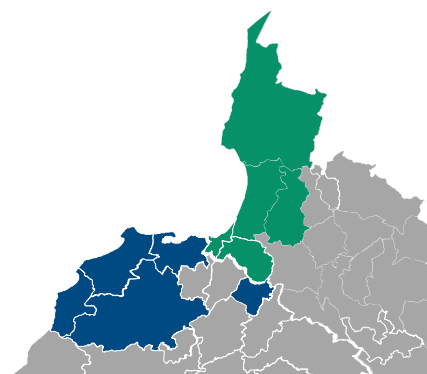

Departamentos:	Córdoba y Sucre
No. de Municipios en el Pacto Territorial:	Departamento de Córdoba: (5) Departamento de Sucre (5)
Fecha de suscripción:	07/02/2020
Fecha de terminación:	07/02/2025
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$912.236 (100%)
Nación (%)	\$ 852.314(93%)
Territorio y otros (%)	\$ 59.922 (7%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$68.576 (8%)
Compromiso Nación	\$58.574
Compromiso Territorio	\$10.002

Proyectos en ejecución	\$68.576 (9 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



Para la ejecución del proyecto de la vía El Delirio – Puerto Viejo, el departamento informó que suscribió el 24 de marzo de 2021 un convenio con FINDETER, quién licitará la intervención de este proyecto, el cual espera adjudicar el 23 de abril, para su posterior suscripción de acta de inicio.

• **Estación de Bomberos – Santiago de Tolú, Sucre.**

Estado: en proceso precontractual pre factibilidad y factibilidad.

Avance: el 24 de marzo se firmó el contrato interadministrativo No. DNP-789-2021, suscrito entre FINDETER y el DNP para la estructuración integral (técnica, jurídica y financiera) en las etapas de pre factibilidad, factibilidad y acompañamiento del proyecto con lo que se podría iniciar obra a finales de esta vigencia.

Para la adquisición del lote de la Estación de Bomberos de Tolú se contrató por parte de la Gobernación de Sucre el respectivo avalúo y en el mes de abril se podrá avanzar con la oferta por el respectivo predio. Por parte de la GNPT se continúa apoyando al departamento en la elaboración del proyecto de inversión para la adquisición del lote con recursos de regalías.

Se realizó visita de campo con la Dirección Nacional de Bomberos y Findeter, como estructurador del proyecto, al lote propuesto para la construcción de la estación de Bomberos en el municipio de Santiago de Tolú. De igual forma se realizó la articulación para la hoja de ruta del proceso de estructuración entre Findeter, Dirección Nacional de Bomberos, Departamento de Sucre y Alcaldía Municipal para el acompañamiento y aporte de las entidades.

• **Hospital – Coveñas, Sucre**

Estado: en proceso precontractual pre factibilidad y factibilidad.

Avance: el 24 de marzo se firmó el contrato interadministrativo No. DNP-789-2021, suscrito entre FINDETER y el DNP para la estructuración integral (técnica, jurídica y financiera) en las etapas de pre factibilidad, factibilidad y acompañamiento del proyecto con lo que se podría iniciar obra a finales de esta vigencia.

Este proyecto se construirá en un lote que adquirirá el Departamento de Sucre para el cual se está realizando los respectivos avalúos para finalizar la compra en el mes de abril. De manera paralela, esta entidad territorial deberá adelantar dos trámites, el primero, presentar en el mes de abril de 2021 el nuevo Documento de Red Hospitalaria de Sucre al Ministerio de Salud para su aprobación y segundo, terminar de elaborar el proyecto de inversión que contempla como una etapa de éste, la adquisición del predio con recursos de regalías.

Se han realizado mesas de trabajo con Ecopetrol para articular su acompañamiento en la estructuración de este



proyecto. Para abril se espera, tener concretado el acompañamiento de esta empresa en la construcción del hospital.

- **Marina - Municipio de Tolú, Sucre**

Estado: En estructuración

Avance: Se avanzó en la segunda mesa técnica con el Viceministerio de Turismo para realizar articulación con esta cartera para la asistencia técnica para el proyecto de la Marina del Golfo de Morrosquillo.

Se realizó Mesa de trabajo en Sincelejo entre la DIES, DAPP, Departamento de Sucre, Alcaldía de Tolú y GNPT para el Proyecto de la Marina. Para tales efectos, se plantearon los dos escenarios que a la fecha se tienen, el primero, el relacionado con la contratación que se pretende adelantar desde el Municipio de Tolú de unos estudios y diseños para “obra pública” de una marina en lote de propiedad del municipio en el sector de Manhattan. La segunda opción, es la que un privado adelante el proyecto de manera independiente, articulando él mismo la construcción y operación de este proyecto, dejando en claro que en este caso no habría recursos públicos para este proyecto. Teniendo en cuenta los dos escenarios, se concluyó que en primera medida el departamento abordará la opción del particular, en cuanto a la entrega del lote a la entidad territorial y si no se avanza en esta opción, se procederá a brindar asistencia técnica al municipio de Tolú para estructurar una APP de iniciativa pública en el lote de propiedad del municipio, haciendo necesario retirar de SECOP el proceso de contratación de los estudios y diseños bajo la figura de obra pública y avanzar bajo las condiciones jurídicas de las APP.

- **Acueducto de San Antero hasta el corregimiento del Porvenir**

Estado: En licitación

Avance: se recibió por parte del Plan Departamental de Aguas de Córdoba el convenio No 014 de 2020 entre Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. y la empresa de servicios públicos AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P. para la ejecución del proyecto. La licitación contemplaba fecha de adjudicación el 10 de marzo, pero fue declarada desierta, por tanto, se recibe nuevo cronograma del proceso el cual estima fecha de adjudicación el 07 de abril de 2021.

- **Erosión Costera**

Estado: En estructuración.

Avance: El 3 de marzo se recibió propuesta por parte de la DIMAR para la estructuración del proyecto de mitigación de la erosión costera en el Golfo de Morrosquillo. Posteriormente, se realizó mesa de trabajo con esta entidad para concretar el alcance de los productos que tendría la consultoría para la mitigación de la erosión costera. Al respecto, quedó claro que entregan estudios y diseños de las intervenciones más adecuadas que se deban implementar en la región del Golfo de Morrosquillo para mitigar la erosión costera, faltando por contratar los estudios



y licencias de impacto ambiental y los relacionados con arqueología.

- **Acueducto Regional e iniciativas sector agua potable y saneamiento**

Estado: En estructuración

Avance: se realizó mesa de trabajo con ENTerritorio para conocer las propuestas que hace esta entidad para el acueducto regional del golfo de Morrosquillo. Así las cosas, se verificaron los alcances a los estudios y diseños del acueducto que serían ejecutados por ENTerritorio. Posteriormente, se desarrolló mesa de trabajo en la que se presentaron los posibles cronogramas y alcances para la ejecución de la pre factibilidad y factibilidad del proyecto de acueducto regional. Se conocieron los proyectos en los municipios por las dos Unidades regionales, que comprende la de los municipios de Córdoba y la otra de los municipios de Sucre. También se planteó la necesidad de extender el Convenio Marco entre ENTerritorio y DNP, para poder suscribir el nuevo contrato para las fases 2 y 3 del citado proyecto.

El 24 de marzo se firmó el contrato interadministrativo No. DNP-789-2021, suscrito entre FINDETER y el DNP para la estructuración integral (técnica, jurídica y financiera) en las etapas de pre factibilidad, factibilidad y acompañamiento del proyecto de Soluciones de agua potable y saneamiento básico para el municipio de Coveñas, Departamento de Sucre. Este proyecto está integrado por 4 componentes como se establece a continuación:

- Optimización y ampliación de las redes de acueducto del casco urbano del municipio de Coveñas, departamento de Sucre y programa de reducción de pérdidas.
- Optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Coveñas, departamento de Sucre.
- Drenaje pluvial del casco urbano del municipio de Coveñas, departamento de Sucre.
- Optimización de los sistemas de abastecimiento y de las plantas de tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio de Coveñas departamento de Sucre.

- **Malecón de Coveñas**

Estado: en estructuración

Avance: se avanzó en la segunda mesa técnica con el Viceministerio de Turismo para realizar articulación con esta cartera para la asistencia técnica para el proyecto del malecón de la segunda ensenada en Coveñas. De igual forma se presentaron los avances en el proceso de estructuración del proyecto al Ministerio de Turismo de los Malecones de la primera ensenada y del municipio de Tolú, para ir trabajando en conjunto la estructuración de los proyectos y recibir el acompañamiento por parte del ministerio.



- **Megacolegio Heriberto García Garrido en el municipio de Toluviéjo – Sucre**

Estado: Proyecto viabilizado

Avance: El FFIE solicitó nuevo cargue del proyecto al SUIFP teniendo en cuenta el nuevo presupuesto para el proyecto. No se ha podido realizar el cargue porque el FFIE no ha definido el presupuesto definitivo del proyecto. Esta iniciativa deberá ser ajustada en el próximo Consejo Directivo dado los mayores valores que aportará el departamento de Sucre por el Fondo del 60% de regalías y los valores que deberá aportar el MEN.

- **Ampliación sede del SENA**

Estado: en estructuración

Avance: a la fecha el SENA ya adquirió dos lotes con un área de (1.185 m²), necesarios para la ampliación de la sede de Tolú por \$751 millones. El tercer lote (1.200 m²) está en revisión jurídica dado los inconvenientes legales de los actuales propietarios, para que sea adquirido por el SENA y el Municipio de Tolú por \$800 millones aproximadamente. Se espera que para abril la Contraloría haya definido el levantamiento de la medida cautelar que hay sobre el tercer lote.

Tan pronto se tenga certeza de la compra de esos lotes, el SENA procederá con la elaboración de los estudios y diseños de la ampliación de la actual sede. El Departamento de Sucre en el 2021, espera iniciar la construcción de esta ampliación, para posteriormente proceder con su dotación.

- **Construcción de Centro SACUDETE**

Estado: en estructuración

Avance: se recibió confirmación por parte del MinInterior de la aprobación del proyecto del Centro SACUDETE del municipio de Lorica por \$1.250 millones, el cual se espera inicie en el segundo semestre del 2021. Respecto a la construcción de los Centros SACUDETE en los municipios de Coveñas y Tuchín se informó que los proyectos se encuentran radicados pendientes por evaluar. Para los proyectos de SACUDETE de los municipios de San Onofre y San Bernardo del Viento los proyectos no han sido radicados.

- **Auditorías de cuentas de punto final Salud**

Estado: en estructuración

Avance: la Gobernación de Sucre manifestó verbalmente el desistimiento de la radicación del proyecto para su financiación, por tanto, se espera la confirmación de esta información por medio oficial al DNP. Los aportes económicos para esta iniciativa serán 100% de las Gobernaciones.

- **Fortalecimiento Institucional**

Estado: en estructuración

Avance: en el marco de la implementación del PTGM, la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales diseñó una



estrategia de capacitación dirigida a fortalecer las competencias y conocimientos del recurso humano de las 12 entidades territoriales participantes de este Pacto, con el objetivo de fortalecer los procesos de planificación territorial y del ciclo de la inversión pública, que permitan elevar la calidad y productividad de las entidades participantes.

- **Estrategia de Ecodesarrollo**

Estado: en estructuración

Avance: se está adelantando el proceso de concertación para la financiación del proyecto con los departamentos de Córdoba y Sucre. A la fecha, el Gobernador de Sucre ha manifestado el deseo de apoyar económicamente el proyecto y por parte del departamento de Córdoba no se ha recibido manifestación al respecto.

- **Centro multipropósito**

Estado: en estructuración

Avance: se sostuvo reunión con el viceministro de turismo en la cual se presentaron los lotes propuestos para el Centro Multipropósito con el fin de recibir las recomendaciones sobre la pertinencia de la ubicación de este proyecto. Como resultado de la reunión se concluyó que es necesario culminar el estudio de mercado para determinar el alcance de este proyecto, el cual deberá estar concluido al finalizar el mes de abril, y así contar con los insumos técnicos necesarios para validar la mejor ubicación del proyecto. En reunión sostenida con la Gobernación de Sucre y el particular propietario del lote se estableció que a más tardar el 20 de abril se tendrá el lote del sector palo blanco a nombre del municipio o Gobernación de Sucre, para la ejecución de este proyecto.

- **Aeropuerto Golfo de Morrosquillo**

Estado: en estructuración

Avance: la ampliación y mejoramiento de la pista del Aeropuerto del Golfo de Morrosquillo de Tolú se adelantará teniendo como referencia el Plan Maestro Aeroportuario para este terminal y se desarrollará en tres fases en las cuales se intervendrá el lado aire, lado tierra y obras de urbanismo, que requieren una inversión estimada a precios 2017 de \$181.455 millones.

En el 2020 la AEROCIVIL contrató los estudios y diseños por \$1.329 millones, para la ampliación a 2.200 mts de la pista. Este contrato se encuentra en ejecución y se prevé su finalización en mayo de 2021.

Se sostuvo mesa de trabajo entre la Aerocivil, el Ministerio del Interior, Departamento de Sucre y la GNPT para consultarle a la Subdirección Técnica de la Dirección de Consultas Previas del Ministerio del Interior si es necesaria la Consulta Previa con el Cabildo El Palmar, para la ampliación de la pista del aeropuerto del Golfo de Morrosquillo en Tolú. Así las cosas, la subdirectora mencionó que el 17 de marzo de 2021 fue expedida la Resolución que establece que no es necesaria la Consulta Previa a este cabildo. Se recibió recomendación de avanzar en los



estudios de impacto de ruido para determinar la incidencia de esta variable en esta comunidad, también se advirtió sobre las consideraciones que defina CARSUCRE, para la definición de licencias y permisos ambientales.

- **Conectividad – Zona digital**

Estado: en estructuración

Avance: el MINTIC se encuentra desarrollando un proyecto para la instalación de zonas digitales rurales, el cual está programado inició en agosto de 2020, con una ejecución de 18 meses. Entre los municipios beneficiados se encuentra Lorica con 6 zonas digitales y 5 zonas en Tolú.

El segundo proyecto, es el correspondiente a los incentivos a la oferta de Internet fijo (conexiones a los hogares). Su instalación inició en Moñitos y San Antero (octubre 2020) y Tolviejo (noviembre 2020). La operación inició en Moñitos y San Antero (diciembre 2020) y Tolviejo (enero 2021).

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	1	2
Comercio Industria y Turismo	3	-	-	3
Educación	1	-	1	-
Interior	3	-	1	2
Salud y Protección Social	3	-	1	2
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	-	-	1
Trabajo	1	-	1	-
Transporte	4	-	2	2
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	3	-	2	1
Total, general	22	-	9	13

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$126.924	\$400	0%	\$126.524	100%
Comercio Industria y Turismo	\$71.490	\$28.490	40%	\$43.000	60%
Educación	\$20.309	\$2.030	10%	\$18.279	90%
Interior	\$12.473	\$1.000	8%	\$11.473	92%
Salud y Protección Social	\$59.695	\$2.000	3%	\$57.695	97%



Sector	Costo Total Estimado	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$1.053	\$0	0%	\$1.053	100%
Trabajo	\$20.000	\$16.000	80%	\$4.000	20%
Transporte	\$454.568	\$0	0%	\$454.568	100%
Vivienda Ciudad y Territorio – Agua	\$145.724	\$10.002	7%	\$135.722	93%
TOTAL	\$912.236	\$59.922	7%	\$852.314	93%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2021

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

7,5%

Total, Ejecución 2020 – 2025 (Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$126.924	\$0	0%	\$494	0%
Comercio Industria y Turismo	\$71.490	\$0	0%	\$0	0%
Educación	\$20.309	\$0	0%	\$5.000	25%
Interior	\$12.473	\$0	0%	\$267	2%
Salud y Protección Social	\$59.695	\$0	0%	\$267	0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$1.053	\$0	0%	\$0	0%
Trabajo	\$20.000	\$0	0%	\$751	4%
Transporte	\$454.568	\$0	0%	\$43.301	10%
Vivienda Ciudad y Territorio – Agua	\$145.724	\$5.000	3%	\$18.497	13%
TOTAL	\$912.236	\$5.000	0,5%	\$68.576	8%

3. PRINCIPALES AVANCES POR LÍNEA TEMÁTICA Y SECTOR

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO PLAN– INDICADORES ESTRATÉGICOS*



*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en proceso de construcción, las cuales una vez avaladas y aprobadas por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederán a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.

Principales avances de proyectos por línea temática y sector:



Línea temática1

•Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible

Sector	Avances
Ambiente y Desarrollo Sostenible	• N/A
Comercio Industria y Turismo	• N/A
Trabajo	• N/A
Transporte	• N/A



Línea temática2

• Infraestructura para la disminución de las NBI

Sector	Avances
Educación	• N/A
Interior	• N/A
Salud y Protección Social	<ul style="list-style-type: none"> • Estructuración Hospital Coveñas. El proyecto se encuentra en ejecución, se suscribió contrato para el perfilamiento con ENTerritorio en el 2020 con una inversión de \$267 millones recursos del DNP, en marzo de 2021 se suscribió contrato con Findeter con una inversión de \$2080 millones por parte del DNP, para la prefactibilidad y factibilidad en un plazo de ejecución de ocho (08) meses. Con este proyecto se benefician 130.485 habitantes. El principal objetivo es la estructuración integral (técnica, jurídica y financiera) para la construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital de Coveñas. El departamento de Sucre radicará en el mes de abril el nuevo



Sector	Avances
	Documento Red para aprobación de este nuevo prestador de servicios y se espera poder concretar en este mismo mes la adquisición del predio para este proyecto por parte del departamento.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> N/A
Transporte	<ul style="list-style-type: none"> Estudios y diseño para el mejoramiento y ampliación de la pista del aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre. El proyecto se encuentra en ejecución, se adjudicó contrato por \$1.329 millones para los estudios y diseños de la ampliación de la pista, para pasar de 1.400 mts a 2.200 mts de longitud, con este proyecto se benefician 390.000 habitantes de los municipios signatarios, el principal objetivo es aumentar la capacidad de recibir aviones de mayor envergadura y así, fortalecer el potencial turístico del Golfo de Morrosquillo.
Vivienda Ciudad y Territorio – Agua	<ul style="list-style-type: none"> Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo. El proyecto se encuentra en ejecución, se suscribió contrato para el perfilamiento con ENTerritorio en el 2020 con una inversión de \$495 millones por parte del DNP. Las etapas de prefactibilidad y factibilidad se esperan contratar en el mes de abril. Con este proyecto se benefician 390.000 habitantes de los municipios signatarios, con el objetivo de proponer y recomendar soluciones que optimizaran la cobertura, continuidad y calidad en la prestación del servicio, tanto en la zona urbana como en la zona rural que actualmente se atienden con los sistemas de la zona urbana. Estas propuestas deberán estar enfocadas en un estudio articulado de la región que permita identificar las ventajas de una operación regionalizada del servicio. Así mismo, se podrán proponer soluciones puntuales de acuerdo con las necesidades de cada uno de los municipios, como quiera que en las etapas posteriores se desarrollarán las selecciones de alternativas y soluciones a esta. Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta el corregimiento del porvenir, San Antero, Córdoba. El proyecto se encuentra en ejecución, con una inversión de \$18.002 millones, de los cuales corresponde \$5.000 millones al DNP, \$3.000 millones al MVCT y \$10.002 millones al territorio, el proyecto tiene como fecha de adjudicación de contrato el 07 de abril por parte del operador Aqualia. El proyecto mejorará la producción, tratamiento y distribución de agua potable en las localidades de San Antero y el corregimiento de El Porvenir, la población beneficiada corresponde a 33.096 habitantes, esta optimización del sistema genera una oferta de 120 litros por segundo y mejorará una continuidad y calidad en la prestación del servicio.



Línea temática3

- Fortalecimiento y ordenamiento institucional**



Sector	Avances
Ambiente y Desarrollo Sostenible	<ul style="list-style-type: none">N/A
Interior	<ul style="list-style-type: none">Estructuración de Estación de Bomberos. El proyecto se encuentra en ejecución, se suscribió contrato para el perfilamiento con ENTerritorio en el 2020 con una inversión de \$267 millones con recursos del DNP, en marzo de 2021 se suscribió contrato con Findeter con una inversión de \$497 millones por parte del DNP, para elaborar la pre factibilidad y factibilidad en un plazo de ejecución de seis (06) meses, con este proyecto se benefician 130.485 habitantes. El principal objetivo es la estructuración integral (técnica, jurídica y financiera) para la construcción y dotación de la estación de bomberos en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre.



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total es un proyecto cofinanciado en ejecución, por valor de \$ 5.000 millones (0,5%).

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta el corregimiento del porvenir, San Antero, Córdoba	En Ejecución	\$10.002	\$8.000	\$5.000	\$18.002
Total, general			\$10.002	\$8.000	\$5.000	\$18.002

Millones de \$ COP
