



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
03/02/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/12/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre y los municipios signatarios, las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de la región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento y ordenamiento institucional.
- Infraestructura para la disminución de las NBI.
- Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.

TEMAS ESTRATEGICOS


El 26 de noviembre de 2021 se realizó el quinto Consejo Directivo, en el que se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Inversiones pasando de \$1.315.045 millones a \$1.412.523 millones con 68 iniciativas estratégicas.

➤ Compromisos instancias administración:

- Modificar el PEI y PA2021, aprobados por el Consejo Directivo No. 5.
- Agendar reunión de revisión de la estructuración del proyecto de Erosión Costera con los Departamentos de Córdoba y Sucre y FINDETER para revisión de alcances y proyecto por fases.
- Agendar segunda mesa de pasos urbano del municipio de Loricá con INVIAS.
- Agendar reunión con INVIAS para revisión por parte de los municipios y departamentos signatarios del PTGM del cronograma de ejecución de obras de los diferentes proyectos incluidos en el PEI.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Golfo de Morrosquillo generará cerca de 18.411 empleos directos y 30.402 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 415.000 habitantes del área de influencia del Pacto Golfo de Morrosquillo.

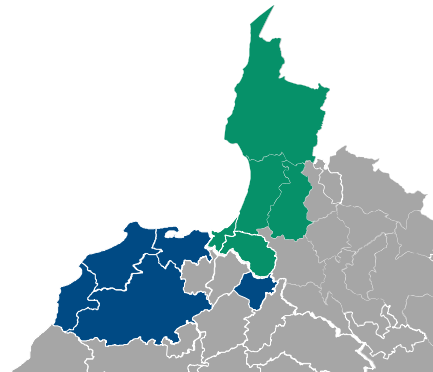Área de Intervención: Pacto Golfo de Morrosquillo

Departamentos:	Córdoba y Sucre
No. de Municipios en el Pacto Territorial:	Departamento de Córdoba: (5) Departamento de Sucre (5)
Fecha de suscripción:	07/02/2020
Fecha de terminación:	07/02/2025
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$1.412.523 (100%)
Nación (%)	\$1.201.274 (85%)
Territorio y otros (%)	\$211.249 (15%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$682.438 (48,3%)
Compromiso Nación	\$529.724
Compromiso Territorio	\$152.714

Proyectos en ejecución	\$682.438 (51 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Vía Santa Lucía – Moñitos, Córdoba.

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - El proyecto tiene una inversión de \$190.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad' para la intervención de 55 km. Vía adjudicada el 9 de abril de 2021 por \$171.472 millones por el INVIAS, el inicio fue en mayo de 2021, con un plazo de ejecución de 54 meses. A la fecha el contrato se encuentra en ejecución en mejoramiento de los puntos críticos.
 - El 27 de noviembre fue inaugurado por el señor Presidente de la Republica los primeros 5 kilómetros de vía.

Vía El Delirio - Puerto Viejo.

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - La vía comprende el tramo entre Palmito, Coveñas y Tolú para el cual se suscribió convenio el 6 de octubre de 2020 por valor de \$37.790 millones con recursos Nación entre INVIAS y departamento de Sucre, la interventoría fue contratada por INVIAS por \$4.182 millones, para un total de 41.972 millones. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de ejecución del contrato en el marco del convenio suscrito entre la Gobernación de Sucre y FINDETER.
 - Se suscribió contrato No. 3-1-97902 de 2021-1 (PAF-SUCRE-0-051-2021) el 8 de septiembre de 2021 por valor de \$35.578.255.324 pesos, el 15 de septiembre de 2021 se firmó el Acta de inicio de obra con un plazo estimado de 12 meses.
 - Se realizó acto protocolario de inicio de obras el día 26 de noviembre en Puerto Viejo. El inicio formal de las obras se realizó el 1 de diciembre de 2021.

Vía Moñitos-San Bernardo del Viento-Lorica-Chinú.

- **Estado:** Proyecto en ejecución por INVIAS que hace parte del Programa de "Concluir - Concluir".
- **Avance:**
 - Fue adjudicado en diciembre del 2020 mediante proceso licitatorio No. LP-DT-045-2020 al KMA CONSTRUCCIONES SAS contrato de Obra No. 1591 del 2020 por \$26.678 millones. Mediante proceso CMA-DT-172-2020 se adjudicó la interventoría al CONSORCIO SUPERVISIÓN CORREDORES VIALES contrato No. 1791 del 2020 por \$2.249 millones. Se comprometieron recursos por \$28.927 millones para una ejecución estimada de 60 meses, contados a partir del 2 de marzo del 2021.

Estructuración y compra de lote Estación de Bomberos

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - Se adelanta la estructuración integral técnica, legal, financiera y social en las fases de prefactibilidad, factibilidad y acompañamiento para la viabilidad del proyecto de construcción y dotación de una estación de bomberos en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre. Esta estructuración está siendo desarrollada a través de contrato con Findeter por \$546 millones, incluyendo la interventoría. La prefactibilidad, factibilidad y gestión predial se espera finalice en el primer trimestre del 2022. En el mes de septiembre se concretó la adquisición del lote por el departamento con recursos de regalías por \$621 millones.
 - Se legalizaron los contratos de consultoría el 8 de septiembre de 2021 al Consorcio Caribe y el contrato de interventoría el 22 de septiembre de 2021 al consorcio JCB. La firma del acta de inicio se realizó el 24 de septiembre de 2021 con fecha estimada de finalización el 24 de febrero de 2021.



- El proyecto tiene un avance real del 38%.

Estructuración Hospital de Coveñas, Sucre

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - Findeter adjudicó contratos de Consultoría e interventoría el 2 de junio de 2021, la primera a CURE Y CIA SAS, por \$1.639 millones, la segunda a INVER MIL GROUP SAS, por \$329 millones. Con esta contratación se pretende estructurar la prefactibilidad y factibilidad de este proyecto, con lo cual se tendrán los resultados finales en diciembre de 2021. De manera paralela, se suscribirá el convenio entre MinSalud y Findeter, para la construcción. A la fecha, se han adelantado mesas de trabajo para poder articular el convenio interinstitucional y la Gerencia de esta construcción.
 - La adquisición del predio por parte de la Gobernación de Sucre se concretó con recursos propios tanto del Departamento como del municipio de Coveñas. El municipio aportará \$1.000 millones y la Gobernación \$900 millones. La titularidad del lote se materializará tan pronto se pueda registrar la titularidad del predio obtenido en un proceso de sucesión. Actualmente se encuentra en trámite de escrituras y registro en Oficina de Instrumentos Públicos.
 - El proyecto tiene un avance real de 87% vs 95% programado.
 - Se realizó emisión de CONPES el día 29 de noviembre el cual contempla vigencias futuras excepcionales para el año 2022 por valor de \$15.000 millones y 2023: \$14.140 millones.

Estructuración Marina del Golfo de Morrosquillo - Municipio de Tolú, Sucre

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:**
 - La gobernación de Sucre junto con el municipio de Tolú avanza en la estructuración de una obra pública. El Vice-ministerio de Turismo y el DNP han brindado asistencia técnica a ambas entidades territoriales para definiciones de la estructuración y de la ubicación, la cual será en el predio de propiedad del municipio en el sector de Manhattan.
 - El municipio de Santiago de Tolú el 25 de agosto de 2021 adjudicó el contrato ST-CM-021-2021 al consultor Consorcio Santa Marta cuyo objeto es "ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MARINA DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE" por \$318 millones, se espera que para diciembre de 2021 sea entregado el producto final para posteriormente proceder a la viabilidad sectorial.
 - El DNP contempló \$40.000 millones en el reciente CONPES de Pactos Territoriales para este proyecto.

Infraestructuras de acueducto y saneamiento básico en los Municipios del PTGM

Esta iniciativa incluida en la versión No. 2 del PEI del pacto golfo de Morrosquillo aprobado en el 2021 en el tercer Consejo Directivo plantea los siguientes proyectos: Segunda etapa del alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba, Soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas, Construcción Sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre y Acueducto de San Antero hasta el corregimiento del Porvenir. A continuación, se describe el avance:

Acueducto de San Antero hasta el corregimiento del Porvenir

- **Estado:** En Ejecución
- **Avance:**



- El Plan Departamental de Aguas de Córdoba firmó convenio No. 014 de 2020 entre Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. y la empresa de servicios públicos AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P. para la ejecución del proyecto. El 12 de abril de 2021 se adjudicó el proceso por parte del AQUALIA el proceso No. SCO-AQLATAM-ACU-002-2021, de igual forma el 4 de mayo de 2021 fue adjudicada la interventoría del proyecto. El proyecto se encuentra en ejecución desde el 25 de mayo de 2021 a la fecha el proyecto lleva un avance del 9% que corresponde a la construcción de los tanques de almacenamiento y extensión de redes.

Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:**
 - Se firmó convenio DNP - Municipio por \$8.476 millones, de los cuales el territorio realizó un aporte de \$2.542 millones de pesos y el FRPT \$5.933 millones de pesos.

Estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:**
 - El 31 de marzo se suscribió el acta de inicio del Contrato suscrito con FINDETER por \$4.821 millones para la estructuración de:
 1. Optimización y ampliación de las redes de acueducto del casco urbano del municipio de Coveñas y programa de reducción de pérdidas.
 - A la fecha la estructuración tiene una ejecución de 83% de avance y será entregada en Febrero de 2022.
 2. Optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Coveñas.
 - Esta estructuración será entregada en enero de 2022 y ejecutado por FINDETER. A la fecha tiene un avance en ejecución de 55%.
 3. Drenaje pluvial del casco urbano del municipio de Coveñas.
 - A la fecha la estructuración tiene una ejecución de 55% de avance y será entregada en marzo de 2022.
 4. Optimización de los sistemas de abastecimiento y de las plantas de tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio de Coveñas.
 - Esta estructuración será entregada en enero de 2022 y ejecutado por FINDETER. A la fecha tiene un avance en ejecución de 56%.
 - En el mes de diciembre se sostuvieron mesas de seguimiento con la consultoría y Findeter.

Estructuración Proyectos de Prevención y Mitigación de Erosión Costera

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:**
 - El 1 de octubre de 2021 el DNP contrató con FINDETER por \$17.124 millones la estructuración de este proyecto, para los componentes técnico, legal, ambiental y financiero de obras de prevención y mitigación de la erosión costera para 10 puntos críticos en la costa del Golfo de Morrosquillo y cuyos resultados se esperan tener finalizados en julio de 2022.



- Las Gobernaciones de Córdoba y Sucre, FINDETER, la ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales deben realizar el proceso de licenciamiento a través de FINDETER, quien deberá garantizar la continuidad del mismo consultor de la fase de estructuración. Se gestionó en septiembre la suscripción de una Carta de Intención por parte de los Gobernadores de Sucre y Córdoba, en la que se comprometen a destinar los recursos económicos para el licenciamiento de este proceso, que incluyen el acompañamiento de Findeter y el costo de las respectivas licencias.
- En proceso pre-contractual de los contratos derivados.

Acueducto Regional Golfo de Morrosquillo

- **Estado:** En estructuración
- **Avance:**
 - En el mes de diciembre de 2020 se entregó el perfilamiento del proyecto.
 - Se suscribió contrato interadministrativo entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio No. DNP- 869-2021 / ENT 221010 cuyo objeto es "DESARROLLAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LAS SOLUCIONES DE AGUA Y/O SANEAMIENTO PARA EL GOLFO DE MORROSQUILLO" por valor de \$14.127 millones que contempla los siguientes alcances:

GRUPO I: "Estructuración integral para los proyectos de agua potable y saneamiento básico en los municipios de San Bernardo del viento, San Antero, Moñitos y Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba".

GRUPO II: "Estructuración integral para la solución de abastecimiento de agua en los municipios de Coveñas, Santiago de Tolú, Toluvié y San Onofre, y entrega de agua en bloque en el departamento de Sucre".
 - Se socializó con los departamentos de Córdoba y Sucre y los municipios signatarios del Pacto Golfo de Morrosquillo, el alcance de contrato interadministrativo de la estructuración del acueducto regional los días 28 y 29 de septiembre.
 - Se socializaron con los municipios y Departamentos de Córdoba y Sucre los consultores de esta estructuración los días 15 y 16 de diciembre. Se indicó la hoja de ruta y alcance de la consultoría por cada municipio.

Estructuración Malecón de Coveñas (Segunda Ensenada)

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - La Gobernación de Sucre aportará los estudios y diseños de este proyecto y se podrá radicar en FONTUR para la respectiva viabilidad. FONTUR, el departamento, DNP (CONPES 4037 por \$8.000 millones) y el municipio aportarán los recursos para el cierre financiero de esta obra.
 - Se adjudicó el 6 de octubre de 2021 contrato No. CM-SID-006-2021 al Consorcio Coveñas 2021 por \$915 millones, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PARQUE LINEAL RECREO-DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE".
 - Se sostuvo mesa de trabajo con Viceministerio de Turismo para ir presentando los avances en el proceso de consultoría, a lo cual el Viceministerio realizó la observación del valor total del proyecto que se presentó que es cercano a los \$48.000 millones, para lo cual se solicitó al Departamento claridad en las fuentes de financiación para lograr el cierre financiero del proyecto. De igual forma se aclaró que con estos recursos no se pueden adquirir predios, como lo presentó el Departamento en los avances a la fecha.

Megacolegio Heriberto García Toluvié, Sucre

- **Estado:** En Ejecución
- **Avance:**
 - El 27 de abril en el marco de la visita del Señor Presidente a Toluvié se instaló la primera piedra de esta obra y en este momento el proyecto se encuentra en ejecución. Este proyecto contempla una ejecución de 18 meses, a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), se espera haber terminado en 14 meses el edificio



principal para la inauguración del Señor Presidente. El Megacolegio Heriberto García Garrido en Toluvejo, Sucre, atenderá 2.160 estudiantes con una inversión total de \$27.161 millones.

- La construcción del Megacolegio Heriberto García Garrido presenta un avance del 40% de ejecución.

Ampliación sede del SENA

- **Estado:** en estructuración
- **Avance:**
 - Para la ampliación de la sede del SENA en Tolú, esta institución ya adquirió todos los lotes necesarios con un área de 2.200 m² por \$1.354 millones. El último lote está en trámite de adquisición por parte del municipio por \$273 millones de 400 m² para diciembre de 2021. Los estudios y diseños serán aportados en el primer trimestre de 2022 por el SENA, a través de un convenio suscrito con Findeter y la construcción estará a cargo del departamento de Sucre, que iniciará en el primer semestre de 2022.
 - Se adelanta el contrato de consultoría No. 3-1-96322- (PAF-SENASUCRE-C-009-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA REGIONAL SUCRE Y CONSORCIO SZSTUDIO+CONSOLTEC cuyo objeto es realizar los “ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES, EN LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO DEL SENA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE” por \$226 millones incluido IVA y se estima que se entreguen los productos en el mes de marzo de 2022.

Centros Sacúdete: (1) en San Bernardo del Viento, (1) en San Onofre, (1) en Palmito, (1) Toluvejo, (1) Tuchín y (2) en Lorica

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - ✓ Actualmente están viabilizados por \$4.000 millones los SACULETE de Lorica (2), Tuchín y Toluvejo.
 - ✓ Se encuentran por aprobación los de Coveñas, Tolú y San Onofre según lo reportado por el Ministerio del Interior.

Cofinanciación de Auditorías de cuenta de salud de punto final

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** Los departamentos de Sucre y Córdoba financian con recursos propios las auditorías a las cuentas de salud, en el marco de la Ley de Punto Final por \$3.124 millones, ya que ambos manifestaron por escrito el desistimiento a la financiación con recursos del DNP. El departamento de Sucre adelanta las auditorías por \$1.128 millones y el departamento de Córdoba por \$1.996 millones.

Fortalecimiento Institucional

- **Estado:** ejecutado
- **Avance:** en el marco de la implementación del PTGM, la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales diseñó una estrategia de capacitación dirigida a fortalecer las competencias y conocimientos del recurso humano de las 12 entidades territoriales participantes de este Pacto, con el objetivo de fortalecer los procesos de planificación territorial y del ciclo de la inversión pública, que permitan elevar la calidad y productividad de las entidades participantes.

Estrategia de Ecodesarrollo

- **Estado:** en gestión
- **Avance:** se está adelantando el proceso de concertación para la financiación del proyecto con los departamentos de Córdoba y Sucre. En el desarrollo del Consejo Directivo No. 3 del Pacto Golfo de Morrosquillo desarrollado en Lorica, el 16 de abril, el Gobernador de Sucre y el Gobernador de Córdoba manifestaron la intención de realizar aportes cada uno por \$500 millones, para el desarrollo del proceso de estructuración del proyecto.



Centro multipropósito

- **Estado:** en gestión
- **Avance:** La Gobernación de Sucre realizó el estudio de mercado para sustentar la viabilidad de este proyecto. Actualmente el departamento se encuentra elaborando el documento técnico para contratar la estructuración con Puerta de Oro y la adquisición del predio, ambos, con recursos de regalías, documento que deberá ser viabilizado por el Viceturismo, iniciativa que se ubicará en el sector de Manhattan (Tolú), al lado de donde se está estructurando la Marina.

Estudios, Diseños y construcción para el mejoramiento y ampliación de del aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre.

Estado: en ejecución

Avance:

- En el 2020 la AEROCIVIL contrató los estudios y diseños por \$1.329 millones, para la ampliación a 2.200 mts de la pista. Los estudios y diseños para la ampliación del aeropuerto de Tolú finalizaron satisfactoriamente. Para la ejecución es necesario tramitar la licencia ambiental con CARSUCRE y la Consulta Previa con el Ministerio del Interior. El costo de la ampliación incluyendo la interventoría es de \$132.000 millones e iniciará ejecución en 2022. La nueva vía hacia Coveñas será entregada por la concesión en mayo de 2022.
- Se anunció por parte de la Directora Nacional del DNP que se aseguran los recursos por \$80.000 millones, distribuidos para el 2022 \$32.000 millones y 2023 \$48.000 millones, para la reconstrucción total de la pista y llevarla a 1.400 mts, ampliarla el doble, pasando de 16 mts a 30 mts, ampliación de la plataforma y obras complementarias en la terminal de transporte.
- Se realizó visita con la Aeronáutica Civil. Gobernación de Sucre, DIES y equipo del Pacto Golfo de Morrosquillo el día 14 de diciembre de 2021. Se sostuvo mesa técnica para la articulación entre las entidades para los tramites de licencia ambiental, consulta previa y revisión del CONPES. De igual forma, se realizó el recorrido por la pista de aterrizaje para la verificación del alcance de la intervención y el estado actual de la construcción de la nueva vía que comunica los municipios de Coveñas y Santiago de Tolú, ya que el tramo actual no permite la ampliación de la pista.

Conectividad – Zona digital

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** el MINTIC se encuentra desarrollando cinco proyectos en zonas rurales y urbanas: 1) Acceso Universal Sostenible - Zonas digitales rurales, 2) Centros digitales, 3) Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional, 4) Incentivos a la Oferta de Internet Fijo y 5) zonas digitales urbanas. Proyectos con año de inicio en 2019 y año de finalización en el 2031, de los cuales 15 se encuentran ejecutados, 3 en aprobación, 4 en ejecución, 10 en operación, 3 en instalación y 9 en planeación, ubicados en los municipios definidos en el Pacto del Golfo de Morrosquillo.

Vías terciarias

- **Estado:** En ejecución
- **Avance:** En el marco de la visita del Señor Presidente, el 27 de abril se firmaron los convenios para las siguientes intervenciones en vías terciarias:

Departamento	Municipio	Corredor vial	Tipo de Vía	Postulado a Colombia Rural	Longitud (Km)	Inversión estimada
Sucre	Tolúviejo	Palmira - Gualón	Terciaria Municipio	Si	3.95	\$ 1.265.549.461
Sucre	Coveñas	Guayabal - parcelas de Algarrobo y desvío hacia el sector represa Villeros	Terciaria Municipio	No	18,79	\$ 4.392.234.201
Sucre	Coveñas	Aserradero - Coveñas	Terciaria Municipio	No	8.40	\$ 2.693.421.595
Sucre	Santiago de Tolú	Tolú - El francés	Terciaria Municipio	No	4.70	\$ 10.000.000.000



Sucre	San Onofre	Aguas Negras - Berlín (90CS01)	Terciaria Departamental	No	5,5	\$ 13.000.000.000
Inversión red terciaria Sucre						\$ 31.351.205.257
Córdoba	Moñitos	Murcielagal - El Tigre- San Patricio- Mangle**	Terciaria Municipio	Si	5	\$ 1.603.227.140
Córdoba	San Bernardo del viento	Villa Fátima - Perpetuo Socorro	Terciaria Municipio	Si	7,7	\$ 2.468.969.796
Córdoba	San Antero	Porvenir - Peñón- Cerro- Petrona- Aserradero	Terciaria Municipio	Si	9,4	\$ 3.023.686.386
Córdoba	Lorica	Corregimiento los Gómez	Terciaria Municipio	Si	27	\$ 8.657.426.556
Inversión red terciaria Córdoba						\$ 15.753.309.878
TOTAL						\$ 47.104.515.135

Se adelanta por parte de ambas Gobernaciones la licitación y adjudicación, para el inicio de obras en el 2022, en sus respectivas jurisdicciones.

Construcción vía paralela al mar desde el sector la viuda hasta el sector Bucaneros en la zona turística de playa blanca, San Antero.

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - Se firmó convenio para la ejecución del proyecto con recursos del FRPT por \$ 8.792 millones. El municipio ejecutará la obra.

Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el Cangrejo - Playa Blanca, San Antero.

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - Se firmó convenio para la ejecución del proyecto con recursos del FRPT por \$ 14.549 millones. El municipio ejecutará la obra.

Proyecto construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero, Departamento de Córdoba.

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - Se firmó convenio para la ejecución del proyecto por \$.7898 millones de pesos, de los cuales se aportan por el FRPT-DNP \$6.319 millones y con recursos del municipio por \$1.579 millones. El municipio ejecutará la obra.

Proyecto Construcción unidad recreodeportiva Moñitos, Córdoba.

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:**
 - Se firmó convenio para la ejecución del proyecto por \$9.585 millones, de los cuales se logró el cierre financiero del proyecto con recursos del FRPT por \$8.000 millones y recursos del municipio por \$1.585 millones. El municipio ejecutará la obra.

Proyecto Construcción unidad recreodeportiva San Bernardo del Viento, Córdoba

- **Estado:** en estructuración



- **Avance:** en el mes de diciembre se realizó seguimiento al proyecto con el municipio de San Bernardo del Viento y se informó que el municipio realizó las subsanaciones de la documentación del proyecto radicado el 5 de agosto de 2021 al Ministerio del Deporte. El municipio radicó el 16 de diciembre el proyecto con los nuevos ajustes solicitados por el Ministerio para obtener la viabilidad del proyecto.

Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba.

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** se realizó mesa de trabajo con la Gobernación de Córdoba para el avance de la lista de requisitos del FRPT, en la cual se revisó la documentación requerida para la financiación del proyecto. Se logró subsanar las observaciones realizadas a la documentación incluida en las carpetas acordes a lo exigido por el Fondo Regional de Pactos Territoriales y obtener el cumplimiento de requisitos para la firma del convenio.

Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** Se realizó mesa de trabajo con la Alcaldía de Tuchín para el avance de la lista de requisitos del FRPT, en la cual se revisó la documentación requerida para la financiación del proyecto. Se logró subsanar las observaciones realizadas a la documentación incluida en las carpetas acordes a lo exigido por el Fondo Regional de Pactos Territoriales y obtener el cumplimiento de requisitos para la firma del convenio. A la fecha se encuentra a la espera de la respuesta para proceder con la firma del convenio y financiación con recursos del FRPT.

Mejoramiento de la vía que comunica la transversal del caribe sector Moñitos San Bernardo del Viento en el sector La Rada municipio de Moñitos Departamento de Córdoba

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** La gobernación de Córdoba realizó convenio con el municipio de Moñitos para la ejecución de la obra, mediante convenio CIA No. 015 de 2021 cuyo objeto es CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA TRANSVERSAL DEL CARIBE - SECTOR MOÑITOS – SAN BERNARDO DEL VIENTO CON EL CORREGIMIENTO LA RADA MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO “ASOMOR” por valor de (\$3.697.108.875,00) y de igual forma con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SINÚ “ASOSINU” mediante convenio CIA No. 016 de 2021 cuyo objeto es CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 015 DE 2021, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA TRANSVERSAL DEL CARIBE - SECTOR MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO CON EL CORREGIMIENTO LA RADA MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA por valor de \$302.892.783,00 para un total de \$4.000.001.658.

Mejoramiento y mantenimiento de la vía que conduce del municipio de Tuchín hasta el límite del municipio de Palmito (Sucre) en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** proyecto en contratación por \$22.224 millones. El municipio ejecutará la obra.

Mejoramiento en pavimento flexible de la vía Toluviejo - San Antonio de Palmito, departamento de Sucre

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** proyecto en contratación con recursos del territorio por OCAD Paz por \$37.408 millones. El municipio ejecutará la obra.

Estudios y diseños Puente la Doctrina

- **Estado:** ejecutado



- **Avance:** proyecto ejecutado en el año 2021 por \$1.069 millones de pesos por el INVIAS. Se contrató por el INVIAS la construcción del nuevo puente.

Construcción Sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** proyecto en ejecución con recursos del territorio por \$7.402 millones. El municipio ejecuta la obra.

Construcción bulevar Jesús María Lugo, en el municipio de Santa Cruz de Lorica – Córdoba

- **Estado:** Ejecución
- **Avance:** Convenio suscrito entre FONTUR y municipio, incluido en el Consejo Directivo No.5 del Pacto Golfo de Morrosquillo el 26 de noviembre de 2021. El valor del proyecto es de \$2.777 millones, de los cuales serán financiados por convenio con Fontur \$2.222 millones y el territorio \$555 millones. El municipio ejecutará la obra.

Remodelación plaza monumento - Santa Cruz de Lorica

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** Convenio suscrito entre Fontur y municipio, incluido en el consejo directivo No.5 del Pacto Golfo de Morrosquillo el 26 de noviembre de 2021. El valor del proyecto es de \$1.896 millones, de los cuales serán financiados por convenio con Fontur \$1.515 millones y el territorio \$381 millones. El municipio ejecutará la obra.

Construcción de parador turístico, en el municipio de San Antero, Departamento de Córdoba

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** convenio suscrito entre Fontur y municipio, incluido en el consejo directivo No.5 del Pacto Golfo de Morrosquillo el 26 de noviembre de 2021. El valor del proyecto es de \$9.771 millones, de los cuales serán financiados por convenio con Fontur \$7.817 millones y el territorio \$1.954 millones. El municipio ejecutará la obra.

Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú – Sucre

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** proyecto viabilizado incluido en el consejo directivo No.5 del Pacto Golfo de Morrosquillo el 26 de noviembre de 2021. El valor total del proyecto es de \$41.468 millones, de los cuales serán financiados por el DNP \$22.994 millones y el territorio \$18.474 millones. Este proyecto deberá ser incluido en el próximo CONPES que se emita para garantizar proyectos de Pactos Territoriales.

Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, Córdoba.

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** proyecto viabilizado incluido en el consejo directivo No.5 del Pacto Golfo de Morrosquillo el 26 de noviembre de 2021. El valor total del proyecto es de \$20.482 millones, de los cuales serán financiados por el FRPT \$19.482 millones y el territorio \$1.000 millones. Este proyecto deberá ser incluido en el próximo CONPES que se emita para garantizar proyectos de Pactos Territoriales.

Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:**



- Proyecto viabilizado por el INVIAS e incluido en el consejo directivo No.5 del Pacto Golfo de Morrosquillo el 26 de noviembre de 2021. El valor del proyecto es de \$7.524 millones que serán financiados al 100% con recursos del FRPT.
- Se realizó mesa de trabajo con la Alcaldía de San Bernardo del Viento para el avance de la lista de requisitos del FRPT en la cual se revisó la documentación requerida para la financiación del proyecto. Se logró subsanar las observaciones realizadas a la documentación incluida en las carpetas acordes a lo exigido por el Fondo Regional de Pactos Territoriales y obtener el cumplimiento de requisitos para la firma del convenio. A la fecha se encuentra a la espera de la respuesta para proceder con la firma del convenio y financiación con recursos del FRPT.

Culminación del mercado público del municipio de San Antero, Departamento de Córdoba

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** El valor total del proyecto es de \$7.000 millones, el 100% es con recursos del territorio. Se encuentra en proceso de licitación.

Recuperación ambiental y paisajística de la cuenca del río Sinú y obras para la mitigación de inundaciones y control de procesos erosivos en el municipio de San Bernardo del Viento

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** El valor total del proyecto es de \$23.823 millones de los cuales serán financiados el 100% con recursos del territorio. Se encuentra en proceso de licitación por parte del municipio.

Construcción del complejo deportivo en el municipio de Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** El valor total del proyecto es de \$21.000 millones, de los cuales serán financiados el 100% con recursos del territorio. En el mes de diciembre se realizó el proceso de contratación por parte del municipio.

Construcción de pavimento rígido en la vía vereda nuevo mundo y corregimiento caño grande en el municipio de San Bernardo del viento, Córdoba

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** El valor total del proyecto es de \$6.000 millones, de los cuales serán financiados el 100% con recursos del territorio. Se encuentra en proceso de legalización de contratación.

Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Antonio de palmito Departamento de Sucre del programa Colombia rural – nacional. Vía que conduce del municipio de San Antonio de Palmito al corregimiento Algodoncillo ruta del sombrero vueltaio

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** El valor total del proyecto es de \$18.000 millones, de los cuales serán financiados el 100% con recursos de la nación. En el mes de diciembre se realizó el proceso de contratación por parte del municipio.

Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Sabaneta – Coveñas

- **Estado:** viabilizado
- **Avance:** El valor total del proyecto es de \$10.000 millones, 100% con recursos de la nación.

Construcción del centro de comercio rural zenú, en el municipio de Tuchín, Córdoba

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** El valor total del proyecto es de \$3.000 millones, de los cuales serán financiados el 100% con recursos del territorio. En el mes de diciembre se realizó el proceso de contratación por parte del municipio de Tuchín.

**Construcción de pavimento rígido en los barrios: Getsemaní, San Pedro, Barrio Nuevo, las Palmeras y Los Olivos de la zona urbana del municipio de Tuchín**

- **Estado:** en ejecución
- **Avance:** El valor total del proyecto es de \$4.300 millones, 100% con recursos del territorio. En el mes de diciembre se realizó el proceso de contratación por parte del municipio de Tuchín.

CAM Santiago de Tolú

- **Estado:** en ejecución

Avance: Proyecto en ejecución por parte del municipio de Santiago de Tolú por \$4.323 millones, de los cuales son financiados el 100% con recursos de la nación.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	7	-	3	4
Comercio Industria y Turismo	13	-	9	4
Deporte y Recreación	3	-	2	1
Educación	1	-	1	-
Interior	4	-	3	1
Salud y Protección Social	3	-	2	1
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	-	1	-
Trabajo	2	-	1	1
Transporte	26	-	23	3
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	7	-	5	2
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	1	-	1	-
Total, general	68	-	51	17

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL**2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)**

Sector	Valor Total Indicativo	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$222.247	\$20.474	9%	\$201.772	91%
Comercio Industria y Turismo	\$136.752	\$52.837	39%	\$83.916	61%
Deporte y Recreación	\$38.252	\$25.052	65%	\$13.200	35%
Educación	\$29.230	\$8.230	28%	\$21.000	72%
Interior	\$18.107	\$621	3%	\$17.486	97%
Salud y Protección Social	\$36.768	\$5.072	14%	\$31.695	86%



Sector	Valor Total Indicativo	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$0	0%	\$5.361	100%
Trabajo	\$20.000	\$18.417	92%	\$1.583	8%
Transporte	\$638.071	\$56.642	9%	\$581.429	91%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$264.194	\$20.363	8%	\$243.831	92%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$3.542	100%	\$0	0%
TOTAL	\$1.412.523	\$211.249	15%	\$1.201.274	85%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021

48,3%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2020 – 2025
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$222.247	\$48.932	22%	\$48.932	22%
Comercio Industria y Turismo	\$136.752	\$6.319	5%	\$55.983	41%
Deporte y Recreación	\$38.252	\$8.000	21%	\$30.564	80%
Educación	\$29.230	\$5.000	17%	\$27.161	93%
Interior	\$18.107	\$813	4%	\$11.741	65%
Salud y Protección Social	\$36.768	\$2.555	7%	\$7.564	21%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$0	0%	\$5.361	100%
Trabajo	\$20.000	\$0	0%	\$1.583	8%
Transporte	\$638.071	\$63.991	10%	\$421.950	66%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$264.194	\$30.812	12%	\$68.230	26%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$0	0%	\$3.369	95%
TOTAL	\$1.412.523	\$166.422	12%	\$682.438	48,3%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.



(2021)

(2020-2025)

%Avance 100%



% Avance Acumulado 100%



Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.


Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas % Avance: 100% % Avance Acumulado: 100%

- Vivienda Ciudad y Territorio % Avance: 100% % Avance Acumulado: 100%

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	-	-	-	-		Gris	2	-	-		Gris	
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.		174	174	100%		verde	174	174	100%		verde	31/12/2021




SEMÁFORO



- Transporte % Avance: -% % Avance Acumulado: -%

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo	0	-	-	-		Gris	180	-	-		Gris	


SEMÁFORO



- TIC % Avance: -% % Avance Acumulado: -%

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Zonas digitales instaladas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo	0	-	-	-		Gris	11	-	-		Gris	

SEMÁFORO



Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas/ Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible % Avance: -% % Avance Acumulado: -%

- Educación/ Salud y Protección Social/ Interior/ Trabajo % Avance: -% % Avance Acumulado: -%



Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura educativa, hospitalaria, pública y para el trabajo construida y mejorada en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	-	-	-	-		Gris	4	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas

- Vivienda Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	Para el periodo se encuentra suscrito el contrato específico número 2210717, derivado del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo, contrato de mandato número 221009 suscrito entre el DNP y ENTerritorio, para construcción de la segunda etapa del alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos en el departamento de Córdoba. Se firmó convenio administrativo firmado entre el Ministerio de Vivienda y el municipio de San Bernardo del Viento y Aguas de Córdoba para la ejecución del proyecto optimización hidráulica y operativa del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de San Bernardo del Viento. Se encuentran en ejecución el proyecto "Construcción sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, Sucre contrato de obra LP-003 -2020 que apunta a la meta del indicador.
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	Para el periodo se encuentra ejecutado el contrato LP .002-2020 de obra pública "Construcción de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de San Onofre, Sucre

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo	Para el periodo se encuentran en ejecución el Corredor Santa Lucía- Moñitos Córdoba 49 kilómetros, Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía el Delirio - Puerto Viejo, Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Moñitos - San Bernardo del Viento - Loricá - Chinú en el departamento de Córdoba,

- TIC



Indicador	Avance Cualitativo
Zonas digitales instaladas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	Para el periodo no se encuentran proyectos en ejecución que apunten a la meta del indicador.

Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas/ Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.

- Educación/ Salud y Protección Social/ Interior/ Trabajo

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura educativa, hospitalaria, pública y para el trabajo construida y mejorada en el marco del pacto Golfo de Morrosquillo.	Para el periodo se encuentran con un 52% de ejecución el proyecto del Megacolegio Heriberto García en Toluviejo y el CAM en Santiago de Tolú que apuntan a la meta del indicador.

4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 15 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 166.422 millones equivalente al 12% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera	En Ejecución	\$0	\$17.619	\$17.619	\$17.619
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba	En Ejecución	\$0	\$24.298	\$24.298	\$24.298
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín	En Ejecución	\$0	\$7.015	\$7.015	\$7.015
Comercio Industria y Turismo	Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero	En Ejecución	\$1.580	\$6.319	\$6.319	\$7.899
Deporte y Recreación	Construcción de Unidad Recreo deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$1.585	\$8.000	\$8.000	\$9.585
Educación	Megacolegio Heriberto García Garrido en Tolviejo, Sucre	En Ejecución	\$6.667	\$20.494	\$5.000	\$27.161
Interior	Estructuración y compra de lote Estación de Bomberos	En Ejecución	\$622	\$813	\$813	\$1.435
Salud y Protección Social	Estructuración y compra de lote Hospital Coveñas	En Ejecución	\$1.884	\$2.555	\$2.555	\$4.440
Transporte	Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y tolú en el departamento de Sucre.	En Ejecución	\$0	\$40.650	\$40.650	\$40.650
Transporte	Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$0	\$14.549	\$14.549	\$14.549
Transporte	Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$0	\$8.792	\$8.792	\$8.792
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo	En Ejecución	\$0	\$14.622	\$14.622	\$14.622

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta el corregimiento del Porvenir, San Antero, Córdoba	En Ejecución	\$9.909	\$7.925	\$4.953	\$17.834
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas	En Ejecución	\$0	\$5.304	\$5.304	\$5.304
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Proyectos de Acueducto y Saneamiento Básico para el Golfo de Morrosquillo	En Ejecución	\$2.543	\$20.525	\$5.933	\$23.068
Total, general			\$24.789	\$199.481	\$166.422	\$224.270

Millones de \$ COP
