



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
08/02/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/12/2021

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** El Pacto Funcional Santander tiene como objetivo consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo económico y social.

**Líneas Temáticas:**

- Conectividad subregional.
- Infraestructura para el desarrollo económico y social.

**TEMAS ESTRATEGICOS**

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión extraordinaria No 4, realizada el 09 de noviembre de 2021, se priorizan un total de 47, dichas iniciativas tienen un valor indicativo de \$1.944.333.134.006, de los cuales \$1.392.993.223.913 son aporte indicativo de la Nación y \$551.339.915.093 billones del territorio.

## ➤ Compromisos instancias administración:

En la sesión N° 2 del Consejo Directivo, se estableció el siguiente compromiso: Realizar seguimiento a los proyectos de Centro de Alto Rendimiento y Terminación Hospital Mogotes.


**Estado:**

- Centro de alto rendimiento: Se encuentra en ejecución los estudios y diseños del proyecto: Plan maestro de la villa olímpica de Bucaramanga, por parte del departamento.
- Terminación hospital Mogotes: En mesa de trabajo adelantada el 23 de noviembre del equipo territorial de la GNPT, se precisó que el proyecto continúa suspendido en la primera fase por deficiencia en los diseños, sobre los cuales se presentó propuesta de solución al Ministerio de Salud el 21 de octubre de 2021, en la cual se define el alcance de la terminación de las obras con recursos departamentales.

## ➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Funcional Santander generaría cerca de 14.000 empleos directos, 24.000 indirectos.

Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a más de 2 millones de habitantes de las diferentes provincias, sin contar el beneficio generado a población flotante o exógena que llega o transita por los territorios y que se benefician de las obras de conectividad vial principalmente.

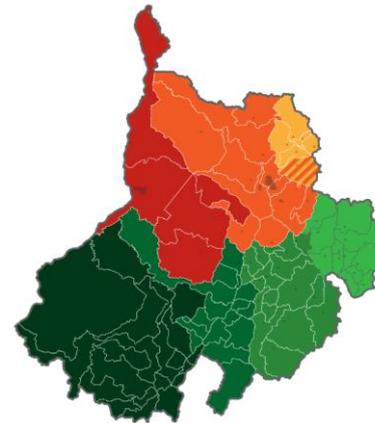**Área de Intervención: Pacto Santander**

<b>Departamento:</b>	<b>Santander</b>
<b>No. de Municipios en el Pacto Territorial:</b>	(7 provincias y 80 municipios)
<b>Fecha de suscripción:</b>	31/10/2020
<b>Fecha de terminación:</b>	31/10/2025
<b>Plazo:</b>	5 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$1.944.333 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$1.392.993 (72%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$551.340 (28%)

**Avance financiero (Millones)**

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$1.266.739 (65,2%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$1.023.576
<b>Compromiso Territorio</b>	\$243.163

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$1.266.739 (20 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

- **Pavimentación vía Curos – Málaga**  
**Valor:** \$320.000 millones  
**Estado:** Ejecución.  
**Avance:** INVIAS: Obra adjudicada el 09/04/2021 al CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 (Proceso LP-DT-066-2020), Contrato 1042 de 2021 por valor de \$ 286.170.023.299. Acta de inicio 29/06/20021. Interventoría adjudicada el 26 de abril al CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (Proceso CMA-DT-191-2020) Contrato 1002 valor \$ 19.999.940.500.  
**Beneficiarios:** 33.129
- **Pavimentación Troncal Central Norte**  
**Valor:** \$160.212 millones  
**Estado:** En ejecución  
**Avance:** INVIAS: Contrato obra 1684 de 2020 por \$153.012 y contrato interventoría 1912 de 2020 por \$7200 millones. En proceso de ejecución.  
**Beneficiarios:** 29.115
- **Pavimentación Transversal Carare**  
**Valor:** \$86.953 millones  
**Estado:** En ejecución  
**Avance:** INVIAS: Contrato obra 1628 de 2020 por \$81.013 millones y contrato interventoría 1871 de 2020 por \$5.940 millones. En proceso de ejecución.  
**Beneficiarios:** 109.162
- **Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín – Mogotes**  
**Valor:** \$90.000 Millones  
**Estado:** En ejecución.  
**Avance:** Convenio 2046 firmado el 12 de noviembre de 2021 entre Invias y departamento de Santander por \$90.000 millones.  
**Beneficiarios:** 17.707
- **Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional**  
**Valor:** \$6.706 millones  
**Estado:** En ejecución  
**Avance:** En ejecución con recursos Nación a través del INVIAS contrato obra 1962 de 2020 por \$3.459 millones y contrato interventoría 1811 de 2020 por \$748 millones.  
Recursos Territorio: En ejecución estudios y diseños según contrato adjudicado el 25 de enero de 2021 por \$2.353 millones por parte del departamento.  
**Beneficiarios:** 454.923
- **Anillo vial Girón – Floridablanca**  
**Valor:** \$19.393 millones  
**Estado:** En ejecución  
**Avance:** En ejecución contrato No. LP-DO-SRN-060-202 por \$ \$17.485.276.053,00 Contrato 2327-2020 - CMA-DO-SRN-182-2020 por \$1.908.120.839,00 contrato 1968 de 2020 y contrato interventoría 2327 de 2020.  
**Beneficiarios:** 450.351
- **Pavimentación vía Zapatoca - Galán – Barichara.**  
**Valor:** \$152.281 Millones  
**Estado:** En ejecución  
**Avance:** Finalizados estudios y diseños obra CO1.PCCNTR. 2157119 por valor de \$2.039 millones (proceso IT-CM-20-04). Interventoría CO1.PCCNTR.2326406 por valor de \$331 millones. Viabilizado por INVIAS. Se firmó convenio N° 2046 entre el Invias y el departamento de Santander el 12 de noviembre de 2021, por \$147.936 millones.  
**Beneficiarios:** 18.301
- **Pavimentación Socorro – Páramo**



**Valor:** \$15.792 Millones

**Estado:** En etapa precontractual.

**Avance:** Aprobado por el Banco de Proyectos del departamento. Se cuenta con el respectivo SSEPI, Se encuentra en proceso de contratación en la página del Secop II (proceso IT-LP-21-01) (Valor: 14.997.463.123).

**Beneficiarios:** 34.875

- **Pavimentación acceso a Puerto Wilches**

**Valor:** \$13.000 Millones

**Estado:** Se encuentra con el respectivo SSEPI

**Avance:** Aprobado por el Banco de Proyectos del departamento. Se cuenta con el respectivo SSEPI, Se encuentra en proceso de contratación en la página del Secop II (proceso IT-LP-21-01) (Valor: \$11.753.923.067).

**Beneficiarios:** 31.510

- **Mejoramiento /pavimentación Guavatá – Vélez**

**Valor:** \$10.000 Millones

**Estado:** En ejecución

**Avance:** Se firmó decreto 505 el 21 de octubre de 2021 por el Gobernador de Santander, con un valor total de \$9.999.994.539, valor obra \$9.324.407.739, valor interventoría \$675.586.800.

**Beneficiarios:** 22.613

- **Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.**

**Valor:** \$132.994 millones

**Estado:** Contratos adjudicados (41) / Viabilizados (4) del departamento Colombia Rural (41) Municipios firmado convenio.

**Avance:** La ejecución de los recursos Nación corresponde a los convenios firmados entre INVIAS y 41 municipios. Colombia Rural: firmados convenio con INVIAS y 41 Municipios valor comprometido: \$48.550 millones. El aporte del territorio corresponde a 13 proyectos aprobados por regalías por \$28.657 millones.

Se firmó contrato específico el 12 de noviembre de 2021, entre el DNP por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales y la Gobernación de Santander No. 2210745 por valor de \$29.422.679.762.

**Beneficiarios:** 509.138

- **Construcción Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga**

**Valor:** \$28.773 millones

**Estado:** En ejecución.

**Avance:** Se firmó contrato específico No. 2210677 el 10 de noviembre del 2021, por un valor de \$28.274.924.970, aporte del DNP, por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, entre la Gobernación de Santander, ENTerritorio y UTS.

**Beneficiarios:** 528.352

- **Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta**

**Valor:** \$13.840 millones

**Estado:** En estructuración

**Avance:** Se cuenta con diseño arquitectónico, estructural, eléctrico, hidráulico, sanitario y de voz y datos y de suelos al 100%. En trámite licencia de construcción, presupuesto en elaboración, revisión y trámite de concepto por parte del MEN.

**Beneficiarios:** 1.152.665

- **Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander**

**Valor:** \$101.481 millones (actualizado en valor a \$114.196.122.634 millones)

**Estado:** En ejecución.

**Avance:** Se firmó contrato específico No. 2210733 el 10 de noviembre del 2021, entre el departamento de Santander, ENTerritorio y UIS. Por un valor de \$114.196.122.634, de los cuales \$60.000.000.000 son aporte del DNP por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, \$18.005.575.267 serán aportados con recursos de la Universidad Industrial de Santander y \$36.190.547.367 serán aportados con recursos del Departamento de Santander

**Beneficiarios:** 528.352

- **Ampliación SENA, San Gil**



**Valor:** \$28.000 millones

**Estado:** En ejecución

**Avance:** Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social valor del convenio \$13.000 millones, el cual se encuentra en avance de estudios y diseños.

**Beneficiarios:** 45.605

- **Terminación hospital, Mogotes**

**Valor:** \$5.000 millones

**Estado:** En estructuración

**Avance:** En el caso de la terminación la Secretaría de Salud Departamental realizó los ajustes al proyecto en atención a requerimientos del Ministerio de salud y se radicó el 25 de octubre de 2021. El proyecto su primera fase se encuentra suspendida por deficiencia en los estudios y diseños.

**Beneficiarios:** 10.885

- **Construcción hospital, San Andrés**

**Valor:** \$8.000 millones

**Estado:** En contratación

**Avance:** Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los diseños arquitectónicos y los estudios de suelos para los tres Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02).

**Beneficiarios:** 8.432

- **Construcción hospital Barbosa**

**Valor:** \$10.000 millones

**Estado:** En contratación.

**Avance:** Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los diseños arquitectónicos y los estudios de suelos para los tres Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02).

**Beneficiarios:** 28.873

- **Construcción hospital, Suaita**

**Valor:** \$8.000 millones

**Estado:** En contratación

**Avance:** Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los diseños arquitectónicos y los estudios de suelos para los tres Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02).

**Beneficiarios:** 10.212

- **Centro de alto rendimiento en altura, Tona**

**Valor:** \$80.000 millones

**Estado:** Sin avance

**Avance:** En revisión propuesta de cambio de esta iniciativa con la inclusión del proyecto Plan Maestro de la Villa Deportiva de Bucaramanga, la cual se encuentra en proceso de estudios y diseños por parte del departamento.

**Beneficiarios:** 7.129

- **Construcción de la villa olímpica, Oiba**

**Valor:** \$5.000 millones

**Estado:** En ejecución

**Avance:** Convenio realizado con el municipio convenio N°1480 de 2021 por un valor de \$4.998.543.093. Proceso No. IT-CD-21-005

**Beneficiarios:** 11.815

- **Construcción de la villa olímpica, Matanza**

**Valor:** \$5.000 millones

**Estado:** En ejecución



**Avance:** Convenio realizado con el municipio de Matanza Convenio CO1.PCCNTR.2606912 N°1663 de 2021 por un valor de \$4.999.352.989,59.

**Beneficiarios:** 5.238

- **Construcción del Malecón, Barrancabermeja**

**Valor:** \$64.737 millones

**Estado:** En ejecución.

**Avance:** En ejecución, se firmó convenio de asociación No.3044720 el 12 de noviembre de 2021, entre Ecopetrol y el Municipio de Bucaramanga por un valor de \$24.660.234.618

**Beneficiarios:** 191.704

- **Construcción de Infraestructura Agroturística y Náutica en el Departamento de Santander**

**Valor:** \$140.093 millones

**Estado:** En proceso de viabilidad.

**Avance:**

7 septiembre: Presentación por parte del departamento al Viceministerio de turismo, el proyecto para viabilidad sectorial.

6 octubre: Celebración comité técnico N° 3 del Pacto Funcional Santander, donde se avaló el cambio de nombre y sector del proyecto para ser presentado al Consejo Directivo N° 4.

11 octubre: Emisión de observaciones al proyecto por parte del Viceministerio de Turismo.

29 octubre: Legalización de las escrituras del predio a nombre del departamento.

29 octubre: Presentación proyecto subsanado por parte del departamento, al Viceministerio de Turismo.

22 de noviembre: Radicación del proyecto ante el Invías para concepto sectorial sobre el componente de infraestructura vial que contiene el proyecto (2 kms de vía terciaria a ser pavimentada).

26 de noviembre: Se adelantó mesa de trabajo Viceministerio de Turismo, DNP, ENTerritorio y departamento de Santander para revisión del estado de avance del proyecto.

9 y 10 de diciembre: Se realizó visita de inspección por parte del Viceministerio de Turismo para el respectivo proceso de viabilidad sectorial.

15 de diciembre: Mesa de trabajo DNP, ENTerritorio, Gobernación y Viceministerio de Turismo para revisar el proyecto de acuerdo con la lista de verificación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

20 de diciembre: Entrega por parte del departamento, de las subsanaciones recomendadas.

**Beneficiarios:** 5.075

- **Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón**

**Valor:** \$12.276 millones

**Estado:** En estructuración

**Avance:** Se encuentra con el respectivo SSEPI ya tiene aprobación de vigencias futuras por Asamblea Departamental, Se encuentra en proceso de contratación en la página del Secop II Proceso IT-LP-21-05. (Valor: \$8.012.483.684) Adjudicado obra a Consorcio arte y cultura de Girón, la interventoría se adjudicará a finales de diciembre.

**Beneficiarios:** 185.248

- **Parque Lineal de la Libertad, Socorro**

**Valor:** \$5.000 millones

**Estado:** En estructuración

**Avance:** En revisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental.

**Beneficiarios:** 32.577

- **Módulo de integración social barrio El Reposo – Floridablanca**

**Valor:** \$11.500 millones

**Estado:** En estructuración

**Avance:** Se presentará ante la Asamblea Departamental para cambio de este proyecto solicitud realizada por el municipio por el proyecto "Construcción de las obras geotécnicas de prevención, mitigación y estabilización en el sector de la transversal oriental (ASOMIFLOR), fases I, II, III en el municipio de Floridablanca Departamento de Santander" una vez la asamblea lo apruebe, este se presentará el cambio al Consejo Directivo para consideración.

**Beneficiarios:** 266.102

- **Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja**



**Valor:** \$10.064 millones

**Estado:** Viabilizado

**Avance:** Aprobado por el Banco de Proyectos del Departamento. Se encuentra en proceso de contratación en la página del Secop II, Proceso IT-LP-21-02 (Valor: \$ 9.291.096.387,00).

**Beneficiarios:** 191.704

- **Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta**

**Valor:** \$23.000 millones

**Estado:** En ejecución

**Avance:** Se firmó convenio con la Empresa municipal de servicios públicos domiciliario de Piedecuesta E.S.P.- Piedecuestana de servicios públicos. Convenio CO1.PCCNTR.2584008. (Valor: 23.139.977.876,00)

**Beneficiarios:** 152.665

- **Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta**

**Valor:** \$20.000 millones

**Estado:** en ejecución.

**Avance:** se firmó convenio interadministrativo 9677 PPA001 – 1598 – 2021 por \$25.000 millones, de los cuales \$20.000 millones aporta el Departamento y \$5.000 millones la UNGRD.

**Beneficiarios:** 152.665

- **Construcción vivienda nueva:** (Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratoca, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaíta, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia)

**Valor:** \$ 71.889 millones

**Estado:** En ejecución

**Avance:** A la fecha se encuentran comprometido por un valor \$58.158.593.436 con 18 iniciativas en los siguientes decretos: Acuerdo No 89 de 14 de diciembre de 2020, proyectos de los municipios de: Charala, Suaíta, Barbosa, Oiba, San Gil, Curití por \$11.059.915.036. , en proceso de resolución los municipios de Charalá y Suaíta, solicitaron prórroga para contratar los municipios de Barbosa y Oiba, terminando licitación San Gil y Curití. El total de viviendas son 180, a cada municipio con construcción de 30 viviendas.

Decreto 290 del 30 de junio de 2021 para iniciar la contratación los municipios de: Socorro, Guavatá, Paramo, San Miguel, Lebrija, Piedecuesta, Puente Nacional, El Peñón, El Palmar, Betulia, Puerto Wilches, Barichara, Confines, Valle de San José, Aratoca, Chima, Villa Nueva, Onzaga, Guapota, California , Gambita , Guadalupe, San Benito (Mejoramientos). Por un valor de \$24.627.800.000

Firmó decreto 383 del 5 de agosto de 2021 el Señor Gobernador de Santander para iniciar contratación de los Municipios de: Aratoca, Villanueva, Onzaga, Gambita, Guadalupe, Valle de San José. Por un valor de \$15.261.600.000.

**Beneficiarios:** 297.837

- **Mejoramiento vivienda:**(Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos)

**Valor:** \$12.600 millones

**Estado:** En ejecución

**Avance:** A la fecha se encuentra comprometido por un valor de \$ 6.973.761.170. Así:

En resolución para iniciar ejecución los municipios de El Playón, Chipatá, Capitanejo, Palmas del Socorro, Ocamonte, Carcasí, Coromoro, Encino, Hato, Pinchote.

Ejecutados mejoramientos de vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebrija, Piedecuesta con un total de 54 viviendas.

**Beneficiarios:** 10.212

- **Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza - Santander**

**Valor:** \$1.064 millones

**Estado:** Estructurado.

**Avance:** Se encuentra en proceso de viabilidad sectorial por parte del Ministerio del Interior.

**Beneficiarios:** 5.238



- Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.**  
**Valor:** \$56.830 millones (DNP: \$46.830 millones; Municipio: \$10.000 millones).  
**Estado:** Viabilizado.  
**Avance:** En proceso de estructuración de minuta de contrato específico por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.  
**Beneficiarios:** 528.352
- Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Girón.**  
**Valor:** \$15.225 millones  
**Estado:** Vaibilizado.  
**Avance:** En proceso de estructuración de minuta de contrato específico por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales  
**Beneficiarios:** 185.248
- Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.**  
**Valor:** \$14.757 millones  
**Estado:** En estructuración  
**Avance:** En trámite de aprobación por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.  
**Beneficiarios:** 185.248
- Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga.**  
**Valor:** \$29.731 millones  
**Estado:** viabilizado  
**Avance:** En proceso de estructuración de minuta de contrato específico por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.  
**Beneficiarios:** 19.884
- Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Bucaramanga.**  
**Valor:** \$14.553 millones  
**Estado:** En estructuración  
**Avance:** Se firmó contrato específico No. 2210947 el 13 de enero de 2022, por un valor de \$ 14.553.552.351, aporte del DNP, por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales.  
**Beneficiarios:** 528.352
- Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación San Gil**  
**Valor:** \$12.000 millones  
**Estado:** En estructuración  
**Avance:** En trámite de revisión por parte del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.  
**Beneficiarios:** 45.605

## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	6	-	1	5
Comercio Industria y Turismo	4	-	1	3
Deporte y Recreación	4	-	2	2
Educación	5	-	3	2
Interior	1	-	-	1
Salud y Protección Social	5	-	-	5
Transporte	15	-	9	6
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	3	-	2	1
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	4	-	2	2
<b>Total, general</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>27</b>



## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

## 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$137.500	\$0	0%	\$137.500	100%
Comercio Industria y Turismo	\$222.106	\$115.056	52%	\$107.050	48%
Deporte y Recreación	\$100.000	\$20.000	20%	\$80.000	80%
Educación	\$186.654	\$63.481	34%	\$123.173	66%
Interior	\$1.064	\$0	0%	\$1.064	100%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$56.000	100%	\$0	0%
Transporte	\$1.085.775	\$141.568	13%	\$944.207	87%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$49.181	\$49.181	100%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$106.053	\$106.053	100%	\$0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.944.333</b>	<b>\$551.340</b>	<b>28%</b>	<b>\$1.392.993</b>	<b>72%</b>

## 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021

65,2%

## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2020 – 2025  
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$137.500	\$14.554	11%	\$14.554	11%
Comercio Industria y Turismo	\$222.106	\$0	0%	\$24.660	11%
Deporte y Recreación	\$100.000	\$0	0%	\$9.998	10%
Educación	\$186.654	\$88.275	47%	\$155.471	83%
Interior	\$1.064	\$0	0%	\$0	0%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$1.085.775	\$29.423	3%	\$948.784	87%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$49.181	\$0	0%	\$48.140	98%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$106.053	\$0	0%	\$65.132	61%



TOTAL	\$1.944.333	\$132.251	7%	\$1.266.739	65,2%
-------	-------------	-----------	----	-------------	-------

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2021)

(2020-2025)

%Avance 11,71%



Avance Acumulado 3,23%



Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021


\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Conectividad Subregional % Avance: - % Avance Acumulado: -

- Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander.	2172,48	-	-	-		Gris	2.504,98	-	-		Gris	



Infraestructura para el desarrollo económico y social % Avance: 11,71% % Avance Acumulado: 3,23%

Educación % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura educativa construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	2	-	-	-		Gris	5,00	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Salud % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura hospitalaria construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	5	-	-	-		Gris	5,00	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Deporte y recreación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva y al servicio del deporte construida y mejorada en el Marco del Pacto Funcional Santander.	1	-	-	-		Gris	4,00	-	-		Gris	



## SEMÁFORO



&lt;60%

≥80%

Turismo % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Funcional Santander.	10	-	-	-		Gris	4,00	-	-		Gris	

## SEMÁFORO



&lt;60%

≥80%

Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: 11,71% % Avance Acumulado: 3,23%

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Soluciones de vivienda rural y urbanas entregadas en el marco del Pacto Funcional Santander.	1.621	54,00	461,00	11,71%		Rojo	1.671,00	54,00	3,23%		Rojo	31/12/2021
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Funcional Santander.	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	



## SEMÁFORO



&lt;60%

≥80%

## 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

## Conectividad Subregional

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander.</b>	A 31 de diciembre de 2021. Las Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander. Línea base: 2172 km Avance: 0 km. Avance total: 2172 kilómetros que hayan sido intervenidos incluyendo línea base. Descripción del avance: se encuentran en ejecución los siguientes proyectos en ejecución: Curos Málaga: INVIAS: Obra adjudicada el 09/04/2021 al CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 (Proceso LP-DT-066-2020), Contrato 1042 de 2021 por valor de \$ 286.170.023.299. Acta de inicio 29/06/20021. Interventoría adjudicada el 26 de abril al CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (Proceso CMA-DT-191-2020) Contrato 1002 valor \$ 19.999.940.500. . Pavimentación Troncal Central Norte: obra 1684 de 2020 por \$ 153.012 e interventoría 1912 de 2020 por \$7200 millones. . Pavimentación Transversal Carare: obra 1628 de 2020 por \$81.013 millones e interventoría 1871 de 2020 por \$5.940 millones. Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional: Recursos Nación: obra 1962 de 2020 por \$3.459 millones, interventoría 1811 de 2020 por \$748 millones. Recursos Territorio: En ejecución estudios y diseños según contrato adjudicado el 25 de enero de 2021 por \$2.353 millones. Anillo vial Girón – Floridablanca: obra 1968 de 2020 por \$17.485 millones e interventoría 2327 de 2020 por \$1.908 millones. . Pavimentación vía Zapatoca - Galán – Barichara: Adjudicados estudios y diseños obra por valor de \$2.039 millones (proceso IT-CM-20-04). Interventoría por valor de \$331 millones. Mejoramiento vías terciarias: Contratos adjudicados Colombia Rural: firmados convenios con INVIAS y 41 Municipios valor comprometido: \$48.550 millones. El aporte del territorio corresponde a 13 proyectos aprobados por regalías por \$28.657 millones. Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín – Mogotes: Convenio de firmado el 12 de noviembre de 2021 entre Invias y departamento de Santander por \$90.000 millones. Mejoramiento /pavimentación Guavatá – Vélez: Se firmó decreto 505 el 21 de octubre de 2021 por el Gobernador de Santander, con un valor total de \$9.999.994.539, valor obra \$9.324.407.739, valor interventoría \$675.586.800. Informe suministrado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, la Gobernación de Santander.

## Infraestructura para el desarrollo económico y social

- Educación

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura educativa construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander</b>	A 31 de diciembre de 2021. Un proyecto en ejecución: Ampliación SENA, San Gil, valor: \$28.000 millones. Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social valor del convenio \$13.000 millones. Construcción Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga: Se firmó contrato específico No. 2210677 el 10 de noviembre del 2021, por un valor de \$28.274.924.970, aporte del DNP, por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales. Entre la Gobernación de Santander, EnTerritorio y UTS.



Indicador	Avance Cualitativo
	Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander Valor: \$101.481 millones (actualizado en valor a \$106.177 millones). Avance: Se firmó contrato específico No. 2210733 el 10 de noviembre del 2021, entre el departamento de Santander, ENTerritorio y UIS. Por un valor de \$114.196.122.634, de los cuales \$60.000.000.000 son aporte del DNP por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, \$18.005.575.267 serán aportados con recursos de la Universidad Industrial de Santander y \$36.190.547.367 serán aportados con recursos del Departamento de Santander. Los dos proyectos faltantes se encuentran en estructuración. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.

- Salud

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura hospitalaria construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander</b>	A 31 de diciembre de 2021. Se encuentran en contratación tres proyectos Construcción hospital San Andrés, Construcción hospital Barbosa, Construcción hospital, Suaita: Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los diseños arquitectónicos y los estudios de suelos para los tres Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02). Hospital de Mogotes: En el caso de la terminación la Secretaría de Salud Departamental realizó los ajustes al proyecto en atención a requerimientos del Ministerio de salud y se radico el 25 de octubre de 2021. El proyecto su primera fase se encuentra suspendida por deficiencia en los estudios y diseños. Información suministrada por la Gobernación de Santander.

- Deporte y recreación

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura deportiva y al servicio del deporte construida y mejorada en el Marco del Pacto Funcional Santander.</b>	A 31 de diciembre de 2021. Se encuentran en ejecución: Construcción Villa Olímpica de Oiba: Convenio realizado con el municipio convenio N°1480 de 2021 por un valor de \$4.998.543.093. Proceso No. IT-CD-21-005. Villa Olímpica de Matanza: Convenio realizado con el municipio de Matanza Convenio CO1.PCCNTR.2606912 N°1663 de 2021 por un valor de \$4.999.352.989,59. En estructuración los demás proyectos. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.

- Turismo

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Funcional Santander.</b>	A 31 de diciembre de 2021. Se encuentran en estructuración los proyectos. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Soluciones de vivienda rural y urbanas entregadas en el marco del Pacto Funcional Santander.</b>	A 31 de diciembre de 2021: Construcción de Vivienda: Acuerdo No 89 de 14 de diciembre de 2020, proyectos de los municipios de: Charalá, Suaita, Barbosa, Oiba, San Gil, Curití por \$11.059.915.036., en proceso de resolución los municipios de Charalá y Suaita, solicitaron prórroga para contratar los municipios de



Indicador	Avance Cualitativo
	<p>Barbosa y Oiba, terminando licitación San Gil y Curití. El total de viviendas son 180, a cada municipio con construcción de 30 viviendas. Decreto 290 del 30 de junio de 2021 para iniciar la contratación los municipios de: Socorro, Guavatá, Paramo, San Miguel, Lebrija, Piedecuesta, Puente Nacional, El Peñón, El Palmar, Betulia, Puerto Wilches, Barichara, Confinés, Valle de San José, Aratoca, Chima, Villa Nueva, Onzaga, Guapota, California, Gambita, Guadalupe, San Benito (Mejoramientos). Por un valor de \$24.627.800.000. Firmó decreto 383 del 5 de agosto de 2021 el Señor Gobernador de Santander para iniciar contratación de los Municipios de: Aratoca, Villanueva, Onzaga, Gambita, Guadalupe, Valle de San José. Por un valor de \$15.261.600.000,00. Mejoramiento vivienda: (Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos). Mejoramiento de Vivienda: Ejecutados mejoramientos de vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebrija, Piedecuesta con un total de 54 viviendas. Información suministrada por la Gobernación de Santander.</p>
<b>Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Funcional Santander.</b>	<p>A 31 de diciembre de 2021. de 2021. Se encuentra en ejecución el proyecto: • Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta. Avance: Se firmó convenio con la Empresa municipal de servicios públicos domiciliario de Piedecuesta E.S.P.- Piedecuestana de servicios públicos. Convenio CO1.PCCNTR.2584008. (Valor: 23.139.977.876,00) En estructuración los demás proyectos. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.</p>



## 4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:**

En total son 4 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 132.251 millones equivalente al 7% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Bucaramanga.	En Ejecución	\$0	\$14.554	\$14.554	\$14.554
Educación	Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.	En Ejecución	\$0	\$28.275	\$28.275	\$28.275
Educación	Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.	En Ejecución	\$54.196	\$60.000	\$60.000	\$114.196
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	En Ejecución	\$31.313	\$87.877	\$29.423	\$119.190
<b>Total, general</b>			<b>\$85.509</b>	<b>\$190.705</b>	<b>\$132.251</b>	<b>\$276.214</b>
