



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
22/07/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/06/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.

Líneas Temáticas:

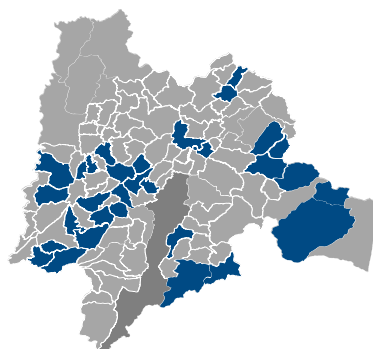
- Infraestructura para la integración social
- Gestión ambiental y saneamiento básico

TEMAS ESTRATÉGICOS

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue aprobado en la sesión No. 1 del Consejo Directivo del Pacto Cundinamarca, realizado el 30 de julio de 2021. En este PEI se priorizaron un total de 53 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto con un valor indicativo de \$536.820.997.439, de los cuales \$518.598.380.421 son aporte indicativo de la Nación y \$18.222.617.017 del territorio.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Cundinamarca generaría cerca de 7.514 empleos directos y 11.772 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 1.3 millones habitantes del área de influencia del Pacto Cundinamarca.

Área de Intervención: Cundinamarca**Departamento:**

Cundinamarca Municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Cajicá, Caquezá, Chía, Chipaque, Chocontá, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Fomeque, Funza, Fúquene, Gachetá, Girardot, Guayabal de Siquima, Guaya-betal, Gutiérrez, Jerusalén, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Paime, Pulí, Quetame, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Subachoque, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Viotá y Zipaquirá.

Fecha de suscripción:	19/02/2021
Fecha de terminación:	19/02/2024
Plazo:	3 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$536.821 (100%)
Nación (%)	\$518.598 (97%)
Territorio y otros (%)	\$18.223 (3%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$ 197.096 (36,7%)
Compromiso Nación	\$ 176.984
Compromiso Territorio	\$20.112

Proyectos en ejecución	\$ 197.096 (17 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****Proyectos en ejecución:**

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación plaza de mercado - central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa	El proyecto 4266-Adecuación plaza de mercado - central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.167.000.000, con un aporte territorial de \$ 3.167.000.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.210 personas ubicadas en La Mesa (Cundinamarca), generar 39 empleos directos y 56 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá	El proyecto 4282-Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 851.120.000, con un aporte territorial de \$ 851.120.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 146.352 personas ubicadas en Zipaquirá (Cundinamarca), generar 12 empleos directos y 18 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	El proyecto 4261-Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.480.550.120, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 2.480.550.120, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 8.745 personas ubicadas en Gacheta (Cundinamarca), generar 36 empleos directos y 52 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la edificación de la mujer tejedora cabeza de hogar del municipio de Chipaque	El proyecto 4253-Construcción de la edificación de la mujer tejedora cabeza de hogar del municipio de Chipaque se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.463.836.860, con un aporte territorial de \$ 1.463.836.860 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 228 personas ubicadas en Chipaque (Cundinamarca), generar 25 empleos directos y 36 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Síquima	El proyecto 4262-Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Síquima se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.484.140.000, con un aporte territorial de \$ 1.484.140.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.584 personas ubicadas en Guayabal de Síquima (Cundinamarca), generar 19 empleos directos y 27 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	El proyecto 4254-Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.093.293.603, con un aporte territorial de \$ 211.689.182 y un aporte nación de \$ 881.604.421, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.500 personas ubicadas en Chipaque (Cundinamarca), generar 13 empleos directos y 19 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca	El proyecto 4264-Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.704.720.764, con un aporte territorial de \$ 568.072.985 y un aporte nación de \$ 1.136.647.7795, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 802 personas ubicadas en Gutiérrez (Cundinamarca), generar 16 empleos directos y 24 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. Observaciones adicionales: Como pendientes para el comité operativo que se desarrollará el 1 de julio de 2022, se encuentra pendiente el cumplimiento de los compromisos de entrega de informes mensuales ajustados y entrega de informe de mayo y junio 2022. Así mismo se encuentra pendiente la entrega de rendimientos financieros a junio 2022. La fecha máxima para su cumplimiento es el 8 de julio 2022.
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	El proyecto 4251-Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.603.360.938, con un aporte territorial de \$ 361.786.287 y un aporte nación de \$ 1.241.574.651, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.013 personas ubicadas en Bituima (Cundinamarca), generar 18 empleos directos y 26 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación El proceso de contratación de obra se ha declarado desierto en dos ocasiones. Municipio informa que publica nuevo proceso de selección el 3 de junio de 2022. Responsable Municipio de Bituima. Avance El municipio informa que avanza con el ajuste de pliegos para publicar nuevo proceso de selección abreviada. Alerta El contrato específico tiene fecha de terminación el 1 de octubre de 2022 y no se ha contratado obra ni interventoría
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del casco urbano, municipio de San Antonio del Tequendama	El proyecto 4276-Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del casco urbano, municipio de San Antonio del Tequendama se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 536.773.000, con un aporte territorial de \$ 536.773.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 14.000 personas ubicadas en San Antonio De



Sector	Proyecto	Descripción Avance
		Tequendama (Cundinamarca), generar 8 empleos directos y 12 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Adecuación y remodelación estadio municipal Ubaté	El proyecto 4290-Adecuación y remodelación estadio municipal Ubaté se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.455.490.394, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 7.455.490.394, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 22.558 personas ubicadas en Ubaté (Cundinamarca), generar 105 empleos directos y 161 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. Observaciones adicionales: A corte del mes de junio, el proyecto tiene pendiente la firma de acta de inicio, compromiso que se programó para el 7 de julio 2022.
Deporte y Recreación	Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	El proyecto 4291-Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 21.407.596.852, con un aporte territorial de \$ 6.407.596.852 y un aporte nación de \$ 15.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 146.352 personas ubicadas en Zipaquirá (Cundinamarca), generar 300 empleos directos y 462 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Municipio solicitó ajuste de precios a ENTerritorio, para lo cual se tramitó el otrosí modificatorio el 23 de junio de 2022. No ha iniciado el proceso contratación derivada debido a que la alcaldía de Zipaquirá solicitó indexar el presupuesto, por aumento de precios en el mercado de la construcción.
Deporte y recreación	Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca	El proyecto 4285-Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 38.692.432.704, con un aporte territorial de \$ 4.692.432.704 y un aporte nación de \$ 34.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 107.459 personas ubicadas en Funza (Cundinamarca), generar 542 empleos directos y 835 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Proyecto retrasado, porque el municipio presentó garantías hasta el 28 de junio. De acuerdo con cronograma del proyecto, se estimaban 4 meses para contratar obras desde la firma del contrato en el mes de noviembre de 2021.. Responsable Municipio de Funza. Avance Se presentó y aprobó garantía por ENTerritorio el 28 de junio. Alerta Retraso de actividades del proyecto porque se requirieron 7 meses para presentación y aprobación de garantía Observaciones adicionales: Se tiene como compromiso de la entidad, el envío de la certificación



Sector	Proyecto	Descripción Avance
		bancaria que describe que la cuenta está exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes. El cumplimiento de este se pacto con fecha máxima del 6 de julio 2022.
Deporte y recreación	Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca	El proyecto 4287-Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.185.446.332, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.185.446.332, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 791 personas ubicadas en Jerusalén (Cundinamarca), generar 62 empleos directos y 95 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Contrato de obra adjudicado. Contrato de interventoría en proceso de evaluación de ofertas, sin embargo, fue detenido por sentencia de la Corte Constitucional. Responsable Municipio de Jerusalén. Avance El contrato de obra fue adjudicado y se suspendió el proceso de interventoría por sentencia de la Corte Constitucional. Alerta Proyecto afectado por sentencia de la Corte Constitucional de Ley de Garantías
Deporte y recreación	Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	El proyecto 4289-Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 20.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 20.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 11.014 personas ubicadas en Tocancipá (Cundinamarca), generar 280 empleos directos y 432 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Inclusión Social y reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	El proyecto 4294-Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.722.596.163, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 5.722.596.163, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 21.515 personas ubicadas en Cajicá (Cundinamarca), generar 89 empleos directos y 141 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Municipio solicitó adición de recursos por actualización de precios y la documentación soporte está siendo revisada por ENTerritorio. Una vez se apruebe la solicitud y se realice el otrosí modificatorio se iniciará contratación derivada. Responsable Municipio de Cajicá y ENTerritorio. Avance Municipio presentó documentación soporte ajustada el 27 de mayo y 1 de junio a ENTerritorio. Alerta La contratación derivada no se puede iniciar hasta tanto no se apruebe la adición de recursos y se realice la firma del otrosí modificatorio
Transporte	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	El proyecto 4296-Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 83.380.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un



Sector	Proyecto	Descripción Avance
		aporte nación de \$ 83.380.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 770.855 personas ubicadas en Cajicá (Cundinamarca), Chía (Cundinamarca), Cota (Cundinamarca), El Rosal (Cundinamarca), Facatativá (Cundinamarca), Funza (Cundinamarca), Madrid (Cundinamarca), Mosquera (Cundinamarca), Tabio (Cundinamarca), Tenjo (Cundinamarca), generar 1.168 empleos directos y 2.008 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación El ICCU presentó a ENTerritorio propuesta de modificación para la contratación de los componentes predial y de obra de manera separada. Responsable ENTerritorio. Avance ENTerritorio informa que resultado de su revisión se evidencia que la propuesta genera modificaciones al proyecto inicial, y por ello, se solicitará aclaraciones al ICCU frente a situaciones que deben ser resueltas.. Alerta De la aprobación de la propuesta depende que ICCU avance con trámite de incorporación de recursos y publicación de procesos contractuales
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	El proyecto 4295-Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.867.430.423, con un aporte territorial de \$ 367.430.423 y un aporte nación de \$ 1.500.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.638 personas ubicadas en Chocontá (Cundinamarca), generar 21 empleos directos y 37 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	34	-	9	25
Ambiente y Desarrollo Sostenible	4	-	-	4
Cultura	1	-	-	1
Deporte y Recreación	8	-	5	3
Inclusión Social y Reconciliación	1	-	1	-
Planeación	2	-	-	2
Transporte	2	-	2	-
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	1	-	-	1
Total, general	53	-	17	36

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)



Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$147.951	\$7.123	5%	\$140.829	95%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$69.600	\$0	0%	\$69.600	100%
Cultura	\$5.736	\$0	0%	\$5.736	100%
Deporte y Recreación	\$111.363	\$11.100	10%	\$100.263	90%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.352	\$0	0%	\$6.352	100%
planeación	\$10.270	\$0	0%	\$10.270	100%
Transporte	\$84.880	\$0	0%	\$84.880	100%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$100.668	\$0	0%	\$100.668	100%
TOTAL	\$536.821	\$18.223	3%	\$518.598	97%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO DE 2022

36,7%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$147.951	\$5.740	4%	\$14.385	10%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$69.600	\$0	0%	\$0	0%
Cultura	\$5.736	\$0	0%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$111.363	\$80.641	72%	\$91.741	82%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.352	\$5.723	90%	\$5.723	90%
Planeación	\$10.270	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$84.880	\$84.880	100%	\$85.248	100%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$100.668	\$0	0%	\$0	0%
TOTAL	\$536.821	\$176.984	33%	\$197.096	36,7%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

**3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS DEL DNP.**

(2022)



(2021-2024)

%Avance - % Avance Acumulado - **Fecha de corte: 30 de junio de 2022**

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS DEL DNP.**Gestión ambiental y saneamiento básico % Avance: - % Avance Acumulado: --**

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Obras de mitigación de riesgo realizadas en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	5	-	-		Gris	

SEMÁFORO





<60%

≥80%

Infraestructura Para la Integración Social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Transporte % Avance: 0% % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías y cicloinfraestructura intervenidas en el marco del Pacto	32,67	32,67	33,23	0%		Rojo	77,10	32,67	0%		Rojo	30/06/2022



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Cundinamarca												

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Productores beneficiados con proyectos dirigidos al sector agropecuario en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	3.010	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Deporte y Recreación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva y recreativa intervenida en el marco	0	-	-	-		Gris	8	-	-		Gris	



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
del Pacto Cundinamarca												

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Planeación/ Inclusión Social y Reconciliación/ Cultura % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura pública intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	4	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Gestión ambiental y saneamiento básico

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Obras de mitigación de riesgo realizadas en el marco del Pacto Cundinamarca	Se avanza con la verificación de requisitos del FRPT a los proyectos de gestión del riesgo para suscribir contrato específico una vez culmine Ley de Garantías, así: Intervención ambiental para mitigación del riesgo, Cáqueza: proyecto por valor de \$10.245 millones, viabilizado por parte de la UNGRD y logró la verificación de requisitos del FRPT, por lo cual el DNP está realizando los trámites para firma del contrato específico. Intervención ambiental para mitigación del riesgo, Ubaque: proyecto por valor de \$28.593 millones, viabilizado por parte de la UNGRD y logró la verificación de requisitos del FRPT, por lo cual el DNP está realizando los trámites para firma del contrato específico. Intervención ambiental para mitigación del riesgo, Paime: proyecto por valor de \$3.978 millones, viabilizado por parte de la UNGRD y logró la verificación de requisitos del FRPT, por lo cual el DNP está realizando los trámites para firma del contrato específico..

**Infraestructura Para la Integración Social**

Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías y cicloinfraestructura intervenidas en el marco del Pacto Cundinamarca	Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá. Se suscribió el contrato específico N°2210751 entre ENTerritorio y el municipio de Chocontá, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$1.867 millones. El 16 de febrero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El municipio avanza con el proceso de contratación de obra LP-07-2021 y el concurso de méritos CM-01-2022 para interventoría, con fecha estimada de adjudicación, de los dos procesos, el 25 de julio de 2022. Cicloruta de la Sabana. Se suscribió el contrato específico N°2210754 entre ENTerritorio y el ICCU, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$83.380 millones. El 27 de abril se aprobó la garantía por parte de ENTerritorio, quedando legalizado el contrato. El 6 de mayo ICCU presentó solicitud de ajuste de forma de contratación derivada debido a normatividad de los pliegos tipo del sector transporte, la cual está siendo revisada por ENTerritorio.

Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
Productores beneficiados con proyectos dirigidos al sector agropecuario en el marco del Pacto Cundinamarca	Avanza la ejecución de los proyectos de plazas de mercado y centros de acopio dirigidos a productores del sector agropecuario, así: Por parte de ENTerritorio, en el mes de noviembre de 2021, se suscribieron contratos específicos para la construcción y adecuación de la plaza de mercado de Gachetá, plaza de mercado de Bituima, centro de acopio de Gutiérrez y centro de acopio de la vereda cerezos grandes en Chipaque, por valor total de \$6.882 millones y todos se encuentran legalizados ante ENTerritorio. El municipio de Gutiérrez inició proceso de obra, Chipaque adjudicó proceso de obra e interventoría, Gachetá adjudicó proceso de obra y avanza con interventoría y Bituima declaró por segunda vez desierto proceso de obra.

Deporte y Recreación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura deportiva y recreativa intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	Avanza la ejecución de los proyectos de estadios, coliseos, escenarios deportivos, así: Estadio Villa San Diego de Ubaté. Se suscribió el contrato específico N°2210729 entre ENTerritorio y el municipio de Ubaté, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$7.455 millones. El 7 de marzo se aprobaron las garantías del contrato. El municipio adjudicó el proceso de contratación LP-005-2022 al consorcio CONSORCIO BMC 2022, por valor de \$6.929.060.346 y el concurso de méritos CM-002-2022, el 2 de junio, al CONSORCIO INTER CANCHA 2022, por valor de \$520.908.419. Estadio Zipaquirá. Se suscribió el contrato específico N°2210732 entre ENTerritorio, ICCU y el municipio de Zipaquirá, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$21.407 millones. El 16 de febrero se aprobaron las garantías del contrato. El municipio presentó a ENTerritorio solicitud de ajuste de presupuesto el cual fue aprobado en el comité operativo realizado el 2 de junio. El 28 de junio se suscribió modificatorio y municipio avanza con proceso de contratación. Coliseo municipio de Funza. Se suscribió el contrato específico N°2210731 entre ENTerritorio, ICCU y el municipio de Funza, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$38.692 millones. El 28 de junio se aprobaron las garantías del contrato. Se tramitará modificatorio para realizar primer desembolso. Villa olímpica de Jerusalén, Cundinamarca. Se suscribió el contrato específico N°2210956 entre ENTerritorio y el municipio de Tocancipá, el 29 de diciembre de 2021, por valor de \$4.185 millones. El 23 de febrero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El municipio adjudicó el proceso AJ- LP – N°002 de 2022 al Consorcio Infraestructura deportiva. Se suspendió el



Indicador	Avance Cualitativo
	proceso de contratación la interventoría, teniendo en cuenta la sentencia de Ley de Garantías. Parque recreo deportivo Los Patos de Tocancipá. Se suscribió el contrato específico N°2210741 entre ENTerritorio y el municipio de Tocancipá, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$20.000 millones. El 12 de enero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El 1 de junio el municipio adjudicó el proceso de licitación 006 MT 2022 al Consorcio Los Patos por valor de \$18.518.517.963 millones y el 22 de junio adjudicó el concurso de méritos CM-001-MT-2022 para la contratación de la interventoría al Consorcio CANARDS por valor de \$1.481.481.471.

Planeación/ Inclusión Social y Reconciliación/ Cultura

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura pública intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	Avanza la ejecución de los proyectos de infraestructura publica intervenida, así: Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá. Se suscribió el contrato específico N°2210738 entre ENTerritorio y el municipio de Cajicá, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$5.722 millones. El 2 de marzo de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El 9 de marzo de 2022 se realizó el primer comité operativo y de seguimiento del contrato específico entre Alcaldía, ENTerritorio y DNP. El 28 de junio municipio remitió documentos ajustados para soportar la actualización de precios y está en revisión de ENTerritorio.



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 12 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 176.984 millones, equivalente al 33% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$2.481	\$2.481	\$2.481
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$212	\$882	\$882	\$1.093
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutierrez, Cundinamarca	En Ejecución	\$568	\$1.137	\$1.137	\$1.705
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	En Ejecución	\$362	\$1.242	\$1.242	\$1.603
Deporte y Recreación	Adecuación y remodelación estadio municipal Ubate	En Ejecución	\$0	\$7.455	\$7.455	\$7.455
Deporte y Recreación	Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	En Ejecución	\$6.408	\$15.000	\$15.000	\$21.408
Deporte y Recreación	Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca	En Ejecución	\$4.692	\$34.000	\$34.000	\$38.692
Deporte y Recreación	Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$4.185	\$4.185	\$4.185
Deporte y Recreación	Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	En Ejecución	\$0	\$20.000	\$20.000	\$20.000
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	En Ejecución	\$0	\$5.723	\$5.723	\$5.723
Transporte	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$83.380	\$83.380	\$83.380
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	En Ejecución	\$367	\$1.500	\$1.500	\$1.867
Total, general			\$12.609	\$176.984	\$176.984	\$189.593

Millones de \$ COP
