



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
17/10/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/09/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: El Pacto Funcional Santander tiene como objetivo articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para su desarrollo económico y social.

Líneas Temáticas:

- Conectividad subregional.
- Infraestructura para el desarrollo económico y social.


TEMAS ESTRATEGICOS

Con la modificación realizada por el Consejo Directivo en la sesión No. 6, realizada el 25 de agosto de 2022, se priorizan un total de 46, dichas iniciativas tienen un valor indicativo de \$1.800.891.288.963, de los cuales \$1.312.993.223.913 son aporte indicativo de la Nación y \$487.898.065.050 del territorio.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Funcional Santander generaría cerca de 26.101 empleos directos, 43.943 indirectos.

Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a más de 2 millones de habitantes de las diferentes provincias, sin contar el beneficio generado a población flotante o exógena que llega o transita por los territorios y que se benefician de las obras de conectividad vial principalmente.

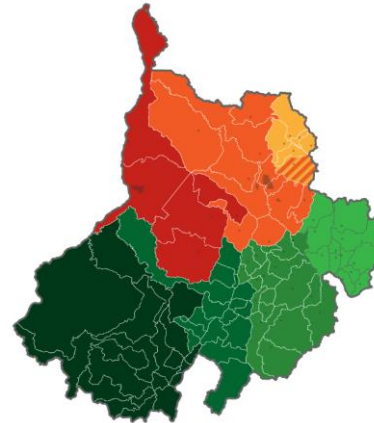Área de Intervención: Pacto Santander

Departamento:	Santander
No. de Municipios en el Pacto Territorial:	(7 provincias y 80 municipios)
Fecha de suscripción:	31/10/2020
Fecha de terminación:	31/10/2025
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$1.800.891 (100%)
Nación (%)	\$1.312.993 (73%)
Territorio y otros (%)	\$487.898 (27%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$1.533.084 (85%)
Compromiso Nación	\$1.212.187
Compromiso Territorio y otros	\$ 320.897

Proyectos en ejecución	\$1.533.084 (30 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****Proyectos en ejecución:**

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander	El proyecto 4173-Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.225.695.968, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 15.225.695.968, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 185.248 personas ubicadas en Girón (Santander), generar 217 empleos directos y 317 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander	El proyecto 4176-Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 14.757.197.176, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 14.757.197.176, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 185.248 personas ubicadas en Girón (Santander), generar 210 empleos directos y 307 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de Santander.	El proyecto 4172-Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de Santander. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 56.830.428.703, con un aporte territorial de \$ 10.000.000.000 y un aporte nación de \$ 46.830.428.703, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 528.352 personas ubicadas en Bucaramanga (Santander), generar 700 empleos directos y 1.022 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Control y mitigación de inundaciones mediante la construcción del canal de aguas lluvias para la quebrada Suratoque (entre la carrera 6 y 150 metros debajo de la confluencia con la quebrada la palmira) en el municipio de Piedecuesta y corresponde al sector de Ambiente y desarrollo sostenible	El proyecto 4045-Control y mitigación de inundaciones mediante la construcción del canal de aguas lluvias para la quebrada Suratoque (entre la carrera 6 y 150 metros debajo de la confluencia con la quebrada la palmira) en el municipio de Piedecuesta y corresponde al sector de Ambiente y desarrollo sostenible se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 25.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 20.000.000.000 y un aporte nación de \$ 5.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 152.665 personas ubicadas en Piedecuesta (Santander), generar 280 empleos directos y 470 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Comercio Industria y Turismo	Construcción del Malecón, Barrancabermeja	El proyecto 4036-Construcción del Malecón, Barrancabermeja se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 45.557.973.470, con un aporte territorial de \$ 45.557.973.470 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 12 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 191.704 personas ubicadas en Barrancabermeja (Santander), generar 906 empleos directos y 1.477 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Comercio Industria y Turismo	Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón	El proyecto 4038-Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.562.241.428, con un aporte territorial de \$ 8.562.241.428 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 2 % y financiero del 2 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 185.245 personas ubicadas en Girón (Santander), generar 172 empleos directos y 280 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción de la villa olímpica, Matanza	El proyecto 4032-Construcción de la villa olímpica, Matanza se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.999.352.960, con un aporte territorial de \$ 4.999.352.960 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.238 personas ubicadas en Matanza (Santander), generar 70 empleos directos y 108 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción de la villa olímpica, Oiba	El proyecto 4035-Construcción de la villa olímpica, Oiba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.998.543.093, con un aporte territorial de \$ 4.998.543.093 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 20 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 11.815 personas ubicadas en Oiba (Santander), generar 70 empleos directos y 108 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Educación	Ampliación SENA, San Gil	El proyecto 4026-Ampliación SENA, San Gil se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 19.000.000.000, cuenta con un avance físico del 16 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 46.152 personas ubicadas en San Gil (Santander), generar 392 empleos directos y 686 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Educación	Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.	El proyecto 4022-Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 28.274.924.970, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 28.274.924.970, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 15 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 528.352 personas ubicadas en Bucaramanga (Santander), generar 403 empleos directos y 705 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Educación	Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.	El proyecto 4025-Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 120.657.402.700, con un aporte territorial de \$ 60.657.402.700 y un aporte nación de \$ 60.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 15 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 528.352 personas ubicadas en Bucaramanga (Santander), generar 1.421 empleos directos y 2.486 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Interior	Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.	El proyecto 4171-Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.063.987.596, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 1.063.987.596, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 5.238 personas ubicadas en Matanza (Santander), generar 15 empleos directos y 24 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Salud y Protección Social	Construcción hospital Barbosa	El proyecto 4030-Construcción hospital Barbosa se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 337.682.016, con un aporte territorial de \$ 337.682.016 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 28.873 personas ubicadas en Barbosa (Santander), generar 140 empleos directos y 221 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Salud y Protección Social	Construcción hospital, San Andrés	El proyecto 4029-Construcción hospital, San Andrés se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 253.261.512, con un aporte territorial de \$ 253.261.512 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 8.432 personas ubicadas en San Andrés (Santander), generar 112 empleos directos y 177 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Salud y Protección Social	Construcción hospital, Suaita	El proyecto 4031-Construcción hospital, Suaita se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 253.261.512, con un aporte territorial de \$ 253.261.512 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 10.212 personas ubicadas en Suaita (Santander), generar 112 empleos directos y 177 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja y Santander y corresponde al sector de Transporte	El proyecto 4041-Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja y Santander y corresponde al sector de Transporte se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.622.369.722, con un aporte territorial de \$ 9.622.369.722 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 11 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 191.704 personas ubicadas en Barrancabermeja (Santander), generar 141 empleos directos y 237 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional	El proyecto 4011-Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.662.508.251, con un aporte territorial de \$ 2.352.761.376 y un aporte nación de \$ 6.309.746.875, cuenta con un avance físico del 90 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 454.923 personas ubicadas en Barbosa (Santander), Girón (Santander), Oiba (Santander), Piedecuesta (Santander), San Gil (Santander), Socorro (Santander), generar 94 empleos directos y 161 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento /pavimentación Guavatá - Vélez	El proyecto 4017-Mejoramiento /pavimentación Guavatá - Vélez se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.999.994.539, con un aporte territorial de \$ 9.999.994.539 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 2 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 5.038 personas ubicadas en Gambita (Santander), generar 140 empleos directos y 241 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento anillo vial Girón – Floridablanca	El proyecto 4021-Mejoramiento anillo vial Girón – Floridablanca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 19.393.396.892, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 19.393.396.892, cuenta con un avance físico del 39 % y financiero del 39 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 451.350 personas ubicadas en Floridablanca (Santander), Girón (Santander), generar 280 empleos directos y 482 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	El proyecto 4020-Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 114.443.108.320, con un aporte territorial de \$ 18.851.793.928 y un aporte nación de \$ 95.591.314.392, cuenta con un avance físico del 10 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 535.897 personas ubicadas en Aguada (Santander), Betulia (Santander), California (Santander), Carcasí (Santander), Charalá (Santander), Charta (Santander), Coromoro (Santander), Curiti (Santander), El Carmen de Chucurí (Santander), El Guacamayo (Santander), El Playón (Santander), Guaca (Santander), Guapotá (Santander), Guavatá (Santander), La Belleza (Santander), La Paz (Santander), Lebríja (Santander), Macaravita (Santander), Matanza (Santander), Ocamonte (Santander), Oiba (Santander), Palmar (Santander), Piedecuesta (Santander), Rionegro (Santander), Sabana de Torres (Santander), San Andrés (Santander), San Gil (Santander), San Miguel (Santander), San Vicente de Chucurí (Santander), Santa Bárbara (Santander), Santa Helena del Opón (Santander), Socorro (Santander), Suaita (Santander), Tona (Santander), Vélez (Santander), generar 1.862 empleos directos y 3.203 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Pavimentación acceso a Puerto Wilches	El proyecto 4014-Pavimentación acceso a Puerto Wilches se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 11.816.699.062, con un aporte territorial de \$ 11.816.699.062 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 5 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 31.510 personas ubicadas en Puerto Wilches (Santander), generar 182 empleos directos y 313 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín - Mogotes	El proyecto 4137-Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín - Mogotes se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 90.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 90.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 17.707 personas ubicadas en Mogotes (Santander), Onzaga (Santander), San Joaquín (Santander), generar 1.260 empleos directos y 2.167 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Pavimentación Socorro - Páramo	El proyecto 4013-Pavimentación Socorro - Páramo se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.233.147.939, con un aporte territorial de \$ 15.233.147.939 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 5 % y financiero del 5 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 34.875 personas ubicadas en Páramo (Santander), Socorro (Santander), generar 221 empleos directos y 380 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Pavimentación Transversal Carare	El proyecto 4010-Pavimentación Transversal Carare se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 129.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 129.000.000.000, cuenta con un avance físico del 55 % y financiero del 45 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 109.162 personas ubicadas en Barbosa (Santander), Cimitarra (Santander), Landázuri (Santander), Vélez (Santander), generar 1.260 empleos directos y 2.167 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Pavimentación Troncal Central Norte	El proyecto 4009-Pavimentación Troncal Central Norte se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 223.679.701.492, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 223.679.701.492, cuenta con un avance físico del 66 % y financiero del 37 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 35.064 personas ubicadas en Capitanejo (Santander), Cerrito (Santander), Concepción (Santander), Málaga (Santander), San José de Miranda (Santander), generar 2.520 empleos directos y 4.334 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Pavimentación vía Curos - Málaga	El proyecto 4008-Pavimentación vía Curos - Málaga se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 316.124.639.074, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 316.124.639.074, cuenta con un avance físico del 7 % y financiero del 5 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 33.129 personas ubicadas en Guaca (Santander), Málaga (Santander), San Andrés (Santander), generar 4.480 empleos directos y 7.706 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Pavimentación vía Zapatoca - Galán - Barichara	El proyecto 4012-Pavimentación vía Zapatoca - Galán - Barichara se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 150.306.556.160, con un aporte territorial de \$ 2.370.556.160 y un aporte nación de \$ 147.936.000.000, cuenta con un avance físico del 20 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 18.301 personas ubicadas en Barichara (Santander), Galán (Santander), Zapatoca (Santander), generar 2.132 empleos directos y 3.667 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta	El proyecto 4044-Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 23.139.977.876, con un aporte territorial de \$ 23.139.977.876 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 72 % y financiero del 60 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 152.665 personas ubicadas en Piedecuesta (Santander), generar 322 empleos directos y 541 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Construcción vivienda nueva, Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratoca, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaita, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia	El proyecto 4042-Construcción vivienda nueva, Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratoca, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaita, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 65.251.232.924, con un aporte territorial de \$ 65.251.232.924 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 30 % y financiero del 38 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 545.785 personas ubicadas en Albania (Santander), Aratoca (Santander), Barbosa (Santander), Betulia (Santander), Bolívar (Santander), Cabrera (Santander), California (Santander), Charalá (Santander), Chima (Santander), Concepción (Santander), Confines (Santander), Curití (Santander), El Carmen de Chucurí (Santander), El Guacamayo (Santander), El Peñón (Santander), Galán (Santander), Gambita (Santander), Guadalupe (Santander), Guapotá (Santander), Guavatá (Santander), La Belleza (Santander), Lebrija (Santander), Macaravita (Santander), Matanza (Santander), Mogotes (Santander), Oiba (Santander), Onzaga (Santander), Palmar (Santander), Páramo (Santander), Piedecuesta (Santander), Puente Nacional (Santander), Puerto Wilches (Santander), Rionegro (Santander), San Gil (Santander), San Miguel (Santander), Socorro (Santander), Suaita (Santander), Valle de San José (Santander), Villanueva (Santander), generar 1.006 empleos directos y 1.691 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Mejoramiento vivienda, Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos	El proyecto 4043-Mejoramiento vivienda, Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 6.973.761.170, con un aporte territorial de \$ 6.973.761.170 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 7 % y financiero del 3 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 2.375.413 personas ubicadas en Capitanejo (Santander), Carcasí (Santander), Cepitá (Santander), Chipatá (Santander), Contratación (Santander), Coromoro (Santander), El Playón (Santander), Encino (Santander), Guaca (Santander), Hato (Santander), Jordán (Santander), Los Santos (Santander), Molagavita (Santander), Ocamonte (Santander), Palmas del Socorro (Santander), Pinchote (Santander), San Joaquín (Santander), Santa Helena del Opón (Santander), Zapatoca (Santander), generar 176 empleos directos y 296 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	7	-	4	3
Comercio Industria y Turismo	4	-	2	2
Deporte y Recreación	3	-	2	1
Educación	5	-	3	2
Interior	1	-	1	-
Salud y Protección Social	5	-	3	2
Transporte	16	-	12	4
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	2	-	1	1
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	3	-	2	1
Total, general	46	-	30	16

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$157.500	\$20.000	13%	\$137.500	87%
Comercio Industria y Turismo	\$158.664	\$51.614	33%	\$107.050	67%
Deporte y Recreación	\$20.000	\$20.000	100%	\$0	0%
Educación	\$186.654	\$63.481	34%	\$123.173	66%
Interior	\$1.064	\$0	0%	\$1.064	100%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$56.000	100%	\$0	0%
Transporte	\$1.095.839	\$151.632	14%	\$944.207	86%



Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$29.181	\$29.181	100%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$95.989	\$95.989	100%	\$0	0%
TOTAL	\$1.800.891	\$487.898	27%	\$1.312.993	73%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2022

85%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2020 – 2025
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$157.500	\$76.813	49%	\$111.813	71%
Comercio Industria y Turismo	\$158.664	\$0	0%	\$54.120	34%
Deporte y Recreación	\$20.000	\$0	0%	\$9.998	50%
Educación	\$186.654	\$88.275	47%	\$161.932	87%
Interior	\$1.064	\$1.064	100%	\$1.064	100%
Salud y Protección Social	\$56.000	\$0	0%	\$844	2%
Transporte	\$1.095.839	\$29.423	3%	\$1.098.282	100%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$29.181	\$0	0%	\$23.140	79%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$95.989	\$0	0%	\$71.890	75%
TOTAL	\$1.800.891	\$195.575	11%	\$1.533.084	85%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO FUNCIONAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2020-2025)

%Avance 100%

F-CA-08

Avance Acumulado 63,10%

Versión: 1

GGNPT



Fecha de corte: 30 de septiembre de 2022

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.


3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Conectividad Subregional % Avance: 100 % Avance Acumulado: 85,26%

- Transporte % Avance: 100 % Avance Acumulado: 85,26%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander.	2172,4	2.456	2.259,48	100%		Verde	2.504,98	2.456	85,26%		Amarillo	30/09/2022

SEMÁFORO




Infraestructura para el desarrollo económico y social % Avance: 100% % Avance Acumulado: 40,93%

Educación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura educativa construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	2	-	-	-		Gris	5,00	-	-		Gris	

SEMÁFORO



Salud % Avance: - % Avance Acumulado: -



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura hospitalaria construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	5	-	-	-		Gris	5,00	-	-		Gris	

SEMÁFORO




<60%

≥80%

Deporte y recreación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva y al servicio del deporte construida y mejorada en el Marco del Pacto Funcional Santander.	1	-	-	-		Gris	4,00	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Turismo % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Funcional Santander.	10	-	-	-		Gris	4,00	-	-		Gris	



SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vivienda, Ciudad y Territorio % Avance: 100% % Avance Acumulado: 40,93%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Soluciones de vivienda rural y urbanas entregadas en el marco del Pacto Funcional Santander.	1.621	630	580	100%		Verde	1.671	684	40,93%		Rojo	30/09/2022
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Funcional Santander.	0	-	-	-		Gris	3	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Conectividad Subregional

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Funcional Santander.	Línea base: 2172 km Avance: 284 km. Avance total: 2456 km han sido intervenidos incluyendo línea base. Descripción del avance: Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: Cueros Málaga: INVIAS: Obra adjudicada el 09/04/2021 al CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066, Contrato 1042 de 2021 por valor de \$ 286.170 m. Acta de inicio 29/06/2021. Interventoría adjudicada el 26 de abril al CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 Contrato 1002 valor \$ 20.000 m. Avance: 2 km físico: 3% . Pavimentación Troncal Central Norte: obra 1684 de 2020 por \$ 153.012 e interventoría 1912 de 2020 por \$7200 m. Avance: 5 km físico: 44%. Pavimentación Transversal Carare: obra 1628 de 2020 por \$81.013 m e interventoría 1871 de 2020 por \$5.940 m. Avance 1 km físico: 53% Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional: Recursos Nación: obra 1962 de 2020 por \$3.459 m, interventoría 1811 de 2020 por \$748 millones. Recursos Territorio: En ejecución estudios y diseños según contrato adjudicado el 25 de enero de 2021 por \$2.353 m. Anillo vial



Girón – Floridablanca: obra 1968 de 2020 por \$17.485 m e interventoría 2327 de 2020 por \$1.908 m. Pavimentación vía Zapatoca - Galán – Barichara: Adjudicados estudios y diseños obra por valor de \$2.039 m . Interventoría por valor de \$331 m. Mejoramiento vías terciarias: Contratos adjudicados Colombia Rural: La ejecución de los recursos Nación corresponde a los convenios firmados entre INVIAS y 62 municipios, se han ejecutado 8 municipios para un total de 284 km intervenidos intervenidos valor comprometido: \$66.169 millones. El aporte del territorio corresponde a 13 proyectos aprobados por regalías por \$28.657 m. Se firmó contrato específico entre el DNP por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales y la Gobernación de Santander No. 2210745 por valor de \$29.422.679.762. Actualmente se encuentra en etapa precontractual. Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín – Mogotes: Convenio de firmado el 12 de noviembre de 2021 entre Inviás y departamento de Santander por \$90.000 m. Mejoramiento /pavimentación Guavatá – Vélez: Se firmó decreto 505 el 21 de octubre de 2021 por el Gobernador de Santander, con un valor total de \$10.000 m, valor obra\$9.324 m, valor interventoría \$676 m. Socorro- Paramo: contrato de obra No. 2972 Información suministrada por INVIAS, Gobernación de Santander.

Infraestructura para el desarrollo económico y social

- Educación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura educativa construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	Proyectos en ejecución:3 infraestructura mejorada. Ampliación SENA, San Gil, valor: \$28.000 millones. Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social valor del convenio \$13.000 millones. Avance físico: 50% Construcción Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga: Se firmó contrato específico No. 2210677 el 10 de noviembre del 2021, por un valor de \$28.274.924.970, aporte del DNP, por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales. Entre la Gobernación de Santander, ENTerritorio y UTS. Se adjudico contratos: obra 4 de mayo e interventoría 9 junio del 2022, actas de inicio firmadas el 11 de julio . Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander Valor: \$101.481 millones (actualizado en valor a \$106.177 millones).Avance: Se firmó contrato específico No. 2210733 el 10 de noviembre del 2021, entre el departamento de Santander, ENTerritorio y UIS. Por un valor de \$114.196.122.634, de los cuales \$60.000.000.000 son aporte del DNP por recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, \$18.005.575.267 serán aportados con recursos de la Universidad Industrial de Santander y \$36.190.547.367 serán aportados con recursos del Departamento de Santander, Hay ajuste en los precios de varios items, lo cual implico gestión de nuevos recursos los cuales serán asumidos por UIS , Se firmo Otro si con una adición de \$6.461.280.066 el 22 de julio de 2022, lo cual permite reiniciar proceso de adjudicación. Se encuentra en etapa precontractual. Los dos proyectos faltantes se encuentran en estructuración. Informe suministrado por la Gobernación de Santander, UIS, UTS.

- Salud

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura hospitalaria construida y mejorada en el marco del Pacto Funcional Santander	Se encuentran en ejecución tres proyectos Construcción hospital San Andrés, Construcción hospital Barbosa, Construcción hospital, Suaita: Se dio inicio al contrato de consultoría para los estudios y diseños. Se adelanta la elaboración de los diseños arquitectónicos y los estudios de suelos para los tres Hospitales de San Andrés, Barbosa y Suaita por un valor de \$757.197.000 publicado en Secop (Proceso IT-CM-21-02). Hospital San Gil: Su alcance dependerá de las obras faltantes



Indicador	Avance Cualitativo
	en la fase 1 actualmente en ejecución. Hospital de Mogotes: La secretaría de Salud ha adelantado mesas de trabajo en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, el contratista de obra y el contratista de interventoría con el fin de dar este alcance de la primera fase y poder proceder con la actualización de la Fase II. Información suministrada por la Gobernación de Santander.

- Deporte y recreación

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura deportiva y al servicio del deporte construida y mejorada en el Marco del Pacto Funcional Santander.	Se encuentran en ejecución: Construcción Villa Olímpica de Oiba: Convenio realizado con el municipio convenio N°1480 de 2021 por un valor de \$4.998.543.093 avance: 28%. Proceso No. IT-CD-21-005. Villa Olímpica de Matanza: Convenio realizado con el municipio de Matanza Convenio CO1.PCCNTR.2606912 N°1663 de 2021 por un valor de \$4.999.352.989,59, sin avance. En estructuración los demás proyectos. Informe suministrado por la Gobernación de Santander.

- Turismo

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Funcional Santander.	Se encuentran en ejecución: 2 proyectos Construcción del Malecón, Barrancabermeja y Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón. Malecón de Barranca: Valor: \$64.737 millones. Avance: se firmó convenio de asociación No.3044720 el 12 de noviembre de 2021, entre Ecopetrol y el Municipio de Bucaramanga por un valor de \$24.660.234.618 avance: 12%. •Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón. Valor: \$12.276 millones. - Avance 2% - Están terminando proceso de arqueología (90%). - Inician obras en el mes de agosto. Aporte territorio, se firmó contrato de obra No. 2882297 con el CONSORCIO ARTE Y CULTURA GIRÓN el 31/12/2021 por un valor de \$8.011.241.428 y contrato de interventoría No. 11718383-4343 con el CONSORCIO INTERPARES GIRÓN el 31/12/2021 por un valor de \$551.000.000. En proceso de viabilidad: • Construcción de Infraestructura Agroturística y Náutica en el Departamento de Santander. Valor: \$76.651 millones, viabilidad sectorial del 17 de agosto de 2022. En estructuración Parque la Libertad de Socorro. Informe suministrado por la Gobernación de Santander..

- Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador	Avance Cualitativo
Soluciones de vivienda rural y urbanas entregadas en el marco del Pacto Funcional Santander.	Línea base: 1621 viviendas Avance: 684 viviendas entregadas e intervenidas. Avance total: 2305 Acuerdo No 89 de 14 de diciembre de 2020, Acuerdo 90 21 de diciembre de 2020 son proyectos de los municipios de: Charalá, Suaita, Barbosa, Oiba, San Gil, Curití, a la fecha se han terminado y entregado 30 viviendas por municipio con un total de 180 viviendas. Firmó decreto 383 del 5 de agosto de 2021 el Señor Gobernador de Santander para los Municipios de: Confines, Valle de San Jose, Socorro, Aratocha, Villanueva, Onzaga, Gambita, Guadalupe, Guapota, California, Chima, Barichara. Por un valor de \$15.261.600.000,00. Cada municipio con avance de 30 viviendas cada uno para un total de 390 viviendas Firmo decreto 124 de 2022 avance viviendas intervenidas Municipios de Paramo y Lebrija de 30 vivienda cada uno, total 60 viviendas Mejoramiento vivienda: (Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos). Mejoramiento de Vivienda: Ejecutados mejoramientos de



Indicador	Avance Cualitativo
	vivienda de los Municipios de: El Peñón, Lebrija, Piedecuesta con un total de 54 viviendas por un valor de \$770 millones. Información suministrada por la Gobernación de Santander.
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Funcional Santander.	Avance: 1 proyecto. Se encuentra en ejecución: el proyecto: • Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta Valor: \$23.000 millones. Avance: Se firmó convenio con la Empresa municipal de servicios públicos domiciliario de Piedecuesta E.S.P.- Piedecuestana de servicios públicos. Convenio CO1.PCCNTR.2584008. (Valor: 23.139.977.876,00). Avance físico: 80% • Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta. Valor: \$25.000 millones. Se modificó el Sector en el CD No. 6, se firmó convenio No 9677-PPAL001-1598-2021, entre UNGRD, Gobernación de Santander, alcaldía de Piedecuesta el día 10/11/2021 por un valor de \$25.000.000.000. En estructuración el proyecto Alcantarillado de Charala. Informe suministrado por la Gobernación de Santander..



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 7 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 195.575 millones equivalente al 11% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander	En Ejecución	\$0	\$15.226	\$15.226	\$15.226
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander	En Ejecución	\$0	\$14.757	\$14.757	\$14.757
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.	En Ejecución	\$10.000	\$46.830	\$46.830	\$56.830
Educación	Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.	En Ejecución	\$0	\$28.275	\$28.275	\$28.275
Educación	Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.	En Ejecución	\$60.657	\$60.000	\$60.000	\$120.657
Interior	Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.	En Ejecución	\$0	\$1.064	\$1.064	\$1.064
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	En Ejecución	\$18.852	\$95.591	\$29.423	\$114.443
Total, general			\$89.509	\$261.744	\$195.575	\$351.253
