



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
20/02/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/12/2022

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.

**Líneas Temáticas:**

- Infraestructura para la integración social
- Gestión ambiental y saneamiento básico


**TEMAS ESTRATÉGICOS**

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue modificado en la sesión No. 6 del Consejo Directivo del Pacto Cundinamarca, realizado el 7 de diciembre de 2022. En esta modificación se pasó de un valor indicativo de \$493.920.668.269 a \$519.012.723.070 de los cuales \$457.267.519.339 son aporte indicativo de la Nación y \$ 61.745.203.731 del territorio

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Cundinamarca generaría cerca de 6.913 empleos directos y 10.685 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 1.3 millones habitantes del área de influencia del Pacto Cundinamarca.

**Área de Intervención: Cundinamarca**

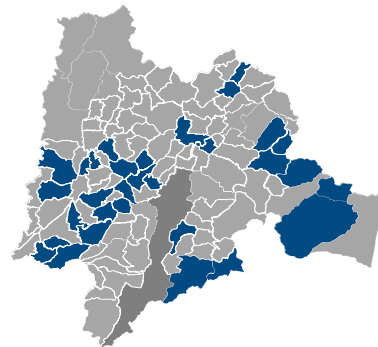

<b>Departamento:</b>	<b>Cundinamarca</b> Municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Cajicá, Caquezá, Chía, Chipaque, Chocontá, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Fomeque, Funza, Fúquene, Gachetá, Girardot, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Paima, Pulí, Quetame, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Subachoque, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Viotá, Zipaquirá y Gachancipá.
<b>Fecha de suscripción:</b>	19/02/2021
<b>Fecha de terminación:</b>	19/02/2024
<b>Plazo:</b>	3 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$519.013 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$457.268 (88%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$61.745 (12%)

**Avance financiero (Millones)**

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$453.098 (87%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$ 393.312
<b>Compromiso Territorio</b>	\$59.785

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$ 453.098 (38 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$ 0 (0 proyectos)



**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

**Proyectos en ejecución:**

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá	El proyecto 4280-Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.885.377.358, con un aporte territorial de \$ 743.339.494 y un aporte nación de \$ 1.142.037.864, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 9.644 personas ubicadas en Ubalá (Cundinamarca), generar 26 empleos directos y 39 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación plaza de mercado – central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa	El proyecto 4266-Adecuación plaza de mercado – central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.167.000.000, con un aporte territorial de \$ 3.167.000.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.210 personas ubicadas en La Mesa (Cundinamarca), generar 44 empleos directos y 65 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá	El proyecto 4282-Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 851.120.000, con un aporte territorial de \$ 851.120.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 146.352 personas ubicadas en Zipaquirá (Cundinamarca), generar 12 empleos directos y 18 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	El proyecto 4261-Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.480.550.120, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 2.480.550.120, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 8.745 personas ubicadas en Gacheta (Cundinamarca), generar 35 empleos directos y 51 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima	El proyecto 4278-Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.585.833.235, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 1.585.833.235, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 1.206 personas ubicadas en Sasaima (Cundinamarca), generar 23 empleos directos y 34 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la edificación de la mujer tejedora cabeza de hogar del municipio de Chipaque	El proyecto 4253-Construcción de la edificación de la mujer tejedora cabeza de hogar del municipio de Chipaque se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.463.836.860, con un aporte territorial de \$ 1.463.836.860 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 228 personas ubicadas en Chipaque (Cundinamarca), generar 20 empleos directos y 30 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	El proyecto 4270-Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.367.719.407, con un aporte territorial de \$ 177.971.247 y un aporte nación de \$ 1.189.748.160, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 1.200 personas ubicadas en Manta (Cundinamarca), generar 19 empleos directos y 28 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca	El proyecto 4249-Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.133.334.629, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 10.133.334.629, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 6.423 personas ubicadas en Agua De Dios (Cundinamarca), generar 142 empleos directos y 209 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque, Cundinamarca	El proyecto 4260-Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 16.092.465.423, con un aporte territorial de \$ 2.330.866.681 y un aporte nación de \$ 13.761.598.742, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 10.156 personas ubicadas en Fomeque (Cundinamarca), generar 193 empleos directos y 283 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Síquima	El proyecto 4262-Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Síquima se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.484.140.000, con un aporte territorial de \$ 1.484.140.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.584 personas ubicadas en Guayabal De Síquima (Cundinamarca), generar 21 empleos directos y 31 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca	El proyecto 4263-Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.759.352.165, con un aporte territorial de \$ 504.512.099 y un aporte nación de \$ 3.254.840.066, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 3.375 personas ubicadas en Guayabetal (Cundinamarca), generar 53 empleos directos y 77 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	El proyecto 4254-Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.093.293.603, con un aporte territorial de \$ 211.689.182 y un aporte nación de \$ 881.604.421, cuenta con un avance físico del 13 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.500 personas ubicadas en Chipaque (Cundinamarca), generar 15 empleos directos y 22 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca	El proyecto 4264-Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.704.720.764, con un aporte territorial de \$ 568.072.985 y un aporte nación de \$ 1.136.647.779, cuenta con un avance físico del 29 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 802 personas ubicadas en Gutiérrez (Cundinamarca), generar 24 empleos directos y 35 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal	El proyecto 4259-Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.046.426.377, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 1.046.426.377, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 25.757 personas ubicadas en El Rosal (Cundinamarca), generar 15 empleos directos y 22 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana	El proyecto 4272-Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.642.326.908, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 3.642.326.908, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 5.168 personas ubicadas en Nilo (Cundinamarca), generar 52 empleos directos y 77 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte	El proyecto 4275-Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.945.122.389, con un aporte territorial de \$ 2.605.759.622 y un aporte nación de \$ 2.339.362.767, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 14.367 personas ubicadas en Ricaurte (Cundinamarca), generar 69 empleos directos y 102 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá	El proyecto 4267-Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 6.081.790.346, con un aporte territorial de \$ 2.695.556.000 y un aporte nación de \$ 3.386.234.346, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 90 personas ubicadas en Macheta (Cundinamarca), generar 85 empleos directos y 125 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial – centro funcional Quetame	El proyecto 4274-Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial – centro funcional Quetame se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 24.587.726.584, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 24.587.726.584, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 7.141 personas ubicadas en Quetame (Cundinamarca), generar 362 empleos directos y 532 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; Il etapa, Chipaque	El proyecto 4255-Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; Il etapa, Chipaque se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.194.426.098, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 2.194.426.098, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 3.500 personas ubicadas en Chipaque (Cundinamarca), generar 31 empleos directos y 45 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca	El proyecto 4256-Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.272.144.497, con un aporte territorial de \$ 272.144.497 y un aporte nación de \$ 2.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 20.568 personas ubicadas en Chocontá (Cundinamarca), generar 28 empleos directos y 41 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituíma, Cundinamarca	El proyecto 4251-Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituíma, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.603.360.938, con un aporte territorial de \$ 361.786.287 y un aporte nación de \$ 1.241.574.651, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.013 personas ubicadas en Bituíma, (Cundinamarca), generar 22 empleos directos y 33 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del casco urbano, municipio de San Antonio del Tequendama	El proyecto 4276-Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del casco urbano, municipio de San Antonio del Tequendama se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 536.773.000, con un aporte territorial de \$ 536.773.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 14.000 personas ubicadas en San Antonio De Tequendama (Cundinamarca), generar 8 empleos directos y 11 empleos indirectos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí	El proyecto 4273-Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.947.720.336, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 2.947.720.336, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 600 personas ubicadas en Pulí (Cundinamarca), generar 41 empleos directos y 61 empleos indirectos.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca	El proyecto 4247-Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 28.593.102.330, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 28.593.102.330, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 1.854 personas ubicadas en Ubaque (Cundinamarca), generar 400 empleos directos y 584 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca	El proyecto 4244-Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.245.579.312, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 10.245.579.312, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 1.041 personas ubicadas en Cáqueza (Cundinamarca), generar 143 empleos directos y 209 empleos indirectos.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paime, departamento de Cundinamarca	El proyecto 4246-Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paime, departamento de Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.802.828.143, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 3.802.828.143, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 400 personas ubicadas en Paime (Cundinamarca), generar 56 empleos directos y 81 empleos indirectos.
Cultura	Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá	El proyecto 4356-Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 47.178.427.246, con un aporte territorial de \$ 7.446.690.670 y un aporte nación de \$ 39.731.736.576, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 156.983 personas ubicadas en Zipaquirá (Cundinamarca), generar 551 empleos directos y 849 empleos indirectos.
Cultura	Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá Cundinamarca	El proyecto 4359-Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 59.525.738.433, con un aporte territorial de \$ 13.525.738.433 y un aporte nación de \$ 46.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 156.315 personas ubicadas en Zipaquirá (Cundinamarca), generar 644 empleos directos y 992 empleos indirectos.
Cultura	Construcción del Centro Cultural en Gachancipá	El proyecto 4358-Construcción del Centro Cultural en Gachancipá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.543.989.057, con un aporte territorial de \$ 800.445.463 y un aporte nación de \$ 14.743.543.594, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 14.268 personas ubicadas en Gachancipá (Cundinamarca), generar 206 empleos directos y 318 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Deporte y Recreación	Adecuación y remodelación estadio municipal Ubaté	El proyecto 4290-Adecuación y remodelación estadio municipal Ubaté se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.455.490.394, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 7.455.490.394, cuenta con un avance físico del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 22.558 personas ubicadas en Ubaté (Cundinamarca), generar 104 empleos directos y 161 empleos indirectos.
Deporte y Recreación	Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	El proyecto 4291-Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 25.722.032.639, con un aporte territorial de \$ 10.722.032.639 y un aporte nación de \$ 15.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 146.352 personas ubicadas en Zipaquirá (Cundinamarca), generar 360 empleos directos y 555 empleos indirectos.
Deporte y Recreación	Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca	El proyecto 4285-Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 38.692.432.704, con un aporte territorial de \$ 4.692.432.704 y un aporte nación de \$ 34.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 107.459 personas ubicadas en Funza (Cundinamarca), generar 542 empleos directos y 834 empleos indirectos.
Deporte y Recreación	Mejoramiento de los polideportivos de los barrios La Magnolia, Escallón y San Luis de la zona urbana del municipio de Madrid, Cundinamarca	El proyecto 4353-Mejoramiento de los polideportivos de los barrios La Magnolia, Escallón y San Luis de la zona urbana del municipio de Madrid, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.868.727.572, con un aporte territorial de \$ 3.868.727.572 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 4.000 personas ubicadas en Madrid (Cundinamarca), generar 54 empleos directos y 83 empleos indirectos.
Deporte y Recreación	Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca	El proyecto 4287-Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.185.446.332, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.185.446.332, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 791 personas ubicadas en Jerusalén (Cundinamarca), generar 59 empleos directos y 90 empleos indirectos.





Sector	Proyecto	Descripción Avance
Deporte y Recreación	Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	El proyecto 4289-Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 20.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 20.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 11.014 personas ubicadas en Tocancipá (Cundinamarca), generar 280 empleos directos y 431 empleos indirectos.
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	El proyecto 4294-Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 6.109.892.265, con un aporte territorial de \$ 387.296.102 y un aporte nación de \$ 5.722.596.163, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 21.515 personas ubicadas en Cajicá (Cundinamarca), generar 86 empleos directos y 135 empleos indirectos.
Transporte	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	El proyecto 4296-Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 83.380.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 83.380.000.000, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 770.855 personas ubicadas en Cajicá (Cundinamarca), Chía (Cundinamarca), Cota (Cundinamarca), El Rosal (Cundinamarca), Facatativá (Cundinamarca), Funza (Cundinamarca), Madrid (Cundinamarca), Mosquera (Cundinamarca), Tabio (Cundinamarca), Tenjo (Cundinamarca), generar 1.167 empleos directos y 2.008 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	El proyecto 4295-Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.867.430.423, con un aporte territorial de \$ 367.430.423 y un aporte nación de \$ 1.500.000.000, cuenta con un avance físico del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.638 personas ubicadas en Chocontá (Cundinamarca), generar 26 empleos directos y 45 empleos indirectos.

## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Agricultura y Desarrollo Rural	32	-	23	9
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	3	-
Cultura	4	-	3	1
Deporte y Recreación	7	-	6	1



Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Inclusión Social y Reconciliación	1	-	1	-
Planeación	2	-	-	2
Transporte	2	-	2	-
<b>Total, general</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>13</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

### 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$145.444	\$19.934	14%	\$125.509	86%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$42.642	\$0	0%	\$42.642	100%
Cultura	\$127.984	\$21.773	17%	\$106.211	83%
Deporte y Recreación	\$101.316	\$19.283	19%	\$82.033	81%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.110	\$387	6%	\$5.723	94%
Planeación	\$10.270	\$0	0%	\$10.270	100%
Transporte	\$85.247	\$367	0%	\$84.880	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$519.013</b>	<b>\$61.745</b>	<b>12%</b>	<b>\$457.268</b>	<b>88%</b>

### 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2022

87%

### EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

#### Total, Ejecución 2021 – 2024 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$145.444	\$78.952	54%	\$96.927	67%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$42.642	\$42.642	100%	\$42.642	100%
Cultura	\$127.984	\$100.475	79%	\$122.248	96%
Deporte y Recreación	\$101.316	\$80.641	80%	\$99.924	99%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.110	\$5.723	94%	\$6.110	100%
Planeación	\$10.270	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$85.247	\$84.880	100%	\$85.247	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$519.013</b>	<b>\$393.312</b>	<b>76%</b>	<b>\$453.098</b>	<b>87%</b>



### 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

#### 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2021-2024)

%Avance 100%



% Avance Acumulado 0,42%



Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

#### 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Gestión ambiental y saneamiento básico % Avance: - % Avance Acumulado: --

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Obras de mitigación de riesgo realizadas en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	5	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%


Infraestructura Para la Integración Social % Avance: 100% % Avance Acumulado: 0%

Transporte % Avance: 0% % Avance Acumulado: 0,42%



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías y cicloinfraestructura intervenidas en el marco del Pacto Cundinamarca	32,67	33,23	33,23	100%		Verde	77,10	33,23	1,26%		Rojo	31/12/2022


SEMÁFORO



Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Productores beneficiados con proyectos dirigidos al sector agropecuario en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	3.010	-	-		Gris	

SEMÁFORO



Deporte y Recreación % Avance: - % Avance Acumulado: 0%



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva y recreativa intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	8	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Planeación/ Inclusión Social y Reconciliación/ Cultura % Avance: - % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura pública intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	4	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

### 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

#### Gestión ambiental y saneamiento básico

##### Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Obras de mitigación de riesgo realizadas en el marco del Pacto Cundinamarca	Se tienen los siguientes avances: Intervención ambiental para mitigación del riesgo, Cáqueza: Se suscribió el contrato específico N°2210766 entre ENTerritorio y Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, el 4 de agosto de 2022, por valor de \$10.245 millones. El 25 de octubre de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paima: Se suscribió el contrato específico N°2210813 entre ENTerritorio y el municipio de Paima el 12 de agosto de 2022, por valor de \$3.803 millones. El 8 de



septiembre de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El 25 de octubre se realizó comité operativo y de seguimiento del contrato específico donde el municipio manifiesta la propuesta de realizar una contratación directa con la Agencia Inmobiliaria de Cundinamarca. ENTerritorio envió comunicado al municipio de Paime el 21 de noviembre indicando los análisis jurídicos y técnicos frente a la propuesta y solicitan radicar oficialmente la solicitud. Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca. Se suscribió el contrato específico N°2221015 entre ENTerritorio y el municipio de Ubaque el 8 de septiembre de 2022, por valor de \$28.593 millones. El 25 de octubre de 2022 se aprobaron las garantías del contrato.

## Infraestructura Para la Integración Social

### Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Vías y cicloinfraestructura intervenidas en el marco del Pacto Cundinamarca</b>	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá. Se suscribió el contrato específico N°2210751 entre ENTerritorio y el municipio de Chocontá, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$1.867 millones. El 16 de febrero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El 17 de agosto el municipio adjudicó el proceso de obra al CONSORCIO FEQUEZ, por valor de \$1.512.645.812,22 y el 5 de agosto adjudicó el concurso de méritos al proponente SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S, por valor de \$287.717.010. El 14 de septiembre se suscribió acta de inicio de obra. En reunión del 28 de noviembre la Alcaldía reportó avance de obra del 9,7%, sin embargo, presentan atrasos por ola invernal y están implementando plan de contingencia para cumplir el cronograma pactado. Se suscribió el contrato específico N°2210754 entre ENTerritorio y el ICCU, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$83.380 millones. El 27 de abril se aprobó la garantía por parte de ENTerritorio, quedando legalizado el contrato. Se suscribió modificatorio al contrato específico el 19 de agosto. El ICCU avanzó con proceso de contratación del grupo de gestión predial. Sin embargo, no se han iniciado los demás procesos de contratación derivada (avalúos, obra e interventoría) toda vez que la ANI está haciendo la intervención de unos tramos viales que ocasionaron cambios en los diseños aprobados. ICCU está ajustando información para presentarla al Comité Operativo y de Seguimiento.

### Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Productores beneficiados con proyectos dirigidos al sector agropecuario en el marco del Pacto Cundinamarca</b>	Avanza la ejecución de los siguientes proyectos: 1) CE N°2210753 Plaza mercado de la Sierra, Bituima.; el 5 de octubre adjudicó interventoría al Consorcio Inter Plaza Sierra MJ por valor de \$112.796.000. El 9 de noviembre se suscribió acta de inicio de obra 2) CE N°2210746 Centro de acopio Cerezos Grandes, Chipaque: Se reporta avance de ejecución del 53,7% 3) CE N°2210748 Plaza de mercado Gachetá: inició obras el 27 de julio. Solicitud de prórroga 3 meses por optimización de diseños. 4) CE N°2210728 Centro de acopio Gutiérrez: inició obras el 3 de marzo y reporta avance del 38.2%. 5) CI 906 Edificación mujer tejedora Chipaque: inició obra el 16 de mayo. 6) CI 660 Plaza de mercado Guayabal de Siquima: inició obra el 2 de mayo. 7) CI 742 Plaza de mercado de La Mesa: en ejecución de obras. 8) CI 731 Plaza de mercado San Antonio del Tequendama: en ejecución de obras 9) CI 754 Plaza de mercado de Zipaquira: en ejecución de obras. 10) CE 2220798 Centro de acopio municipio de El Rosal: se suscribió contrato el 5 de agosto de 2022, por valor de \$1.046 millones y el 21 de octubre se aprobaron las garantías. 11) CE 2220951 Plaza de mercado Ricaurte: se suscribió contrato el 23 de agosto de 2022, por valor de \$4.945 millones y el 6 de septiembre se aprobaron las garantías. 12) CE 2220968 Plaza de mercado Ubalá: se suscribió el 23 de agosto de 2022, por valor de \$1.885 millones; el 29 nov se aprobaron las garantías. 13) CE 2221137 Plaza de mercado Agua de Dios. se suscribió el 24 de



Indicador	Avance Cualitativo
	octubre de 2022, por valor de \$10.133 millones; 21 de nov aprobación de garantías. 14) CE 2221143 Plaza de mercado Guayabetal: se suscribió el 31 de octubre de 2022, por valor de \$3.759 millones; en legalización. 15) CE 2221138 Plaza de mercado Machetá: se suscribió el 28 de octubre de 2022, por valor de \$6.081 millones; en legalización. 16) CE 2221134 Plaza de ferias Manta: se suscribió el 27 de octubre de 2022, por valor de \$1.367 millones; 23 nov se aprobaron garantías del contrato. 17) CE 2221135 Plaza de mercado Pulí: se suscribió el 27 de octubre de 2022, por valor de \$2.947 millones; 23 de nov aprobación póliza por Enterritorio.

#### Deporte y Recreación

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura deportiva y recreativa intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca</b>	Avanza la ejecución de los proyectos de estadios, coliseos, escenarios deportivos, así: 1) Adecuación y remodelación estadio municipal Ubaté. Se suscribió el contrato específico N°2210729, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$7.455 millones. El 7 de marzo se aprobaron las garantías del contrato. Se suscribió acta de inicio el 8 de julio. Se reporta avance de ejecución del 57%. 2) Estadio Zipaquirá. Se suscribió el contrato específico N°2210732 el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$21.407 millones. El 16 de febrero se aprobaron las garantías del contrato. Pendiente suscribir acta de inicio. 3) Coliseo de Funza. Se suscribió el contrato específico N°2210731 el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$38.692 millones. El 28 de junio se aprobaron las garantías del contrato. No se han iniciado obras dado que se requiere surtir el trámite modificatorio del contrato específico por aumento de precios. 4) Parque recreo deportivo Los Patos de Tocancipá. Se suscribió el contrato específico N°2210741 el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$20.000 millones. El 12 de enero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. Se suscribió acta de inicio el 2 de agosto y se reporta avance de ejecución del 7,56%. 5) Mejoramiento polideportivos Madrid. El 2 de mayo el Mideporte realizó devolución del proyecto con observaciones. El municipio manifestó que el proyecto será financiado por ICCU lo cual no ha podido ser constatado. 6) Mejoramiento escenario deportivo Jerusalén. Se suscribió el contrato específico N°2221133 el 24 de octubre de 2022, por valor de \$4.185 millones. El 29 nov aprobación de garantías.

#### Planeación/ Inclusión Social y Reconciliación/ Cultura

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura pública intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca</b>	Avanza la ejecución de los proyectos de infraestructura pública intervenida, así: Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá. Se suscribió el contrato específico N°2210738 entre ENTerritorio y el municipio de Cajicá, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$5.722 millones. El 2 de marzo de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El comité operativo y de seguimiento aprobó modificación del contrato específico el cual quedó suscrito el 12 de agosto. El 19 de octubre el municipio adjudicó el proceso LP-006-2022 al Consorcio Construcajicá por valor de \$5.470.186.487 y el 7 de octubre adjudicó el concurso de méritos CM-006-2022 al Consorcio Inter CDI por valor de \$399.712.578. No se ha suscrito acta de inicio de obra.

**4. ANEXOS**
**Proyectos de la matriz, financiados DNP:**

En total son 32 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 393.312 millones, equivalente al 76% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá	En Ejecución	\$743	\$1.142	\$1.142	\$1.885
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$2.481	\$2.481	\$2.481
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	En Ejecución	\$178	\$1.190	\$1.190	\$1.368
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabetal, Cundinamarca	En Ejecución	\$505	\$3.255	\$3.255	\$3.759
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$212	\$882	\$882	\$1.093
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutierrez, Cundinamarca	En Ejecución	\$568	\$1.137	\$1.137	\$1.705
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana	En Ejecución	\$0	\$3.642	\$3.642	\$3.642
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte	En Ejecución	\$2.606	\$2.339	\$2.339	\$4.945
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá	En Ejecución	\$2.696	\$3.386	\$3.386	\$6.082
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - centro funcional Quetame	En Ejecución	\$0	\$24.588	\$24.588	\$24.588
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; II etapa, Chipaque	En Ejecución	\$0	\$2.194	\$2.194	\$2.194
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima,, Cundinamarca	En Ejecución	\$362	\$1.242	\$1.242	\$1.603
Agricultura y Desarrollo Rural	Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí	En Ejecución	\$0	\$2.948	\$2.948	\$2.948
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima	En Ejecución	\$0	\$1.586	\$1.586	\$1.586
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$10.133	\$10.133	\$10.133
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Fómeque, Cundinamarca	En Ejecución	\$2.331	\$13.762	\$13.762	\$16.092





Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal	En Ejecución	\$0	\$1.046	\$1.046	\$1.046
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca	En Ejecución	\$272	\$2.000	\$2.000	\$2.272
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$28.593	\$28.593	\$28.593
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$10.246	\$10.246	\$10.246
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paime, departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$3.803	\$3.803	\$3.803
Cultura	Ampliación y reforzamiento estructural del teatro Roberto Mac Douall de Zipaquirá	En Ejecución	\$7.447	\$39.732	\$39.732	\$47.178
Cultura	Construcción Centro cultural y de Convenciones Tierra de artistas del municipio de Zipaquirá Cundinamarca	En Ejecución	\$13.526	\$46.000	\$46.000	\$59.526
Cultura	Construcción del Centro Cultural en Gachancipá	En Ejecución	\$800	\$14.744	\$14.744	\$15.544
Deporte y Recreación	Adecuación y remodelación estadio municipal Ubaté	En Ejecución	\$0	\$7.455	\$7.455	\$7.455
Deporte y Recreación	Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	En Ejecución	\$10.722	\$15.000	\$15.000	\$25.722
Deporte y Recreación	Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca	En Ejecución	\$4.692	\$34.000	\$34.000	\$38.692
Deporte y Recreación	Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$4.185	\$4.185	\$4.185
Deporte y Recreación	Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	En Ejecución	\$0	\$20.000	\$20.000	\$20.000
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	En Ejecución	\$387	\$5.723	\$5.723	\$6.110
Transporte	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$83.380	\$83.380	\$83.380
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	En Ejecución	\$367	\$1.500	\$1.500	\$1.867
<b>Total, general</b>			<b>\$48.414</b>	<b>\$393.312</b>	<b>\$393.312</b>	<b>\$441.726</b>

Millones de \$ COP
