



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
28/05/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/03/2023

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Casanare como un eje dinamizador de crecimiento y productividad a través de la identificación y ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la conectividad, la equidad y al desarrollo económico y social.

### Líneas Temáticas:

- Desarrollo económico y social
- Vías para la equidad
- Infraestructura social


### TEMAS ESTRATEGICOS

El tres de marzo de 2023 se realizó el quinto Consejo Directivo, en el que se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Inversiones en el que se aprobó modificar el PEI pasando de priorizar 22 iniciativas estratégicas a 19, por un valor indicativo de \$579.164.992.120, de los cuales \$383.928.131.445 son aportes de la Nación y \$195.236.860.675 aportes de las entidades territoriales.

- Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Casanare generará cerca de 8.108 empleos directos y 13.837 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 444.602 habitantes del área de influencia del Pacto Casanare.

### Área de Intervención: Casanare

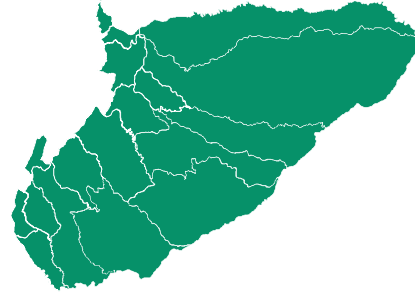

#### Departamento:

**Casanare**, 19 municipios del departamento de Casanare, así: Yopal, Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luís de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva.

Fecha de suscripción: 27/02/2021

Fecha de terminación: 27/02/2026

Plazo: 5 años

#### Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$579.165 (100%)
Nación (%)	\$383.928 (66%)
Territorio y otros (%)	\$195.237 (34%)

#### Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$306.381 (53%)
Compromiso Nación	\$241.012
Compromiso Territorio	\$65.368

Proyectos en ejecución	\$298.153 (8 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$10.639 (2 proyectos)



**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

Proyectos financiados por el Fondo Regional de Pactos Territoriales con Contratos Específicos en Ejecución:

#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
1	Construcción de obras de protección sobre el río Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare	Municipio de Orocué	Ejecución Contratos Derivados	30/09/2023	20,9%	*El 05.Ene.2023, se suscribió el Acta de inicio de la interventoría *El 10.Ene.2023, se suscribió el Acta de inicio de Obra *El 17 feb 2023, se realizó comité operativo y de seguimiento del CE. *El 08 Mar 2023, se solicita la radicación del informe mensual de ejecución (febrero) *El 14 Mar 2023, por parte de la entidad ejecutora se radica el informe mensual (febrero), reportando un avance de 20,09% contra un programa del 4,18%
2	Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de la Selva - Parque del Arroz, Granja del Adulto Mayor - intersección Caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare	Municipio de Aguazul	Proceso contratación derivada	21/09/2025	0,00%	El 30.dic.2022, se suscribió el contrato de obra. *El 31.dic.2022, se suscribió el contrato de interventoría. *De acuerdo con la información del Secop: la interventoría tiene acta de inicio del 1 de febrero de 2023 *De acuerdo con la información del Secop: la obra no tiene acta de inicio *La entidad ejecutora no ha presentado informes correspondientes a los meses de enero, febrero de 2023. *El 30.Mar.2023 se realizó mesa de trabajo, en la cual la entidad se



#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	% Avance	Observación
						comprometió a radicar toda la documentación pendiente el día 3 de abril de 2023.

## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Ambiente y Desarrollo Sostenible	5	2	3	-
Comercio Industria y Turismo	3	-	1	2
Deporte y Recreación	1	-	-	1
Transporte	9	-	3	6
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	1	-	1	-
<b>Total, general</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

### 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$81.958	\$4.586	6%	\$77.373	94%
Comercio Industria y Turismo	\$65.755	\$65.755	100%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$24.569	\$5.500	22%	\$19.069	78%
Transporte	\$404.046	\$118.242	29%	\$285.804	71%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$2.837	\$1.155	41%	\$1.683	59%
<b>Total, general</b>	<b>\$579.165</b>	<b>\$195.237</b>	<b>34%</b>	<b>\$383.928</b>	<b>66%</b>

### 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2023



## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

### Total, Ejecución 2021 – 2026 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$81.958	\$27.959	34%	\$78.824	96%



Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Comercio Industria y Turismo	\$65.755	\$0	0%	\$11.355	17%
Deporte y Recreación	\$24.569	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$404.046	\$64.296	16%	\$213.364	53%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$2.837	\$0	0%	\$2.837	100%
<b>Total general</b>	<b>\$579.165</b>	<b>\$92.255</b>	<b>16%</b>	<b>\$306.380</b>	<b>53%</b>

### 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

#### 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2023)

(2021-2026)

%Avance 0%



% Avance Acumulado 0%



Fecha de corte: 31 de marzo de 2023

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de producto y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

#### 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Desarrollo económico y social % Avance: - % Avance Acumulado: -

Comercio Industria y Turismo % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Casanare	0	-	-	-	Gris	3	-	-	Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Infraestructura social % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%



Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Obras de mitigación de riesgo entregadas en el marco del Pacto Casanare	0	-	2	0%		Rojo	5	0	0%		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vivienda Ciudad y Territorio- Agua % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura para el saneamiento básico intervenida en el marco del Pacto Casanare	0	-	1	-		Rojo	1	-	-		Rojo	31/03/2023

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Vías para la equidad % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

Transporte % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Casanare	0	-	8	-		Rojo	24	0	-		Rojo	31/03/2023



SEMÁFORO



<60%

≥80%

### 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

#### Desarrollo económico y social

##### Comercio Industria y Turismo

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura turística intervenida en el marco del Pacto Casanare</b>	A corte 31 de marzo de 2023, se encuentra en ejecución el proyecto Construcción del punto de información turística y centro de artesanías en el Parque del Arroz del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare con una inversión de \$ 11.354.926.038, cuenta con un avance físico del 22 % y financiero del 48 %. Los demás proyectos se encuentran en estructuración.

#### Infraestructura social

##### Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Obras de mitigación de riesgo entregadas en el marco del Pacto Casanare</b>	<p>A corte 31 de marzo de 2023, se han entregados dos Obras de mitigación de riesgo en el marco del Pacto Casanare que son: Construcción de obras de mitigación y protección para control de fenómeno de remoción en masa en el sector de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Sabanalarga con una inversión de \$1.139.307.625, en el que se realizó la construcción de un muro de contención de 50,93 metros lineales para la protección y estabilización del sector de la planta de tratamiento de agua potable; y el proyecto Construcción de obras de protección sobre la rivera del Rio Meta o el casco urbano del municipio de Orocué con una inversión de \$ 9.499.832.703, en el que se realizó la construcción de 245 ml bolsacretos y dos muros de contención de 17 metros c/u.</p> <p>También se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: Construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección del Rio Cravo sur margen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización El Paraíso del municipio de Yopal con un avance físico del 47.6 % y financiero del 5.73%; Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué y el proyecto Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, ambos se encuentran en perfeccionamiento de la contratación derivada..</p>

##### Vivienda Ciudad y Territorio- Agua

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura para el saneamiento básico intervenida en el marco del Pacto Casanare</b>	A corte 31 de marzo de 2023, se avanza en la ejecución del proyecto: Construcción de la planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario centro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey departamento de Casanare con una inversión de \$ 2.837.352.875, cuenta con un avance físico del 10 % y financiero del 40 %.



Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Vías intervenidas en el marco del Pacto Casanare</b>	A corte 31 de marzo de 2023, se cuenta con un avance de 10,2 km en vías intervenidas en el marco del Pacto Casanare que corresponde al proyecto: Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní con una inversión de \$ 19.218.145.490, cuenta con un avance físico y financiero del 97 %. También se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo con una inversión de \$ 45.077.794.822, cuenta con avance físico y financiero del del 80,14 % correspondiente a una longitud de intervención de 16,72 km ; y el proyecto Mejoramiento a nivel de pavimento en mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - Orocué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) municipio de Orocué con una inversión de \$ 149.068.107.059, con acta de inició del 6 de marzo de 2023. Los demás proyectos se encuentran en proceso de estructuración.



#### 4. ANEXOS

##### Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total, al corte de esta información, son 4 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 92.255 millones equivalente al 16% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Com-prometido
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare	En Ejecución	\$0	\$0	\$9.448	\$9.448
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.	En Ejecución	\$0	\$0	\$18.511	\$18.511
Transporte	Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare	En Ejecución	\$0	\$0	\$19.218	\$19.218
Transporte	Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare	En Ejecución	\$0	\$0	\$45.078	\$45.078
<b>Total, general</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$92.255</b>	<b>\$92.255</b>

Cifras en millones de pesos
