



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
28/05/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2023

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos priorizados del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (POMCA) y del Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios ecosistémicos de la cuenca hidrográfica del río Bogotá

Líneas Temáticas:


- Ordenamiento y gobernanza ambiental

TEMAS ESTRATÉGICOS

El 9 de marzo de 2023 en la sesión No. 3 del Consejo Directivo del Pacto fue modificado el Plan Estratégico de Inversiones, se pasó de 7 iniciativas estratégicas a 6 iniciativas para ser implementadas en el marco del Pacto Río Bogotá, con un valor indicativo de \$ 34.074.672.070, de los cuales \$22.050.095.527 son aporte indicativo de la Nación y \$12.024.576.543 del territorio.

Se estima que el Pacto Río Bogotá generaría cerca de 475 empleos directos y 774 indirectos. Así mismo, es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 2,4 millones habitantes del área de influencia de la Cuenca del Río Bogotá que comprende 46 municipios y el Distrito Capital.

Área de Intervención: 46 municipios y el Distrito Capital

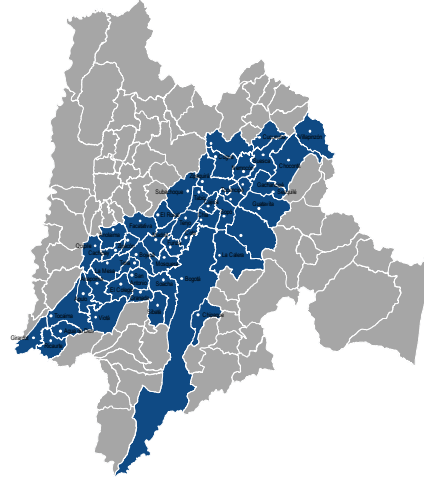

Departamento:	46 municipios y el Distrito Capital del Departamento de Cundinamarca
Fecha de suscripción:	30/06/2021
Fecha de terminación:	30/06/2026
Plazo:	5 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$34.075 (100%)
Nación (%)	\$22.050 (65%)
Territorio y otros (%)	\$12.025 (35%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$26.487 (78%)
Compromiso Nación	\$20.485
Compromiso Territorio	\$ 6.002

Proyectos en ejecución	\$26.487 (2 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$ 0 (0 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.

Proyectos financiados por el Fondo Regional de Pactos Territoriales con Contratos Específicos en Ejecución:

#	Nombre corto Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Fecha de terminación	Porcentaje de Avance	Observación
1	Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento de la calidad del agua en zonas de interés o priorizadas sobre la cuenca del Río Bogotá, Cundinamarca	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR	Proceso contratación derivada	17/01/2025	0,00%	*El 13 de marzo de 2023 se firmó acta de inicio del contrato de Suministro No. 2110 de 2023 por una duración de 11 meses

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Ambiente y Desarrollo Sostenible	6	-	2	4
Total, general	6		2	4

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$34.075	\$12.025	35%	\$22.050	65%
Total general	\$34.075	\$12.025	35%	\$22.050	65%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2023



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2026
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$34.075	\$11.997	35%	\$26.487	78%
Total general	\$34.075	\$11.997	35%	\$26.487	78%



3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2023)

(2021-2026)

%Avance 0%



% Avance Acumulado 0%



Fecha de corte: 31 de marzo de 2023

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Ordenamiento y gobernanza ambiental

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Áreas restauradas en el marco del Pacto Río Bogotá	0	0	765	0%		Rojo	1.265	0	0%		Rojo	31/03/2023
Estaciones de monitoreo de la calidad del agua optimizadas en el marco del Pacto Río Bogotá	0	0	7	0%		Rojo	12	0	0%		Rojo	31/03/2023
Personas beneficiadas de estrategias de participación y educación ambiental en el marco del	0	0	300	0%		Rojo	1.000	0	0%		Rojo	31/03/2023



Indicador	Línea Base	Avance 2023	Meta 2023	% Avance	Semáforo	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
Pacto Río Bogotá										

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Ordenamiento y gobernanza ambiental

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Áreas restauradas en el marco del Pacto Río Bogotá	El Proyecto "Implementación de un proceso de restauración ecológica como medida de adaptación al cambio climático en Cundinamarca", será ejecutado mediante un convenio de cooperación interadministrativo entre CAR y Gobernación de Cundinamarca. El Proyecto "Implementación de acciones de restauración en el municipio de Suesca Cundinamarca", se encuentra estructurado y en definición de cierre financiero. El Plan Estratégico de inversiones fue ajustado el 9 de marzo de 2023 con la inclusión del proyecto denominado "Fortalecimiento de la producción de material vegetal arbustivo y arbóreo para la recuperación de la cobertura arbórea en el departamento de Cundinamarca", que reemplaza el proyecto "Producir y sembrar un millón de árboles a través de la implementación de diez centros regionales de propagación vegetal en Cundinamarca". Actualmente se encuentra en priorización por parte de la Gobernación para su financiamiento a través de las regalías del departamento.
Estaciones de monitoreo de la calidad del agua optimizadas en el marco del Pacto Río Bogotá	El proyecto "Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá", inició su fase de ejecución en marzo del 2023. El Proyecto "Fortalecer la red de monitoreo en la Cuenca Alta del río Bogotá", se encuentra estructurado y será ejecutado a través de un convenio entre la CAR y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Personas beneficiadas de estrategias de participación y educación ambiental en el marco del Pacto Río Bogotá	Se encuentra en estructuración el proyecto "Fortalecimiento y Transferencia de conocimiento en el marco de la educación ambiental en el departamento de Cundinamarca". El Plan Estratégico de inversiones fue ajustado el 9 de marzo de 2023 con la inclusión del proyecto denominado "Fortalecimiento de la producción de material vegetal arbustivo y arbóreo para la recuperación de la cobertura arbórea en el departamento de Cundinamarca", que reemplaza el proyecto "Producir y sembrar un millón de árboles a través de la implementación de diez centros regionales de propagación vegetal en Cundinamarca". Actualmente se encuentra en priorización por parte de la Gobernación para su financiamiento a través de las regalías del departamento.



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

1 proyecto cofinanciado en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 11.997 millones, equivalente al 35% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Com-prometido
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca del río Bogotá.	En Ejecución	\$2.641	\$11.997	\$11.997	\$14.638
Total, general			\$2.641	\$11.997	\$11.997	\$14.638

Millones de \$ COP
