


# Pacto **BICENTENARIO** Ficha trimestral, junio de 2024.



**\$ 2,5** Billones

### Recursos aportados

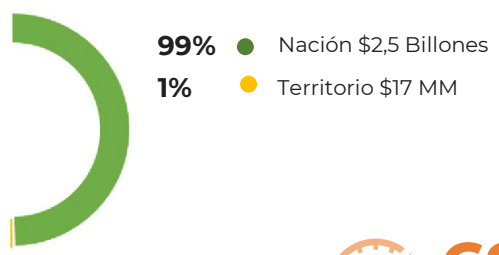

**33** Proyectos financiados



**69%**  
Avance consolidado

## Pacto Territorial Bicentenario

26/06/2019 Fecha suscripción	10 Plazo en años	26/06/2029 Fecha de Terminación	59 Meses para vencimiento	50% % Tiempo Transcurrido
71 Total Proyectos		\$3,654,888 Valor Indicativo (Millones)		
\$2,446,680 Aporte indicativo nación (Millones)	\$1,208,209 Aporte indicativo territorio (Millones)	\$0 Aporte indicativo otros (Millones)		


### Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Comercio Industria y Turismo	\$224,888	\$65,680	\$159,209	\$0
Transporte	\$3,430,000	\$2,381,000	\$1,049,000	\$0
<b>Total</b>	<b>\$3,654,888</b>	<b>\$2,446,680</b>	<b>\$1,208,209</b>	<b>\$0</b>

### Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

68.66%	\$2,509,429 Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado
--------	--


### Número de Proyectos por Estado

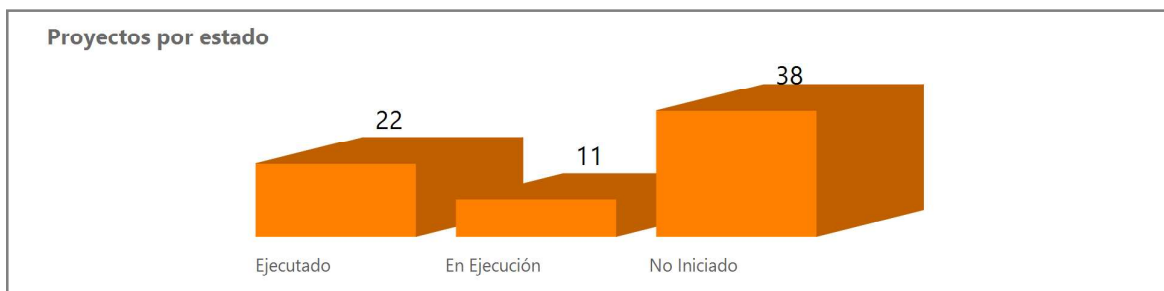

### Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ejecutado	Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca	\$8,020	\$0	\$8,020	\$0
Ejecutado	Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander	\$5,540	\$0	\$5,540	\$0

Ejecutado	Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.	\$1,646	\$1,246	\$400	\$0
Ejecutado	Revitalización Puente del Común	\$1,415	\$0	\$1,415	\$0
Ejecutado	Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional	\$1,150	\$1,150	\$0	\$0
Ejecutado	Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander	\$946	\$0	\$946	\$0
Ejecutado	Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario	\$946	\$0	\$946	\$0
Ejecutado	Plan de Promoción y Fortalecimiento Turístico – "turismo 200" en la vitrina turística de ANATO 2020, 2021 y 2022.	\$680	\$680	\$0	\$0
Ejecutado	Programa de Formación Exportadora	\$600	\$600	\$0	\$0
Ejecutado	Programa de Formación Exportadora Capítulos "Pacto Bicentenario" y "Ruta Cusiana"	\$390	\$390	\$0	\$0
Ejecutado	Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena"	\$350	\$0	\$350	\$0
Ejecutado	Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.	\$316	\$0	\$316	\$0
Ejecutado	Elaboración del inventario turístico de los 30 municipios que hacen parte del Pacto Bicentenario	\$283	\$283	\$0	\$0

 Departamento Nacional de Planeación		FICHA TRIMESTRAL PACTOS TERRITORIALES			Página 3 De 7	
Ejecutado	Programa de capacitación empresarial "Experiencia del producto turístico Ruta Leyenda El Dorado"	\$220	\$220	\$0	\$0	
Ejecutado	Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario	\$200	\$200	\$0	\$0	
Ejecutado	Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander.	\$200	\$200	\$0	\$0	
Ejecutado	Fomento a la cultura turística de los actores de la cadena del turismo de los municipios de Pore, Socorro, Tame, Paipa y Chía	\$198	\$198	\$0	\$0	
Ejecutado	Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.	\$141	\$141	\$0	\$0	
Ejecutado	Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa.	\$69	\$69	\$0	\$0	
Ejecutado	Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander.	\$50	\$50	\$0	\$0	
Ejecutado	Becas para diplomado en Agroturismo.	\$48	\$48	\$0	\$0	
Ejecutado	Programa de Formación Exportadora Cápsulas de formación en ventas, comercialización y estrategias digitales dirigidas a actores de la cadena de valor del sector	\$44	\$44	\$0	\$0	
En Ejecución	Zipacquirá - Chiquinquirá-Barbosa	\$750,000	\$525,000	\$225,000	\$0	
En Ejecución	Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche - Chiquinquirá	\$620,000	\$434,000	\$186,000	\$0	
En Ejecución	Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena	\$600,000	\$420,000	\$180,000	\$0	
En Ejecución	Ruta de los Libertadores: Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo	\$520,000	\$364,000	\$156,000	\$0	

En Ejecución	Duitama – Charalá - San Gil	\$500,000	\$350,000	\$150,000	\$0
En Ejecución	Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal	\$230,000	\$161,000	\$69,000	\$0
En Ejecución	Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul)	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0
En Ejecución	Construcción del parque temático lineal alusivo a la Batalla de Pienta.	\$12,826	\$12,826	\$0	\$0
En Ejecución	Parque turístico Piedras del Tunjo - conexión con Regiotram	\$3,500	\$945	\$2,555	\$0
En Ejecución	Programa de formación en inglés para actores de la cadena de valor del sector turístico en Colombia	\$500	\$500	\$0	\$0
En Ejecución	Identificación y fortalecimiento de 40 experiencias de turismo creativo, asociado a la economía naranja (proyecto con impacto nacional, seis experiencias de los departamentos del Pacto Bicentenario)	\$147	\$147	\$0	\$0
No Iniciado	BTS: Tibasosa - Sogamoso	\$110,000	\$77,000	\$33,000	\$0
No Iniciado	Centro interinstitucional y embarcadero de Topocoro fase II	\$31,000	\$8,370	\$22,630	\$0
No Iniciado	Mejoramiento sitio histórico Puente de Boyacá	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0
No Iniciado	Casona de San Gil fase II	\$30,000	\$8,100	\$21,900	\$0
No Iniciado	Centro interinstitucional y embarcadero de Topocoro fase I	\$18,000	\$0	\$18,000	\$0
No Iniciado	Casona de San Gil fase I	\$10,425	\$10,425	\$0	\$0
No Iniciado	Producto ecoturístico de senderismo campaña Ruta Libertadora	\$8,800	\$0	\$8,800	\$0
No Iniciado	Restauración y reforzamiento estructural de la Hacienda El Salitre	\$7,693	\$0	\$7,693	\$0
No Iniciado	Mirador ecoturístico de la Peña del Cabro del municipio de Málaga, Santander	\$5,000	\$1,350	\$3,650	\$0
No Iniciado	Construcción nodo turístico Puente del Común	\$4,800	\$0	\$4,800	\$0
No Iniciado	Estudios, diseños y construcción Megaparque Nimaima - Gualivá	\$4,000	\$1,080	\$2,920	\$0

No Iniciado	Construcción parques temáticos de La Ruta Libertadora (Pore - Nunchía - Tamara - Paz de Ariporo - Hato Corozal)	\$3,675	\$0	\$3,675	\$0
No Iniciado	Gestión para el fortalecimiento de las conexiones de conectividad terrestre a sitios de interés turístico y a atractivos (mejoramientos y construcción de infraestructura en miradores)	\$2,940	\$0	\$2,940	\$0
No Iniciado	Diseño y construcción de senderos representativos en los atractivos turísticos del departamento de Casanare (Laguna del Tinije, San Miguel de Farallones, Wisirare, Lagunazo)	\$2,940	\$794	\$2,146	\$0
No Iniciado	Remodelación del parque principal del casco urbano del municipio de Coromoro de Santander	\$2,785	\$0	\$2,785	\$0
No Iniciado	Identificación y conceptualización del Paisaje Cultural Llanero de Colombia PCLC de Casanare	\$2,500	\$675	\$1,825	\$0
No Iniciado	1 estudio de mercados para Bicentenario	\$2,500	\$2,500	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción mirador Guane en el municipio de Zapatoca departamento de Santander	\$2,338	\$0	\$2,338	\$0
No Iniciado	Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame.	\$2,000	\$540	\$1,460	\$0
No Iniciado	Estructuración de rutas y circuitos del Bicentenario y temáticas complementarias	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0
No Iniciado	Misiones académicas para conocer la estructuración del producto bicentenario en México	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0
No Iniciado	Misiones comerciales para la oferta de rutas y circuitos resultantes	\$1,500	\$1,500	\$0	\$0

No Iniciado	Diseño, fabricación, suministro e instalación de señalización vial, peatonal e interpretativa que oriente el acceso a los municipios, y en los principales atractivos turísticos en los 10 Municipios del Corredor de los Llanos del Departamento de Casanare	\$1,200	\$324	\$876	\$0
No Iniciado	Desarrollo de productos turísticos	\$1,200	\$1,200	\$0	\$0
No Iniciado	Estrategia de internacionalización para destinos maduros con apoyo de Procolombia	\$1,200	\$1,200	\$0	\$0
No Iniciado	Constitución de la red turística del Bicentenario	\$800	\$800	\$0	\$0
No Iniciado	Implementación de señalización turística de los centros históricos de Suesca, Chía y Tame.	\$800	\$800	\$0	\$0
No Iniciado	Plan de Promoción Nacional del Bicentenario	\$600	\$600	\$0	\$0
No Iniciado	Participación de la Red en eventos turísticos nacionales	\$500	\$500	\$0	\$0
No Iniciado	Rutas de aviturismo de los Llanos y Selvas de transición hacia la Amazonía	\$433	\$433	\$0	\$0
No Iniciado	Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander	\$250	\$68	\$183	\$0
No Iniciado	Fortalecimiento del producto turístico de biciturismo en municipios del bicentenario	\$200	\$100	\$100	\$0
No Iniciado	Promoción del Bicentenario a través de la campaña nacional #yovoy.	\$100	\$100	\$0	\$0
No Iniciado	Promoción del municipio de Suesca, haciendo referencia al producto turístico deportivo de escalada en roca, en el marco de un evento deportivo.	\$100	\$100	\$0	\$0
No Iniciado	Estrategia de comercialización turística diseñada para los corredores turísticos de Colombia y los destinos Bicentenario	\$69	\$69	\$0	\$0

No Iniciado	Manual de avistamiento responsable de fauna silvestre en la Orinoquía colombiana (Arauca, Casanare, Vichada y Meta)	\$60	\$60	\$0	\$0
No Iniciado	Fortalecimiento de capacidades en experiencia al cliente de la cadena de valor del sector turismo	\$37	\$37	\$0	\$0
No Iniciado	Fortalecimiento de los emprendimientos turísticos comunitarios con un enfoque competitivo dirigido hacia la comercialización y promoción.	\$19	\$19	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>\$3,654,888</b>	<b>\$2,446,680</b>	<b>\$1,208,209</b>	<b>\$0</b>

### Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

<b>0</b> Total Proyectos	Valor Indicativo (Millones)					
Aporte indicativo DNP FRPT	Aporte indicativo territorio	Aporte indicativo Sector			Aporte indicativo Otros	
Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
<b>Total</b>						

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Bicentenario.aspx>



# Anexo

Fichas detalle de proyectos en ejecución y/o  
ejecutados  
sector transporte.

## Pacto Territorial Bicentenario

**Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa**

Via primaria mejorada Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa

### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2018011000034
<b>Ejecutor</b>	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
<b>Fecha de suscripción</b>	
<b>Fecha de inicio</b>	
<b>Plazo inicial</b>	
<b>Fecha fin inicial</b>	
<b>Fecha fin actualizada</b>	
<b>Plazo final</b>	
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$557,367,997,532.00

### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor inicial</b>	\$498,787,947,913.00	\$0.00	\$0.00	\$498,787,947,913.00
<b>Adiciones</b>	\$58,580,049,619.00			\$58,580,049,619.00
<b>Valor total</b>	<b>\$557,367,997,532.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>557,367,997,532.00</b>

### Modificaciones contractuales

Modificación	Fecha	Descripción
--------------	-------	-------------

### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	0989/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO VIAL MHC 063
<b>Fecha de suscripción</b>	13/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$465,288,090,475.00
<b>Adiciones</b>	\$58,580,049,619.00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$523,868,140,094.00

<b>No. contrato de interventoría</b>	0971/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO ICEACSA -TPF
<b>Fecha de suscripción</b>	5/12/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$33,499,857,438.00
<b>Adiciones</b>	\$0.00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$33,499,857,438.00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 37.21% a fecha 31/03/2024

La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021. A través de los recursos de la Nación, el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado al Consorcio Vial MHC 063, conformado por MHC Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles y Mario Alberto Huertas Cotes, por un valor de \$465.288 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 63.8 km en el corredor mencionado. Actualmente se encuentra pendiente por definir la fuente del aporte territorial.

Por parte de las Entidades se han realizado 0 desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

### Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena

Mejoramiento del corredor vial en pavimento flexible, en una longitud total de 85.85 kilómetros, mediante intervención por tramos.

Tramos a intervenir: PR8+250 al PR19+100 (Pamplona y Labateca) PR21+000 al PR58+000(Labateca y Toledo) PR77+000 al PR115+000(Toledo)

#### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2018011000444
<b>Ejecutor</b>	Instituto Nacional de Vías INVIAS / SMCN
<b>Fecha de suscripción</b>	21/05/2022
<b>Fecha de inicio</b>	7/01/2021
<b>Plazo inicial</b>	109
<b>Fecha fin inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha fin actualizada</b>	31/08/2030
<b>Plazo final</b>	109
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$417,974,542,827.00

#### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor inicial</b>	\$390,933,880,228.00	\$0.00	\$0.00	\$390,933,880,228.00
<b>Adiciones</b>	\$27,040,662,599			\$27,040,662,599
<b>Valor total</b>	<b>\$417,974,542,827.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>417,974,542,827.00</b>

#### Modificaciones contractuales

Modificación	Fecha	Descripción
Adición		Adición por valor de \$ 27.040.662.599

#### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	0988/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063
<b>Fecha de suscripción</b>	21/05/2022
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$362,133,900,815.00
<b>Adiciones</b>	\$27,040,662,599.00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$389,174,563,414.00

<b>No. contrato de interventoría</b>	1013/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188
<b>Fecha de suscripción</b>	18/05/2022
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$28,799,979,413.00
<b>Adiciones</b>	\$0.00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$28,799,979,413.00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 13.57% a fecha 31/03/2024

Programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021. A través de los recursos de la Nación, el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado al Consorcio Vías Colombia 063 conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia e Hidalgo e Hidalgo Sucursal Colombia, por un valor de \$362.134 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 47 km en el corredor mencionado. Actualmente se encuentra pendiente por definir la fuente del aporte territorial.

Por parte de las Entidades se han realizado 2 desembolsos por valor de \$59,122,000,000.00

La obra espera finalizar el 31/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deech6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

**Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo**

via primaria mejorada 129 km

### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2017011000301
<b>Ejecutor</b>	Instituto Nacional de Vías - INVIAS - SMCN
<b>Fecha de suscripción</b>	13/05/2021
<b>Fecha de inicio</b>	25/06/2021
<b>Plazo inicial</b>	98
<b>Fecha fin inicial</b>	31/08/2029
<b>Fecha fin actualizada</b>	31/08/2029
<b>Plazo final</b>	98
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$370,249,700,000.00

### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor inicial</b>	\$350,189,730,108.00	\$0.00	\$0.00	\$350,189,730,108.00
<b>Adiciones</b>	\$20,059,969,892			\$20,059,969,892
<b>Valor total</b>	<b>\$370,249,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>370,249,700,000.00</b>

### Modificaciones contractuales

Modificación	Fecha	Descripción
Adición		Adición por valor de \$ 20.059.969.892

### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	0978/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO VIAS NACIONALES
<b>Fecha de suscripción</b>	13/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2029
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2029
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$322,790,000,000.00
<b>Adiciones</b>	\$20,059,969,892.00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$342,849,969,892.00

<b>No. contrato de interventoría</b>	1038/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
<b>Fecha de suscripción</b>	21/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2029
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2029
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$27,399,730,108.00
<b>Adiciones</b>	\$0.00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$27,399,730,108.00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 26.00% a fecha 31/03/2024

Programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021. A través de los recursos de la Nación, el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado al Consorcio PCT San Boy, conformado por Procopal y Castro Tcherassi, por un valor de \$310.625 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 41 km en el corredor mencionado. Actualmente se encuentra pendiente por definir la fuente del aporte territorial.

Por parte de las Entidades se han realizado 1 desembolsos por valor de \$43,935,748,182.00

La obra espera finalizar el 31/08/2029

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

**Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá**

via primaria mejorada

### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2018011000507
<b>Ejecutor</b>	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
<b>Fecha de suscripción</b>	
<b>Fecha de inicio</b>	
<b>Plazo inicial</b>	
<b>Fecha fin inicial</b>	
<b>Fecha fin actualizada</b>	
<b>Plazo final</b>	
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$439,966,980,571.00

### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor inicial</b>	\$417,694,981,716.00	\$0.00	\$0.00	\$417,694,981,716.00
<b>Adiciones</b>	\$22,271,998,855			\$22,271,998,855
<b>Valor total</b>	<b>\$439,966,980,571.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>439,966,980,571.00</b>

### Modificaciones contractuales

Modificación	Fecha	Descripción
--------------	-------	-------------

### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	0973/2021
<b>Contratista</b>	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES "SUDINCO" S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
<b>Fecha de suscripción</b>	20/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2029
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2029
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$387,695,087,388.00
<b>Adiciones</b>	\$19,271,998,855.00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$406,967,086,243.00



<b>No. contrato de interventoría</b>	0962/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO ECOVISION-188
<b>Fecha de suscripción</b>	5/08/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	14/12/2029
<b>Fecha terminación actual</b>	14/12/2029
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$29,999,894,328.00
<b>Adiciones</b>	\$3,000,000,000.00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$32,999,894,328.00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 27.30% a fecha 31/03/2024

Programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021. A través de los recursos de la Nación, el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado al Consorcio Grosud, conformado por la Sociedad Grodco CI Ingenieros Civiles y Sudinco Sucursal Colombia, por un valor de \$358.872 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 43.7 km en el corredor mencionado. Actualmente se encuentra pendiente por definir la fuente del aporte territorial.

Por parte de las Entidades se han realizado 0 desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deech6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

Duitama – Charalá - San Gil

via secundaria mejorada

### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2019011000264
<b>Ejecutor</b>	Instituto Nacional de Vías - INVIAS - SVR
<b>Fecha de suscripción</b>	14/05/2021
<b>Fecha de inicio</b>	29/06/2021
<b>Plazo inicial</b>	114
<b>Fecha fin inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha fin actualizada</b>	31/08/2030
<b>Plazo final</b>	114
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$353,225,143,093.00

### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor inicial</b>	\$338,225,143,093.00	\$0.00	\$0.00	\$338,225,143,093.00
<b>Adiciones</b>	\$15,000,000,000			\$15,000,000,000
<b>Valor total</b>	<b>\$353,225,143,093.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>353,225,143,093.00</b>

### Modificaciones contractuales

Modificación	Fecha	Descripción
Adición		Adición por valor de \$ 14.002.090.382
Adición		Adición por valor de \$ 997.909.618

### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	987/2021
<b>Contratista</b>	MINCIVIL S.A
<b>Fecha de suscripción</b>	14/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$310,625,154,993.00
<b>Adiciones</b>	\$14,002,090,382.00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$324,627,245,375.00

<b>No. contrato de interventoría</b>	1015/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
<b>Fecha de suscripción</b>	18/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$27,599,988,100.00
<b>Adiciones</b>	\$997,909,618.00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$28,597,897,718.00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 19.00% a fecha 31/03/2024

Programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021. A través de los recursos de la Nación, el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado al Consorcio PCT San Boy, conformado por Procopal y Castro Tcherassi, por un valor de \$310.625 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 41 km en el corredor mencionado. Actualmente se encuentra pendiente por definir la fuente del aporte territorial.

Por parte de las Entidades se han realizado 0 desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el 31/08/2030

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deech6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

### Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal

via secundaria mejorada

#### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2019011000264
<b>Ejecutor</b>	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
<b>Fecha de suscripción</b>	
<b>Fecha de inicio</b>	
<b>Plazo inicial</b>	
<b>Fecha fin inicial</b>	
<b>Fecha fin actualizada</b>	
<b>Plazo final</b>	
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$173,084,038,206.00

#### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor inicial</b>	\$152,184,038,206.00	\$0.00	\$0.00	\$152,184,038,206.00
<b>Adiciones</b>	\$ 20,900,000,000			\$ 20,900,000,000
<b>Valor total</b>	<b>\$173,084,038,206.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>173,084,038,206.00</b>

#### Modificaciones contractuales

Modificación	Fecha	Descripción
--------------	-------	-------------

#### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	986/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063
<b>Fecha de suscripción</b>	18/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	18/10/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$137,479,407,106.00
<b>Adiciones</b>	\$20,699,394,560.00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$158,178,801,666.00

<b>No. contrato de interventoría</b>	996/2021
<b>Contratista</b>	CONSORCIO SAINT
<b>Fecha de suscripción</b>	18/05/2021
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/08/2030
<b>Fecha terminación actual</b>	31/08/2030
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$14,704,631,100.00
<b>Adiciones</b>	\$200,605,440.00
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$14,905,236,540.00

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del 19.00% a fecha 31/03/2024

Programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021. A través de los recursos de la Nación, el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado al Consorcio Corredores Viales 063, conformado por la Sociedad Ingeniería de Vías, Explanan SAS e ICM Ingenieros SAS, por un valor de \$137.480 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 21 km en el corredor mencionado. Actualmente se encuentra pendiente por definir la fuente del aporte territorial.

Por parte de las Entidades se han realizado 0 desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISFACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deech6dde94c420b?experience=power-bi>

## Pacto Territorial Bicentenario

**Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul)**

via primaria mejorada

### Información general del contrato

<b>BPIN</b>	2018011000497
<b>Ejecutor</b>	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
<b>Fecha de suscripción</b>	
<b>Fecha de inicio</b>	
<b>Plazo inicial</b>	
<b>Fecha fin inicial</b>	
<b>Fecha fin actualizada</b>	
<b>Plazo final</b>	
<b>Estado</b>	En Ejecución
<b>Valor Contrato</b>	\$156,192,001,710.00

### Esquema financiero del contrato

Fuente financiación	Sector	Territorio	Otros	Total
<b>Valor inicial</b>	\$115,789,495,744	\$0.00	\$0.00	\$115,789,495,744
<b>Adiciones</b>	\$40,402,505,966			\$40,402,505,966
<b>Valor total</b>	<b>\$156,192,001,709.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>156,192,001,710.00</b>

### Modificaciones contractuales

Modificación	Fecha	Descripción
--------------	-------	-------------

### Contratación derivada

<b>No. contrato de obra</b>	1858/2020
<b>Contratista</b>	CONSORCIO VIAL MHC 056
<b>Fecha de suscripción</b>	27/12/2020
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/12/2022
<b>Fecha terminación actual</b>	30/04/2024
<b>Valor inicial contrato de obra</b>	\$109,589,909,864.00
<b>Adiciones</b>	\$35,065,888,532.00
<b>Valor actual contrato de obra</b>	\$144,655,798,396.00

<b>No. contrato de interventoría</b>	1860/2020
<b>Contratista</b>	CONSORCIO TERRA CGS
<b>Fecha de suscripción</b>	24/12/2020
<b>Fecha terminación inicial</b>	31/12/2022
<b>Fecha terminación actual</b>	30/04/2024
<b>Valor inicial contrato de interventoría</b>	\$6,199,585,880.00
<b>Adiciones</b>	\$5,336,617,433.50
<b>Valor actual contrato de interventoría</b>	\$11,536,203,313.50

### Avance del contrato

Las Entidades reporta un avance de obra del **98.00%** a fecha **31/03/2024**

El proyecto 3935-Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 115.789.585.880, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 115.789.585.880, cuenta con un avance físico del 25 % y financiero del 14 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2020. Se espera beneficiar a 246.121 personas ubicadas en Aguazul (Casanare), Pajarito (Boyacá), Sogamoso (Boyacá), generar 1.400 empleos directos y 2.408 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado. Actualmente se encuentra pendiente por definir la fuente del aporte territorial.

Por parte de las Entidades se han realizado **0** desembolsos por valor de

La obra espera finalizar el

Para información adicional puede consultar el sistema de información SISPACTOS del DNP:

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9d742106-796e-4ace-a02f-e679bf3a9e8f/ReportSection2537deecb6dde94c420b?experience=power-bi>
