




Pacto CASANARE

Ficha trimestral - diciembre 2023



Inversión indicativa

\$577 Mil millones



\$325 MM

Comprometidos


56%
Avance consolidado

Proyectos priorizados

19 proyectos



proyectos no iniciados (en proceso de estructuración o viabilidad sectorial)



Pacto Territorial Casanare

27/02/2021 <small>Fecha suscripción</small>	5 <small>Plazo en años</small>	27/02/2026 <small>Fecha de Terminación</small>	26 <small>Meses para vencimiento</small>	57% <small>% Tiempo Transcurrido</small>
19 <small>Total Proyectos</small>		\$577,324 <small>Valor Indicativo (Millones)</small>		
\$382,087 <small>Aporte indicativo nación (Millones)</small>	\$195,237 <small>Aporte indicativo territorio (Millones)</small>	\$0 <small>Aporte indicativo otros (Millones)</small>		


Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$80,118	\$75,532	\$4,586	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$65,755	\$0	\$65,755	\$0
Deporte y Recreación	\$24,569	\$19,069	\$5,500	\$0
Transporte	\$404,046	\$285,804	\$118,242	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$2,837	\$1,683	\$1,155	\$0
Total	\$577,324	\$382,087	\$195,237	\$0

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

56.36%	\$325,361 <small>Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado</small>
--------	---

Número de Proyectos por Estado

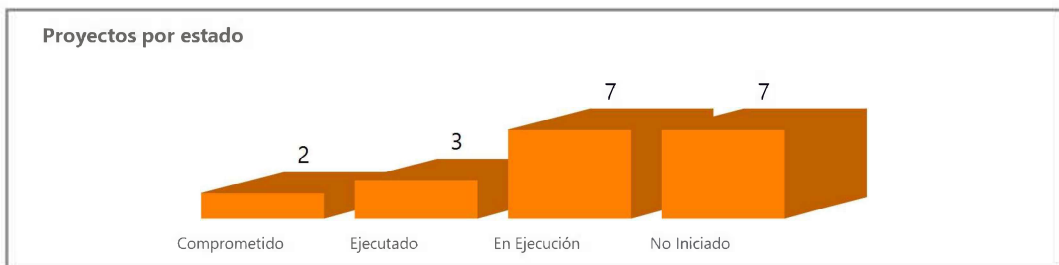

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)



Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Comprometido	Mejoramiento y adecuación de la vía que comunica el casco urbano del municipio de Trinidad con el corregimiento de Bocas del Pauto a orillas del Río Meta - fase I	\$47,240	\$0	\$47,240	\$0
Comprometido	Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.	\$14,992	\$14,992	\$0	\$0
Ejecutado	Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare	\$18,497	\$18,497	\$0	\$0
Ejecutado	Construcción de obras de protección sobre la rivera del río meta o el casco urbano del municipio de Orocué del departamento del Casanare.	\$9,500	\$9,500	\$0	\$0
Ejecutado	Construcción de obras de mitigación y protección para control de fenómeno de remoción en masa en el sector de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Sabanalarga Casanare.	\$1,140	\$1,140	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento a nivel de pavimento en mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - Orocué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) municipio de Orocué departamento de Casanare.	\$149,068	\$100,653	\$48,415	\$0
En Ejecución	Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare	\$45,078	\$45,078	\$0	\$0



En Ejecución	Construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección del Rio Cravo sur margen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización El Paraíso del municipio de Yopal - departamento de Casanare	\$41,518	\$36,933	\$4,586	\$0
En Ejecución	Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.	\$18,511	\$18,511	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción parador y obras de urbanismo en El Parque del Arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare	\$11,355	\$0	\$11,355	\$0
En Ejecución	Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.	\$9,448	\$9,448	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de la planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario centro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey departamento de Casanare	\$2,837	\$1,683	\$1,155	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de vías terciarias a nivel de capa de rodadura, placas huellas y obras de arte en diferentes vías de los municipios del departamento de Casanare	\$59,671	\$50,914	\$8,756	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de la vía entre los municipios de Aguazul - Maní y la vereda La Poyata en el municipio de Maní, departamento de Casanare	\$55,670	\$55,670	\$0	\$0

No Iniciado	Construcción parque lineal ecoturístico y malecón del municipio de Yopal en el departamento de Casanare	\$42,000	\$0	\$42,000	\$0
No Iniciado	Construcción del coliseo departamental en el Polideportivo Pier Lora Muñoz del municipio de Yopal	\$24,569	\$19,069	\$5,500	\$0
No Iniciado	Construcción parque lineal y mirador 360° en la vereda Cuarto Unete del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare	\$12,400	\$0	\$12,400	\$0
No Iniciado	Mejoramiento a nivel de capa de rodadura de la vía que conduce de Monterralo - Los Lirios en el municipio de Aguazul - a Visinaca municipio de Tauramena , departamento de Casanare	\$9,728	\$0	\$9,728	\$0
No Iniciado	Mejoramiento a nivel de pavimento del tramo vial que conduce desde el casco urbano de municipio de Nunchía al sector la Y vereda Buenos Aires del municipio de Nunchía, departamento de Casanare	\$4,103	\$0	\$4,103	\$0
Total		\$577,324	\$382,087	\$195,237	\$0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

3 Total Proyectos	\$42,951 Valor Indicativo (Millones)
-----------------------------	--

\$42,951 Aporte indicativo DNP FRPT	\$0 Aporte indicativo territorio	\$0 Aporte indicativo Sector	\$0 Aporte indicativo Otros
---	--	--	---------------------------------------

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.	En Ejecución	\$9,448	\$9,448	\$0	\$0	\$0

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.	En Ejecución	\$18,511	\$18,511	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.	Comprometido	\$14,992	\$14,992	\$0	\$0	\$0
Total		\$42,951	\$42,951	\$0	\$0	\$0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Casanare.aspx>

Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos comprometidos, en ejecución y ejecutados



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Pacto Territorial Casanare	Fecha de Corte 15/12/2023
Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.	Estado Proyecto Comprometido

Información general del contrato específico

\$14,992 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En legalización de permisos, Estado Detallado
---	---

\$14,992 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
--	--	--

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Yopal
BPIN	2021000070026	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	179-2230153	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	101	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	4	Fecha viabilidad	3/27/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 6 km de vías en pavimento flexible. Adicionalmente se construirán 14 alcantarillas de 36".	Vía terciaria mejorada	6 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

16/06/2023 Fecha de Suscripción	11/09/2023 Fecha de Inicio	17 Plazo en Meses	11/02/2025 Fecha Terminación	12,393 Número de Beneficiarios
---	--------------------------------------	-----------------------------	--	--

\$13,818 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$0 Presupuesto Comprometido Territorio
--	---	---

\$13,818 Presupuesto Comprometido Total (millones)
--

Avance físico del proyecto

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado
-----------------------	--------------	-------------

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Casanare

Fecha de Corte

15/12/2023

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$18,511

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución

Estado Detallado

\$18,511

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Aguazul
BPIN	2022850100003	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	129-2220844	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	37	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	8/3/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Canalización de 1800 mts de los caños Aguazulero y Cimarrón mediante revestimiento en concreto reforzado al talud, con zona de transitabilidad.	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1
		Numero de obras de infraestructura


Información específica de ejecución contrato específico

12/08/2022 Fecha de Suscripción	21/11/2022 Fecha de Inicio	26 Plazo en Meses	21/01/2025 Fecha Terminación	5,637 Número de Beneficiarios
\$18,511 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$0 Presupuesto Comprometido Territorio	\$18,511 Presupuesto Comprometido Total (millones)	

Avance físico del proyecto

21/11/2023	26%	30%
-------------------	------------	------------

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado
-----------------------	--------------	-------------

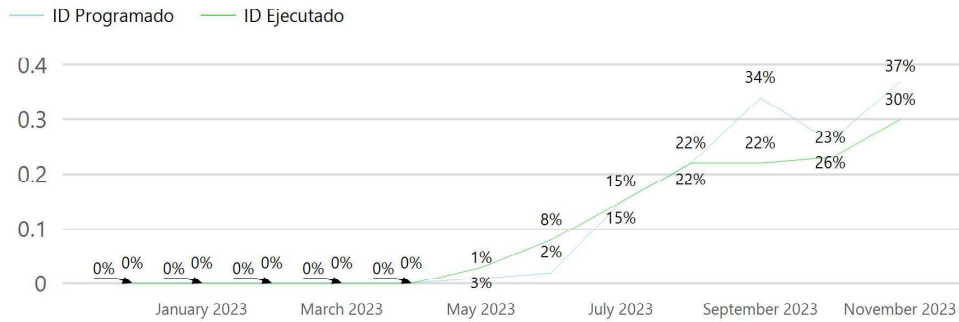

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Casanare	Fecha de Corte 15/12/2023
Construcción de obras de protección sobre el Río Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.	Estado Proyecto En Ejecución

Información general del contrato específico

\$9,448 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En ejecución Estado Detallado
--	---

\$9,448 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)
---	--	--

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Orocué
BPIN	2021852300012	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	124-2220768	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	38	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	8/18/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una obra de infraestructura en geotubos, adecuación de cauce con dragados y conformación de banca, como obra principal para el desarrollo del proyecto, para la mitigación y la atención de desastres en el centro poblado El Algarrobo del municipio de Orocué.	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1 Numero de obras de infraestructura

Información específica de ejecución contrato específico


2/08/2022 Fecha de Suscripción	30/08/2022 Fecha de Inicio	22 Plazo en Meses	10/06/2024 Fecha Terminación	600 Número de Beneficiarios
--	--------------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------

\$9,448 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$0 Presupuesto Comprometido Territorio
---	---	---

\$9,448 Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

30/09/2023 Fecha de Corte Avance	66% % Programado	33% % Ejecutado
--	----------------------------	---------------------------

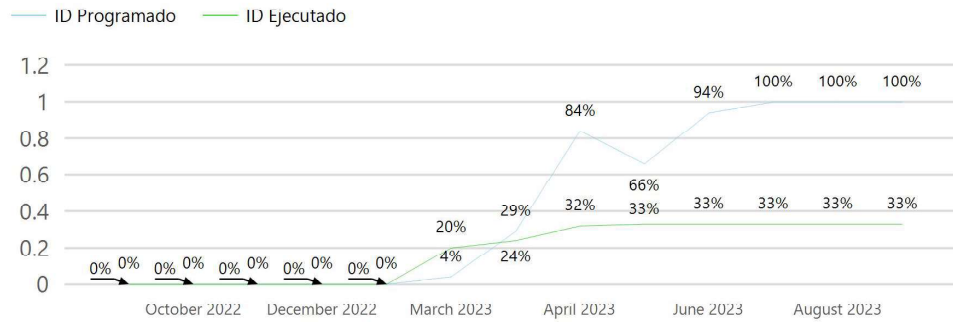

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
