

Pacto Territorial Casanare

27/02/2021 <small>Fecha suscripción</small>	5 <small>Plazo en años</small>	27/02/2026 <small>Fecha de Terminación</small>	14 <small>Meses para vencimiento</small>	77% <small>% Tiempo Transcurrido</small>
19 <small>Total Proyectos</small>	3 <small>Proyectos FRPT</small>	16 <small>Proyectos Otras Fuentes</small>	\$577.324 <small>Valor Indicativo (Millones)</small>	
\$382.087 <small>Aporte indicativo nación (Millones)</small>		\$195.237 <small>Aporte indicativo territorio (Millones)</small>		\$0 <small>Aporte indicativo otros (Millones)</small>

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$80.118	\$75.532	\$4.586	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$65.755	\$0	\$65.755	\$0
Deporte y Recreacion	\$24.569	\$19.069	\$5.500	\$0
Transporte	\$404.046	\$285.804	\$118.242	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$2.837	\$1.683	\$1.155	\$0
Total	\$577.324	\$382.087	\$195.237	\$0

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)


Sector de inversión	Comprometido Total	Consolidado Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$79.124	\$74.381	\$4.742	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$11.355	\$0	\$11.355	\$0
Deporte y Recreacion	\$0	\$0	\$0	\$0
Transporte	\$232.345	\$178.046	\$54.299	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$2.837	\$1.683	\$1.155	\$0
Total	\$325.661	\$254.110	\$71.551	\$0

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

56,41%	<p>\$325.661</p> <p><small>Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado</small></p>
--------	---

Número de Proyectos por Estado

Proyectos por estado



En Ejecución

No Iniciado

Terminado

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Mejoramiento a nivel de pavimento en mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - Orocué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) municipio de Orocué departamento de Casanare.	\$149.068	\$100.653	\$48.415	\$0
En Ejecución	Mejoramiento y adecuación de la vía que comunica el casco urbano del municipio de Trinidad con el corregimiento de Bocas del Pauto a orillas del Río Meta - fase I	\$47.240	\$0	\$47.240	\$0
En Ejecución	Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare	\$45.078	\$45.078	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección del Rio Cravo sur margen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización El Paraiso del municipio de Yopal - departamento de Casanare	\$41.518	\$36.933	\$4.586	\$0

En Ejecución	Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.	\$18.511	\$18.511	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.	\$14.992	\$14.992	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción parador y obras de urbanismo en El Parque del Arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare	\$11.355	\$0	\$11.355	\$0
En Ejecución	Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.	\$9.448	\$9.448	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de la planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario centro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey departamento de Casanare	\$2.837	\$1.683	\$1.155	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de vías terciarias a nivel de capa de rodadura, placas huellas y obras de arte en diferentes vías de los municipios del departamento de Casanare	\$59.671	\$50.914	\$8.756	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de la vía entre los municipios de Aguazul - Maní y la vereda La Poyata en el municipio de Maní, departamento de Casanare	\$55.670	\$55.670	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción parque lineal ecoturístico y malecón del municipio de Yopal en el departamento de Casanare	\$42.000	\$0	\$42.000	\$0

No Iniciado	Construcción del coliseo departamental en el Polideportivo Pier Lora Muñoz del municipio de Yopal	\$24.569	\$19.069	\$5.500	\$0
No Iniciado	Construcción parque lineal y mirador 360° en la vereda Cuarto Unete del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare	\$12.400	\$0	\$12.400	\$0
No Iniciado	Mejoramiento a nivel de capa de rodadura de la vía que conduce de Monterralo - Los Lirios en el municipio de Aguazul - a Visinaca municipio de Tauramena , departamento de Casanare	\$9.728	\$0	\$9.728	\$0
No Iniciado	Mejoramiento a nivel de pavimento del tramo vial que conduce desde el casco urbano de municipio de Nunchía al sector la Y vereda Buenos Aires del municipio de Nunchía, departamento de Casanare	\$4.103	\$0	\$4.103	\$0
Terminado	Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare	\$18.497	\$18.497	\$0	\$0
Terminado	Construcción de obras de protección sobre la rivera del rio meta o el casco urbano del municipio de Orocue del departamento del Casanare.	\$9.500	\$9.500	\$0	\$0
Terminado	Construcción de obras de mitigación y protección para control de fenómeno de remoción en masa en el sector de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Sabanalarga Casanare.	\$1.140	\$1.140	\$0	\$0
Total		\$577.324	\$382.087	\$195.237	\$0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

3 Total Proyectos	\$42.951 Valor Indicativo (Millones)		
\$42.951 Aporte indicativo DNP FRPT	\$0 Aporte indicativo territorio	\$0 Aporte indicativo Sector	\$0 Aporte indicativo Otros

3

Proyectos En Ejecución /Ejecutados

\$42.077

Presupuesto Comprometido (Millones)

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.	En Ejecución	\$9.448	\$9.448	\$0	\$0	\$0
Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.	En Ejecución	\$18.511	\$18.511	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.	En Ejecución	\$14.992	\$14.992	\$0	\$0	\$0
Total		\$42.951	\$42.951	\$0	\$0	\$0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Casanare.aspx>

ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Casanare

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$9.448

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$9.448

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Orocué
BPIN	2021852300012	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	124-2220768	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	38	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	18/08/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una obra de infraestructura en geotubos, adecuación de cauce con dragados y conformación de banca, como obra principal para el desarrollo del proyecto, para la mitigación y la atención de desastres en el centro poblado El Algarrobo del municipio de Orocué.	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1
		Numero de obras de infraestructura

Información específica de ejecución contrato específico

2/08/2022

Fecha de Suscripción

30/08/2022

Fecha de Inicio

31

Plazo en Meses

10/03/2025

Fecha Terminación

600

Número de Beneficiarios

\$9.448

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$299

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$9.747

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

30/06/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

54%

% Ejecutado

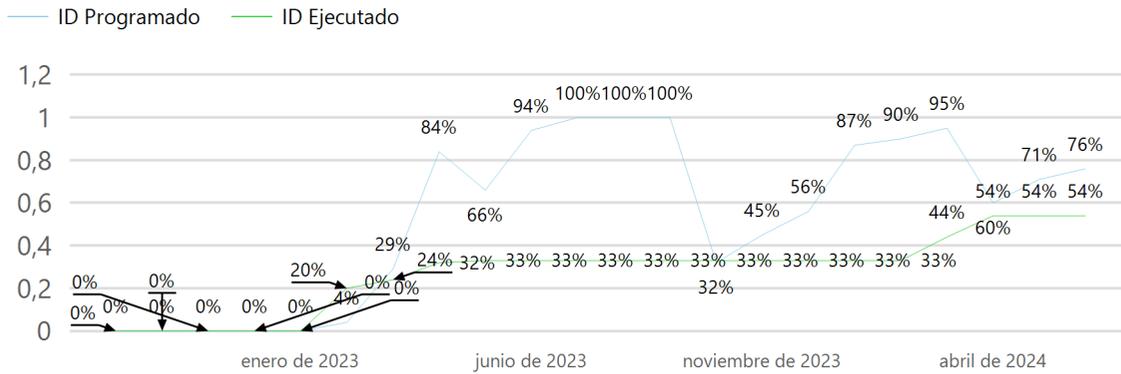


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$9.448
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

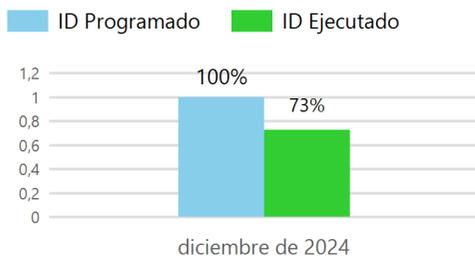

\$6.887
Valor Ejecutado (mill)

73%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Casanare

Fecha de Corte

26/12/2024

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$18.511

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$18.511

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Aguazul
BPIN	2022850100003	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	129-2220844	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	37	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	03/08/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Canalización de 1800 mts de los caños Aguazulero y Cimarrón mediante revestimiento en concreto reforzado al talud, con zona de transitabilidad.	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1
		Numero de obras de infraestructura

Información específica de ejecución contrato específico

12/08/2022

Fecha de Suscripción

21/11/2022

Fecha de Inicio

26

Plazo en Meses

21/01/2025

Fecha Terminación

5.637

Número de Beneficiarios

\$18.511

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$18.511

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

21/06/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

83%

% Ejecutado

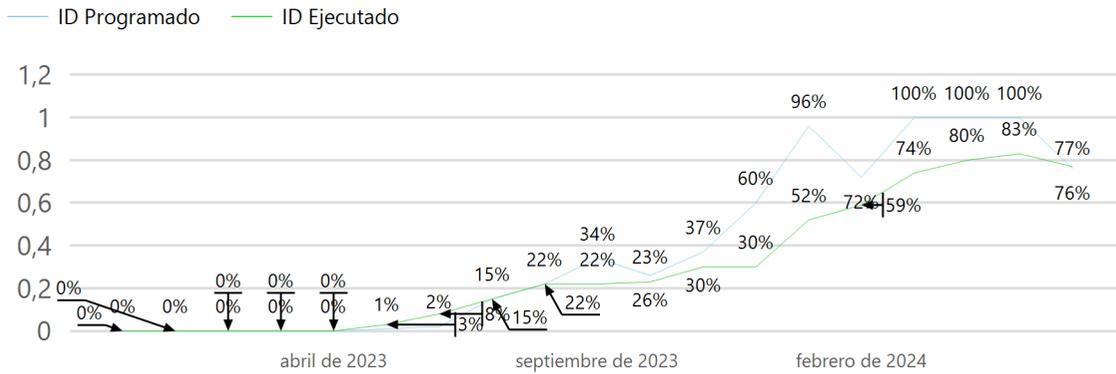


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$18.511
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

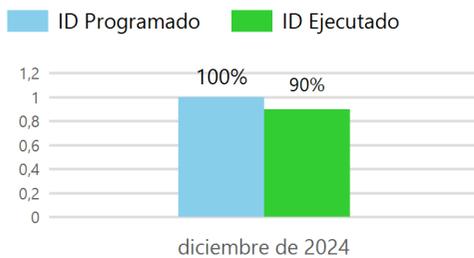

\$16.660
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Casanare

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$14.992

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$14.992

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Yopal
BPIN	2021000070026	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	179-2230153	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	101	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	4	Fecha viabilidad	27/03/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 6 km de vías en pavimento flexible. Adicionalmente se construirán 14 alcantarillas de 36".	Vía terciaria mejorada	6 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

16/06/2023

Fecha de Suscripción

11/09/2023

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

11/02/2025

Fecha Terminación

12.393

Número de Beneficiarios

\$13.818

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$13.818

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

11/10/2024


Fecha de Corte Avance

55%

% Programado

39%

% Ejecutado

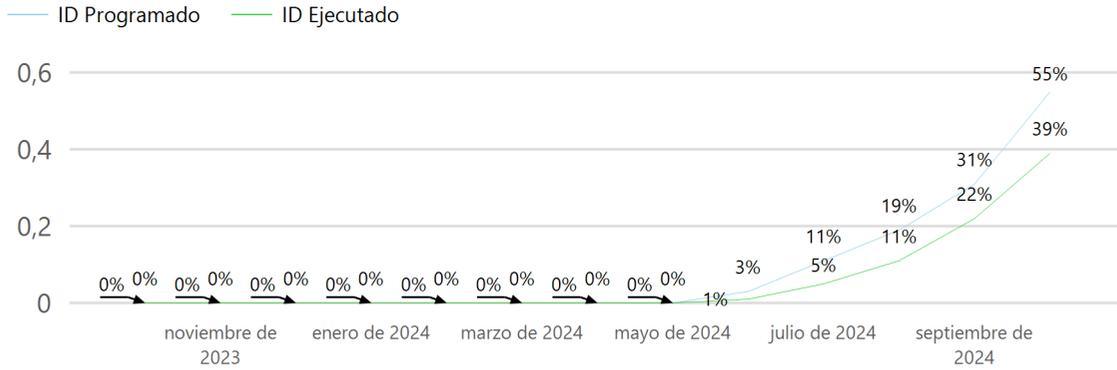

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
