

 Departamento Nacional de Planeación	FICHA TRIMESTRAL PACTOS TERRITORIALES	Página 1 De 14
---	---	----------------

Pacto Territorial Magdalena

22/12/2021 Fecha suscripción	5 Plazo en años	22/12/2026 Fecha de Terminación	24 Meses para vencimiento	61% % Tiempo Transcurrido
97 Total Proyectos	36 Proyectos FRPT	61 Proyectos Otras Fuentes	\$1.267.722 Valor Indicativo (Millones)	
\$1.133.021 Aporte indicativo nación (Millones)		\$134.702 Aporte indicativo territorio (Millones)		\$0 Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	\$77.592	\$3.204	\$74.389	\$0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$47.420	\$47.420	\$0	\$0
Defensa y Policía	\$24.627	\$24.627	\$0	\$0
Deporte y Recreación	\$47.874	\$47.874	\$0	\$0
Interior	\$9.792	\$9.026	\$765	\$0
Minas y Energía	\$30.759	\$5.568	\$25.191	\$0
Transporte	\$943.321	\$918.964	\$24.357	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$86.338	\$76.338	\$10.000	\$0
Total	\$1.267.722	\$1.133.021	\$134.702	\$0

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Comprometido Total	Consolidado Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	\$0	\$0	\$0	\$0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$27.525	\$27.525	\$0	\$0
Defensa y Policía	\$0	\$0	\$0	\$0
Deporte y Recreación	\$23.046	\$22.742	\$305	\$0
Interior	\$3.549	\$3.549	\$0	\$0
Minas y Energía	\$5.593	\$5.568	\$25	\$0
Transporte	\$862.466	\$861.336	\$1.130	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$50.455	\$40.455	\$10.000	\$0
Total	\$972.635	\$961.175	\$11.460	\$0


Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

76,72%

\$972.635

Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado

Número de Proyectos por Estado

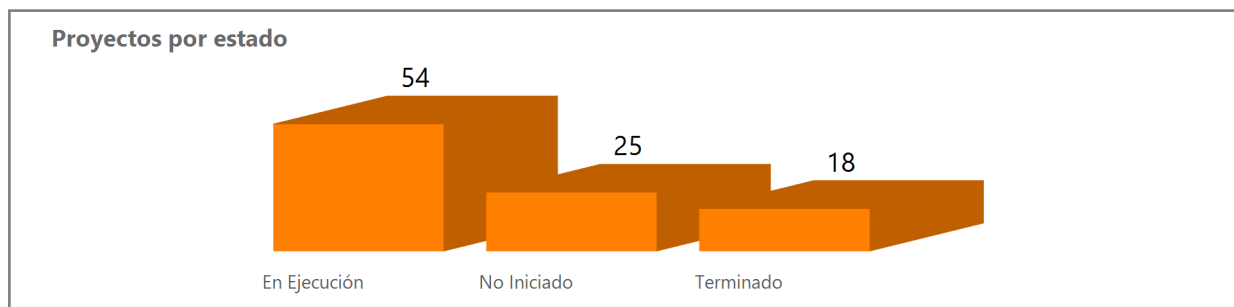

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Conexión puente Pumarejo - Ciénaga	\$700.000	\$700.000	\$0	\$0
En Ejecución	Proyecto de construcción de alcantarillado en el municipio de Ariguani	\$43.000	\$33.000	\$10.000	\$0
En Ejecución	Construcción de canales como estrategia para la mitigación del riesgo por inundación en la zona urbana del municipio de Nueva Granada, departamento del Magdalena.	\$14.226	\$14.226	\$0	\$0
En Ejecución	Control de inundaciones en el municipio de San Zenón	\$13.300	\$13.300	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Real del Obispo - Santa Ines en el municipio de Tenerife, Departamento del Magdalena	\$12.000	\$12.000	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Concordia - Bálsamo del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	\$10.800	\$10.800	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bahiahonda del municipio de Pedraza	\$10.464	\$10.464	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Ariguani - Buenavista en el municipio de Ariguani departamento del Magdalena	\$9.000	\$9.000	\$0	\$0

En Ejecución	Vía Pivijay - San José en el municipio de Pivijay	\$8.999	\$8.999	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía San Basilio - Sabanas, municipio de El Piñón - Magdalena	\$8.733	\$8.733	\$0	\$0
En Ejecución	La Montaña- San Antonio - Santa Ines- Limite Chibolo en el municipio de Tenerife	\$6.900	\$6.900	\$0	\$0
En Ejecución	Adecuación de cancha recreo deportiva de fútbol Finel de los Ríos, ubicada en el municipio de El Reten - Magdalena	\$6.370	\$6.370	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de la cancha de fútbol sector antigua feria del municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena	\$5.700	\$5.700	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Angostura - Janeiro, jurisdicción del municipio de San Zenón - Magdalena	\$5.586	\$5.586	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento De La Calidad De Las Viviendas Rurales A Través De La Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Aracataca, Magdalena	\$5.568	\$5.568	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía desde la Y hasta la loma los mangos sector quebrada seca en el municipio de Aracataca	\$5.547	\$5.547	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción del estadio municipal de Pivijay, Departamento de Magdalena	\$5.056	\$5.056	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía El Bajo - Los Mangos en el municipio de Nueva Granada	\$4.623	\$4.623	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Plato - Cerro Grande en la zona rural del municipio de Plato	\$4.532	\$4.532	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Loma del Bálsamo - Bellavista en el municipio de Algarrobo	\$4.500	\$4.500	\$0	\$0
En Ejecución	Vía la Estrella- Pueblo Nuevo en el municipio de Chibolo	\$4.500	\$4.500	\$0	\$0

En Ejecución	Vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de La Estrella y Canoas en el municipio de Chibolo	\$4.500	\$4.500	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Reten- Las Flores en El Retén en el municipio de El Retén	\$4.500	\$4.500	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Julepe - Puente El Chivo - la Y de Vainillal - Aserradero en el municipio de Salamina	\$4.500	\$4.500	\$0	\$0
En Ejecución	Vía el Reten - Corregimiento el Bongo en el municipio de el Retén.	\$4.485	\$4.485	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Palomar - Bermejál en el municipio de San Zenón	\$4.463	\$4.463	\$0	\$0
En Ejecución	Vía corregimiento Santa Rosa de Lima km 25 de la vía el copey en el municipio de Fundación	\$4.460	\$4.460	\$0	\$0
En Ejecución	Vía que comunica al Corregimiento de Tío Goyo con Sabanas en el municipio de El Piñón	\$4.186	\$4.186	\$0	\$0
En Ejecución	Vía corregimiento Las Palmitas - vía acceso Santa Ana en el municipio de Santa Ana	\$4.157	\$4.157	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Palmor- Mekenkal en el municipio de Ciénaga	\$4.050	\$4.050	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Pinto Nuevo - Veladero en el municipio de Santa Barbara de Pinto	\$3.850	\$3.850	\$0	\$0
En Ejecución	DE BUENAVISTA, MAGDALENA	\$3.813	\$3.813	\$0	\$0
En Ejecución	Vía corregimiento La Colombia - vereda La Bogotana en el municipio de El Retén	\$3.810	\$3.810	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de graderías cancha de fútbol, cerramiento perimetral en el corregimiento de Guaquirí del municipio de Pedraza, Magdalena	\$3.747	\$3.747	\$0	\$0
En Ejecución	corredor vial Tamarindo - Nueva idea en el municipio de Algarrobo	\$3.150	\$3.150	\$0	\$0
En Ejecución	Vía entre los Corregimientos de Caño de Palma y Menchiquejo en el municipio de El Banco	\$3.150	\$3.150	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Garrapata en el municipio de Pivijay	\$2.700	\$2.700	\$0	\$0

En Ejecución	Vía La María en el municipio de Remolino	\$2.700	\$2.700	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía palo prieto – soplador en el municipio de pueblo viejo - departamento de Magdalena	\$2.502	\$2.502	\$0	\$0
En Ejecución	Vías Sevillano a la vereda Mira y Ciénaga - La Aguja en el municipio de Ciénaga	\$2.500	\$2.500	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Sitio Nuevo - Rodeo - Sarcita en el municipio de Sitionuevo	\$2.322	\$2.322	\$0	\$0
En Ejecución	Proyecto Sacúdete al parque Tipo 2 en el municipio de Ariguani	\$2.300	\$1.840	\$460	\$0
En Ejecución	Vía Guaimaro - Aserradero en en el municipio de Salamina	\$1.350	\$1.350	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Loma de Vitaría - Las Marías en el municipio de Santa Ana	\$1.350	\$1.350	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Santa Barbara de Pinto - Cienegueta en el municipio de Santa Barbara de Pinto	\$1.350	\$1.350	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Punta de Piedras - corregimiento Piedras de Moler – Municipio de Zapayán en el departamento del Magdalena	\$1.350	\$1.350	\$0	\$0
En Ejecución	Vía la Flecha - Salao - Julepe – Retirada en el municipio de Salamina	\$851	\$851	\$0	\$0
En Ejecución	Vía el difícil - Buenaventura en el municipio de Ariguani	\$850	\$850	\$0	\$0
En Ejecución	Vía desde la Y de la vereda cruce azul hasta el puente del rio Aracataca en el municipio de Aracataca	\$840	\$840	\$0	\$0
En Ejecución	Vía El Brillante - San Jose de prevención en el municipio del Pijiño del Carmen	\$760	\$760	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Pedraza- Concordia en el municipio de Pedraza	\$690	\$690	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Concordia- Pedraza en el municipio de Concordia	\$686	\$686	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Pivijay-Corregimiento de Canoas en el municipio de Pivijay	\$650	\$650	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Puente aguas negras - Las Balsas en el municipio de Sitionuevo	\$640	\$640	\$0	\$0

No Iniciado	Fortalecimiento de las capacidades productivas y generación de ingresos de la Subregión Río del departamento del Magdalena a través del establecimiento de un sistema de ganadería doble propósito sostenible	\$32.716	\$0	\$32.716	\$0
No Iniciado	Proyecto fotovoltaico para los municipios de Plato, Nueva Granada, Ariguani y Sabanas de San Ángel	\$25.191	\$0	\$25.191	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de vías mediante la construcción de placa huella para los municipios de la Subregión Centro: Sábanas de San Ángel, Ariguani, Nueva granada, Chibolo, Plato y Tenerife	\$24.157	\$0	\$24.157	\$0
No Iniciado	Construcción del comando distrito de policía Zona Bananera, departamento del Magdalena	\$22.627	\$22.627	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de obras para la recuperación hidráulica y mitigación del riesgo del río Sevilla en el corregimiento de Guacamayal del municipio de Zona Bananera	\$19.895	\$19.895	\$0	\$0
No Iniciado	Fortalecimiento de la cadena ovina en los municipios de la Subregión Centro: Sábanas de San Ángel, Ariguani, Nueva granada, Chibolo, Plato y Tenerife	\$19.326	\$0	\$19.326	\$0
No Iniciado	Mejoramiento de las capacidades productivas, socio empresariales y organizacionales a familias campesinas, mediante la implementación de 205 unidades productivas dedicadas a la explotación de ovinos, en el municipio de Aracataca, Magdalena	\$12.018	\$0	\$12.018	\$0
No Iniciado	Apoyo a la reconversión ambiental productiva de la ganadería en los municipios de Sabanas de San Ángel, Nueva Granada, Chibolo, El Reten, Tenerife, Pijiño del Carmen en el departamento del Magdalena	\$10.330	\$0	\$10.330	\$0

No Iniciado	Reposición redes de acueducto en tubería asbesto, cemento en casco urbano municipio de Fundación, Magdalena	\$10.000	\$10.000	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y módulo de estación de bombeo de aguas residuales EBAR, municipio de El Banco, departamento del Magdalena	\$8.201	\$8.201	\$0	\$0
No Iniciado	Implementación de estrategias para la formalización de la propiedad en el suelo urbano del municipio de Aracataca y los corregimientos de Buenos Aires y Sampués departamento del Magdalena	\$5.500	\$5.500	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de estadio de fútbol municipal de la cabecera de San Sebastián De Buenavista - Magdalena	\$5.167	\$5.167	\$0	\$0
No Iniciado	Optimización del sistema de alcantarillado del sector La Alborada municipio de Ciénaga - Magdalena	\$4.952	\$4.952	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción del polideportivo municipal Tirso Armella Zambrano en el municipio de Chibolo Magdalena	\$4.700	\$4.700	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de cancha sintética y parque recreacional "El mundo de las Maravillas" municipio de Santa Ana , Magdalena	\$4.390	\$4.390	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de 130 sistemas sépticos integrados para las familias de la vereda San Antonio del municipio de Sitionuevo	\$4.221	\$4.221	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de una cancha deportiva y zona recreativa Gilberto el Alcatraz García en el barrio La Unión en el casco urbano del municipio de Pueblo Viejo - Magdalena	\$3.907	\$3.907	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción plaza de mercado público del municipio de Plato - Magdalena	\$3.204	\$3.204	\$0	\$0

No Iniciado	Palacio municipal en el municipio de Nueva Granada	\$3.190	\$3.190	\$0	\$0
No Iniciado	Instalación sistema integrado de CCTV del municipio de Sabanas de San Ángel	\$3.051	\$2.746	\$305	\$0
No Iniciado	Construcción de cancha múltiple cubierta en el corregimiento de Concepción, municipio del Cerro de San Antonio	\$2.950	\$2.950	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de canchas deportivas y zonas recreativas - biosaludables en el municipio de Santa Barbara de Pinto - departamento del Magdalena	\$2.862	\$2.862	\$0	\$0
No Iniciado	Estación de Policía El Retén	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de pavimento en concreto rígido en diferentes calles y carreras del municipio de Ariguaní	\$1.241	\$1.241	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de cancha multifuncional en el corregimiento de Corralviejo en el municipio de Remolino	\$1.024	\$1.024	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía Yee de Vainilla - Aserradero, municipio de Salamina - Magdalena	\$7.005	\$7.005	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	\$5.800	\$5.800	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento de la Vía Estación Villa - Sabanas de San Ángel, municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena.	\$5.000	\$5.000	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento de la Vía Ciénaga Zapayán - corregimiento Piedra Moler - Límites con Chibolo, municipio de Zapayán, departamento del Magdalena	\$5.000	\$5.000	\$0	\$0
Terminado	Vía Pedracero - Argelia en el municipio de Ariguaní	\$4.999	\$4.999	\$0	\$0

Terminado	Mejoramiento Vía K21 Los Morones-Cuatro Bocas, Municipio de Guamal - Magdalena	\$4.950	\$4.950	\$0	\$0
Terminado	Plato - Cerro Grande en el municipio del Plato	\$4.500	\$4.500	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía Prevención - Pijiño del Carmen, municipio de Pijiño del Carmen - Magdalena	\$3.812	\$3.812	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento Vía Campo Amor - San Francisco, Municipio de Guamal - Magdalena	\$2.897	\$2.897	\$0	\$0
Terminado	Remodelación y adecuación del parque paraíso en el municipio de Ariguaní- Magdalena	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía Piñuelas Chinoblas en el municipio de Pivijay, Magdalena	\$1.600	\$1.400	\$200	\$0
Terminado	Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal del Caribe Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de Algarrobo departamento del Magdalena.	\$1.473	\$1.473	\$0	\$0
Terminado	Construcción de un sacúdete en el municipio de Sabanas de San Ángel	\$1.250	\$1.250	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía San Angel - Algarrobo, Municipio de Sabanas de San Angel, departamento de Magdalena	\$1.050	\$1.050	\$0	\$0
Terminado	Corregimiento las planadas en el municipio de Plato	\$850	\$850	\$0	\$0
Terminado	Vía vereda Oceanía del municipio de Sabanas de San Ángel	\$800	\$800	\$0	\$0
Terminado	Vía las Américas - Las tinas en el municipio de Nueva Granada	\$710	\$710	\$0	\$0
Terminado	Intersección vía nacional 80 con vereda Aguas Vivas municipio de Plato Magdalena	\$590	\$590	\$0	\$0
Total		\$1.267.722	\$1.133.021	\$134.702	\$0

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

36

\$223.465

Total Proyectos		Valor Indicativo (Millones)			
\$223.265	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0
Aporte indicativo DNP FRPT	Aporte indicativo territorio	Aporte indicativo Sector	Aporte indicativo Otros		
10		\$118.450			
Proyectos En Ejecución /Ejecutados		Presupuesto Comprometido (Millones)			

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal del Caribe Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de Algarrobo departamento del Magdalena.	Terminado	\$1.473	\$1.473	\$0	\$0	\$0
Implementación de estrategias para la formalización de la propiedad en el suelo urbano del municipio de Aracataca y los corregimientos de Buenos Aires y Sampués departamento del Magdalena	No Iniciado	\$5.500	\$5.500	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento De La Calidad De Las Viviendas Rurales A Través De La Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Aracataca, Magdalena	En Ejecución	\$5.568	\$5.568	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Ariguani - Buenavista en el municipio de Ariguani departamento del Magdalena	En Ejecución	\$9.000	\$9.000	\$0	\$0	\$0
Construcción de cancha múltiple cubierta en el corregimiento de Concepción, municipio del Cerro de San Antonio	No Iniciado	\$2.950	\$2.950	\$0	\$0	\$0

Construcción del polideportivo municipal Tirso Armella Zambrano en el municipio de Chibolo magdalena	No Iniciado	\$4.700	\$4.700	\$0	\$0	\$0
Optimización del sistema de alcantarillado del sector La Alborada municipio de Ciénaga - Magdalena	No Iniciado	\$4.952	\$4.952	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Concordia – Bálsamo del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	En Ejecución	\$10.800	\$10.800	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	Terminado	\$5.800	\$5.800	\$0	\$0	\$0
Construcción de módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y módulo de estación de bombeo de aguas residuales EBAR, municipio de El Banco, departamento del Magdalena	No Iniciado	\$8.201	\$8.201	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía San Basilio - Sabanas, municipio de El Piñón - Magdalena	En Ejecución	\$8.733	\$8.733	\$0	\$0	\$0
Adecuación de cancha recreo deportiva de fútbol Finel de los Ríos, ubicada en el municipio de El Retén - Magdalena	En Ejecución	\$6.370	\$6.370	\$0	\$0	\$0
Estación de Policía El Retén	No Iniciado	\$2.000	\$2.000	\$0	\$0	\$0

Reposición redes de acueducto en tubería asbesto, cemento en casco urbano municipio de Fundación, Magdalena	No Iniciado	\$10.000	\$10.000	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento Vía K21 Los Morones- Cuatro Bocas, Municipio de Guamal - Magdalena	Terminado	\$4.950	\$4.950	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento Vía Campo Amor - San Francisco, Municipio de Guamal - Magdalena	Terminado	\$2.897	\$2.897	\$0	\$0	\$0
Construcción de la cancha de fútbol sector antigua feria del municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena	En Ejecución	\$5.700	\$5.700	\$0	\$0	\$0
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bahiahonda del municipio de Pedraza	En Ejecución	\$10.464	\$10.464	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Prevención - Pijiño del Carmen, municipio de Pijiño del Carmen - Magdalena	Terminado	\$3.812	\$3.812	\$0	\$0	\$0
Construcción del estadio municipal de Pivijay, Departamento de Magdalena	En Ejecución	\$5.056	\$5.056	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Piñuelas Chinoblas en el municipio de Pivijay, Magdalena	Terminado	\$1.600	\$1.400	\$200	\$0	\$0
Construcción plaza de mercado público del municipio de Plato - Magdalena	No Iniciado	\$3.204	\$3.204	\$0	\$0	\$0

Construcción de una cancha deportiva y zona recreativa Gilberto el Alcatraz García en el barrio La Unión en el casco urbano del municipio de Pueblo Viejo - Magdalena	No Iniciado	\$3.907	\$3.907	\$0	\$0	\$0
Construcción de cancha multifuncional en el corregimiento de Corralviejo en el municipio de Remolino	No Iniciado	\$1.024	\$1.024	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la Vía Estación Villa – Sabanas de San Ángel, municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena.	Terminado	\$5.000	\$5.000	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía San Angel - Algarrobo, Municipio de Sabanas de San Angel, departamento de Magdalena	Terminado	\$1.050	\$1.050	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Yee de Vainillal - Aserradero, municipio de Salamina - Magdalena	Terminado	\$7.005	\$7.005	\$0	\$0	\$0
Construcción de estadio de fútbol municipal de la cabecera de San Sebastián De Buenavista - Magdalena	No Iniciado	\$5.167	\$5.167	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Angostura - Janeiro, jurisdicción del municipio de San Zenón – Magdalena	En Ejecución	\$5.586	\$5.586	\$0	\$0	\$0
Construcción de cancha sintética y parque recreacional "El mundo de las Maravillas" municipio de Santa Ana , Magdalena	No Iniciado	\$4.390	\$4.390	\$0	\$0	\$0

Construcción de canchas deportivas y zonas recreativas - biosaludables en el municipio de Santa Barbara de Pinto - departamento del Magdalena	No Iniciado	\$2.862	\$2.862	\$0	\$0	\$0
Construcción de 130 sistemas sépticos integrados para las familias de la vereda San Antonio del municipio de Sitionuevo	No Iniciado	\$4.221	\$4.221	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Real del Obispo - Santa Ines en el municipio de Tenerife, Departamento del Magdalena	En Ejecución	\$12.000	\$12.000	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la Vía Ciénaga Zapayán - corregimiento Piedra Moler - Límites con Chibolo, municipio de Zapayán, departamento del Magdalena	Terminado	\$5.000	\$5.000	\$0	\$0	\$0
Construcción de obras para la recuperación hidráulica y mitigación del riesgo del río Sevilla en el corregimiento de Guacamayal del municipio de Zona Bananera	No Iniciado	\$19.895	\$19.895	\$0	\$0	\$0
Construcción del comando distrito de policía Zona Bananera, departamento del Magdalena	No Iniciado	\$22.627	\$22.627	\$0	\$0	\$0
Total		\$223.465	\$223.265	\$200	\$0	\$0

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Magdalena.aspx>

ANEXO

Fondo Regional para los Pactos Territoriales
Proyectos en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal del Caribe Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de Algarrobo departamento del Magdalena.

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$1.473

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En Liquidación

Estado Detallado

\$1.473

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Algarrobo
BPIN	2020470300002	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	162-2221186	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	110	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	16/03/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejoramiento de 460.22 metros con pavimento hidráulico y la intervención de puntos críticos para mejorar las condiciones de drenaje superficial, en la vía comprendida entre la Troncal del Caribe iniciando en el corregimiento Loma del Bálsamo hacia el corregimiento de Bellavista	Vía terciaria mejorada	0,46 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

22/12/2022

Fecha de Suscripción

28/02/2023

Fecha de Inicio

10

Plazo en Meses

28/12/2023

Fecha Terminación

3.135

Número de Beneficiarios

\$1.471

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$1.471

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

28/12/2023


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

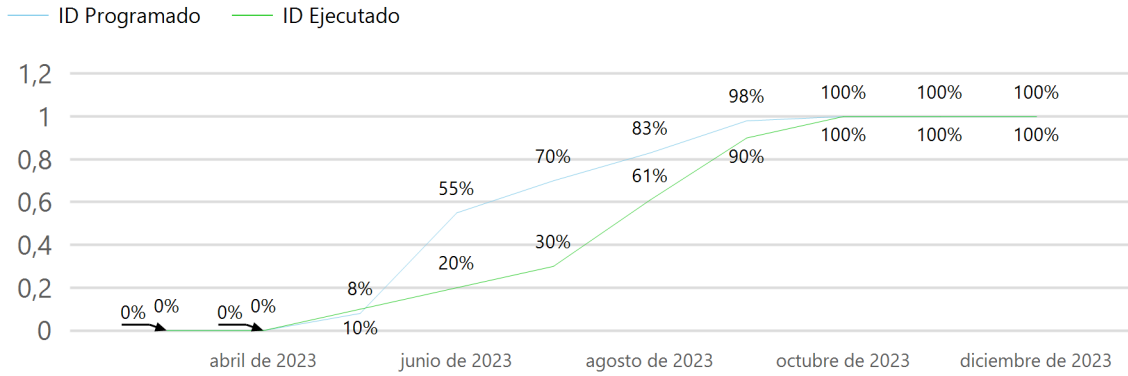

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, departamento del Magdalena

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$5.800

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$5.800

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Concordia
BPIN	2022472050024	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	169-2230013	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	118	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	21/11/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 1.6 km de vías en pavimento rígido. Adicionalmente, se construirá 1 alcantarilla y 5 box coulvert	Vía terciaria mejorada	1,6 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

17/02/2023

Fecha de Suscripción

3/03/2023

Fecha de Inicio

11

Plazo en Meses

3/02/2024

Fecha Terminación

1.500

Número de Beneficiarios

\$5.651

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$5.651

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

3/02/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

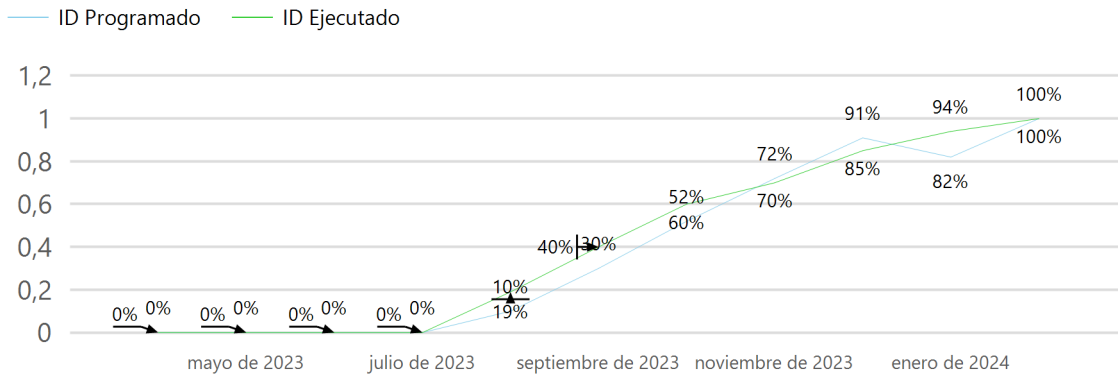


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$5.651
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

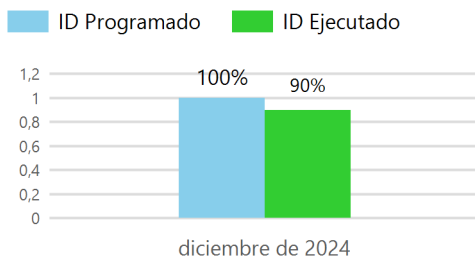

\$5.086
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la vía Concordia – Bálamo del municipio de Concordia,
departamento del Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$10.800

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$10.800

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Concordia
BPIN	2022472050023	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	170-2230021	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	117	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	21/11/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 2.98 km de vías en pavimento rígido. Adicionalmente, se construirá 4 alcantarillas y 5 box coulvert	Vía terciaria mejorada	2,98 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

17/02/2023

Fecha de Suscripción

3/03/2023

Fecha de Inicio

22

Plazo en Meses

18/01/2025

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$10.785

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$10.785

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

3/07/2024


Fecha de Corte Avance

86%

% Programado

78%

% Ejecutado

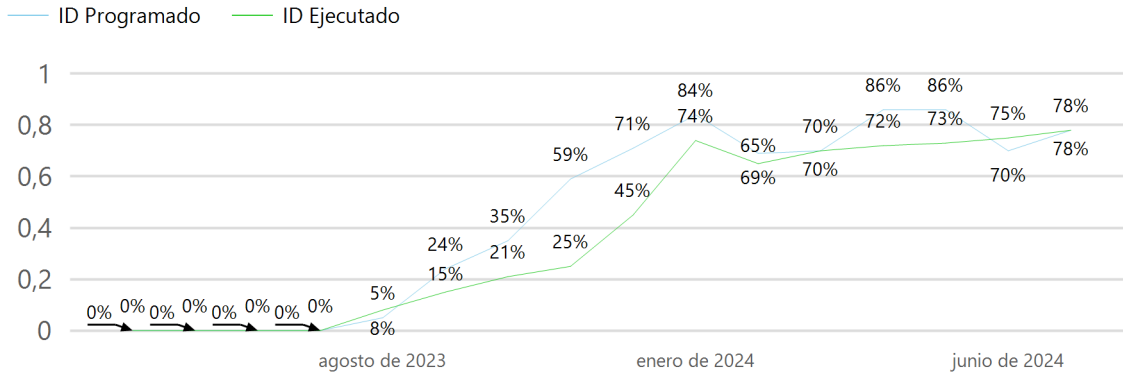

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la vía Real del Obispo - Santa Ines en el municipio de Tenerife, Departamento del Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$12.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$12.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Tenerife
BPIN	2022477980002	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	171-2230022	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	142	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	23/11/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Alcance: Intervención de 7.2km - construcción de 4.415 km de pavimento rígido, distribuidos en 5 tramos - construcción de 7 alcantarillas.	Vía terciaria mejorada	4,4 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

22/02/2023

Fecha de Suscripción

5/04/2023

Fecha de Inicio

21

Plazo en Meses

19/01/2025

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$11.909

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$11.909

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

5/10/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

93%

% Ejecutado

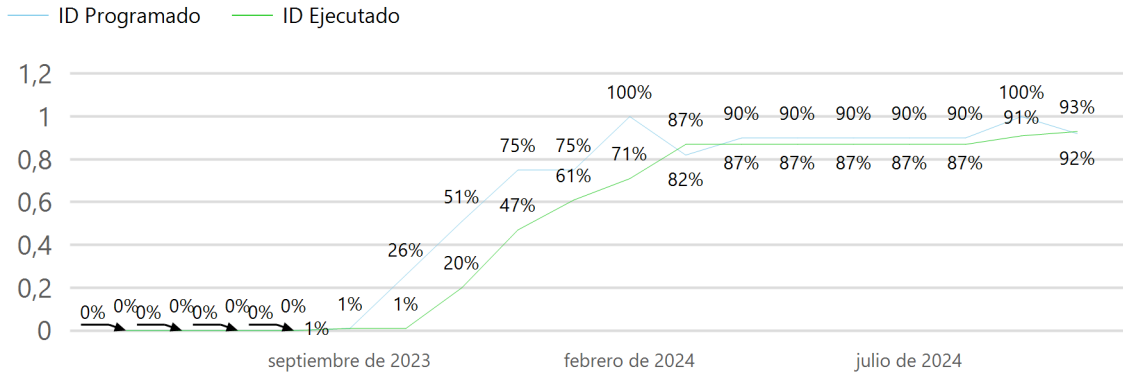

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la vía Piñuelas Chinoblas en el municipio de Pivijay,
Magdalena

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$1.600

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$1.400

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$200

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Pivijay
BPIN	2022475510036	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	172-2230109	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	129	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	19/12/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejoramiento de la vía que conduce del Corregimiento de Piñuelas al Corregimiento de Chinoblas en el municipio de Pivijay departamento del Magdalena en una longitud de 651,00 metros, donde se va a hacer una intervención en pavimento rígido que beneficiará a 3.500 habitantes.	Vía terciaria mejorada	0,651

Información específica de ejecución contrato específico

8/05/2023

Fecha de Suscripción

6/06/2023

Fecha de Inicio

8

Plazo en Meses

6/02/2024

Fecha Terminación

3.500

Número de Beneficiarios

\$1.400

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$200

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$1.600

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/02/2024


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

100%

% Ejecutado

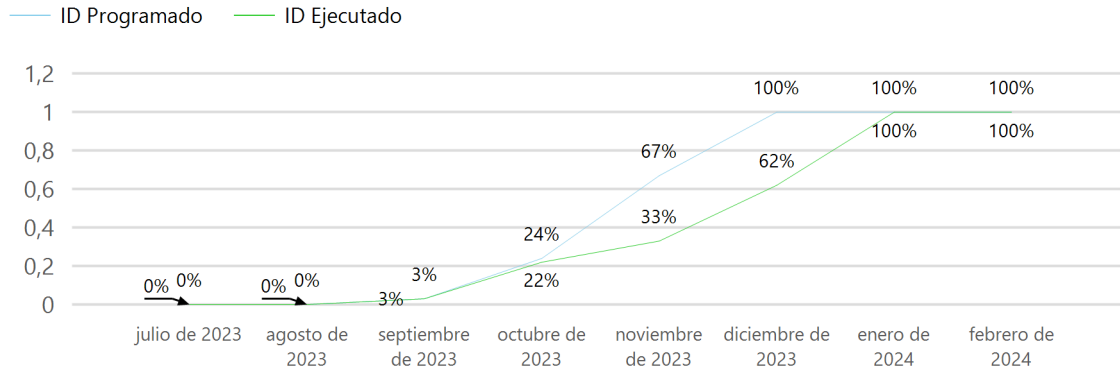

Avance Financiero del proyecto

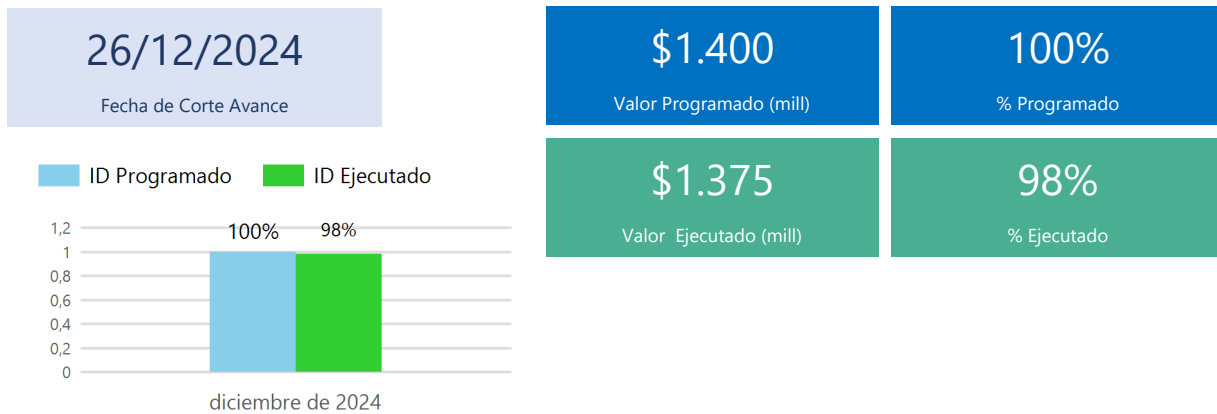

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la vía Yee de Vainilla - Aserradero, municipio de
Salamina - Magdalena

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$7.005

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$7.005

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Salamina
BPIN	2022476750101	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	173-2230143	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	136	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	16/11/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 2.4 km de vía en pavimento rígido. Adicionalmente, se construirán 5 obras de drenaje.	Vía terciaria mejorada	2,4 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

15/06/2023

Fecha de Suscripción

13/07/2023

Fecha de Inicio

14

Plazo en Meses

13/09/2024

Fecha Terminación

2.200

Número de Beneficiarios

\$7.005

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$7.005

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

13/08/2024


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

100%

% Ejecutado

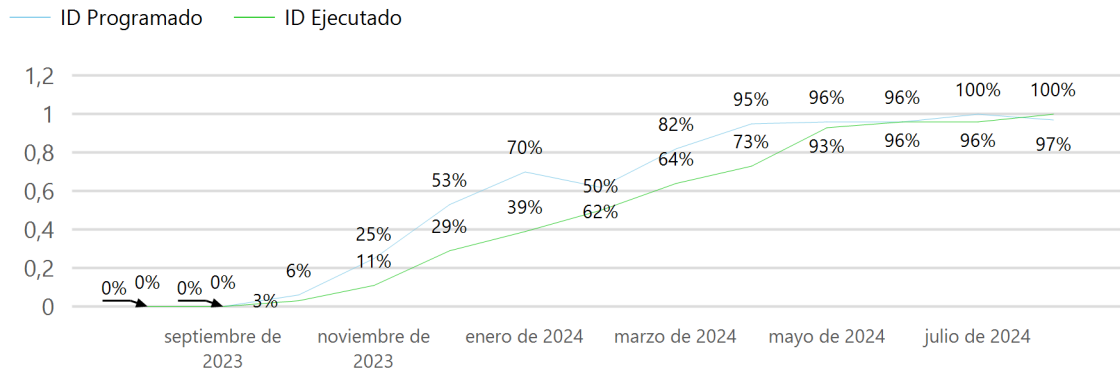

Avance Financiero del proyecto

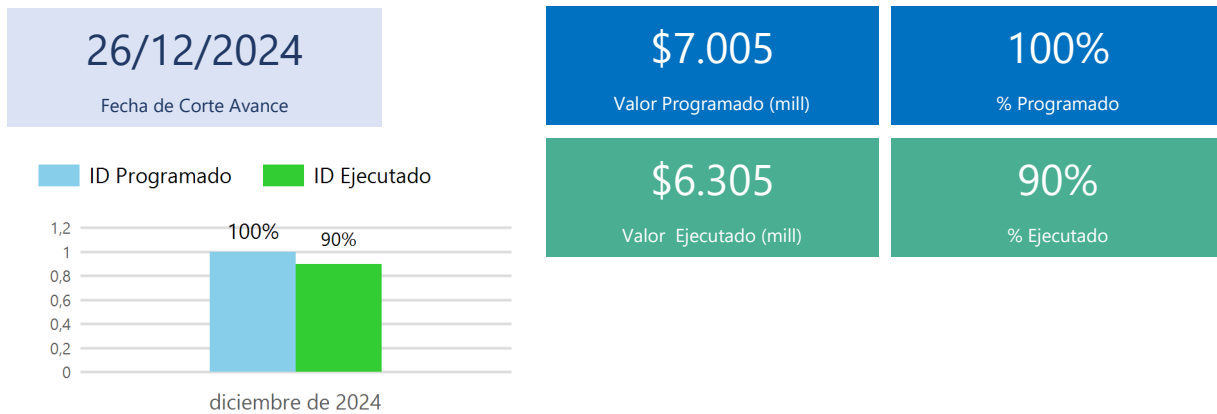

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la vía Ariguani - Buenavista en el municipio de Ariguani
departamento del Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$9.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$9.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Ariguani
BPIN	2022470580032	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	174-2230145	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	113	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	16/03/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 6.2 km de vías en placa huella. Adicionalmente se construirán 10 alcantarillas de 36´.	Vía terciaria mejorada	6,2 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

16/06/2023

Fecha de Suscripción

13/07/2023

Fecha de Inicio

19

Plazo en Meses

18/02/2025

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$9.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$9.000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

13/10/2024


Fecha de Corte Avance

98%

% Programado

83%

% Ejecutado

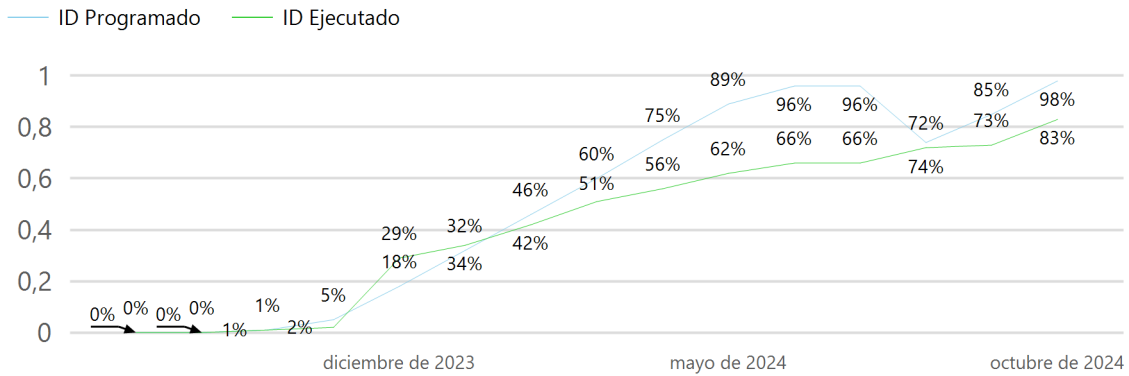

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bahiahonda del municipio de Pedraza

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$10.464

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$10.464

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Municipio Intervención	Pedraza
BPIN	2023475410003	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	175-2230146	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	127	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	30/03/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de la red principal de alcantarillado sanitario en el corregimiento de Bahiahonda con las siguientes actividades principales: Instalación de red principal con un diámetro de 8" con longitud de 6,684 ml; Conexiones domiciliarias en tubería PVC de 6" con longitud de 4.673,50 ml; Construcción de 102 pozos de inspecciones; Estación de bombeo, desarenador, estructura reactor UASB, sedimentador secundario, espesadores, lechos de secado y Planta de tratamiento de aguas residuales, incluye sistema hidráulico y eléctrico.		

Información específica de ejecución contrato específico

15/06/2023

Fecha de Suscripción

10/07/2023

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

31/12/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$10.458

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$10.458

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

10/09/2024


Fecha de Corte Avance

75%

% Programado

49%

% Ejecutado

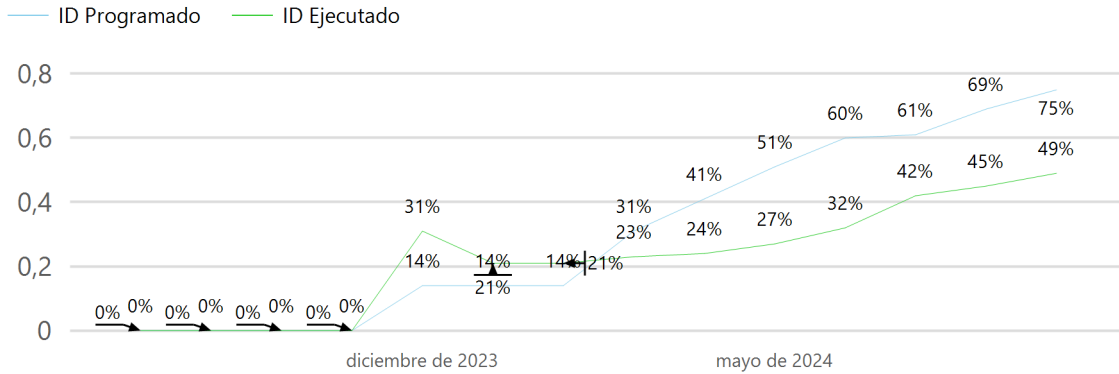


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$10.458
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

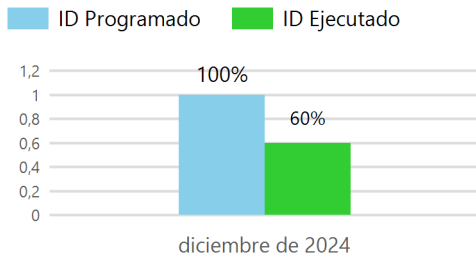

\$6.276
Valor Ejecutado (mill)

60%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la Vía Estación Villa – Sabanas de San Ángel, municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena.

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$5.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$5.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Sabanas de San Ángel
BPIN	2022476600012	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	176-2230147	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	135	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	01/11/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Contempla el mejoramiento de 2.05km y la construcción de 2 obras de drenaje. La intervención se distribuye en 4 tramos críticos.		2,05

Información específica de ejecución contrato específico

16/06/2023

Fecha de Suscripción

4/07/2023

Fecha de Inicio

13

Plazo en Meses

18/08/2024

Fecha Terminación

9.857

Número de Beneficiarios

\$5.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$5.000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

4/08/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

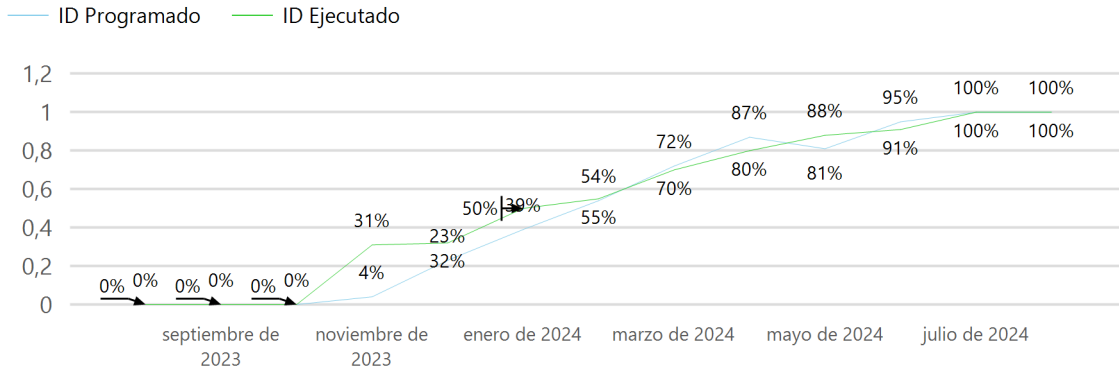

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción del estadio municipal de Pivijay, Departamento de Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$5.056

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$5.056

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreación	Municipio Intervención	Pivijay
BPIN	2021475510056	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	177-2230149	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	130	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	26/04/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 6.354,3 m2 del estadio municipal de Pivijay ubicado en el corregimiento de Media Luna, el cual incluye 4.512 m2 de cancha sintética de 94 x 48 m marcada y porterías en hierro, zona de circulación en adoquín peatonal de 1.166,9 m2 y bordillo perimetral, graderías con zona de discapacitados, cubierta metálica, cobertura vegetal con especies menores y césped y baños.	Cancha construida	1
		Número de canchas

Información específica de ejecución contrato específico

16/06/2023

Fecha de Suscripción

17/08/2023

Fecha de Inicio

19

Plazo en Meses

17/03/2025

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$5.056

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$5.056

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/10/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

26%

% Ejecutado

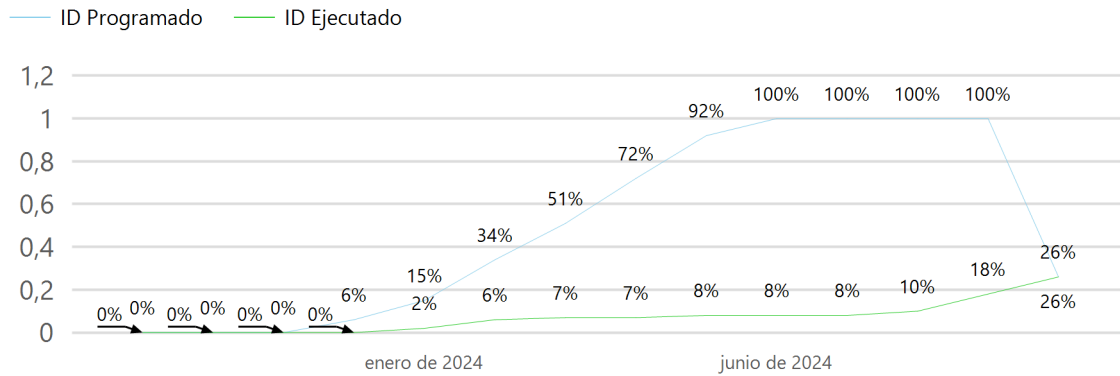


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$5.056
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

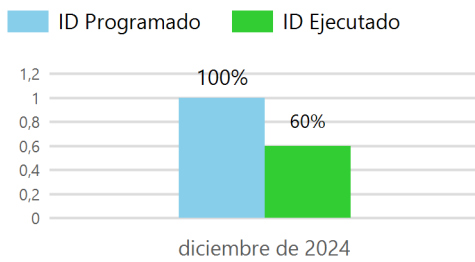

\$3.034
Valor Ejecutado (mill)

60%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la vía Angostura - Janeiro, jurisdicción del municipio de
San Zenón - Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$5.586

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$5.586

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	San Zenón
BPIN	2022477030055	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	180-2230144	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	138	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	24/10/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 3 km de vía en pavimento rígido. Adicionalmente, se construirán 8 obras de drenaje.	Vía terciaria mejorada	3 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

22/06/2023

Fecha de Suscripción

13/07/2023

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

31/12/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$5.586

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$5.586

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

13/07/2024


Fecha de Corte Avance

31%

% Programado

31%

% Ejecutado

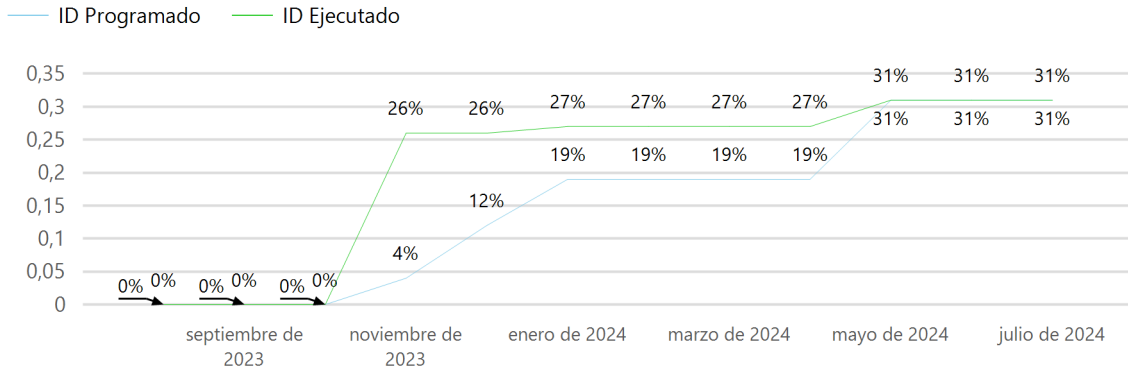

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la vía San Angel - Algarrobo, Municipio de Sabanas de San Angel, departamento de Magdalena

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$1.050

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$1.050

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Sabanas de San Ángel
BPIN	2022476600014	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	181-2230151	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	134	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	01/11/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto consiste en el mejoramiento de la Vía Sabanas de San Ángel – Algarrobo Municipio de Sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, el cual consta de el mejoramiento de 0,64 kilómetros de vía		0,64

Información específica de ejecución contrato específico

21/06/2023

Fecha de Suscripción

24/07/2023

Fecha de Inicio

11

Plazo en Meses

24/06/2024

Fecha Terminación

9.857

Número de Beneficiarios

\$1.050

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$530

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$1.580

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

24/05/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

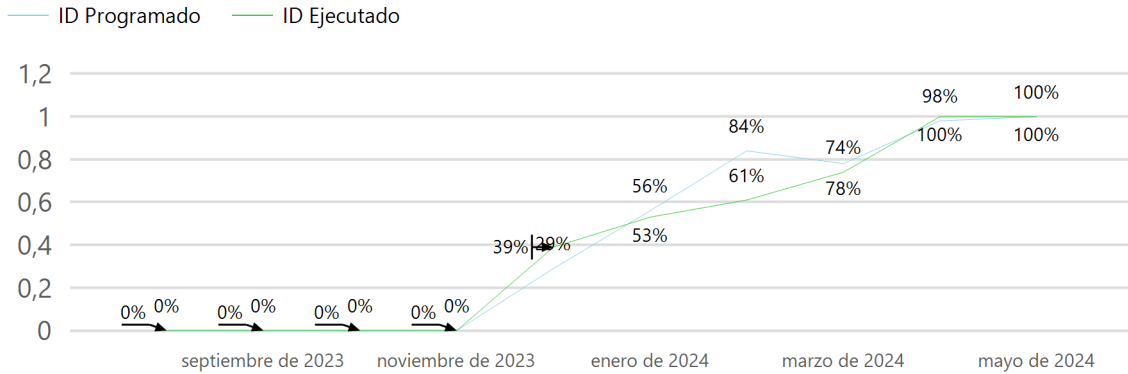

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la vía San Basilio - Sabanas, municipio de El Piñón -
Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$8.733

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$8.733

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	El Piñón
BPIN	2023472580007	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	184-2230162	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	120	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/01/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 2.84 km de vía en pavimento rígido.	Vía terciaria mejorada	2,84 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

17/08/2023

Fecha de Inicio

16

Plazo en Meses

17/12/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$8.733

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$8.733

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/09/2024


Fecha de Corte Avance

94%

% Programado

98%

% Ejecutado

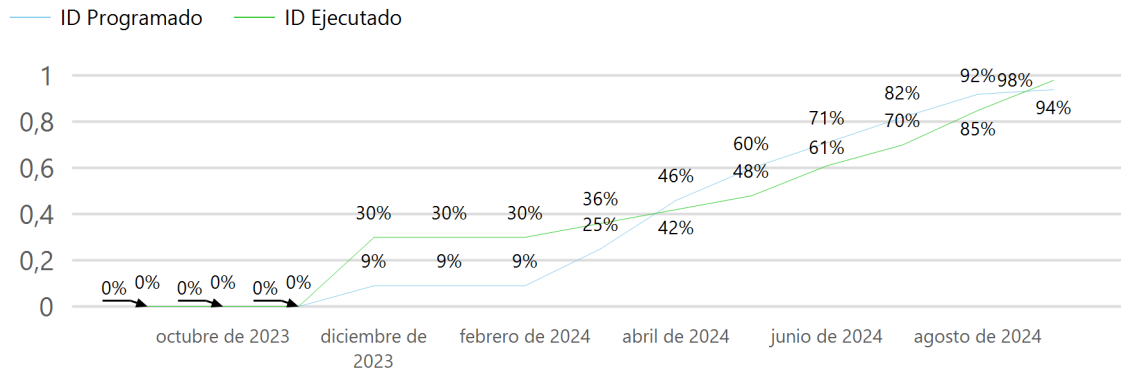


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$8.733
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

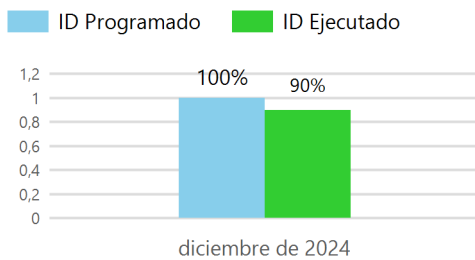

\$7.860
Valor Ejecutado (mill)

90%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la Vía Ciénaga Zapayán - corregimiento Piedra Moler - Límites con Chibolo, municipio de Zapayán, departamento del Magdalena

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$5.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$5.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Zapayán
BPIN	2023479600001	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	185-2230163	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	143	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	02/03/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejoramiento (Pavimento rígido) de 1,56 kilómetros de la vía Ciénaga Zapayán - Corregimiento Piedras Moler - Límites con Chibolo PR0+000 - PR0+263 = Longitud de 263 m PR0+000 - PR0+040 = Longitud de 40 m PR0+000 - PR0+065 = Longitud de 65 m PR6+010 - PR7+206 = Longitud de 1.196 m	Vía terciaria mejorada	1,56

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

1/08/2023

Fecha de Inicio

13

Plazo en Meses

16/09/2024

Fecha Terminación

4.200

Número de Beneficiarios

\$5.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$5.000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

1/09/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

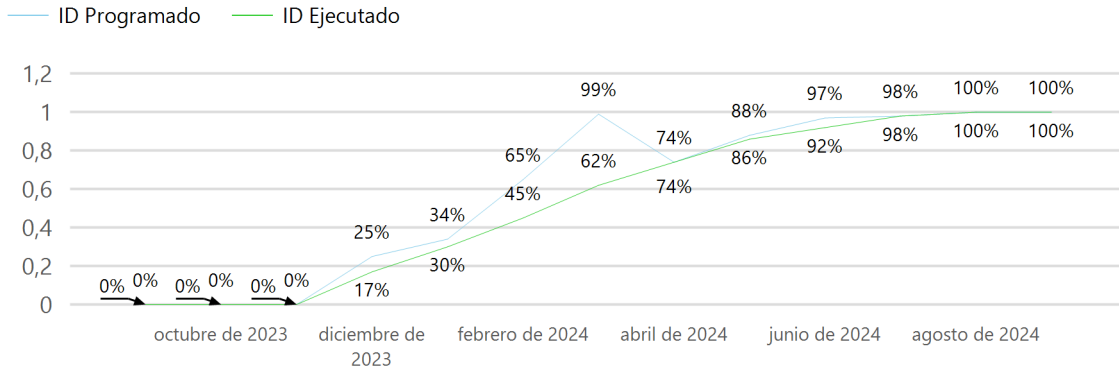

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Adecuación de cancha recreo deportiva de fútbol Finel de los Ríos, ubicada en el municipio de El Reten - Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$6.370

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$6.370

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	El Retén
BPIN	2022472680077	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	186-2230164	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	121	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	26/04/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de cancha para gramdo natural con normal para competencias nacionales e internacionales con un área 5.376 m2, con graderías, baños, camerinos, entre otros que cubren un área de intervención total de 10216 m2	Cancha adecuada	1
		Número de canchas

Información específica de ejecución contrato específico

27/06/2023

Fecha de Suscripción

28/07/2023

Fecha de Inicio

22

Plazo en Meses

28/05/2025

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$6.370

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$6.370

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

28/10/2024


Fecha de Corte Avance

79%

% Programado

69%

% Ejecutado

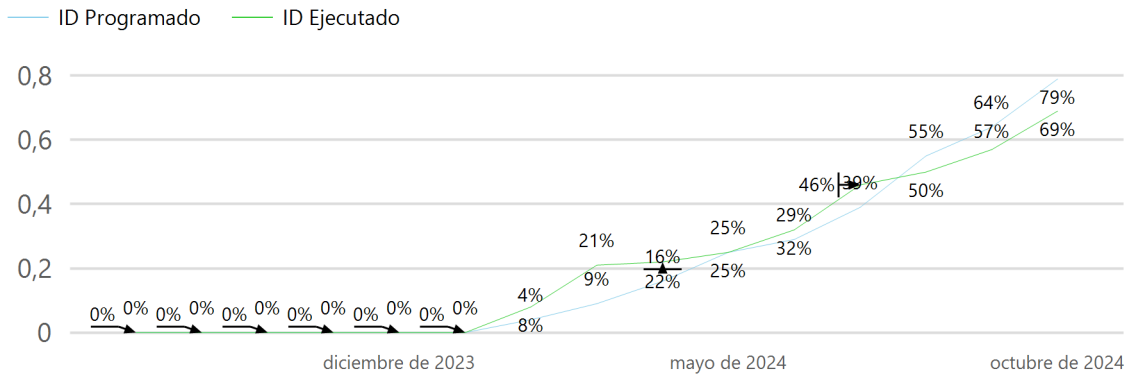

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento Vía K21 Los Morones-Cuatro Bocas, Municipio de Guamal -
Magdalena

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$4.950

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$4.950

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Guamal
BPIN	2023473180005	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	187-2230168	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	124	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/01/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejoramiento en pavimento rígido de 1,72 kilómetros de la Vía K21 Los Morones – Cuatro Bocas	Vía terciaria mejorada	1,72

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

17/08/2023

Fecha de Inicio

11

Plazo en Meses

17/07/2024

Fecha Terminación

5.616

Número de Beneficiarios

\$4.950

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$4.950

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/07/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

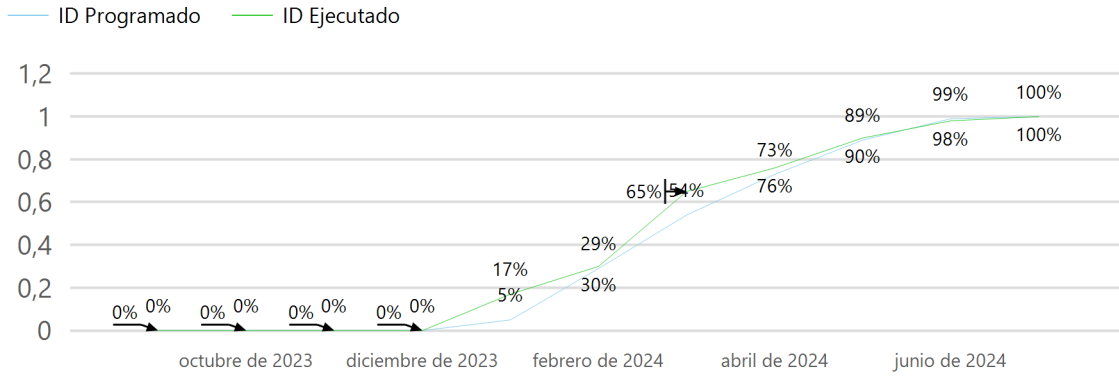

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

**Mejoramiento De La Calidad De Las Viviendas Rurales A Través De La
Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales En Zonas No
Interconectadas Del Municipio De Arcataca, Magdalena**

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$5.568

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$5.568

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Minas y Energia	Municipio Intervención	Aracataca
BPIN	20201301010531	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	188-2230169	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	112	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	05/12/2022
Alcance		Producto Principal	Meta del Producto
		Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	222
			Numero de unidades

Construcción de Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en la zona rural del Municipio de Aracataca, Las metas del proyecto, consiste en la instalación de 222 soluciones de energía solar fotovoltaica autónomas distribuidas así en las veredas Agua Bendita 10, Arenosa 8, Bocatoma 3, Cauca 7, Cerro Azul 25, Dwanawimaku 6, El Torito 7, El Volante 7, Fuente Alta 8, Fuente Baja 12, La Arenosa 7, La Divisa 2, La Fuente 32, Macaraquilla 19, Marimonda 6, Palestina 1, Punto Blanco 8, Quebrada Seca 5, Rio De Piedras 11, Tehobromina 11 Y Tranquilandia 27.

Estas soluciones estarán conformadas por 2 módulos solares de 400 wp, capacidad total de 800 vatios pico. Los módulos fotovoltaicos estarán soportados en una estructura metálica, elevadas 3 metros del suelo por un poste metálico de 4" sobre una base en concreto de 3000 p.s.i. la estructura estará a una distancia de aprox 2 metros de la vivienda.

El sistema cuenta con un controlador MMPT de 40 amperios, haciéndolos trabajar siempre en el punto de máxima potencia; este se encargará de regular la energía que los paneles solares envían al banco de baterías y que controla la carga y la descarga de forma eficiente.

Se utilizará una batería de Ion-litio de ciclo profundo con capacidad de 120 Ah \pm 25.6 VDC \pm mínimo 3650 ciclos al 80% DOD.

La corriente que sale del banco de baterías pasa por el inversor de 1000 watt, de onda completa sinusoidal, el cual transforma la corriente continua que le llega del banco de baterías a 24v en corriente alterna a 120v para poder alimentar los electrodomésticos y luminarias que se conecten. Puesta a Tierra: una varilla de cobre desnuda de mínimo 2,4 m de longitud.


Todos los equipos estarán en unos gabinetes y se contempla una etapa de formación y socialización para el buen uso del sistema.

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023 Fecha de Suscripción	14/09/2023 Fecha de Inicio	23 Plazo en Meses	16/08/2025 Fecha Terminación	0 Número de Beneficiarios
\$5.568 Pto Comprometido DNP FRPT	\$0 Pto Comprometido Sector	\$25 Pto Comprometido Territorio	\$0 Pto Comprometido Otros	
\$5.593 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

14/10/2024 Fecha de Corte Avance	98% % Programado	22% % Ejecutado
-------------------------------------	---------------------	--------------------

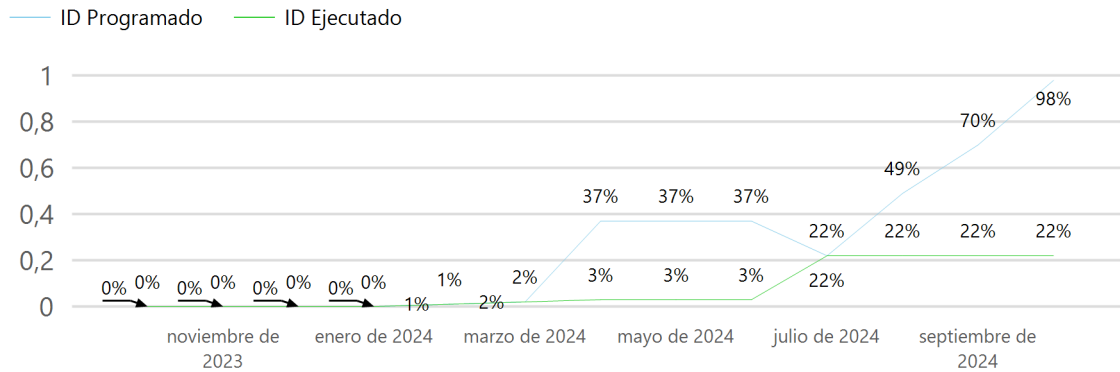

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento de la vía Prevención - Pijiño del Carmen, municipio de Pijiño del Carmen - Magdalena

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$3.812

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$3.812

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Pijiño del Carmen
BPIN	2022475450148	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	190-2230171	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	128	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	01/11/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto consiste en el mejoramiento 1,178 km de la Vía Prevención - Pijiño del Carmen - Magdalena y la construcción de seis obras de drenajes (Box-Culvert de sección 1 m x 1 m, longitud de 5 m)	Vía terciaria mejorada	1,178

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

31/07/2023

Fecha de Inicio

14

Plazo en Meses

30/09/2024

Fecha Terminación

6.300

Número de Beneficiarios

\$3.812

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$3.812

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

31/07/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

95%

% Ejecutado

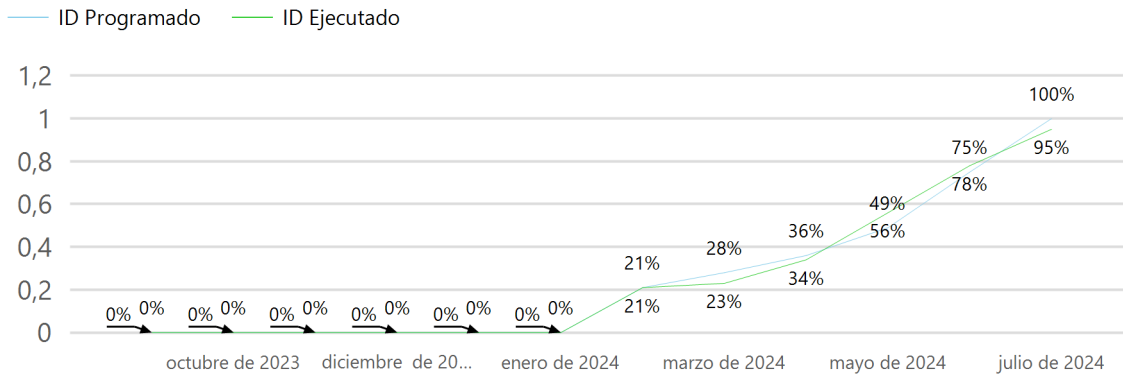

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento Vía Campo Amor - San Francisco, Municipio de Guamal - Magdalena

Estado Proyecto

Terminado

Información general del contrato específico

\$2.897

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$2.897

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Guamal
BPIN	2023473180022	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	192-2230173	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	125	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/01/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejoramiento en pavimento rígido de 0,957 kilómetros de la Vía Campo Amor – San Francisco	Vía terciaria mejorada	0,957

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

17/08/2023

Fecha de Inicio

9

Plazo en Meses

17/05/2024

Fecha Terminación

3.200

Número de Beneficiarios

\$2.897

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$2.897

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/05/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

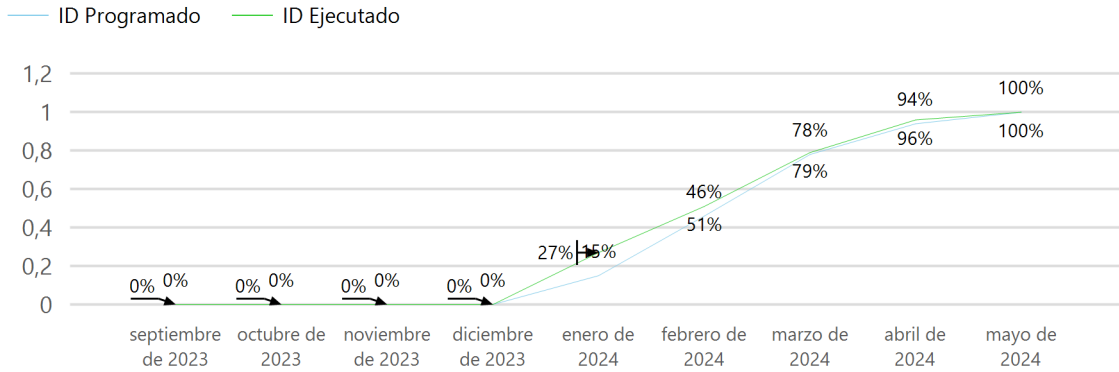

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de la cancha de fútbol sector antigua feria del municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$5.700

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$5.700

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	Nueva Granada
BPIN	2021474600047	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	196-2230388	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	126	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	15/05/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una cancha de futbol 11 en grama sintética en el sector Antigua Feria, con dimensiones de 90x 45m con su respectiva área de seguridad, además se plantea graderías cubiertas en concreto y acero, servicios complementarios como unidades sanitarias, camerinos, rampas de acceso, taquillas, parqueaderos, cerramiento perimetral, instalaciones eléctricas e iluminación para una área de intervención total de 8630,51 M2	Cancha construida y dotada	1 Número de canchas

Información específica de ejecución contrato específico

29/12/2023

Fecha de Suscripción

12/01/2024

Fecha de Inicio

11

Plazo en Meses

27/12/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$5.699

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$295

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$5.994

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

12/09/2024


Fecha de Corte Avance

71%

% Programado

58%

% Ejecutado

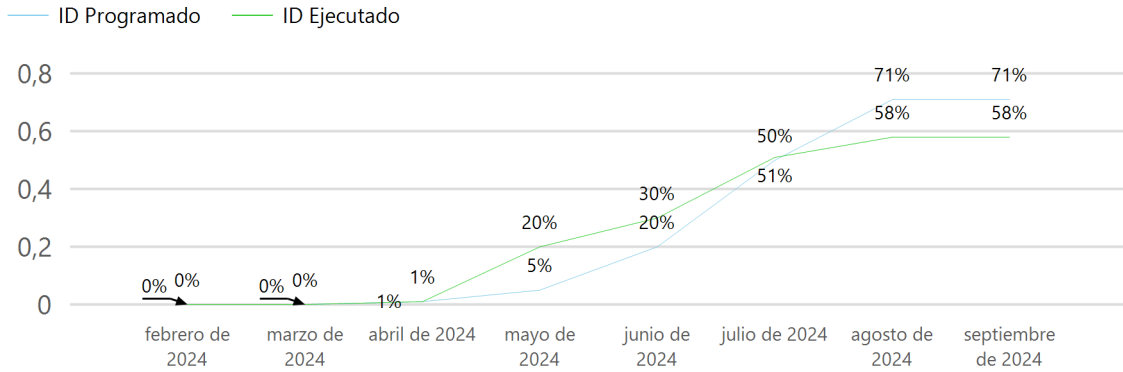


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024
Fecha de Corte Avance

\$5.699
Valor Programado (mill)

100%
% Programado

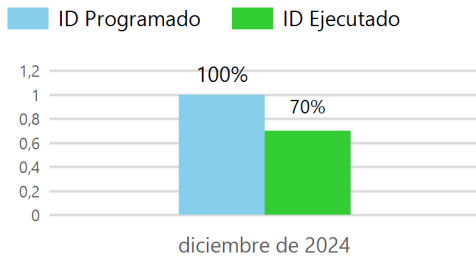

\$3.989
Valor Ejecutado (mill)

70%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
