



Departamento  
Nacional de Planeación



# Informe semestral II-2024

## PACTO TERRITORIAL GOLFO DE MORROSQUILLO

---

GRUPO GERENCIA NACIONAL DE PACTOS TERRITORIALES  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DICIEMBRE 2024



## CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL .....	3
1.1	¿Qué son los Pactos Territoriales? .....	3
1.2	¿Para qué sirve un Pacto Territorial? .....	3
1.3	Evolución normativa .....	4
1.4	Pactos territoriales suscritos.....	8
2.	INFORME PACTO TERRITORIAL CESAR - LA GUAJIRA .....	13

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

---

### 1.1 ¿Qué son los Pactos Territoriales?

**Los Pactos territoriales se definen como:**

Los Pactos territoriales, según el artículo 279 de la Ley 2294 del 2023, se definen como un **instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total**, promoviendo para ello la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, **bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.**

Este instrumento fue incluido en la **Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial** (Ley 1454 de 2011, artículo 18) como una **estrategia de articulación entre los diferentes niveles de gobierno**. Mediante esta figura se pretende incentivar el proceso de descentralización en el país y construir un entorno favorable y simplificado para la inversión pública en el territorio.

### 1.2 ¿Para qué sirve un Pacto Territorial?

Los Pactos Territoriales, basados en experiencias internacionales exitosas en países como Francia e Italia, contribuyen a los procesos de articulación y financiación de iniciativas de proyectos de desarrollo territorial orientados a atender las necesidades en infraestructura y conectividad vial, cobertura de servicios de educación y salud, soluciones de agua potable y saneamiento básico, entre otras necesidades.

A través de la financiación de estos proyectos se promueve el desarrollo económico y social en los territorios en los que tienen incidencia los Pactos Territoriales, dado que se aportaría a la atención de las necesidades identificadas y a impulsar los diferentes sectores, especialmente los más estratégicos, con inversiones que contribuyen al desarrollo local. En resumen, los pactos territoriales sirven para:

- Conectar a las poblaciones y al gobierno (nacional y territorial), articulando y coordinando las capacidades de planeación, gestión y financiación, aprovechando las potencialidades regionales como motor de

crecimiento y equidad, y promoviendo, armónicamente, el desarrollo de las regiones.

- Integrar esfuerzos y visiones de desarrollo de las entidades del orden nacional y local.
- Identificar y desarrollar capacidades municipales para fomentar las ventajas comparativas y competitivas de los territorios.
- Enfocar la cofinanciación mediante inversiones en proyectos de alto impacto, logrando la convergencia regional y buscando reducir las brechas sociales inter e intra municipal y departamental.

### 1.3 Evolución normativa

La figura de los Pactos Territoriales, de acuerdo con el actual Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), es un *"instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total"*<sup>1</sup>. Dicha figura es una actualización de los anteriores Contratos Plan constituidos mediante las leyes 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) y 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), dado que mediante el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, se incorporó al ordenamiento jurídico los Contratos Plan como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno.

Así las cosas, con esta figura se pretende incentivar el proceso de descentralización en el país y construir un entorno favorable y simplificado para la inversión pública en el territorio. En resumen, los Pactos Territoriales impulsan proyectos estratégicos que, por su importancia en la economía nacional, alto uso de mano de obra y generación de empleo formal, buscan generar, en el corto y mediano plazo, beneficios para el bienestar social y económico del país.

Desde su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, esta herramienta de política pública se ha utilizado para impulsar el desarrollo territorial dentro de un esquema de concurrencia de esfuerzos, donde participan los municipios, los departamentos, esquemas asociativos territoriales y la Nación, con una guía técnica por parte de la entidad cabeza de cada sector, cuya participación estará determinada por la finalidad de cada proyecto. En términos del Documento

---

<sup>1</sup> Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, artículo 279.

CONPES 3822 de 2014, *"Estos instrumentos, conocidos genéricamente como acuerdos de desempeño o de resultados, implican tanto negociación como cooperación entre autoridades con diferentes márgenes de autonomía, competencia y capacidades"*.

Con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822, se expidió la Ley 1753 de 2015, cuyos artículos 198 y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una parte, el alcance jurídico de la herramienta, y de otra, crean el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan.

El artículo 198 de la Ley 1753 de 2015 modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contratos Plan como

*"(...) un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial"*.

De igual forma, este artículo señaló que:

*"En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región"*.

Aunque los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio, para impulsar determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, tratándose de la ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean estas del orden nacional (Ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del orden territorial (Departamentos, municipios y corporaciones autónomas, empresas

industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas prestadoras de servicios públicos, entre otras). Es claro que la Entidad Ejecutora conserva su competencia en la contratación, seguimiento, vigilancia y supervisión de los contratos celebrados, bien sea contratos de obra, consultoría y su interventoría, tal como lo establece el marco normativo.

Por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos Plan, como una cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podría ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose en un mecanismo de gestión que permite facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los Contratos Plan / Pactos Territoriales, y de lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles.

Con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de esta herramienta para ser utilizado por los aportantes en estos contratos, bien se trate de las partes o de terceros para la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, *"Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan"*, el cual especifica las condiciones generales de operación y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados los recursos que ingresen a este.

Así mismo y siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo *"Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad"*, para el cuatrienio 2018-2022 se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

De acuerdo con lo anterior, cada Ley del Plan que se ha venido expidiendo ha hecho modificaciones a la figura original (por ejemplo, en cuanto a su enfoque, con la incorporación de los Contratos Plan para la Paz), de manera que hoy podría

hablarse de tres estadios o generaciones de esta figura, a saber: (i) los Contratos Plan (2011); (ii) los Contratos Plan para la Paz (2016); y, (iii) los Pactos Territoriales (2019).

El fondo vigente y en ejecución para los pactos territoriales es el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, anteriormente denominado Fondo Regional para los Contratos Plan, teniendo en cuenta, en todo caso, que con lo establecido en el artículo 250<sup>2</sup> de la Ley 1955 de 2019 se pasa de los Contratos Plan al modelo de Pactos Territoriales. Ahora bien, dicho artículo fue modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023 (Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "*Colombia potencia mundial de la vida*"), actual Plan Nacional de Desarrollo.

Es importante precisar que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de fecha 21 de junio de 2022, "*Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*", el cual señala con relación a lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 que las referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo Regional para los Contratos Plan" se entenderán efectuadas a los "Pactos Territoriales" y al "Fondo Regional para los Pactos Territoriales", respectivamente.

A su vez, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023 modifica el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, para señalar que los departamentos, los municipios, los Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación podrán suscribir **Pactos Territoriales, definidos como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional** definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total. Se promueve para ello la adopción de metodologías con enfoque de género, a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.

---

<sup>2</sup> [\[2\]](#) Ley 1955 de 2019, artículo 250: "*El Departamento Nacional de Planeación coordinará el proceso de **transición y articulación de los Contratos Plan hacia el modelo de Pactos Territoriales** y definirá los aspectos operativos correspondientes. En adelante la Nación, las entidades territoriales y los esquemas asociativos de entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011, solo podrán suscribir pactos territoriales. Se mantendrán como mecanismos para la ejecución de esta nueva herramienta los Contratos Específicos y el Fondo Regional para los Contratos Plan, en adelante Fondo Regional para los Pactos Territoriales, cuya operación se orientará a facilitar la ejecución de los Pactos Territoriales y de los Contratos Plan vigentes. Los Contratos Plan suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1454 de 2011, se mantendrán vigentes por el término de duración pactado entre las partes, que en todo caso, no podrá superar el 31 de diciembre de 2023.*" (Negrilla fuera de texto).



Departamento  
Nacional de Planeación

Ilustración 1 Evolución Normativa Pactos Territoriales



Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP.

### 1.4 Pactos territoriales suscritos

La concertación y suscripción de Pactos territoriales para la ejecución de proyectos estratégicos ha sido una prioridad para el Gobierno nacional, a través del DNP, dando como resultado la suscripción de 11 Pactos Territoriales, que se describen a continuación:

Tabla 1. Pactos Territoriales suscritos

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
<b>Bicentenario</b>	26 de junio de 2019 Duración 10 años, hasta 26 de junio de 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vicepresidencia de la República.</li> <li>DNP.</li> <li>Ministerio de Transporte.</li> <li>Ministerio de Comercio Industria y Turismo.</li> <li>Departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander.</li> </ul>	Articular entre la Nación y los departamentos afines a la conmemoración del Bicentenario, las políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de los proyectos conforme a las necesidades de los territorios con el fin de promover la competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo social y económico de la Región.

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
<b>Golfo de Morrosquillo</b>	7 de febrero de 2020, Duración 5 años, hasta 7 de febrero de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernaciones de Sucre y Córdoba.</li> <li>• Municipios de Coveñas, Tolú, Tolviejo, San Onofre, Palmito, Loricá, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero y Tuchín.</li> </ul>	<p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la campaña libertadora.</p> <p>(ii) Fortalecimiento de la competitividad turística de la campaña libertadora.</p>
<b>Santander</b>	31 de octubre de 2020 Duración 5 años, hasta 31 de octubre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación de Santander.</li> <li>• Provincias de Guantán, Comunera, Vélez, Yariguíes, García Rovira, Soto Norte y Metropolitana.</li> </ul>	<p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Fortalecimiento y ordenamiento institucional.</p> <p>(ii) Infraestructura para la disminución de las necesidades básicas insatisfechas.</p> <p>(iii) Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.</p> <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para su desarrollo económico y social.</p>

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
<b>Cesar – La Guajira</b>	14 de enero de 2021 Duración 5 años, hasta 14 de enero de 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación de Cesar.</li> <li>• Gobernación de la Guajira.</li> <li>• Alcaldía de Valledupar.</li> <li>• Municipios delegados de las subregiones de Norte, Noroccidental, Centro y Sur del departamento del Cesar y los municipios delegados de las subregiones Alta, Media y Sur del departamento de La Guajira</li> </ul>	<p><b>Líneas temáticas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Conectividad subregional.</li> <li>(ii) Infraestructura para el desarrollo económico y social.</li> </ul> <p>Articular entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira las políticas, planes y programas orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Fortalecimiento institucional.</li> <li>(ii) Infraestructura y progreso.</li> <li>(iii) Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.</li> <li>(iv) Seguridad y convivencia.</li> </ul>
<b>Cundinamarca</b>	19 de febrero de 2021 Duración 3 años, hasta 19 de febrero de 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación de Cundinamarca.</li> <li>• Municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Chipaque, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, Fúquene, Gachetá, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Pulí, Ricaurte, San Antonio del</li> </ul>	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Infraestructura para la integración social.</li> <li>(ii) Gestión ambiental y saneamiento básico.</li> </ul>

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
		Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Tocancipá, Ubalá, Ubaté, Viotá y Zipaquirá.	
<b>Casanare</b>	27 de febrero de 2021 Duración 5 años, hasta 27 de febrero de 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación de Casanare.</li> <li>• Municipio de Yopal como capital del departamento, el municipio de Paz de Ariporo en representación de la zona Norte, el municipio de Orocué en representación de la zona Centro y el municipio de Tauramena en representación de la zona Sur.</li> </ul>	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Casanare como un eje dinamizador de crecimiento y productividad a través de la identificación y ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la conectividad, la equidad y al desarrollo económico y social.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Desarrollo económico y social.</p> <p>(ii) Vías para la equidad.</p> <p>(iii) Infraestructura social.</p>
<b>Atlántico</b>	17 de marzo de 2021 Duración 3 años, hasta 17 de marzo de 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación del Atlántico.</li> <li>• Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.</li> <li>• Municipios de Juan de Acosta, Luruaco, Puerto Colombia, Pijó, Tubará y Usiacurí.</li> </ul>	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Desarrollo productivo y turístico sostenible.</p> <p>(ii) Conectividad e integración subregional.</p>
<b>Bolívar</b>	5 de abril de 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación de Bolívar.</li> </ul>	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera</p>

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
	Duración 3 años, hasta 5 de abril de 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distrito de Santa Cruz de Mompós.</li> <li>• Municipios de Arjona, Arenal del Sur, Córdoba, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbana y Villanueva.</li> </ul>	<p>de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Infraestructura para el desarrollo social.</p> <p>(ii) Infraestructura para la integración social.</p>
<b>Arte, la cultura y la vida - Bello</b>	26 de abril de 2021 Duración 5 años, hasta 26 de abril de 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Área metropolitana del Valle de Aburrá.</li> <li>• Municipio de Bello.</li> </ul>	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de intervenciones urbano-integrales, que contribuyan a consolidar el arte, la cultura y la vida, como eje de desarrollo en el municipio de Bello y aporten al desarrollo urbano de la Centralidad Norte del Valle de Aburrá como nodo de integración regional en el departamento de Antioquia.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Manejo y protección del patrimonio cultural.</p> <p>(ii) Revitalización urbana para el arte y la cultura.</p>
<b>Río Bogotá</b>	30 de junio de 2021 Duración 5 años, hasta 30 de junio de 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</li> <li>• Gobernación de Cundinamarca.</li> <li>• Municipios de Zipaquirá, Viotá y Chipaque.</li> </ul>	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos priorizados del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (POMCA) y del Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios ecosistémicos</p>

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
<b>Magdalena</b>	22 de diciembre de 2021 Duración 5 años, hasta 22 de diciembre de 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Todos los municipios del departamento del Magdalena, con excepción del Distrito de Santa Marta.</li> </ul>	<p>de la cuenca hidrográfica del río Bogotá.</p> <p><b>Línea temática:</b></p> <p>(i) Ordenamiento y gobernanza ambiental.</p> <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y social del departamento del Magdalena, a partir del aprovechamiento de sus dinámicas económicas, sociales y ambientales.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Productividad y desarrollo económico.</p> <p>(ii) Infraestructura para la integración y el desarrollo social.</p> <p>(iii) Saneamiento ambiental y adaptación al cambio climático.</p> <p>(iv) Fortalecimiento institucional.</p>

Fuente: Gerencia de Pactos Territoriales, DNP.

## 2. INFORME PACTO TERRITORIAL GOLFO DE MORROSQUILLO

A continuación, se presenta el informe del Pacto Territorial.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

<b>7/02/2020</b> Fecha suscripción	<b>5</b> Plazo en años	<b>7/02/2025</b> Fecha de Terminación	<b>1</b> Meses para vencimiento	<b>98%</b> % Tiempo Transcurrido
<b>75</b> Total Proyectos	<b>18</b> Proyectos FRPT	<b>57</b> Proyectos Otras Fuentes	<b>\$1.394.155</b> Valor Indicativo (Millones)	
<b>\$1.169.248</b> Aporte indicativo nación (Millones)	<b>\$224.906</b> Aporte indicativo territorio (Millones)	<b>\$0</b> Aporte indicativo otros (Millones)		

### Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)


Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$121.933	\$120.933	\$1.000	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$182.781	\$91.872	\$90.909	\$0
Deporte y Recreacion	\$38.550	\$13.200	\$25.350	\$0
Educacion	\$29.230	\$21.000	\$8.230	\$0
Interior	\$22.509	\$20.928	\$1.581	\$0
Salud y Proteccion Social	\$50.628	\$45.555	\$5.072	\$0
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$5.361	\$0	\$0
Trabajo	\$34.437	\$22.221	\$12.217	\$0
Transporte	\$789.323	\$732.681	\$56.642	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$115.861	\$95.498	\$20.363	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$0	\$3.542	\$0
<b>Total</b>	<b>\$1.394.155</b>	<b>\$1.169.248</b>	<b>\$224.906</b>	<b>\$0</b>

### Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Comprometido Total	Consolidado Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$110.882	\$109.882	\$1.000	\$0
Comercio Industria y Turismo	\$122.628	\$72.900	\$49.728	\$0
Deporte y Recreacion	\$40.189	\$8.000	\$32.189	\$0
Educacion	\$28.411	\$21.745	\$6.667	\$0
Interior	\$19.633	\$18.552	\$1.082	\$0
Salud y Proteccion Social	\$46.106	\$41.097	\$5.009	\$0
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$5.361	\$0	\$0

Trabajo	\$1.583	\$1.583	\$0	\$0
Transporte	\$670.286	\$594.852	\$58.994	\$16.440
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$109.962	\$79.984	\$26.497	\$3.481
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.538	\$0	\$3.538	\$0
<b>Total</b>	<b>\$1.158.580</b>	<b>\$953.956</b>	<b>\$184.703</b>	<b>\$19.921</b>

### Número de Proyectos por Estado

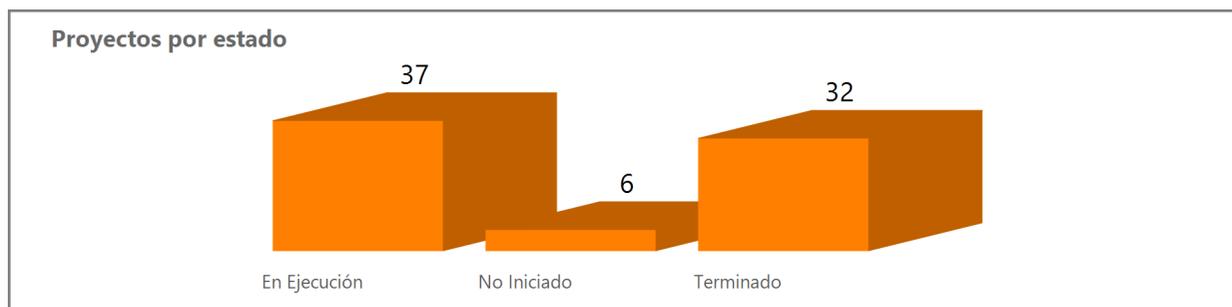

### Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Construcción para el mejoramiento y ampliación de del aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre.	\$273.745	\$273.745	\$0	\$0
En Ejecución	Corredor Santa Lucía - Moñitos	\$190.000	\$190.000	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre	\$43.000	\$43.000	\$0	\$0
En Ejecución	Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre	\$41.494	\$41.494	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento en pavimento flexible de la vía Tolviejo - San Antonio de Palmito, departamento de Sucre. OCAD PAZ	\$37.431	\$0	\$37.431	\$0
En Ejecución	Construcción de Malecón Turístico de la Segunda Ensenada Fase I en el Municipio de Coveñas	\$31.946	\$29.998	\$1.948	\$0

En Ejecución	Construcción de malecón ecoturístico en la Bahía de Cispatá, municipio de San Antero, departamento de Córdoba	\$26.000	\$26.000	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba	\$24.298	\$24.298	\$0	\$0
En Ejecución	Recuperación ambiental y paisajística de la cuenca del río Sinú y obras para la mitigación de inundaciones y control de procesos erosivos en el municipio de San Bernardo del Viento	\$23.823	\$0	\$23.823	\$0
En Ejecución	Mejoramiento y mantenimiento de la vía que conduce del municipio de Tuchín hasta el límite del municipio de Palmito (Sucre) en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.	\$22.224	\$22.224	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción del complejo deportivo en el municipio de Santa Cruz de Lorica, Departamento de Córdoba	\$21.000	\$0	\$21.000	\$0
En Ejecución	Construcción de obras de recolección y manejo de aguas residuales y optimización del sistema de abastecimiento de agua, construcción de obras para las conexiones hidrosanitarias intradomiciliarias, en las localidades de la Libertad y Sabanetica del municipio de San Onofre, Sucre	\$20.830	\$20.830	\$0	\$0
En Ejecución	Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta el corregimiento del Porvenir, San Antero, Córdoba	\$18.002	\$8.000	\$10.002	\$0

En Ejecución	Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Antonio de palmito Departamento de Sucre del programa Colombia rural – nacional. Vía que conduce del municipio de San Antonio de Palmito al corregimiento Algodoncillo ruta del sombrero vueltaio	\$18.000	\$18.000	\$0	\$0
En Ejecución	Optimización hidráulica y operativa del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de San Bernardo del Viento	\$14.592	\$14.592	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	\$14.549	\$14.549	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor departamental Aguas Negras – Berlín (90CS01)	\$13.000	\$13.000	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Tolú - El francés - Guacamayas	\$10.000	\$10.000	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de parador turístico, en el municipio de San Antero, Departamento de Córdoba	\$9.771	\$7.817	\$1.954	\$0
En Ejecución	Construcción de Unidad Recreo-deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba	\$9.585	\$8.000	\$1.585	\$0
En Ejecución	Estructuración y Compra de Lote Centro Multipropósito en Sucre	\$9.424	\$0	\$9.424	\$0
En Ejecución	Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	\$8.792	\$8.792	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Corregimiento los Gomez	\$8.657	\$8.657	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción Sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre	\$7.818	\$0	\$7.818	\$0

En Ejecución	Construcción y Dotación de una Estación de Bomberos en el Municipio de Tolú	\$7.524	\$7.524	\$0	\$0
En Ejecución	Culminación del mercado público del municipio de San Antero, departamento de Córdoba	\$7.000	\$0	\$7.000	\$0
En Ejecución	Construcción de 261 Unidades Sanitarias dispersas en zona rural del municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba	\$6.666	\$6.666	\$0	\$0
En Ejecución	CAM Santiago de Tolú	\$6.105	\$5.605	\$500	\$0
En Ejecución	Construcción de pavimento rígido en la vía Vereda Nuevo Mundo y Corregimiento Caño Grande en el municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba	\$6.000	\$0	\$6.000	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor departamental Guayabal - Parcelas de Algarrobo y desvío hacia el sector represa de Villeros	\$4.392	\$4.392	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Porvenir - Peñón-Cerro- Petrona- Aserradero	\$3.024	\$3.024	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción del centro de comercio rural zenú, en el municipio de Tuchín córdoba	\$3.000	\$0	\$3.000	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Aserradero - Coveñas	\$2.693	\$2.693	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Villa Fátima - Perpetuo Socorro	\$2.469	\$2.469	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento corredor terciario Palmira - Gualon	\$1.267	\$1.267	\$0	\$0
En Ejecución	Centro Sacúdete (1) en San Antero.	\$1.250	\$1.250	\$0	\$0
En Ejecución	Centro Sacúdete (1) en Toluvejo.	\$1.250	\$1.250	\$0	\$0
No Iniciado	Marina del Golfo de Morrosquillo	\$40.000	\$0	\$40.000	\$0
No Iniciado	Ampliación de la sede del SENA en Tolú, Sucre	\$32.637	\$20.637	\$12.000	\$0
No Iniciado	Proyectos de acueducto y alcantarillado para el municipio de Coveñas	\$20.000	\$20.000	\$0	\$0
No Iniciado	Proyectos de prevención y mitigación de erosión costera para el Golfo de Morrosquillo	\$18.520	\$18.520	\$0	\$0

No Iniciado	Construcción del Centro Multipropósito en Sucre.	\$18.000	\$18.000	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de Parque Recreo deportivo en el municipio San Bernardo del Viento Departamento de Córdoba	\$7.965	\$5.200	\$2.765	\$0
Terminado	Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento del puente la Doctrina, departamento de Córdoba.	\$45.072	\$45.072	\$0	\$0
Terminado	Vía Moñitos - San Bernardo del viento y Lorica – Chinú	\$43.198	\$43.198	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y tolú en el departamento de Sucre.	\$41.972	\$41.972	\$0	\$0
Terminado	Megacolegio Heriberto García Garrido en Tolviejo, Sucre	\$29.230	\$21.000	\$8.230	\$0
Terminado	Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, Córdoba.	\$20.482	\$19.482	\$1.000	\$0
Terminado	Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo	\$14.173	\$14.173	\$0	\$0
Terminado	Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera	\$10.123	\$10.123	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Sabaneta – Coveñas	\$10.000	\$10.000	\$0	\$0
Terminado	Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba.	\$8.476	\$5.933	\$2.543	\$0
Terminado	Vía Santiago de Tolú – Coveñas	\$8.000	\$8.000	\$0	\$0
Terminado	Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero	\$7.909	\$6.319	\$1.590	\$0
Terminado	Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento	\$7.524	\$7.524	\$0	\$0

Terminado	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín	\$7.015	\$7.015	\$0	\$0
Terminado	Proyecto Min Tic - Conectividad - Zona digital	\$5.361	\$5.361	\$0	\$0
Terminado	Estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas	\$5.303	\$5.303	\$0	\$0
Terminado	Mejoramiento vías Tolú - El Frances – OCAD PAZ	\$4.911	\$0	\$4.911	\$0
Terminado	Estructuración y compra de lote Hospital Coveñas	\$4.440	\$2.555	\$1.884	\$0
Terminado	Construcción de pavimento rígido en los barrios: Getsemaní, San Pedro, Barrio Nuevo, Las Palmeras y los olivos de la zona urbana del municipio de Tuchin	\$4.300	\$0	\$4.300	\$0
Terminado	Mejoramiento de la vía que comunica la transversal del caribe sector Moñitos San Bernardo del Viento en el sector La Rada municipio de Moñitos Departamento de Córdoba	\$4.000	\$0	\$4.000	\$0
Terminado	Construcción de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en Sucre	\$3.542	\$0	\$3.542	\$0
Terminado	Centro Sacúdete (1) en Tuchín.	\$3.322	\$2.862	\$460	\$0
Terminado	Cofinanciación de Auditorias de cuenta de salud de punto final	\$3.188	\$0	\$3.188	\$0
Terminado	Construcción bulevar Jesús María Lugo, en el municipio de Santa Cruz de Lorica - Córdoba	\$2.778	\$2.222	\$556	\$0
Terminado	Remodelación plaza monumento - Santa Cruz de Lorica	\$1.896	\$1.516	\$381	\$0
Terminado	Estructuración y compra de lote Estación de Bomberos	\$1.808	\$1.187	\$621	\$0
Terminado	Estructuración y compra de lote Ampliación de la sede del SENA en Tolú, Sucre	\$1.800	\$1.583	\$217	\$0
Terminado	Mejoramiento corredor terciario Murcielagal - El Tigre- San Patricio- Mangle**	\$1.603	\$1.603	\$0	\$0

Terminado	Estudios y Diseños para el mejoramiento y ampliación de del aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre.	\$1.430	\$1.430	\$0	\$0
Terminado	Centro Sacúdete No 1 Barrio Los Andes en Loricá.	\$1.250	\$1.250	\$0	\$0
Terminado	Estudios y diseños Puente la Doctrina	\$1.069	\$1.069	\$0	\$0
Terminado	Estructuración Malecón de Coveñas (Segunda Ensenada)	\$915	\$0	\$915	\$0
Terminado	Estructuración Marina del Golfo de Morrosquillo	\$318	\$0	\$318	\$0
<b>Total</b>		<b>\$1.394.155</b>	<b>\$1.169.248</b>	<b>\$224.906</b>	<b>\$0</b>

**Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)**

83,10%

**\$1.158.580**

Valor Comprometido + En Ejecución + Ejecutado

Estado de proyectos	Número de proyectos	Valor Indicativo
En Ejecución	37	\$832.786
Terminado	32	\$325.794
<b>Total</b>		<b>\$1.158.580</b>

Estado de proyectos	Número de proyectos	Valor Indicativo
No Iniciado	6	\$137.123
<b>Total</b>		<b>\$137.123</b>

**Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)**

18

Total Proyectos

**\$311.747**

Valor Indicativo (Millones)

**\$285.315**

Aporte indicativo DNP FRPT

**\$11.432**

Aporte indicativo territorio

**\$15.000**

Aporte indicativo Sector

**\$0**

Aporte indicativo Otros

10

Proyectos En Ejecución /Ejecutados

**\$259.920**

Presupuesto Comprometido (Millones)

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte Indicativo Otros
Construcción de Malecón Turístico de la Segunda Ensenada Fase I en el Municipio de Coveñas	En Ejecución	\$31.946	\$29.998	\$1.948	\$0	\$0

Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre	En Ejecución	\$43.000	\$28.000	\$0	\$15.000	\$0
Construcción y Dotación de una Estación de Bomberos en el Municipio de Tolú	En Ejecución	\$7.524	\$7.524	\$0	\$0	\$0
Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero	Terminado	\$7.909	\$6.319	\$1.590	\$0	\$0
Construcción de Unidad Recreo-deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$9.585	\$8.000	\$1.585	\$0	\$0
Construcción de Parque Recreo deportivo en el municipio San Bernardo del Viento Departamento de Córdoba	No Iniciado	\$7.965	\$5.200	\$2.765	\$0	\$0
Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$8.792	\$8.792	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$14.549	\$14.549	\$0	\$0	\$0
Proyectos de acueducto y alcantarillado para el municipio de Coveñas	No Iniciado	\$20.000	\$20.000	\$0	\$0	\$0

Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba	En Ejecución	\$24.298	\$24.298	\$0	\$0	\$0
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín	Terminado	\$7.015	\$7.015	\$0	\$0	\$0
Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento	Terminado	\$7.524	\$7.524	\$0	\$0	\$0
Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, Córdoba.	Terminado	\$20.482	\$19.482	\$1.000	\$0	\$0
Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre	En Ejecución	\$41.494	\$41.494	\$0	\$0	\$0
Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba.	Terminado	\$8.476	\$5.933	\$2.543	\$0	\$0
Construcción de malecón ecoturístico en la Bahía de Cispatá, municipio de San Antero, departamento de Córdoba	En Ejecución	\$26.000	\$26.000	\$0	\$0	\$0
Construcción de 261 Unidades Sanitarias dispersas en zona rural del municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$6.666	\$6.666	\$0	\$0	\$0

Proyectos de prevención y mitigación de erosión costera para el Golfo de Morrosquillo	No Iniciado	\$18.520	\$18.520	\$0	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>\$311.747</b>	<b>\$285.315</b>	<b>\$11.432</b>	<b>\$15.000</b>	<b>\$0</b>

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Golfo-de-Morrosquillo.aspx>

# **ANEXO**

Fondo Regional para los Pactos Territoriales

Proyectos en ejecución y ejecutados

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de Unidad Recreo-deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$9.585

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$8.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$1.585

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	Moñitos
BPIN	2021235000018	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	079-2210703	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	65	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	Fecha viabilidad	27/05/2021

<b>Alcance</b>	<b>Producto Principal</b>	<b>Meta del Producto</b>
Construcción de un área de 13.380,25 m2. Un espacio destinado a una zona deportiva y recreativa que incluye la construcción de graderías, placa polideportiva, cancha de futbol en arena, cancha de softbol, plaza de acceso principal, locales comerciales y cafetería, baterías sanitarias, zonas verdes y circulaciones.	Centros de recreación construidos y dotados	1
		Número de centros de recreación

### Información específica de ejecución contrato específico

2/11/2021

Fecha de Suscripción

18/01/2022

Fecha de Inicio

37

Plazo en Meses

18/02/2025

Fecha Terminación

25.095

Número de Beneficiarios

\$8.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$2.219

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$10.219

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

18/09/2024

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

88%

% Ejecutado



## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba.

Estado Proyecto

Terminado

### Información general del contrato específico

\$8.476

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$5.933

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$2.543

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	<b>Municipio Intervención</b>	Moñitos
<b>BPIN</b>	2021235000010	<b>Área de influencia</b>	Urbano
<b>No. Contrato Específico</b>	080-2210717	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	108	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	6	<b>Fecha viabilidad</b>	31/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos, departamento de Córdoba, con el siguiente alcance: suministro e instalación de 7.258 ml de tubería PVC sanitario para el alcantarillado de aguas residuales, distribuidos en 6.926 ml de tubería de 8" y 332 ml de tubería de 14", suministro e instalación de 724 acometidas domiciliarias, las cuales están comprendidas por 2.896 ml de tubería en PCV Sanitario de 6", construcción de estación de bombeo de aguas residuales EBAR en el barrio Alfonso López del municipio de Moñitos, línea de impulsión de 30 ml de tubería PEAD DN75mm RED 17 PN 10 desde el EBAR hasta el punto de conexión, 106 pozos de inspección hasta H2.00m, 26 pozos de inspección H 2,0 -3.5m, 2 cámaras de caída, paso subfluvial – cruce de tubería de 8" bajo caño 11,50 ml, a una profundidad de 2,70m; perforación dirigida camisa de 12" en acero Shu. 40, accesorios, paso elevado – cercha metálica para cargue de tubería de impulsión.</p>		

### Información específica de ejecución contrato específico

9/11/2021

Fecha de Suscripción

17/12/2021

Fecha de Inicio

33

Plazo en Meses

17/09/2024

Fecha Terminación

25.095

Número de Beneficiarios

\$5.933

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

Pto Comprometido Territorio

\$3.481

Pto Comprometido Otros

\$9.414

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

17/09/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

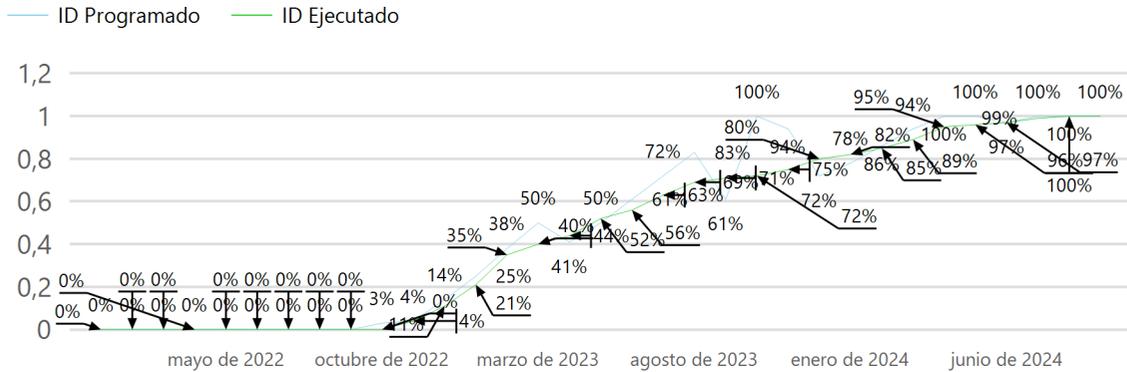

Avance Financiero del proyecto

26/12/2024

Fecha de Corte Avance


\$5.933

Valor Programado (mill)

100%

% Programado

ID Programado ID Ejecutado



\$5.340

Valor Ejecutado (mill)

90%

% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero

Estado Proyecto

Terminado

### Información general del contrato específico

\$7.909

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En Liquidación

Estado Detallado

\$6.319

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$1.590

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Comercio Industria y Turismo	<b>Municipio Intervención</b>	San Antero
<b>BPIN</b>	2021236720128	<b>Área de influencia</b>	Urbano
<b>No. Contrato Específico</b>	085-2210730	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	55	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	3	<b>Fecha viabilidad</b>	10/01/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto tiene un área total de 4455,83 M2 y consta de dos componentes Construcción de zona cubierta (526,83 M2): incluye baños (28,85 M2), cocina (30,00 M2), zona de administración y oficina (13,80 M2), y Construcción de parqueaderos, accesos y andenes (3929,28 M2): incluye zonas verdes (105,37 M2), pavimento (1495,05 M2), andenes (1047 M2), plazas (73,61 M2), zona de parqueadero (404,40 M2), Rampas (136,46 M2), cicloruta (554 M2), Gimnasio biosaludables (61 M2), Escaleras de Acceso deposito (23,78 M2), plazoleta de comidas (276,40 M2), zona Mirador 2 piso (154,00 M2).	Mirador Turístico Construido	1
		UND

### Información específica de ejecución contrato específico

10/11/2021

Fecha de Suscripción

21/01/2022

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

5/06/2023

Fecha Terminación

131.529

Número de Beneficiarios

\$6.319

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$1.580

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$7.899

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

21/06/2023


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

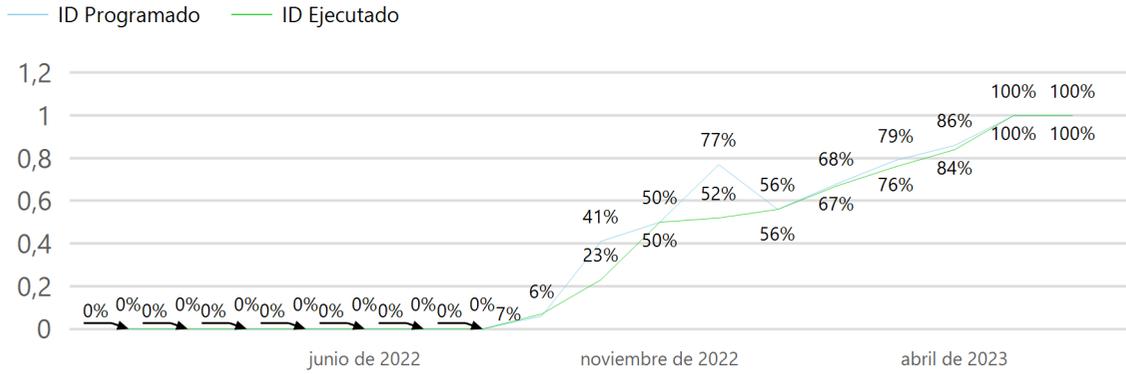


Avance Financiero del proyecto

26/12/2024  
Fecha de Corte Avance

\$6.319  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado

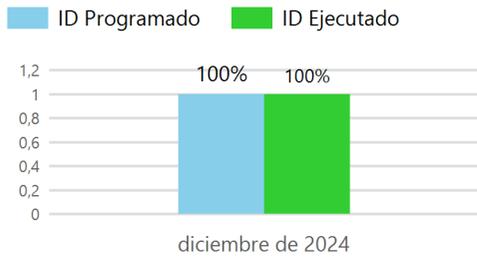

\$6.319  
Valor Ejecutado (mill)

100%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

**Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$14.549

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$14.549

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Transporte	<b>Municipio Intervención</b>	San Antero
<b>BPIN</b>	2021236720178	<b>Área de influencia</b>	Urbano
<b>No. Contrato Específico</b>	089-2210735	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	91	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	10/08/2021

<b>Alcance</b>	<b>Producto Principal</b>	<b>Meta del Producto</b>
Construcción de 3.925,65 metros de pavimento concreto rígido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de vía de 10.7 metros con una calzada de 6.40 metros de ancho incluye señalización vertical y horizontal, anden con bordillo de 1.80 metros de ancho y una ciclo ruta con bordillo de 2.50 metros de ancho.	Vía urbana construida	3,926
		Kilómetros de vías urbanas

### Información específica de ejecución contrato específico

10/11/2021

Fecha de Suscripción

18/02/2022

Fecha de Inicio

39

Plazo en Meses

18/05/2025

Fecha Terminación

131.529

Número de Beneficiarios

\$14.549

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$14.549

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

18/09/2024

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

58%

% Ejecutado



### Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$8.792

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$8.792

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Transporte	<b>Municipio Intervención</b>	San Antero
<b>BPIN</b>	2021236720179	<b>Área de influencia</b>	Urbano
<b>No. Contrato Específico</b>	090-2210736	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	90	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	1	<b>Fecha viabilidad</b>	08/10/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 2.030,00 metros de pavimento concreto rígido MR40 de espesor de 20 cm con un ancho total de vía de 10,00 metros con una calzada de 6,00 metros de ancho, andén con bordillo de 1.50 m y una ciclorruta con bordillo de 2.50 m. incluye señalización vertical y horizontal.	Vía urbana construida	2,07
		Kilómetros de vías urbanas

### Información específica de ejecución contrato específico

11/11/2021

Fecha de Suscripción

18/02/2022

Fecha de Inicio

35

Plazo en Meses

26/01/2025

Fecha Terminación

131.529

Número de Beneficiarios

\$8.792

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$8.792

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

18/07/2024

Fecha de Corte Avance

95%

% Programado

3%

% Ejecutado



## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento

Estado Proyecto

Terminado

### Información general del contrato específico

\$7.524

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$7.524

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	San Bernardo del Viento
BPIN	2021236750026	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	115-2220691	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	105	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	5	Fecha viabilidad	26/11/2021

<b>Alcance</b>	<b>Producto Principal</b>	<b>Meta del Producto</b>
Construcción de pavimento Rígido de longitud 4.10 km en concreto Hidráulico de espesor 21 cm, Subbase Granular e15 cm, incluye cunetas de 80 cm a cada lado y bordillo de e= 15 cms Construcción de un box coulvert doble de 3.0 x 3.0 m, localizado en el K3+363, en donde se encontraba un puente artesanal de madera, el cual no garantiza la funcionalidad durante la vida útil del proyecto. Caracterización vial de la longitud intervenida (4,1 Km)	Vía terciaria mejorada	4,1 Kilómetros de vías terciaria

### Información específica de ejecución contrato específico

18/07/2022

Fecha de Suscripción

6/09/2022

Fecha de Inicio

24

Plazo en Meses

6/09/2024

Fecha Terminación

37.782

Número de Beneficiarios

\$7.524

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$7.524

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

6/09/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

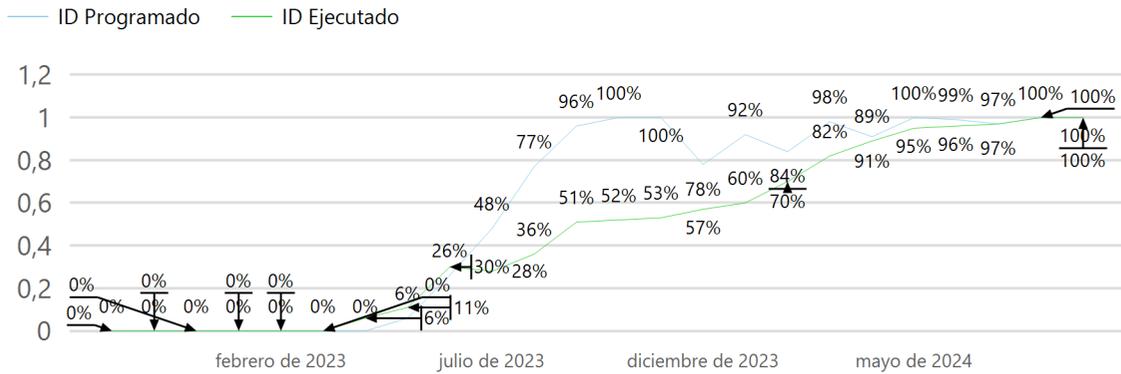

### Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$24.298

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$24.298

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Regional
BPIN	2021002230200	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	128-2220843	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	41	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	4	Fecha viabilidad	16/06/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto consiste en la Construcción de las obras de mitigación para la estabilización por amenazas e inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento en el Departamento de Córdoba, el alcance del contrato incluye el perfilamiento de los taludes, construcción de muro en gaviones, construcción de terraplen y cunetas en los sectores de Remolino y Trementino; terraplen y cunetas en el sector de Leopoldo.		

### Información específica de ejecución contrato específico

12/08/2022

Fecha de Suscripción

30/03/2023

Fecha de Inicio

27

Plazo en Meses

30/06/2025

Fecha Terminación

157.726

Número de Beneficiarios

\$24.298

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$24.298

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

30/09/2024

Fecha de Corte Avance

49%

% Programado

0%

% Ejecutado



## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

**Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín**

Estado Proyecto

Terminado

### Información general del contrato específico

\$7.015

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En Liquidación

Estado Detallado

\$7.015

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Ambiente y Desarrollo Sostenible	<b>Municipio Intervención</b>	Tuchín
<b>BPIN</b>	2021238150094	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	133-2220915	<b>Es Inversión climática?</b>	Si
<b>No. CONPES Anexo B</b>	42	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	4	<b>Fecha viabilidad</b>	13/10/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Recuperación de la cuenca hidrográfica en el resguardo indígena zenú de córdoba-sucre, mediante la canalización y encauce de 1200 ml de canal en revestimiento de concreto y perfilado de 700 ml en canal de tierra del arroyo "las pavas", localizado en la zona urbana del municipio de Tuchin, Departamento de Córdoba.		

### Información específica de ejecución contrato específico

19/08/2022

Fecha de Suscripción

20/10/2022

Fecha de Inicio

13

Plazo en Meses

20/11/2023

Fecha Terminación

37.716

Número de Beneficiarios

\$7.015

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$7.015

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

20/11/2023


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%


% Ejecutado

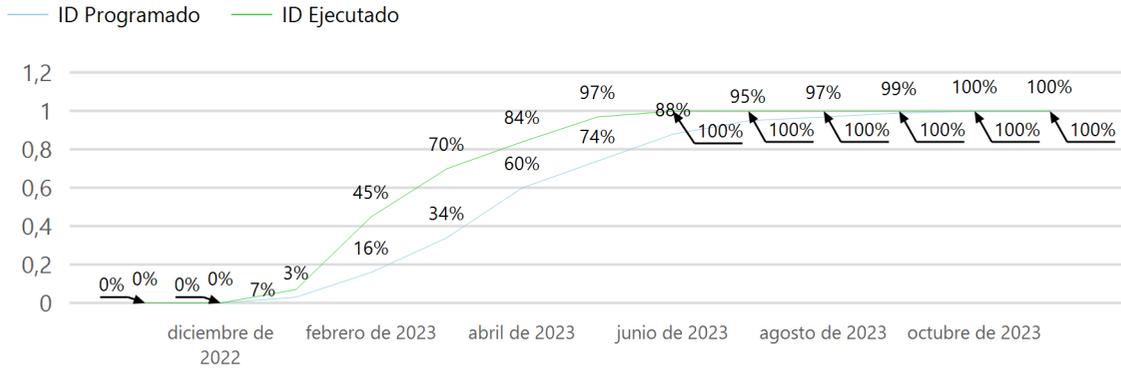

### Avance Financiero del proyecto

26/12/2024  
Fecha de Corte Avance

\$7.015  
Valor Programado (mill)  
100%  
% Programado

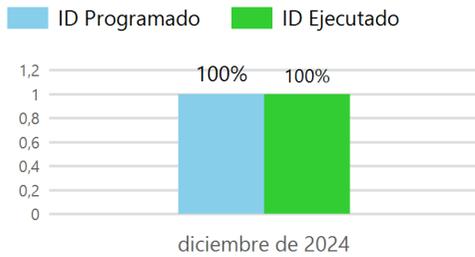

\$7.013  
Valor Ejecutado (mill)  
100%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, Córdoba.**

Estado Proyecto

Terminado

### Información general del contrato específico

\$20.482

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$19.482

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$1.000

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Ambiente y Desarrollo Sostenible	<b>Municipio Intervención</b>	Santa Cruz de Lorica
<b>BPIN</b>	2021002230127	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	151-2221171	<b>Es Inversión climática?</b>	Si
<b>No. CONPES Anexo B</b>	106	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	5	<b>Fecha viabilidad</b>	09/08/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>La alternativa seleccionada del proyecto 3CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA RIBERA DEL CAÑO CHIMALITO, MUNICIPIO DE LORICA, CÓRDOBA</p> <p>Basados en el análisis de vulnerabilidad en la zona de influencia del caño Chimalito, se han identificado varios escenarios con riesgo alto y medio de afectación por el riesgo de efectos del cambio climático, para estos escenarios se han determinado la líneas de proyectos basadas en las estrategias del PNACC acorde a los lineamientos y marcos normativos del proyecto y los indicadores del plan de desarrollo del municipio de lorica, los cuales son:</p> <p>RESTAURACIÓN DE BOSQUES RIPARIOS- 10 Hectáreas CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE VEGETACIÓN FLOTANTE ±17 Hectáreas PATIOS PRODUCTIVOS RESILIENTES ±4000 metros cuadrado CONSTRUIR RELLENOS PARA CONTROL DE INUNDACIÓN= 12025.2 metros cúbicos CONTRUIR Y REALZAR MURO DE CONTENCIÓN (863 M)= 863 metros CONSTRUIR OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL= 1038.83 metros CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA FISICA URBANA= 5496 metros cuadrados</p>		

### Información específica de ejecución contrato específico

6/12/2022

Fecha de Suscripción

20/01/2023

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

20/06/2024

Fecha Terminación

121.214

Número de Beneficiarios

\$19.482

\$0

\$1.000

\$0

Pto Comprometido DNP FRPT

Pto Comprometido Sector

Pto Comprometido Territorio

Pto Comprometido Otros

# \$20.482

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

20/06/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

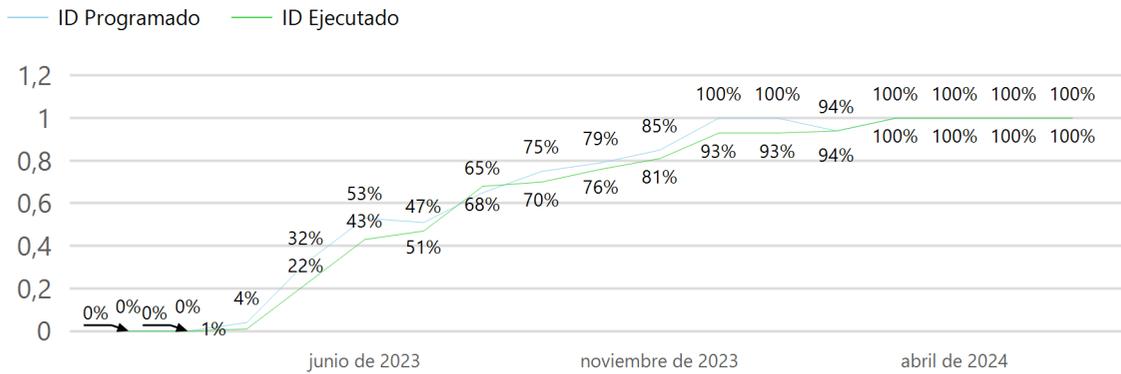

### Avance Financiero del proyecto

26/12/2024

Fecha de Corte Avance


\$19.482

Valor Programado (mill)

100%

% Programado

ID Programado ID Ejecutado



diciembre de 2024

\$19.482

Valor Ejecutado (mill)

100%

% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$41.494

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$41.494

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Municipio Intervención	Santiago de Tolú
BPIN	20221301010001	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	152-2221172	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	107	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	5	Fecha viabilidad	17/06/2022

<b>Alcance</b>	<b>Producto Principal</b>	<b>Meta del Producto</b>
Construcción de 1540 m del Canal hidráulico Rectangular en concreto rígido para la evacuación de aguas lluvias, para una longitud total de 2.876 m a intervenir; Además se contempla el paso de la comunidad de un lado a otro, mediante la construcción de 4 puentes metálicos peatonales y dos puentes vehiculares.	Obras para la prevención y control de inundaciones	2876
		Kilómetros de obras de prevención y control hidráulico

### Información específica de ejecución contrato específico

6/12/2022

Fecha de Suscripción

27/01/2023

Fecha de Inicio

23

Plazo en Meses

27/12/2024

Fecha Terminación

11

Número de Beneficiarios

\$41.468

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$41.468

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

27/07/2024


Fecha de Corte Avance

55%

% Programado

15%

% Ejecutado

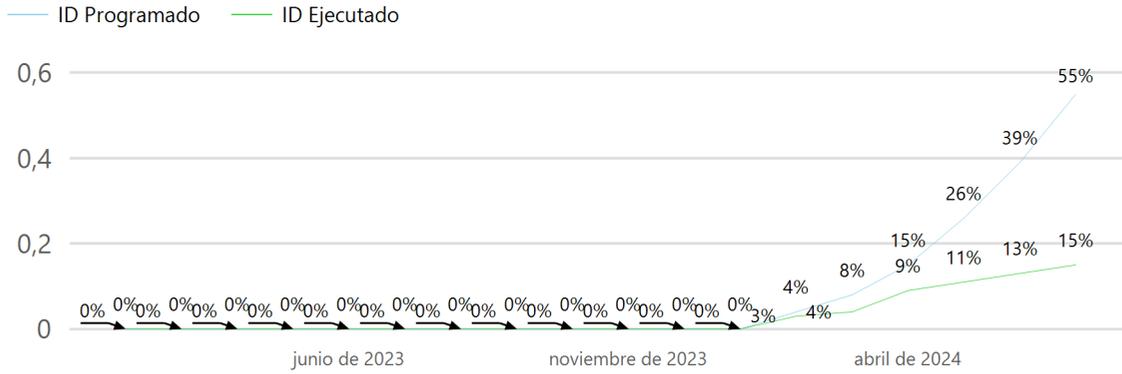


### Avance Financiero del proyecto

26/12/2024  
Fecha de Corte Avance

\$41.468  
Valor Programado (mill)

100%  
% Programado

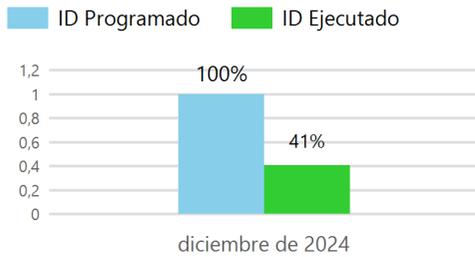

\$16.822  
Valor Ejecutado (mill)

41%  
% Ejecutado

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

### Construcción de Malecón Turístico de la Segunda Ensenada Fase I en el Municipio de Coveñas

Estado Proyecto

En Ejecución

#### Información general del contrato específico

\$31.946

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$29.998

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$1.948

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Comercio Industria y Turismo	Municipio Intervención	Coveñas
BPIN	2021002700374	Área de influencia	Urbano
No. Contrato Específico	168-2221234	Es Inversión climática?	Si
No. CONPES Anexo B	150	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	06/07/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Intervención de un espacio público en el Municipio de Coveñas, adecuándolo para la circulación en el corredor de la playa de la segunda ensenada, contempla la pavimentación de vías, construcción de andenes, cicloruta y creación de espacios para el comercio de productos turísticos (restaurantes - locales comerciales), elementos para la organización del área de la playa (zonas verdes, caseta de vigilancia y zona de primeros auxilios, baterías de baños, zonas de ducha, Mobiliario urbano, instalación de luminaria) con un área total de 23528.52 M2 y una longitud de 983.86 M, que va de la ABS k0+000 a la abscisa k0+983.86, en dicho recorrido la pavimentación de la vía inicia en el K0+350 hasta el K0+983.86 es decir tendrá una longitud de 633.86 M	Malecón construido	1
		UND

#### Información específica de ejecución contrato específico

30/12/2022

Fecha de Suscripción

14/04/2023

Fecha de Inicio

20

Plazo en Meses

14/12/2024

Fecha Terminación

687.419

Número de Beneficiarios

\$29.427

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$570

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$29.998

Presupuesto Comprometido Total (millones)

#### Avance físico del proyecto

14/09/2024


Fecha de Corte Avance

67%

% Programado

1%

% Ejecutado

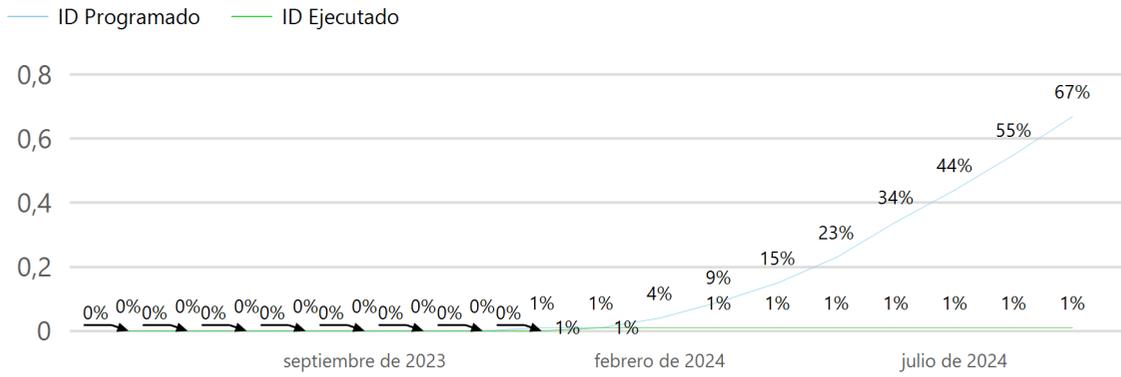

### Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

### Construcción y Dotación de una Estación de Bomberos en el Municipio de Tolú

Estado Proyecto

En Ejecución

#### Información general del contrato específico

\$7.524

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$7.524

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Interior	Municipio Intervención	Santiago de Tolú
BPIN	2022002700102	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	178-2230152	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	86	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	09/11/2022
Alcance		Producto Principal	Meta del Producto
		Estaciones de Bomberos Construidas	1
			Muneo de Estaciones de bomberos

El proyecto cuenta con dos etapas, la primera es la construcción de infraestructura nueva y la segunda consiste en la dotación de la estación con vehículos, dotación al personal con equipos tecnológicos modernos.

La estimación de los costos obedece a un análisis de prefactibilidad y factibilidad cuyos valores son producto inicialmente del análisis de algunas experiencias similares de construcción y posteriormente de cotizaciones recibidas (tanto de insumos como de dotación y equipamiento), que permite la elaboración de un estudio de mercado para la construcción, así como para equipamiento y dotación.

La construcción y dotación de la probable Estación de Bomberos está proyectada para implantarse al suroeste del Municipio de Santiago de Tolú, mediante la unión de 9 predios ubicados en la Urbanización Tolú Nuevo. El área intervención se encuentra señalada dentro de los predios ubicados en la urbanización Tolú nuevo en el municipio de Santiago de Tolú con un área de 2,883.78 m<sup>2</sup>, en 9 lotes declarados de utilidad pública o interés social mediante ordenanza. No.036 de 2020 del Departamento de Sucre. Se incluyen de manera general áreas de recepción, sala de máquinas, vestiré, estación de transferencia de uniformes, salón auditorio, oficinas administrativas, zona de cafetería, área de sanitarios, sala de estar, oficina de comando, gimnasio, salón consejo de oficiales, alojamientos, zonas verdes y duras exteriores, entre otros, además de dotación de máquinas, equipos y dotación personal con los insumos necesarios para atender emergencias.

El tiempo de ejecución de todas las actividades cuenta con un cronograma de 10 meses y los costos del proyecto son los siguientes:

ETAPA I  
 COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA: \$ 5.609.050.826,10  
 COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA: \$ 368.613.523,59



ETAPA II  
 COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE DOTACIÓN: \$1.459.564.850,46  
 COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE DOTACION: \$ 68.399.734,49

TOTAL  
 COSTO TOTAL DEL PROYECTO: \$ 7.522.011.672,50


### Información específica de ejecución contrato específico

15/06/2023 Fecha de Suscripción	24/10/2023 Fecha de Inicio	18 Plazo en Meses	24/04/2025 Fecha Terminación	36.475 Número de Beneficiarios
\$7.522 Pto Comprometido DNP FRPT	\$0 Pto Comprometido Sector	\$0 Pto Comprometido Territorio	\$0 Pto Comprometido Otros	
<b>\$7.522</b> Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

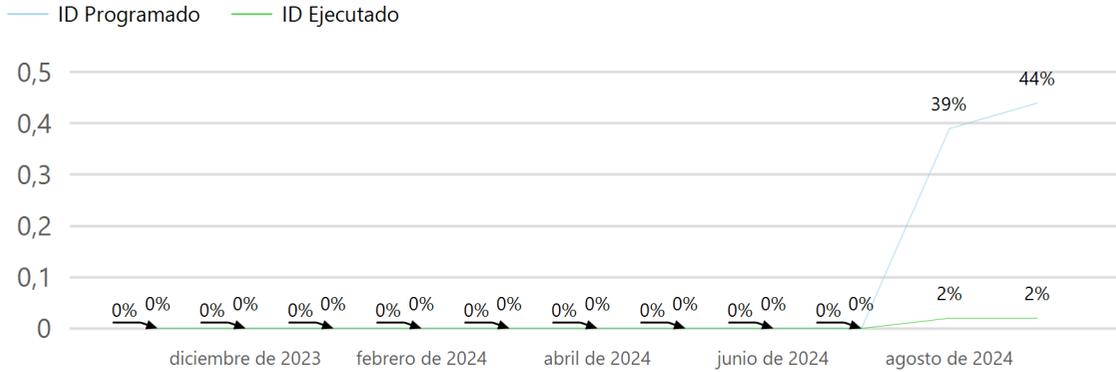

Avance Financiero del proyecto

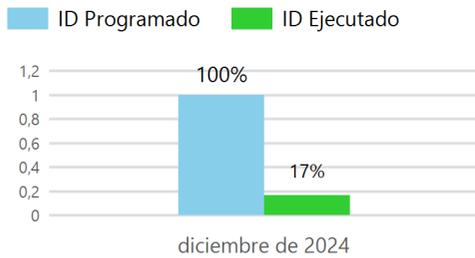

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$43.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$28.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$15.000

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Salud y Protección Social	Municipio Intervención	Coveñas
BPIN	2023002700021	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	189-2230170	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	145	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	30/11/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
La alternativa propuesta comprende la CONSTRUCCIÓN , EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE 1. Área Administrativa: 255,11 mts2 2. Área Consulta externa: 618,46 mts2 3. Área de Urgencias: 708,24 mts2 4. Área Apoyo Diagnóstico: 661,53 mts2 5. Área Hospitalización: 488,70 mts2 6. Área de Cirugía, atención de parto y esterilización: 809,81 mts2 7. Área Servicios Generales y complementarios: 1240,60 mts2 8. Otras Áreas: 1117,47 mts2 9. Aleros: 583,72 mts2 Área Total: 6483,64 mts2	Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados	1 Número de Hospitalises

### Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

2/11/2023

Fecha de Inicio

26

Plazo en Meses

2/01/2026

Fecha Terminación

17.000

Número de Beneficiarios

\$28.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$10.542

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$38.542

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

2/07/2024


3%

3%

Fecha de Corte Avance

% Programado

% Ejecutado

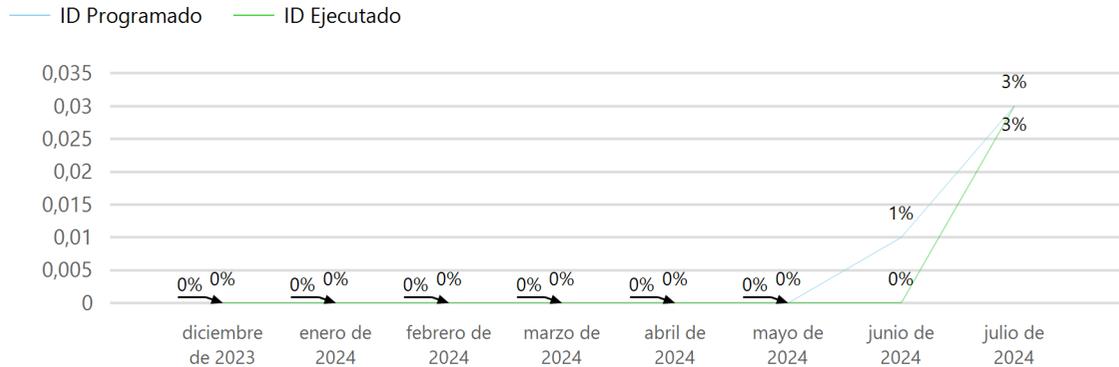

### Avance Financiero del proyecto

26/12/2024

Fecha de Corte Avance

\$28.000

Valor Programado (mill)

100%


% Programado

\$8.400

Valor Ejecutado (mill)

30%

% Ejecutado

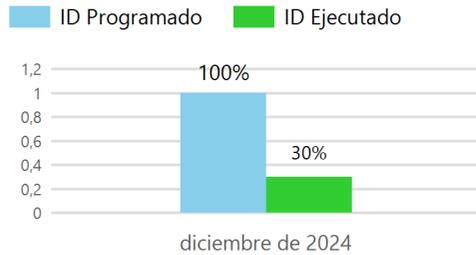

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de malecón ecoturístico en la Bahía de Cispatá, municipio de San Antero, departamento de Córdoba

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$26.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$26.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

<b>Sector de Inversión</b>	Comercio Industria y Turismo	<b>Municipio Intervención</b>	San Antero
<b>BPIN</b>	2022236720080	<b>Área de influencia</b>	Urbano - Rural
<b>No. Contrato Específico</b>	194-2230175	<b>Es Inversión climática?</b>	No
<b>No. CONPES Anexo B</b>	149	<b>Tiene viabilidad?</b>	Si
<b>Sesión CD inclusión PEI</b>	6	<b>Fecha viabilidad</b>	06/08/2023


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
<p>Construcción de espacios de estancia, senderos peatonales cubiertos naturalmente y también con cubiertas artificiales, plazoletas que integren la biodiversidad tanto con el habitante del sector como con los turistas que visitan la zona; muelles turísticos y para pescadores del sector, zonas donde se puedan desarrollar manifestaciones culturales del sector, pasajes comerciales donde se puedan comercializar los productos y artesanías propias de la región y así hacer autosostenible el proyecto diseñado, vías que le den continuidad a la malla vial existente y obligue a recorrer el proyecto en su totalidad, estructuras en concreto y acero, zonas exteriores, redes hidráulicas y sanitarias, redes eléctricas, zonas de parqueaderos, módulos de ventas, espacios cubiertos y lugares de trabajo para los habitantes existentes en la zona de influencia.</p> <p>1. Pavimento propuesto (4558.89 m2) que incluye vía de dos carriles con un ancho de 6 metros y andenes de 1 metro que conecta con pavimentos existente.</p> <p>2. Malecón y andenes (9033.28 m2) que contempla una plazoleta cultural, muelle embarcadero, un faro mirador, plazoleta de juegos de ajedrez y plazoleta del pelicano, juegos infantiles, una plazoleta de comidas, baños, locales y zonas verdes, accesos especiales para personas con movilidad reducidas, pasillos de con losetas táctiles para personas con discapacidad visuales, parque biosaludables.</p> <p>3. Zonas para parqueaderos (1251.79 m2) que cuanta con parqueadero para discapacitados.</p> <p>4. Muelles propuestos (1353.55 m2) incluye muelles para embarcaciones menores, la ampliación del muelle existente y la construcción de un nuevo muelle.</p>	Malecón Construido	1 UND

### Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023 Fecha de Suscripción	6/10/2023 Fecha de Inicio	17 Plazo en Meses	6/03/2025 Fecha Terminación	127 Número de Beneficiarios
\$25.600 Pto Comprometido DNP FRPT	\$0 Pto Comprometido Sector	\$0 Pto Comprometido Territorio	\$0 Pto Comprometido Otros	
\$25.600 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

### Avance físico del proyecto

6/01/2024 Fecha de Corte Avance	0% % Programado	0% % Ejecutado
------------------------------------	--------------------	-------------------

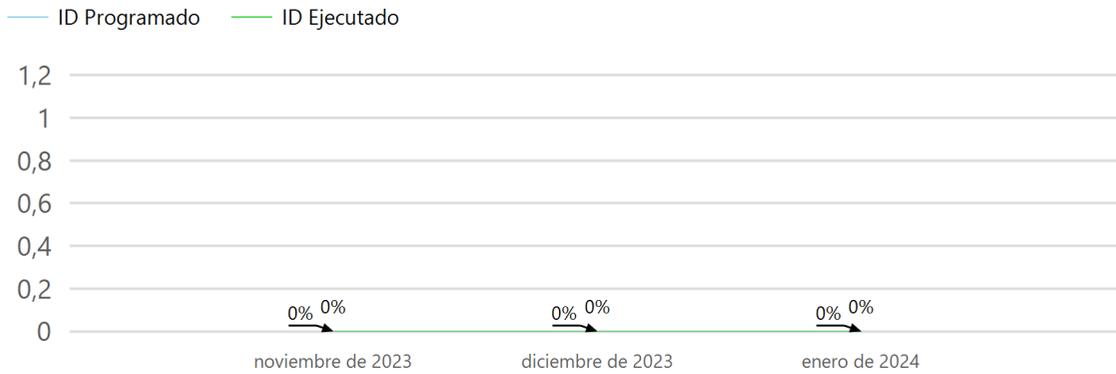

### Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de 261 Unidades Sanitarias dispersas en zona rural del municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$6.666

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En legalización de permisos,

Estado Detallado

obra

\$6.666

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Municipio Intervención	Tuchín
BPIN	2021238150080	Área de influencia	Rural
No. Contrato Específico	195-2230387	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	109	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	Fecha viabilidad	

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 261 Unidades Sanitarias, se permitirán disponer de módulos especiales para satisfacer a la comunidad y ayudar a disminuir la contaminación por el mal manejo de las aguas residuales y por ende disminuir la contaminación al medio ambiente, mejorando la calidad de vida 1.305 habitantes		

### Información específica de ejecución contrato específico

22/12/2023

Fecha de Suscripción

12/03/2024

Fecha de Inicio

13

Plazo en Meses

12/04/2025

Fecha Terminación

38.000

Número de Beneficiarios

\$6.599

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$6.599

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

12/06/2024


Fecha de Corte Avance

0%

% Programado

0%

% Ejecutado



**Avance Financiero del proyecto**



ID Programado (light blue bar)    ID Ejecutado (green bar)

Mes	ID Programado (%)	ID Ejecutado (%)
diciembre de 2024	100%	23%

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
