



Departamento  
Nacional de Planeación



# Informe semestral II-2024

## PACTO TERRITORIAL

## SANTANDER

---

GRUPO GERENCIA NACIONAL DE PACTOS TERRITORIALES  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DICIEMBRE 2024



## CONTENIDO

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | INFORMACIÓN GENERAL .....                   | 3  |
| 1.1 | ¿Qué son los Pactos Territoriales? .....    | 3  |
| 1.2 | ¿Para qué sirve un Pacto Territorial? ..... | 3  |
| 1.3 | Evolución normativa .....                   | 4  |
| 1.4 | Pactos territoriales suscritos.....         | 8  |
| 2.  | INFORME PACTO TERRITORIAL CASANARE .....    | 13 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

---

### 1.1 ¿Qué son los Pactos Territoriales?

**Los Pactos territoriales se definen como:**

Los Pactos territoriales, según el artículo 279 de la Ley 2294 del 2023, se definen como un **instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total**, promoviendo para ello la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, **bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.**

Este instrumento fue incluido en la **Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial** (Ley 1454 de 2011, artículo 18) como una **estrategia de articulación entre los diferentes niveles de gobierno**. Mediante esta figura se pretende incentivar el proceso de descentralización en el país y construir un entorno favorable y simplificado para la inversión pública en el territorio.

### 1.2 ¿Para qué sirve un Pacto Territorial?

Los Pactos Territoriales, basados en experiencias internacionales exitosas en países como Francia e Italia, contribuyen a los procesos de articulación y financiación de iniciativas de proyectos de desarrollo territorial orientados a atender las necesidades en infraestructura y conectividad vial, cobertura de servicios de educación y salud, soluciones de agua potable y saneamiento básico, entre otras necesidades.

A través de la financiación de estos proyectos se promueve el desarrollo económico y social en los territorios en los que tienen incidencia los Pactos Territoriales, dado que se aportaría a la atención de las necesidades identificadas y a impulsar los diferentes sectores, especialmente los más estratégicos, con inversiones que contribuyen al desarrollo local. En resumen, los pactos territoriales sirven para:

- Conectar a las poblaciones y al gobierno (nacional y territorial), articulando y coordinando las capacidades de planeación, gestión y financiación, aprovechando las potencialidades regionales como motor de

crecimiento y equidad, y promoviendo, armónicamente, el desarrollo de las regiones.

- Integrar esfuerzos y visiones de desarrollo de las entidades del orden nacional y local.
- Identificar y desarrollar capacidades municipales para fomentar las ventajas comparativas y competitivas de los territorios.
- Enfocar la cofinanciación mediante inversiones en proyectos de alto impacto, logrando la convergencia regional y buscando reducir las brechas sociales inter e intra municipal y departamental.

### 1.3 Evolución normativa

La figura de los Pactos Territoriales, de acuerdo con el actual Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), es un *"instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total"*<sup>1</sup>. Dicha figura es una actualización de los anteriores Contratos Plan constituidos mediante las leyes 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) y 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), dado que mediante el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, se incorporó al ordenamiento jurídico los Contratos Plan como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno.

Así las cosas, con esta figura se pretende incentivar el proceso de descentralización en el país y construir un entorno favorable y simplificado para la inversión pública en el territorio. En resumen, los Pactos Territoriales impulsan proyectos estratégicos que, por su importancia en la economía nacional, alto uso de mano de obra y generación de empleo formal, buscan generar, en el corto y mediano plazo, beneficios para el bienestar social y económico del país.

Desde su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, esta herramienta de política pública se ha utilizado para impulsar el desarrollo territorial dentro de un esquema de concurrencia de esfuerzos, donde participan los municipios, los departamentos, esquemas asociativos territoriales y la Nación, con una guía técnica por parte de la entidad cabeza de cada sector, cuya participación estará determinada por la finalidad de cada proyecto. En términos del Documento

---

<sup>1</sup> Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, artículo 279.

CONPES 3822 de 2014, *"Estos instrumentos, conocidos genéricamente como acuerdos de desempeño o de resultados, implican tanto negociación como cooperación entre autoridades con diferentes márgenes de autonomía, competencia y capacidades"*.

Con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822, se expidió la Ley 1753 de 2015, cuyos artículos 198 y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una parte, el alcance jurídico de la herramienta, y de otra, crean el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan.

El artículo 198 de la Ley 1753 de 2015 modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contratos Plan como

*"(...) un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial"*.

De igual forma, este artículo señaló que:

*"En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región"*.

Aunque los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio, para impulsar determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, tratándose de la ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean estas del orden nacional (Ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del orden territorial (Departamentos, municipios y corporaciones autónomas, empresas

industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas prestadoras de servicios públicos, entre otras). Es claro que la Entidad Ejecutora conserva su competencia en la contratación, seguimiento, vigilancia y supervisión de los contratos celebrados, bien sea contratos de obra, consultoría y su interventoría, tal como lo establece el marco normativo.

Por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos Plan, como una cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podría ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose en un mecanismo de gestión que permite facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los Contratos Plan / Pactos Territoriales, y de lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles.

Con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de esta herramienta para ser utilizado por los aportantes en estos contratos, bien se trate de las partes o de terceros para la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, *"Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan"*, el cual especifica las condiciones generales de operación y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados los recursos que ingresen a este.

Así mismo y siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo *"Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad"*, para el cuatrienio 2018-2022 se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

De acuerdo con lo anterior, cada Ley del Plan que se ha venido expidiendo ha hecho modificaciones a la figura original (por ejemplo, en cuanto a su enfoque, con la incorporación de los Contratos Plan para la Paz), de manera que hoy podría

hablarse de tres estadios o generaciones de esta figura, a saber: (i) los Contratos Plan (2011); (ii) los Contratos Plan para la Paz (2016); y, (iii) los Pactos Territoriales (2019).

El fondo vigente y en ejecución para los pactos territoriales es el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, anteriormente denominado Fondo Regional para los Contratos Plan, teniendo en cuenta, en todo caso, que con lo establecido en el artículo 250<sup>2</sup> de la Ley 1955 de 2019 se pasa de los Contratos Plan al modelo de Pactos Territoriales. Ahora bien, dicho artículo fue modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023 (Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "*Colombia potencia mundial de la vida*"), actual Plan Nacional de Desarrollo.

Es importante precisar que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de fecha 21 de junio de 2022, "*Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*", el cual señala con relación a lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 que las referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo Regional para los Contratos Plan" se entenderán efectuadas a los "Pactos Territoriales" y al "Fondo Regional para los Pactos Territoriales", respectivamente.

A su vez, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023 modifica el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, para señalar que los departamentos, los municipios, los Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación podrán suscribir **Pactos Territoriales, definidos como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional** definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total. Se promueve para ello la adopción de metodologías con enfoque de género, a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.

---

<sup>2</sup> [\[2\]](#) Ley 1955 de 2019, artículo 250: "*El Departamento Nacional de Planeación coordinará el proceso de **transición y articulación de los Contratos Plan hacia el modelo de Pactos Territoriales** y definirá los aspectos operativos correspondientes. En adelante la Nación, las entidades territoriales y los esquemas asociativos de entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011, solo podrán suscribir pactos territoriales. Se mantendrán como mecanismos para la ejecución de esta nueva herramienta los Contratos Específicos y el Fondo Regional para los Contratos Plan, en adelante Fondo Regional para los Pactos Territoriales, cuya operación se orientará a facilitar la ejecución de los Pactos Territoriales y de los Contratos Plan vigentes. Los Contratos Plan suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1454 de 2011, se mantendrán vigentes por el término de duración pactado entre las partes, que en todo caso, no podrá superar el 31 de diciembre de 2023.*" (Negrilla fuera de texto).



Departamento  
Nacional de Planeación

Ilustración 1 Evolución Normativa Pactos Territoriales



Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP.

### 1.4 Pactos territoriales suscritos

La concertación y suscripción de Pactos territoriales para la ejecución de proyectos estratégicos ha sido una prioridad para el Gobierno nacional, a través del DNP, dando como resultado la suscripción de 11 Pactos Territoriales, que se describen a continuación:

Tabla 1. Pactos Territoriales suscritos

| Nombre del pacto    | Fecha suscripción y duración                                       | Participantes  | Objetivos y líneas temáticas   |
|---------------------|--|--|--|
| <b>Bicentenario</b> | 26 de junio de 2019<br>Duración 10 años, hasta 26 de junio de 2029 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vicepresidencia de la República.</li> <li>DNP.</li> <li>Ministerio de Transporte.</li> <li>Ministerio de Comercio Industria y Turismo.</li> <li>Departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander.</li> </ul> | Articular entre la Nación y los departamentos afines a la conmemoración del Bicentenario, las políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de los proyectos conforme a las necesidades de los territorios con el fin de promover la competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo social y económico de la Región. |

| Nombre del pacto             | Fecha suscripción y duración                                       | Participantes   | Objetivos y líneas temáticas  |
|------------------------------|--|---|---|
| <b>Golfo de Morrosquillo</b> | 7 de febrero de 2020, Duración 5 años, hasta 7 de febrero de 2025  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernaciones de Sucre y Córdoba.</li> <li>• Municipios de Coveñas, Tolú, Tolviejo, San Onofre, Palmito, Loricá, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero y Tuchín.</li> </ul> | <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la campaña libertadora.</p> <p>(ii) Fortalecimiento de la competitividad turística de la campaña libertadora.</p>   |
| <b>Santander</b>             | 31 de octubre de 2020 Duración 5 años, hasta 31 de octubre de 2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación de Santander.</li> <li>• Provincias de Guantán, Comunera, Vélez, Yariguíes, García Rovira, Soto Norte y Metropolitana.</li> </ul>                                      | <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Fortalecimiento y ordenamiento institucional.</p> <p>(ii) Infraestructura para la disminución de las necesidades básicas insatisfechas.</p> <p>(iii) Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.</p> <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para su desarrollo económico y social.</p> |

| Nombre del pacto          | Fecha suscripción y duración  | Participantes   | Objetivos y líneas temáticas  |
|---------------------------|---|---|---|
| <b>Cesar – La Guajira</b> | 14 de enero de 2021<br>Duración 5 años, hasta 14 de enero de 2026     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación de Cesar.</li> <li>• Gobernación de la Guajira.</li> <li>• Alcaldía de Valledupar.</li> <li>• Municipios delegados de las subregiones de Norte, Noroccidental, Centro y Sur del departamento del Cesar y los municipios delegados de las subregiones Alta, Media y Sur del departamento de La Guajira</li> </ul> | <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Conectividad subregional.</li> <li>(ii) Infraestructura para el desarrollo económico y social.</li> </ul> <p>Articular entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira las políticas, planes y programas orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Fortalecimiento institucional.</li> <li>(ii) Infraestructura y progreso.</li> <li>(iii) Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.</li> <li>(iv) Seguridad y convivencia.</li> </ul> |
| <b>Cundinamarca</b>       | 19 de febrero de 2021<br>Duración 3 años, hasta 19 de febrero de 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación de Cundinamarca.</li> <li>• Municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Chipaque, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, Fúquene, Gachetá, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Pulí, Ricaurte, San Antonio del</li> </ul>                       | <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Infraestructura para la integración social.</li> <li>(ii) Gestión ambiental y saneamiento básico.</li> </ul>   |

| Nombre del pacto | Fecha suscripción y duración  | Participantes   | Objetivos y líneas temáticas   |
|------------------|---|---|--|
|                  |   | Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Tocancipá, Ubalá, Ubaté, Viotá y Zipaquirá.   |  |
| <b>Casanare</b>  | 27 de febrero de 2021<br>Duración 5 años, hasta 27 de febrero de 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación de Casanare.</li> <li>• Municipio de Yopal como capital del departamento, el municipio de Paz de Ariporo en representación de la zona Norte, el municipio de Orocué en representación de la zona Centro y el municipio de Tauramena en representación de la zona Sur.</li> </ul> | <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Casanare como un eje dinamizador de crecimiento y productividad a través de la identificación y ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la conectividad, la equidad y al desarrollo económico y social.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Desarrollo económico y social.</p> <p>(ii) Vías para la equidad.</p> <p>(iii) Infraestructura social.</p> |
| <b>Atlántico</b> | 17 de marzo de 2021<br>Duración 3 años, hasta 17 de marzo de 2024     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación del Atlántico.</li> <li>• Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.</li> <li>• Municipios de Juan de Acosta, Luruaco, Puerto Colombia, Piojó, Tubará y Usiacurí.</li> </ul>   | <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Desarrollo productivo y turístico sostenible.</p> <p>(ii) Conectividad e integración subregional.</p>   |
| <b>Bolívar</b>   | 5 de abril de 2021  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Gobernación de Bolívar.</li> </ul>   | <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera</p>  |

| Nombre del pacto                          | Fecha suscripción y duración                                      | Participantes   | Objetivos y líneas temáticas  |
|---|---|---|---|
|   | Duración 3 años, hasta 5 de abril de 2024                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distrito de Santa Cruz de Mompós.</li> <li>• Municipios de Arjona, Arenal del Sur, Córdoba, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbana y Villanueva.</li> </ul> | <p>de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Infraestructura para el desarrollo social.</p> <p>(ii) Infraestructura para la integración social.</p>   |
| <b>Arte, la cultura y la vida - Bello</b> | 26 de abril de 2021<br>Duración 5 años, hasta 26 de abril de 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Área metropolitana del Valle de Aburrá.</li> <li>• Municipio de Bello.</li> </ul>  | <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de intervenciones urbano-integrales, que contribuyan a consolidar el arte, la cultura y la vida, como eje de desarrollo en el municipio de Bello y aporten al desarrollo urbano de la Centralidad Norte del Valle de Aburrá como nodo de integración regional en el departamento de Antioquia.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Manejo y protección del patrimonio cultural.</p> <p>(ii) Revitalización urbana para el arte y la cultura.</p> |
| <b>Río Bogotá</b>                         | 30 de junio de 2021<br>Duración 5 años, hasta 30 de junio de 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</li> <li>• Gobernación de Cundinamarca.</li> <li>• Municipios de Zipaquirá, Viotá y Chipaque.</li> </ul>   | <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos priorizados del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (POMCA) y del Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios ecosistémicos</p>   |

| Nombre del pacto | Fecha suscripción y duración  | Participantes   | Objetivos y líneas temáticas  |
|------------------|---|---|---|
| <b>Magdalena</b> | 22 de diciembre de 2021<br>Duración 5 años, hasta 22 de diciembre de 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNP.</li> <li>• Todos los municipios del departamento del Magdalena, con excepción del Distrito de Santa Marta.</li> </ul> | <p>de la cuenca hidrográfica del río Bogotá.</p> <p><b>Línea temática:</b></p> <p>(i) Ordenamiento y gobernanza ambiental.</p> <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y social del departamento del Magdalena, a partir del aprovechamiento de sus dinámicas económicas, sociales y ambientales.</p> <p><b>Líneas temáticas:</b></p> <p>(i) Productividad y desarrollo económico.</p> <p>(ii) Infraestructura para la integración y el desarrollo social.</p> <p>(iii) Saneamiento ambiental y adaptación al cambio climático.</p> <p>(iv) Fortalecimiento institucional.</p> |

Fuente: Gerencia de Pactos Territoriales, DNP.

## 2. INFORME PACTO TERRITORIAL SANTANDER

A continuación, se presenta el informe del Pacto Territorial.

## Pacto Territorial Santander

|   |                             |   |   |   |
|---|-----------------------------|---|---|---|
| <b>31/10/2020</b><br>Fecha suscripción                    | <b>5</b><br>Plazo en años   | <b>31/10/2025</b><br>Fecha de Terminación                   | <b>10</b><br>Meses para vencimiento               | <b>83%</b><br>% Tiempo Transcurrido                   |
| <b>47</b><br>Total Proyectos                              | <b>13</b><br>Proyectos FRPT | <b>34</b><br>Proyectos Otras Fuentes                        | <b>\$1.832.859</b><br>Valor Indicativo (Millones) |   |
| <b>\$1.313.686</b><br>Aporte indicativo nación (Millones) |                             | <b>\$451.515</b><br>Aporte indicativo territorio (Millones) |   | <b>\$67.657</b><br>Aporte indicativo otros (Millones) |


### Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

| Sector de inversión                     | Valor Indicativo   | Aporte Indicativo Nación | Aporte indicativo Territorio | Aporte indicativo Otros |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Ambiente y Desarrollo Sostenible        | \$174.599          | \$133.099                | \$41.500                     | \$0                     |
| Comercio Industria y Turismo            | \$158.664          | \$107.050                | \$51.614                     | \$0                     |
| Deporte y Recreacion                    | \$22.098           | \$0                      | \$22.098                     | \$0                     |
| Educacion                               | \$205.332          | \$122.675                | \$15.000                     | \$67.657                |
| Interior                                | \$1.064            | \$1.064                  | \$0                          | \$0                     |
| Salud y Proteccion Social               | \$56.000           | \$0                      | \$56.000                     | \$0                     |
| Transporte                              | \$1.101.430        | \$949.798                | \$151.632                    | \$0                     |
| Vivienda Ciudad y Territorio - Agua     | \$29.181           | \$0                      | \$29.181                     | \$0                     |
| Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda | \$84.489           | \$0                      | \$84.489                     | \$0                     |
| <b>Total</b>                            | <b>\$1.832.859</b> | <b>\$1.313.686</b>       | <b>\$451.515</b>             | <b>\$67.657</b>         |

### Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

| Sector de inversión                     | Comprometido Total | Consolidado Nación | Comprometido Territorio | Comp. Aporte Otros |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Ambiente y Desarrollo Sostenible        | \$183.865          | \$138.099          | \$45.766                | \$0                |
| Comercio Industria y Turismo            | \$177.905          | \$65.054           | \$90.595                | \$22.256           |
| Deporte y Recreacion                    | \$12.098           | \$0                | \$12.098                | \$0                |
| Educacion                               | \$186.633          | \$117.275          | \$39.041                | \$30.316           |
| Interior                                | \$1.064            | \$1.064            | \$0                     | \$0                |
| Salud y Proteccion Social               | \$30.435           | \$0                | \$30.435                | \$0                |
| Transporte                              | \$1.266.257        | \$1.061.909        | \$204.348               | \$0                |
| Vivienda Ciudad y Territorio - Agua     | \$28.214           | \$0                | \$28.214                | \$0                |
| Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda | \$89.959           | \$0                | \$89.959                | \$0                |
| <b>Total</b>                            | <b>\$1.976.429</b> | <b>\$1.383.400</b> | <b>\$540.457</b>        | <b>\$52.572</b>    |

## Número de Proyectos por Estado

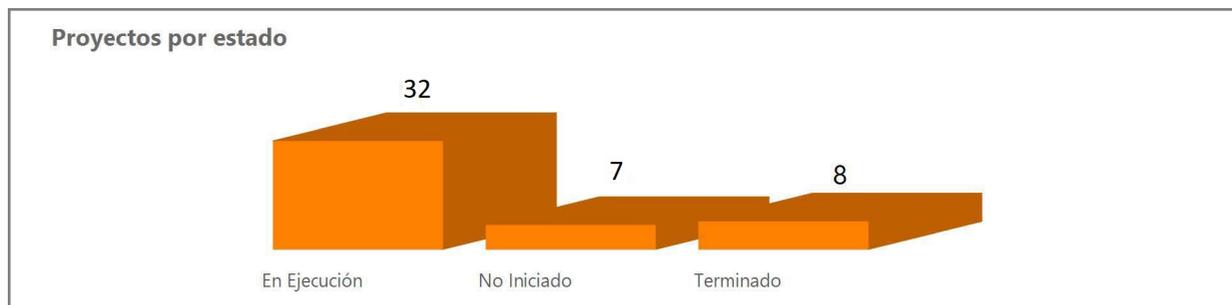

## Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

| Estado Proyecto | Nombre Proyecto   | Inversión Total | Aporte Indicativo Nación | Aportes indicativo Territorio | Aporte indicativo Otros |
|-----------------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| En Ejecución    | Pavimentación vía Curos - Málaga  | \$320.000       | \$320.000                | \$0                           | \$0                     |
| En Ejecución    | Pavimentación vía Zapatoca - Galán - Barichara  | \$152.281       | \$150.000                | \$2.281                       | \$0                     |
| En Ejecución    | Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.  | \$120.657       | \$60.000                 | \$0                           | \$60.657                |
| En Ejecución    | Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.  | \$109.163       | \$66.169                 | \$42.995                      | \$0                     |
| En Ejecución    | Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín - Mogotes   | \$90.000        | \$90.000                 | \$0                           | \$0                     |
| En Ejecución    | Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander.  | \$76.651        | \$60.000                 | \$16.651                      | \$0                     |
| En Ejecución    | Construcción vivienda nueva, Charalá, Cabrera, San Gil, Villanueva, Onzaga, Mogotes, Curití, Valle de San José, Páramo, Aratoca, California, Matanza, Rionegro, Guacamayo, Oiba, Socorro, Confines, Guadalupe, Chima, Gámbita, Guapotá, Suaita, Piedecuesta, Lebrija, Galán, Palmar, San Miguel, Macaravita, Concepción, Barbosa, Puente Nacional, La Belleza, Guavatá, El Peñón, Bolívar, Albania, Puerto Wilches, El Carmen de Chucurí, Betulia | \$71.889        | \$0                      | \$71.889                      | \$0                     |


|              |  |          |          |          |     |
|--------------|--|----------|----------|----------|-----|
| En Ejecución | Construcción del Malecón, Barrancabermeja  | \$64.737 | \$47.050 | \$17.687 | \$0 |
| En Ejecución | Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.  | \$56.830 | \$46.830 | \$10.000 | \$0 |
| En Ejecución | Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2  | \$29.732 | \$29.732 | \$0      | \$0 |
| En Ejecución | Mejoramiento de las vías rurales en los municipios de Rionegro, Lebrija, San Vicente de Chucuri, El Carmen de Chucuri, Cimitarra, Vélez, Güepsa y San Andrés, mediante la construcción de placa huellas en el Departamento de Santander.   | \$29.423 | \$29.423 | \$0      | \$0 |
| En Ejecución | Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.   | \$28.275 | \$28.275 | \$0      | \$0 |
| En Ejecución | Ampliación SENA, San Gil   | \$28.000 | \$13.000 | \$15.000 | \$0 |
| En Ejecución | Mejoramiento /pavimentación Carmen - Yarima  | \$20.000 | \$0      | \$20.000 | \$0 |
| En Ejecución | Control y mitigación de inundaciones mediante la construcción del canal de aguas lluvias para la quebrada Suratoque (entre la carrera 6 y 150 metros debajo de la confluencia con la quebrada la palmira) en el municipio de Piedecuesta y corresponde al sector de Ambiente y desarrollo sostenible | \$20.000 | \$0      | \$20.000 | \$0 |
| En Ejecución | Pavimentación Socorro - Páramo   | \$15.792 | \$0      | \$15.792 | \$0 |
| En Ejecución | Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista-Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander   | \$15.226 | \$15.226 | \$0      | \$0 |

|              |   |          |          |          |         |
|--------------|---|----------|----------|----------|---------|
| En Ejecución | Mejoramiento / rehabilitación Girón - Zapatoca  | \$15.000 | \$0      | \$15.000 | \$0     |
| En Ejecución | Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista-fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander  | \$14.757 | \$14.757 | \$0      | \$0     |
| En Ejecución | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO GAITÁN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER  | \$14.554 | \$14.554 | \$0      | \$0     |
| En Ejecución | Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta  | \$13.840 | \$10.000 | \$0      | \$3.840 |
| En Ejecución | Pavimentación acceso a Puerto Wilches   | \$13.000 | \$0      | \$13.000 | \$0     |
| En Ejecución | Mejoramiento vivienda, Ocamonte, Coromoro, Encino, Pinchote, San Joaquín, Jordán, Cepitá, Contratación, Palmas de Socorro, Hato, Guaca, Molagavita, Carcasí, Capitanejo, Chipatá, Sucre, El Peñón, Santa Helena del Opón, San Vicente, Zapatoca, Lebrija, Piedecuesta, Los Santos | \$12.600 | \$0      | \$12.600 | \$0     |
| En Ejecución | Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón   | \$12.276 | \$0      | \$12.276 | \$0     |
| En Ejecución | Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja y Santander y corresponde al sector de Transporte   | \$10.064 | \$0      | \$10.064 | \$0     |
| En Ejecución | Mejoramiento / pavimentación Gámbita - Palermo  | \$10.000 | \$0      | \$10.000 | \$0     |
| En Ejecución | Mejoramiento /pavimentación Guavatá - Vélez   | \$10.000 | \$0      | \$10.000 | \$0     |
| En Ejecución | Construcción hospital Barbosa   | \$10.000 | \$0      | \$10.000 | \$0     |
| En Ejecución | Construcción hospital, San Andrés   | \$8.000  | \$0      | \$8.000  | \$0     |
| En Ejecución | Construcción hospital, Suaita   | \$8.000  | \$0      | \$8.000  | \$0     |

|              |  |                    |                    |                  |                 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| En Ejecución | Construcción de la villa olímpica, Matanza   | \$5.000            | \$0                | \$5.000          | \$0             |
| No Iniciado  | Terminación hospital, San Gil  | \$25.000           | \$0                | \$25.000         | \$0             |
| No Iniciado  | Construcción de las obras geotécnicas para la prevención, mitigación y estabilización, en el sector de la transversal, (Asomiflor) Fase I, II y III, en el municipio de Floridablanca departamento de Santander. | \$11.500           | \$0                | \$11.500         | \$0             |
| No Iniciado  | Mejoramiento /pavimentación Enciso - Carcasí   | \$10.000           | \$0                | \$10.000         | \$0             |
| No Iniciado  | Sede administrativa Indersantander, Bucaramanga  | \$10.000           | \$0                | \$10.000         | \$0             |
| No Iniciado  | Construcción fase 2 Plan Maestro Alcantarillado, Charalá   | \$6.181            | \$0                | \$6.181          | \$0             |
| No Iniciado  | Terminación hospital, Mogotes  | \$5.000            | \$0                | \$5.000          | \$0             |
| No Iniciado  | Parque Lineal de la Libertad, Socorro  | \$5.000            | \$0                | \$5.000          | \$0             |
| Terminado    | Pavimentación Troncal Central Norte  | \$180.000          | \$180.000          | \$0              | \$0             |
| Terminado    | Pavimentación Transversal Carare   | \$90.000           | \$90.000           | \$0              | \$0             |
| Terminado    | Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta   | \$23.000           | \$0                | \$23.000         | \$0             |
| Terminado    | Mejoramiento anillo vial Girón – Floridablanca   | \$20.000           | \$20.000           | \$0              | \$0             |
| Terminado    | Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander       | \$12.000           | \$12.000           | \$0              | \$0             |
| Terminado    | Construcción de la villa olímpica, Oiba  | \$7.098            | \$0                | \$7.098          | \$0             |
| Terminado    | Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional  | \$6.707            | \$4.207            | \$2.500          | \$0             |
| Terminado    | Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.  | \$1.064            | \$1.064            | \$0              | \$0             |
| <b>Total</b> |  | <b>\$1.832.859</b> | <b>\$1.313.686</b> | <b>\$451.515</b> | <b>\$67.657</b> |

El total incluye el proyecto en ejecución: Adecuación y mejoramiento de la sede regional Tecnológica de Santander, total \$14.560, nación \$11.400 y otros \$3.160

**Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)**



| Estado de proyectos | Número de proyectos | Valor Indicativo   |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| En Ejecución        | 32                  | \$1.535.557        |
| Terminado           | 8                   | \$440.872          |
| <b>Total</b>        |                     | <b>\$1.976.429</b> |

| Estado de proyectos | Número de proyectos | Valor Indicativo |
|---------------------|---------------------|------------------|
| No Iniciado         | 7                   | \$72.681         |
| <b>Total</b>        |                     | <b>\$72.681</b>  |

**Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)**



| Nombre proyecto  | Estado proyecto | Valor Indicativo | Aporte indicativo DNP FRPT | Aportes indicativo Territorio | Aportes indicativo Sector | Aporte Indicativo Otros |
|--|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.           | En Ejecución    | \$28.275         | \$28.275                   | \$0                           | \$0                       | \$0                     |
| Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta         | En Ejecución    | \$13.840         | \$10.000                   | \$0                           | \$0                       | \$3.840                 |
| Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. | En Ejecución    | \$120.657        | \$60.000                   | \$0                           | \$0                       | \$60.657                |

|   |              |          |          |          |     |     |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----|-----|
| Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander.  | En Ejecución | \$76.651 | \$60.000 | \$16.651 | \$0 | \$0 |
| Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.   | Terminado    | \$1.064  | \$1.064  | \$0      | \$0 | \$0 |
| Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de Santander.  | En Ejecución | \$56.830 | \$46.830 | \$10.000 | \$0 | \$0 |
| Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander   | En Ejecución | \$15.226 | \$15.226 | \$0      | \$0 | \$0 |
| Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2 | En Ejecución | \$29.732 | \$29.732 | \$0      | \$0 | \$0 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO GAITÁN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER  | En Ejecución | \$14.554 | \$14.554 | \$0      | \$0 | \$0 |
| Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander   | En Ejecución | \$14.757 | \$14.757 | \$0      | \$0 | \$0 |

|  |              |                  |                  |                 |            |                 |
|--|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander                               | Terminado    | \$12.000         | \$12.000         | \$0             | \$0        | \$0             |
| Mejoramiento de las vías rurales en los municipios de Rionegro, Lebrija, San Vicente de Chucuri, El Carmen de Chucuri, Cimitarra, Vélez, Güepsa y San Andrés, mediante la construcción de placa huellas en el Departamento de Santander. | En Ejecución | \$29.423         | \$29.423         | \$0             | \$0        | \$0             |
| <b>Total</b>   |              | <b>\$413.009</b> | <b>\$321.860</b> | <b>\$26.651</b> | <b>\$0</b> | <b>\$64.497</b> |

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Santander.aspx>

# **ANEXO**

Fondo Regional para los Pactos Territoriales  
Proyectos en ejecución y ejecutados

## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$28.275

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$28.275

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

|                                |               |                                |             |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Sector de Inversión</b>     | Educacion     | <b>Municipio Intervención</b>  | Bucaramanga |
| <b>BPIN</b>                    | 2021004680327 | <b>Área de influencia</b>      | Urbano      |
| <b>No. Contrato Específico</b> | 074-2210677   | <b>Es Inversión climática?</b> | No          |
| <b>No. CONPES Anexo B</b>      | 78            | <b>Tiene viabilidad?</b>       | Si          |
| <b>Sesión CD inclusión PEI</b> | 1             | <b>Fecha viabilidad</b>        | 07/07/2021  |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>Alcance</b>  | <b>Producto Principal</b>  | <b>Meta del Producto</b> |
| Construir una edificación de 5 pisos de altura y 2 sótanos adecuando y mejorando 5.512,52 m2 de planta física, con 11 salones distribuidos en una edificación de 5 pisos de altura y 2 sótanos, 7 laboratorios, 4 oficinas, una biblioteca. | Servicio de apoyo financiero a las Instituciones de Educación Superior | 1                        |
|   |  | Número instituciones     |

### Información específica de ejecución contrato específico

26/10/2021

Fecha de Suscripción

15/12/2021

Fecha de Inicio

41

Plazo en Meses

14/05/2025

Fecha Terminación

1.750

Número de Beneficiarios

\$28.275

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$3.086

Pto Comprometido Otros

\$31.361

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

15/11/2024


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

63%

% Ejecutado

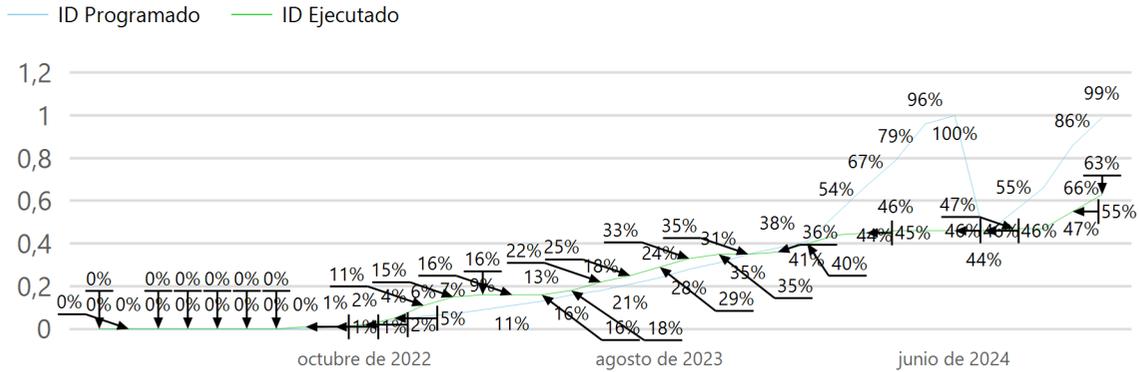

Avance Financiero del proyecto

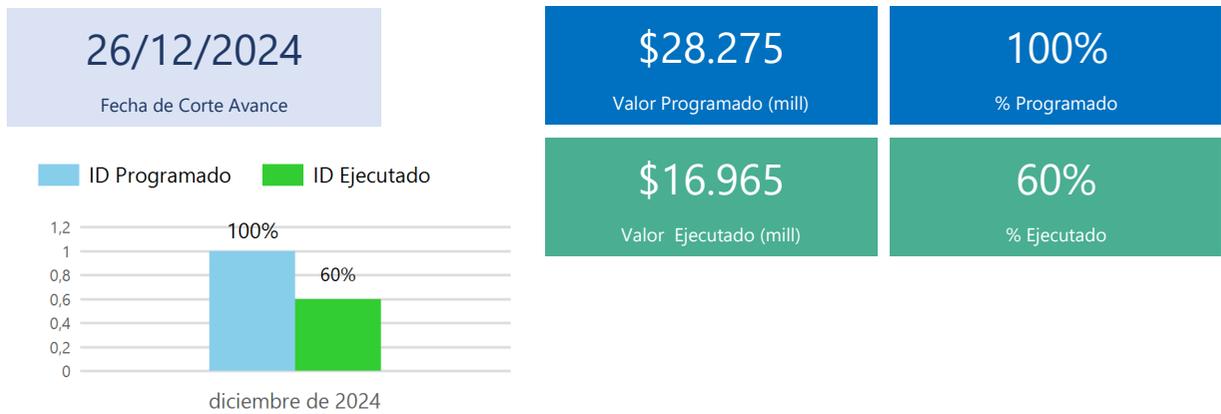

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

### Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.

Estado Proyecto

En Ejecución

#### Información general del contrato específico

\$120.657

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$60.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$60.657

Otros Aporte (millones)

|                         |               |                         |             |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Sector de Inversión     | Educacion     | Municipio Intervención  | Bucaramanga |
| BPIN                    | 2021004680414 | Área de influencia      | Urbano      |
| No. Contrato Específico | 088-2210733   | Es Inversión climática? | No          |
| No. CONPES Anexo B      | 76            | Tiene viabilidad?       | Si          |
| Sesión CD inclusión PEI | 1             | Fecha viabilidad        | 15/10/2021  |

| Alcance  | Producto Principal                                | Meta del Producto    |
|--|---|----------------------|
| <p>Se desarrolló un proyecto global para el campus de la Facultad de Salud, que consiste en la construcción de siete (7) niveles de los cuales, se destinaron dos (2) a parqueaderos y cinco (5) al desarrollo y mejoramiento de espacios para actividades académico- administrativas, culturales con sus respectivas conexiones a redes eléctricas, de comunicaciones, automatización, hidrosanitarias, hidráulica, redes contra incendios y gases especiales.</p> <p>El proyecto contempla la construcción de 27.285,32 m2 repartidos en cincuenta y tres Laboratorios, doce Aulas, treinta y un consultorios, Un auditorio, dos Gimnasios; uno para adultos y otro infantil; una biblioteca y dos centros de estudio.</p> | Sede de educación superior o terciaria construida | 1<br>Número de Sedes |

#### Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021

Fecha de Suscripción

21/12/2021

Fecha de Inicio

40

Plazo en Meses

21/04/2025

Fecha Terminación

2.399

Número de Beneficiarios

\$60.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$39.041

Pto Comprometido Territorio

\$21.616

Pto Comprometido Otros

\$120.657

Presupuesto Comprometido Total (millones)

#### Avance físico del proyecto

21/10/2024


Fecha de Corte Avance

83%

% Programado

99%

% Ejecutado

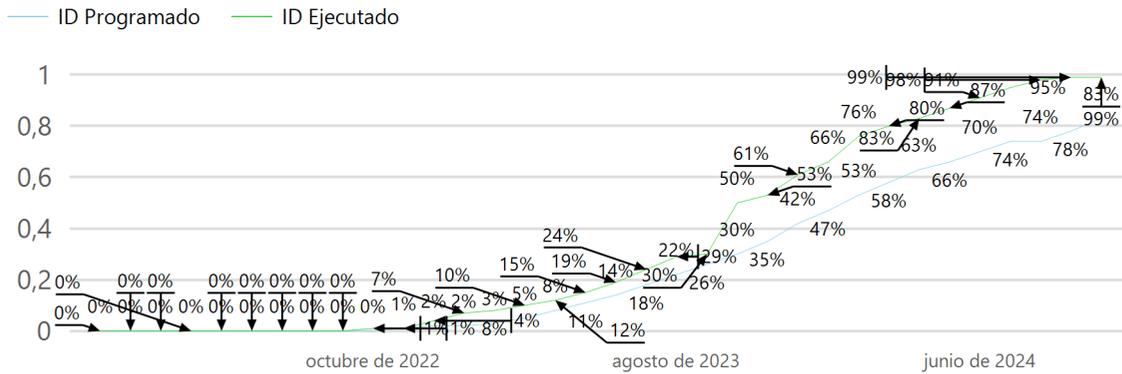

Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

**Mejoramiento de las vías rurales en los municipios de Rionegro, Lebrija, San Vicente de Chucuri, El Carmen de Chucuri, Cimitarra, Vélez, Güepsa y San Andrés, mediante la construcción de placa huellas en el Departamento de Santander.**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$29.423

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$29.423

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

|                         |               |                         |                           |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Sector de Inversión     | Transporte    | Municipio Intervención  | Departamento de Santander |
| BPIN                    | 2021004680423 | Área de influencia      | Rural                     |
| No. Contrato Específico | 097-2210745   | Es Inversión climática? |                           |
| No. CONPES Anexo B      | 97            | Tiene viabilidad?       | Si                        |
| Sesión CD inclusión PEI | 7             | Fecha viabilidad        | 20/09/2021                |

| Alcance                             | Producto Principal | Meta del Producto |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Kilometros pavimentados y mejorados |                    |                   |

### Información específica de ejecución contrato específico

12/11/2021

Fecha de Suscripción

21/04/2022

Fecha de Inicio

34

Plazo en Meses

27/02/2025

Fecha Terminación

Número de Beneficiarios

\$29.423

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$29.423

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

21/11/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

81%

% Ejecutado

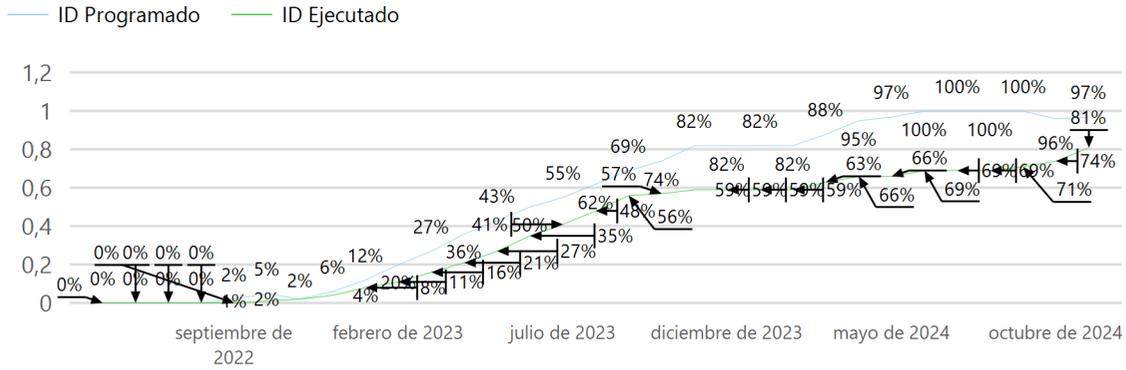

### Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista-  
Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$15.226

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$15.226

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

|                                |                                  |                                |                |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Sector de Inversión</b>     | Ambiente y Desarrollo Sostenible | <b>Municipio Intervención</b>  | Girón          |
| <b>BPIN</b>                    | 2021683070091                    | <b>Área de influencia</b>      | Urbano - Rural |
| <b>No. Contrato Específico</b> | 118-2220695                      | <b>Es Inversión climática?</b> | Si             |
| <b>No. CONPES Anexo B</b>      | 49                               | <b>Tiene viabilidad?</b>       | Si             |
| <b>Sesión CD inclusión PEI</b> | 3                                | <b>Fecha viabilidad</b>        | 05/08/2021     |

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Alcance</b>  | <b>Producto Principal</b>                                       | <b>Meta del Producto</b>           |
| Intervención de un área de aproximadamente 9.600 m2, con la construcción de una pantalla en concreto lanzado con 714 anclajes activos, un muro de contención de 83 metros y 410 ml de canal en concreto reforzado en la corona del talud. | Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres | 1                                  |
|   |   | Número de obras de infraestructura |

### Información específica de ejecución contrato específico

18/07/2022

Fecha de Suscripción

27/02/2023

Fecha de Inicio

32

Plazo en Meses

27/10/2025

Fecha Terminación

185.248

Número de Beneficiarios

\$15.226

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$15.226

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

27/07/2024


Fecha de Corte Avance

0%

% Programado

0%

% Ejecutado

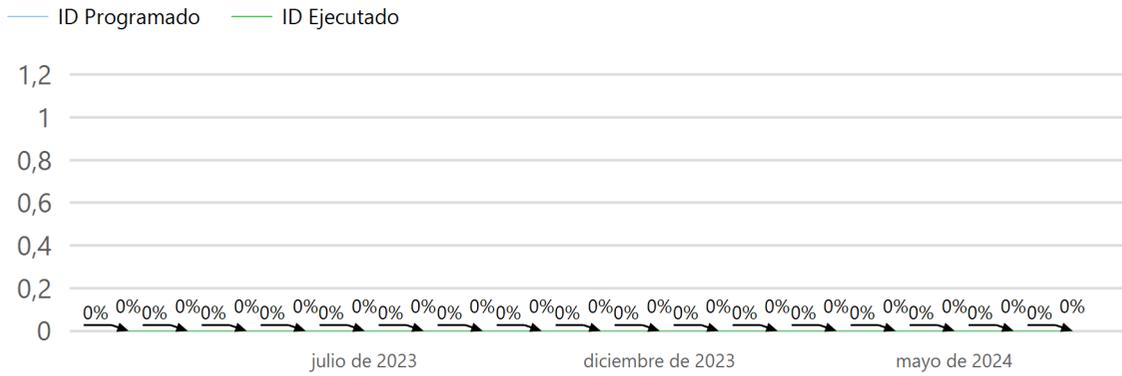

Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$56.830

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$46.830

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$10.000

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

|                                |                                  |                                |                |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Sector de Inversión</b>     | Ambiente y Desarrollo Sostenible | <b>Municipio Intervención</b>  | Bucaramanga    |
| <b>BPIN</b>                    | 2021680010201                    | <b>Área de influencia</b>      | Urbano - Rural |
| <b>No. Contrato Específico</b> | 121-2220760                      | <b>Es Inversión climática?</b> | Si             |
| <b>No. CONPES Anexo B</b>      | 48                               | <b>Tiene viabilidad?</b>       | Si             |
| <b>Sesión CD inclusión PEI</b> | 3                                | <b>Fecha viabilidad</b>        | 30/12/2020     |

| Alcance   | Producto Principal   | Meta del Producto |
|---|--|-------------------|
| La Gloria: Construcción de 917 anclajes activos de 30 metros tensados a 30 toneladas, Pantalla en concreto lanzado de 3.668 m2 de espesor 10 cm para el control de erosión superficial del terreno, Instalación de 1.860 metros lineales de Drenes de penetración horizontal de 15 metros y construcción de 564 ml de canaleta de coronación, Nazareth: Construcción de 848 anclajes activos de 25 metros tensados a 30 toneladas, Pantalla en concreto lanzado de 3.390 m2 de espesor 10 cm para el control de erosión superficial del terreno, Instalación de 1.740 metros lineales de Drenes de penetración horizontal de 15 metros y Construcción de 393 ml de canaleta de coronación, Pablo VI: Construcción de 376 anclajes activos de 30 metros tensados a 30 toneladas, Pantalla en concreto lanzado de 2.820 m2 de espesor 10 cm para el control de erosión superficial del terreno, Instalación de 780 metros lineales de Drenes de penetración horizontal de 15 metros y Construcción de 675 ml de canaleta de coronación. | Obras para la prevención y control de movimientos en masa<br>(Producto principal del proyecto) | 2424<br>m2        |

### Información específica de ejecución contrato específico

2/08/2022

Fecha de Suscripción

27/01/2023

Fecha de Inicio

25

Plazo en Meses

27/02/2025

Fecha Terminación

528.352

Número de Beneficiarios

\$46.830

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$22.516

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$69.346

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto



## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista-  
fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$14.757

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$14.757

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

|                                |                                  |                                |                |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Sector de Inversión</b>     | Ambiente y Desarrollo Sostenible | <b>Municipio Intervención</b>  | Girón          |
| <b>BPIN</b>                    | 2021683070092                    | <b>Área de influencia</b>      | Urbano - Rural |
| <b>No. Contrato Específico</b> | 123-2220767                      | <b>Es Inversión climática?</b> | Si             |
| <b>No. CONPES Anexo B</b>      | 52                               | <b>Tiene viabilidad?</b>       | Si             |
| <b>Sesión CD inclusión PEI</b> | 3                                | <b>Fecha viabilidad</b>        | 26/08/2021     |

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| <b>Alcance</b>  | <b>Producto Principal</b>                                       | <b>Meta del Producto</b>          |
| Construcción de una pantalla en concreto lanzado de 10 centímetros de espesor con 625 anclajes activos. | Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres | 1                                 |
| Construcción de un muro de contención de 120 metros lineales de longitud y 2,5 metros de altura.        |   | Número de obras de infraestructur |
| Construcción de aprox. 310 ml de canal de coronación en concreto reforzado.                             |   |                                   |

### Información específica de ejecución contrato específico

2/08/2022

Fecha de Suscripción

27/02/2023

Fecha de Inicio

32

Plazo en Meses

27/10/2025

Fecha Terminación

185.248

Número de Beneficiarios

\$14.757

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$14.757

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

27/11/2024


Fecha de Corte Avance

26%

% Programado

12%

% Ejecutado

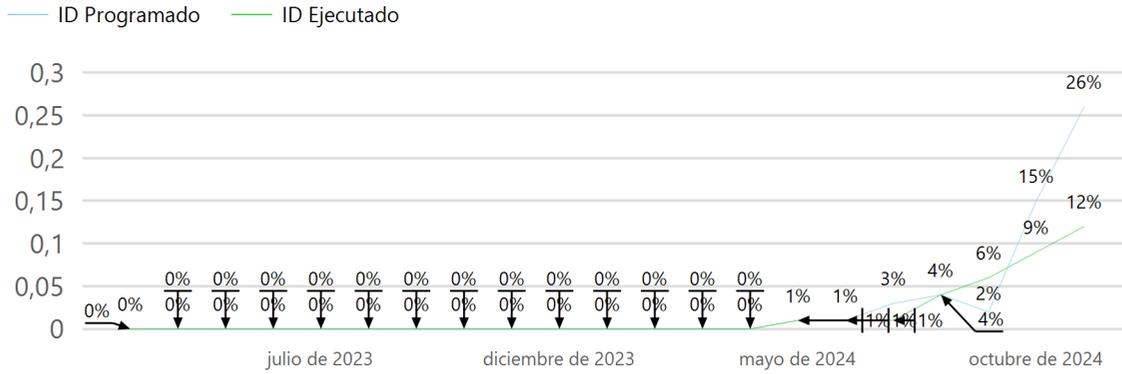

### Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

**Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.**

Estado Proyecto

Terminado

### Información general del contrato específico

\$1.064

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$1.064

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

|                                |               |                                |            |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| <b>Sector de Inversión</b>     | Interior      | <b>Municipio Intervención</b>  | Matanza    |
| <b>BPIN</b>                    | 2022684440001 | <b>Área de influencia</b>      | Urbano     |
| <b>No. Contrato Específico</b> | 130-2220886   | <b>Es Inversión climática?</b> | No         |
| <b>No. CONPES Anexo B</b>      | 85            | <b>Tiene viabilidad?</b>       | Si         |
| <b>Sesión CD inclusión PEI</b> | 3             | <b>Fecha viabilidad</b>        | 28/04/2022 |

| Alcance  | Producto Principal | Meta del Producto         |
|--|--------------------|---------------------------|
| Mejorar las instalaciones para su adecuado funcionamiento, con el fin de ofrecer a los funcionarios que allí desempeñan sus labores y a la comunidad en general que visita a diario las diferentes dependencias, que consta de 549 m2 área construida. | Sedes adecuadas    | 1                         |
|  |                    | Numero de sedes adecuadas |

### Información específica de ejecución contrato específico

17/08/2022

Fecha de Suscripción

12/09/2022

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

27/02/2024

Fecha Terminación

5.592

Número de Beneficiarios

\$1.064

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$1.064

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

12/02/2024

Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado



## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

### CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO GAITÁN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Estado Proyecto

En Ejecución

#### Información general del contrato específico

\$14.554

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$14.554

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

|                         |                                  |                         |                |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Sector de Inversión     | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Municipio Intervención  | Bucaramanga    |
| BPIN                    | 2021680010202                    | Área de influencia      | Urbano - Rural |
| No. Contrato Específico | 141-2221132                      | Es Inversión climática? | Si             |
| No. CONPES Anexo B      | 51                               | Tiene viabilidad?       | Si             |
| Sesión CD inclusión PEI | 3                                | Fecha viabilidad        | 19/05/2021     |

#### Alcance

Construcción de estructura de estabilización tipo pantalla anclada en concreto lanzado de espesor 10 cm, con anclajes activos tensados, con el fin de reducir el riesgo de desastre a través de medidas estructurales adecuadas que contribuyan a la seguridad y estabilidad en el barrio Gaitán, Escarpa Norte, secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, del departamento de Santander.

#### Producto Principal

#### Meta del Producto

#### Información específica de ejecución contrato específico

24/10/2022

Fecha de Suscripción

27/01/2023

Fecha de Inicio

25

Plazo en Meses

27/02/2025

Fecha Terminación

528.352

Número de Beneficiarios

\$14.554

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$3.251

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$17.804

Presupuesto Comprometido Total (millones)

#### Avance físico del proyecto

27/11/2024


Fecha de Corte Avance

90%

% Programado

98%

% Ejecutado

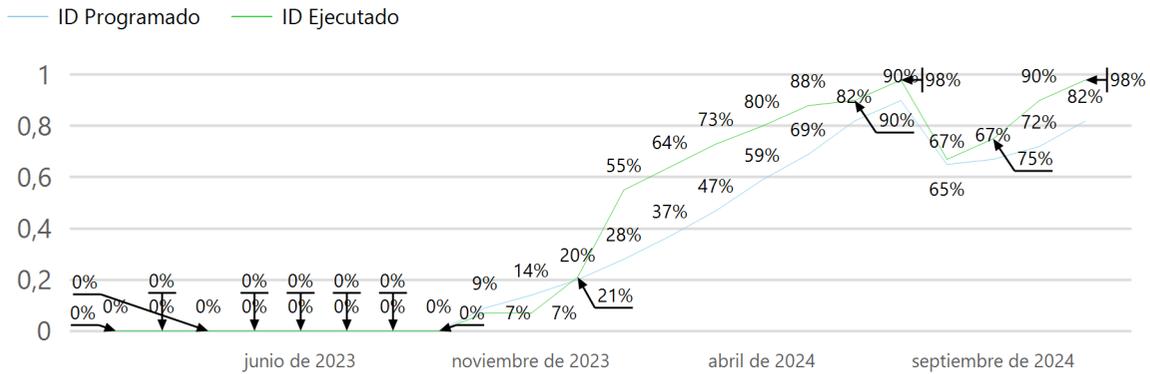

## Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander.

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$76.651

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$60.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$16.651

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Sector de Inversión     | Comercio Industria y Turismo |
| BPIN                    | 2022004680101                |
| No. Contrato Específico | 157-2221180                  |
| No. CONPES Anexo B      | 27                           |
| Sesión CD inclusión PEI | 1                            |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Municipio Intervención  | Betulia    |
| Área de influencia      | Rural      |
| Es Inversión climática? | No         |
| Tiene viabilidad?       | Si         |
| Fecha viabilidad        | 22/08/2022 |



| Alcance  |
|--|
| Dos (02) Plazoletas principales: en una de ella se desarrollarán las edificaciones y la otra será el punto de conexión entre la plazoleta principal y el inicio de la pasarela hacia el embarcadero. Así mismo, se propone una vía de conexión entre la plazoleta principal y el inicio de la pasarela hacia el embarcadero. Se realizarán pasarelas a los miradores que buscan recorrer el proyecto y finalmente, se encuentra el área de parqueaderos. Primer piso: nueve (09) locales, oficina para el CAI, con un área total de 31.41 m2, Hall de acceso y circulación. Un baño con duchas y vestidores, un espacio de 41.99 m2 contemplado para la posterior conformación de una escuela náutica. Un espacio contemplado para enfermería. Un espacio de 36.72 m2 cuyo uso es la reparación liviana de embarcaciones y oficinas para el uso de las diferentes autoridades ambientales salvavidas y guardacostas. Segundo piso: Se plantea como un área de uso institucional y acceso a las pasarelas, donde se encontrará una empresa de turismo cuya área estipuladas son 83.74 m2, una oficina para presencia de la alcaldía, así como oficina para la Gobernación, oficina para la Inspección Fluvial y la Administración del puerto. Dichas oficinas contarán con baños y un centro de reuniones. Tercer piso: Contemplada como una zona de esparcimiento donde se podría encontrar una terraza para disfrute de vista panorámica, Plaza de restaurante – Bar, Cocina y baños. Se proyecta la ejecución de una pasarela suspendida a una altura media del terreno de 1,50 m que contará con 5 miradores, todos habilitados para acceso de minusválidos. La pasarela tendrá ancho mínimo 2,20 m, contando los miradores como un mínimo de 3,50 m. se trata de una reestructura metálica revestida de madera (2 km) Finalmente, el proyecto contempla un muelle para embarcadero fluvial, el cual se compone de una pasarela de acceso estará formada por módulos de estructura en aluminio con "pavimento" de madera que contarán con flotadores de poliestireno. |

| Producto Principal          | Meta del Producto |
|-----------------------------|-------------------|
| Centro Turístico construido | 1                 |
|                             | UND               |


Información específica de ejecución contrato específico



Avance físico del proyecto

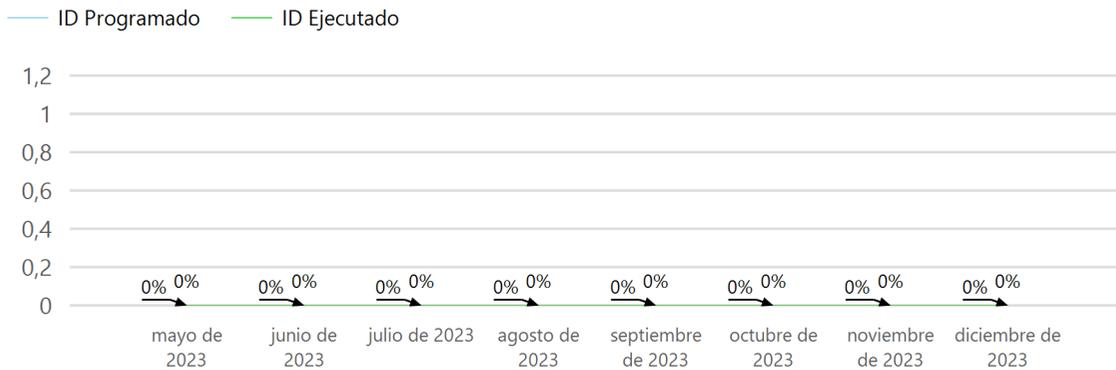

Avance Financiero del proyecto

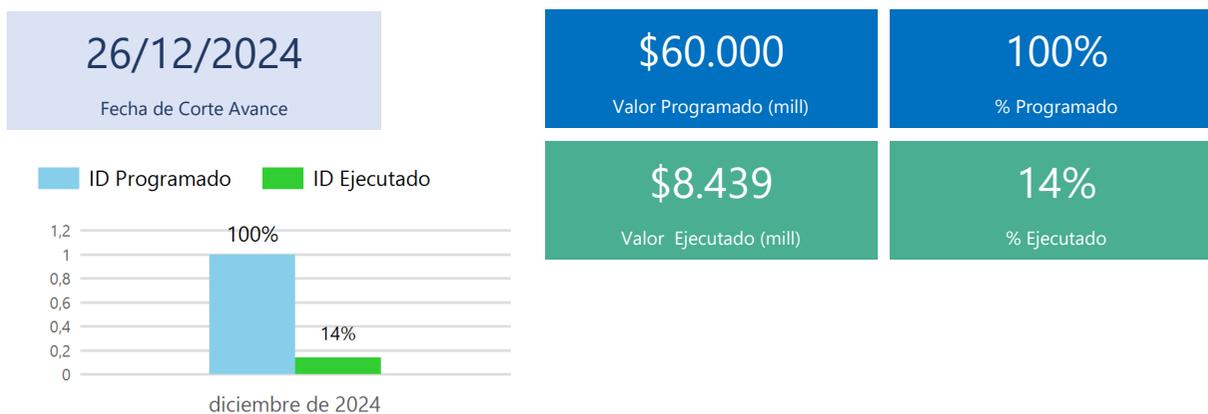

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander**

Estado Proyecto

Terminado

### Información general del contrato específico

\$12.000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Ejecutado

Estado Detallado

\$12.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

|                         |                                  |                         |                |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Sector de Inversión     | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Municipio Intervención  | San Gil        |
| BPIN                    | 2021686790041                    | Área de influencia      | Urbano - Rural |
| No. Contrato Específico | 158-2221183                      | Es Inversión climática? | Si             |
| No. CONPES Anexo B      | 53                               | Tiene viabilidad?       | Si             |
| Sesión CD inclusión PEI | 3                                | Fecha viabilidad        | 13/07/2022     |

| Alcance   | Producto Principal  | Meta del Producto |
|---|---|-------------------|
| Construcción de una pantalla en concreto lanzado de 10 centímetros de espesor con 228 anclajes activos, 231 drenes. | Estabilización de taludes sobre los barrios Jose Antonio Galán, Antonia Santos, San Luis, Altos De La Colina, Santa More 1 y 2. | 4683              |
| Construcción de un muro de contención de 120 metros lineales de longitud y 2,5 metros de altura.                    |   | m2                |
| Construcción de aprox. 515 ml de canal de coronación en concreto reforzado.   |   |                   |

### Información específica de ejecución contrato específico

19/12/2022

Fecha de Suscripción

20/01/2023

Fecha de Inicio

17

Plazo en Meses

20/06/2024

Fecha Terminación

45.605

Número de Beneficiarios

\$12.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$12.000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

20/06/2024


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

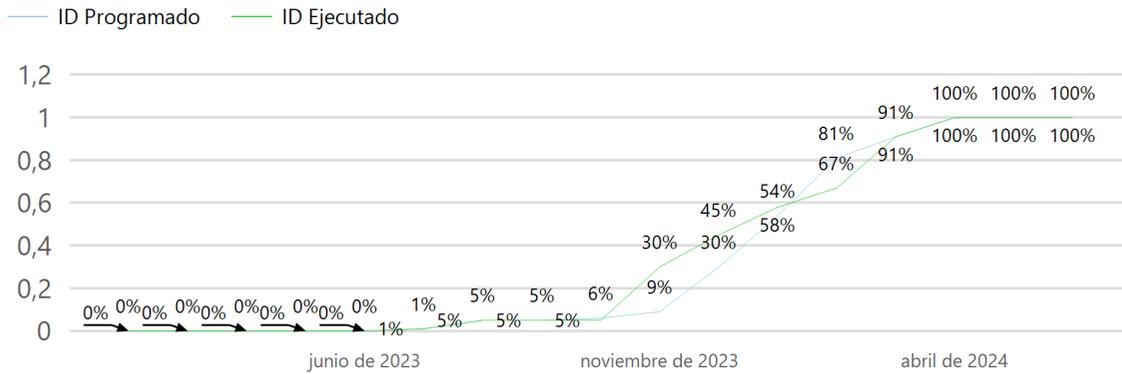

### Avance Financiero del proyecto



\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

**Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2**

Estado Proyecto

En Ejecución

### Información general del contrato específico

\$29.732

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$29.732

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$0

Otros Aporte (millones)

|                         |                                  |                         |                |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Sector de Inversión     | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Municipio Intervención  | Málaga         |
| BPIN                    | 2021684320079                    | Área de influencia      | Urbano - Rural |
| No. Contrato Específico | 159-2221184                      | Es Inversión climática? | Si             |
| No. CONPES Anexo B      | 50                               | Tiene viabilidad?       | Si             |
| Sesión CD inclusión PEI | 3                                | Fecha viabilidad        | 14/07/2022     |

| Alcance  | Producto Principal | Meta del Producto |
|--|--------------------|-------------------|
| Intervención ambiental para mitigación del riesgo.<br>Construcción obras geotécnicas Málaga. |                    |                   |

### Información específica de ejecución contrato específico

19/12/2022

Fecha de Suscripción

20/01/2023

Fecha de Inicio

26

Plazo en Meses

20/03/2025

Fecha Terminación

19.884

Número de Beneficiarios

\$29.732

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$0

Pto Comprometido Otros

\$29.732

Presupuesto Comprometido Total (millones)

### Avance físico del proyecto

20/11/2024

Fecha de Corte Avance

80%

% Programado

96%

% Ejecutado



## Pacto Territorial Santander

Fecha de Corte

26/12/2024

### Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta

Estado Proyecto

En Ejecución

#### Información general del contrato específico

\$13.840

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$10.000

Aporte DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte Territorio (millones)

\$3.840

Otros Aporte (millones)

|                         |               |                         |             |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Sector de Inversión     | Educación     | Municipio Intervención  | Piedecuesta |
| BPIN                    | 2022004680208 | Área de influencia      | Urbano      |
| No. Contrato Específico | 183-2230157   | Es Inversión climática? | No          |
| No. CONPES Anexo B      | 77            | Tiene viabilidad?       | Si          |
| Sesión CD inclusión PEI | 1             | Fecha viabilidad        | 02/09/2022  |

| Alcance  | Producto Principal   | Meta del Producto         |
|--|--|---------------------------|
| Construir una edificación en la sede de Piedecuesta de las UTS para atender a sus alumnos, la cual se desarrolla en cuatro (04) niveles, dos (02) sótanos y una (01) terraza, en los sótanos encontramos veintiséis (26) salones de tutorías, una (01) biblioteca, un (01) salón magistral, cuatro (04) salas de reuniones y una (01) sala de profesores, el primer piso cuenta con cinco (05) salones y oficinas Bienestar Universitario, el segundo piso cuenta con nueve (09) salones, tercer y cuarto piso tendrá cada uno nueve (09) laboratorios de informática. | Servicio de apoyo financiero a las Instituciones de Educación Superior | 1<br>Número instituciones |

#### Información específica de ejecución contrato específico

23/06/2023

Fecha de Suscripción

2/05/2024

Fecha de Inicio

22

Plazo en Meses

2/03/2026

Fecha Terminación

148

Número de Beneficiarios

\$10.000

Pto Comprometido DNP FRPT

\$0

Pto Comprometido Sector

\$0

Pto Comprometido Territorio

\$5.614

Pto Comprometido Otros

\$15.614

Presupuesto Comprometido Total (millones)

#### Avance físico del proyecto


Fecha de Corte Avance

% Programado

% Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

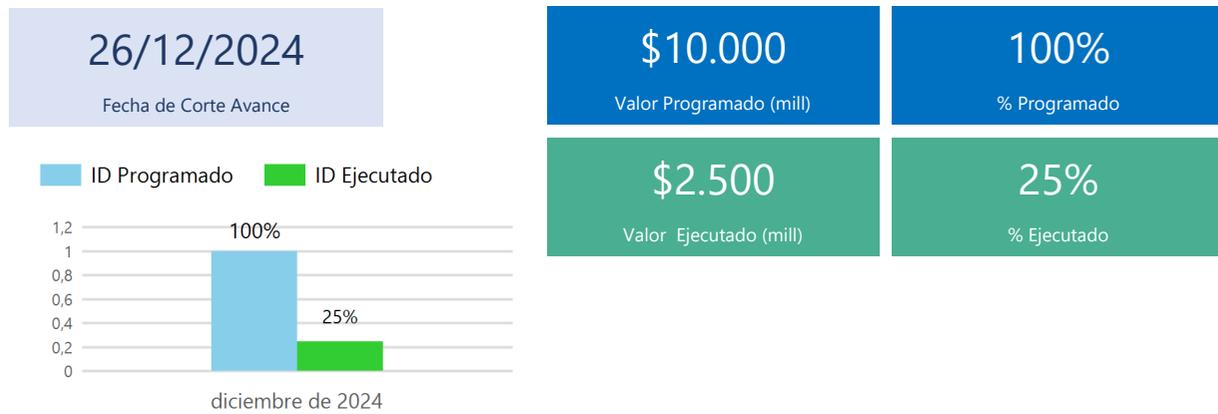

\* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
