



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA INFORMATIVA CONTRATOS PLAN

Contratos Plan
Subdirección General Territorial
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Fecha de actualización:	Día / Mes / Año 31/12/2018	Fecha de corte de la información:	Día / Mes / Año 31/12/2018
Nombre del Gerente:	Ana Maria Aristizabal Osorio	Numero Celular: 3115807465	Correo Electrónico: aaristizabal@dn.gov.co

1. INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA DE INTERVENCIÓN Arauca



Departamento:	Arauca
No. de Municipios en el Contrato Plan:	7 (Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame)
Fecha de Inicio de Negociación:	15/06/2012
Fecha de Suscripción:	16/02/2013
Año de inicio:	2013
	Inicial
Plazo de ejecución:	8 años
Año de terminación:	2021

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA:


Objeto:	<ul style="list-style-type: none"> Articular y coordinar las capacidades de planeación, de gestión y financiación de la Nación con las de las entidades territoriales participantes, con el fin de mejorar los niveles de competitividad y bienestar social, entendiendo que el alcance de este propósito requiere un trabajo mancomunado en el que participen distintos niveles de Gobierno.
Eje Central:	<ul style="list-style-type: none"> El eje central del Contrato Plan se enfoca al “Mejoramiento de la productividad y la competitividad como factores de desarrollo social y económico”.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VALOR TOTAL (Millones \$ COP):

Total: \$1.741.000

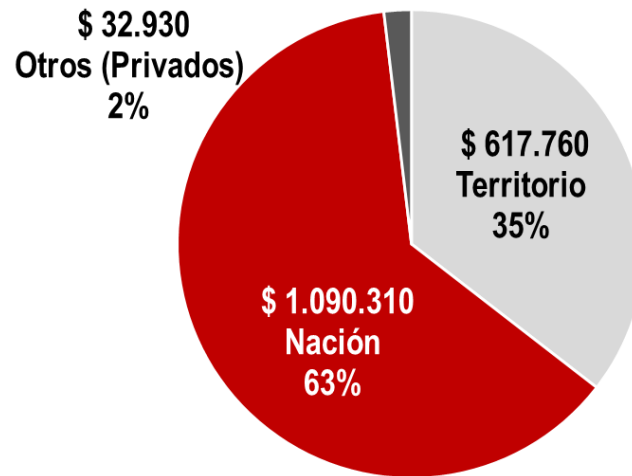

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector Según Acuerdo Estratégico	No. Total Proyectos por Sector	No. Proyectos Terminados	No. Proyectos En Ejecución	No. Proyectos En Gestión	No. Proyectos Descartados
Agricultura y Desarrollo Rural	10	8	1		1
Ambiente y Desarrollo Sostenible	6	6			
Comercio, Industria y Turismo	3	2	1		
TIC	2	2			
Defensa y policía	9	7	2		
Educación	14	14			
Inclusión Social	3	3			
Minas y Energía	18	15	2		1
Salud y Protección Social	7	3	2	2	
Transporte	45	42	3		
Vivienda, Ciudad y Territorio	18	11	2	5	
TOTAL	135	113	13	7	2



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES

(Expresado en Millones de \$ Cop)

SECTOR	Presu- puesto Indicativo	Compro- misos Te- rritorio y Otros	%	Compro- misos (Entida- des Na- cionales) (A)	%	Compro- misos DNP (B)	% Aporte DNP (B/A)
Agricultura y Desarrollo Rural	\$69.046	\$31.420	45,51%	\$37.626	54,49%	\$8.606	23%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$70.291	\$50.291	71,55%	\$20.000	28,45%	\$20.000	100%
Comercio, Industria y Turismo – Comer- cio	\$27.378	\$15.378	56,17%	\$12.000	43,83%	\$10.800	90%
Defensa	\$41.800	\$23.200	55,50%	\$18.600	44,50%	\$9.197	49%
Educación	\$57.234	\$39.800	69,54%	\$17.434	30,46%	\$5.000	29%
Inclusión social	\$11.000	\$5.700	51,82%	\$5.300	48,18%	\$0	0%
Minas y Energía	\$153.500	\$90.600	59,02%	\$62.900	40,98%	\$15.000	24%
Salud	\$80.200	\$65.200	81,30%	\$15.000	18,70%	\$13.000	87%
Tecnologías de Información y Comuni- caciones	\$23.000	\$11.000	47,83%	\$12.000	52,17%	\$0	0%
Transporte	\$983.451	\$204.000	20,74%	\$779.451	79,26%	\$14.197	2%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua Po- table y Saneamiento Básico	\$84.100	\$54.100	64,33%	\$30.000	35,67%	\$0	0%
Vivienda Ciudad y Territorio – Vivienda	\$140.000	\$60.000	42,86%	\$80.000	57,14%	\$9.200	12%
TOTAL	\$1.741.000	\$650.690	37,37%	\$1.090.310	62,63%	\$105.000	10%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA INFORMATIVA
CONTRATOS PLAN

Contratos Plan
Subdirección General Territorial
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

AVANCES EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018

EJECUCION

39%



FINANCIERA

Ejecución 2013 – 2018
(Expresado en Millones de \$ Cop)

Sector	Presu- puesto Indicativo 2013-2021	Recursos Compro- metidos 2013-2018	% Avance Finan- ciero 2013- 2018
Agricultura y Desarrollo Rural	\$69.046	\$16.509	24%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$70.291	\$43.487	62%
Comercio	\$27.378	\$8.220	30%
Defensa y Justicia	\$41.800	\$49.598	118%
Educación	\$57.234	\$12.615	22%
Inclusión Social	\$11.000	\$6.842	61%
Minas y Energía	\$153.500	\$41.607	27%
Salud	\$80.200	\$23.074	29%
Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$23.000	\$12.733	55%
Transporte	\$983.451	\$328.221	33%
Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda	\$140.000	\$102.542	73%
Vivienda, Ciudad y Territorio Agua Potable y Saneamiento Básico	\$84.100	\$32.136	38%
TOTAL	\$ 1.741.000	\$677.584	39%



El futuro
es de todos


DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA INFORMATIVA CONTRATOS PLAN

Contratos Plan
Subdirección General Territorial
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

3. PRINCIPALES AVANCES POR PRIORIDAD ESTRATÉGICA Y SECTOR



Fecha de corte: diciembre 31 de 2018

***Nota:** El avance se calcula con base en la información reportada por la Gerencia Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte (bimensual, trimestral, semestral). Los porcentajes calculados en esta ficha están siendo ajustados en la plataforma Sinergia.



Prioridad Estratégica 1

Productividad y Competitividad


INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2018					Acumulado (2013-2021)					Fecha de Corte	
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance					
Obras de infraestructura especializada para la prestación de servicios empresariales o fronteriza (Semestral)	0	1	0	0%		Rojo	1	0	0%		Rojo	31-12-18	
Obras de infraestructura para la producción agropecuaria y ganadera construidas (Anual)	0	0	-	-		Sin avance 2018	Gris	4	1	25,0%		Rojo	31-12-18
Productores beneficiados con asistencia técnica agropecuaria (Semestral)	0	1.980	0	0%		Rojo	14.998	0	0%		Rojo	31-12-18	
Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Primaria (Trimestral)	0	31	0	0%		Rojo	207,10	27	13,04%		Rojo	31-12-18	
Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Secundaria (Trimestral)	0	102	0	0%		Rojo	343	278,15	81,09%		Naranja	31-12-18	
Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Vial terciaria (Trimestral)	0	30	0	0%		Rojo	236,80	160,80	67,91%		Rojo	31-12-18	



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Indicador	Línea Base	2018				Acumulado (2013-2021)				Fecha de Corte		
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Kilómetros intervenidos en los tramos de la Red Vial urbana (Trimestral)	0	0	0	0		Rojo	123	17,80	14,47%		Rojo	31-12-18



AVANCES ACUMULADOS 2013-2018

Sector	Avances
Agricultura y Desarrollo Rural	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los proyectos que contemplan la construcción y puesta en marcha de los distritos de riego para las asociaciones Asopotam y Asoalpes, se encuentra en proceso de revisión por parte de la Nueva Agencia de Desarrollo Rural desde el día 23 de enero de 2017, estando a la espera del respectivo del respectivo concepto técnico. Los proyectos contemplan una inversión superior a los \$7.000 millones de pesos y con los cuales se espera beneficiar a 117 fincas o predios de 294 Hectáreas. ✓ La segunda fase del proyecto de Asistencia Técnica Directa Rural ha finalizado, destinándose una inversión cercana a los \$2.213 millones, con la cual se logró beneficiar a 473 productores agrícolas del municipio de Arauca. ✓ Se ejecutó la primera etapa del proyecto: Construcción de una Planta Avícola en el municipio de Arauquita (edificio de procesos), con una inversión de \$1.470 millones, que beneficia a 350 productores avícolas de todo el Departamento. ✓ Se finalizaron los estudios para la construcción y puesta en marcha de dos Micro Distritos de riego (Asoalpes y Asopotam) con una inversión de \$382 millones. ✓ Por valor de \$700 millones la Gobernación adelantó los estudios y diseños para la construcción y puesta en marcha de 3 Distritos de Riego de pequeña escala. El proyecto beneficiará 10 veredas con 300 fincas de los municipios del Departamento. (ASOPROCBAP, ASOCHARO y ASOAPTA). ✓ Con una Inversión de \$7.416 millones, se inició la construcción y puesta en operación de la planta procesadora y comercializadora de leche de Arauquita en el centro poblado de la Esmeralda. Con este proyecto se beneficiarán a más de 190.000 habitantes del departamento de Arauca. ✓ Se ejecutó el proyecto Fortalecimiento del sector piscícola en el Departamento de Arauca, donde se implementó mediante asistencia técnica integral y la demostración de método a 60 unidades de producción piscícola de cachama blanca en los municipios de Arauca, Saravena, Fortul, Tame y Arauquita con una inversión de \$700 millones. ✓ La Gobernación suscribió convenio por valor de \$33.072 millones, asignando 949 subsidios para soluciones de vivienda Rural en todo el Departamento de Arauca.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Sector	Avances
<p>Comercio, Industria y Turismo – Comercio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A través del Contrato 619 del 30 de diciembre del año 2016, se dio inicio a la construcción del Centro de Desarrollo Empresarial, con una inversión superior a los \$6.100 millones. Con esta obra se busca consolidar un espacio de prospectiva estratégica que permita al territorio fortalecer sectores económicos claves y reducir la dependencia a la renta petrolera. ✓ Por valor de \$1.433 millones, se culminó la construcción de la Unidad de Desarrollo y Emprendimiento en el municipio de Arauca, la cual aspira a beneficiar a un aproximado de 36.000 habitantes del Departamento de Arauca. ✓ Los estudios y diseños del Centro de Atención Fronteriza -CENAF- por valor de \$651 millones, se finalizaron el día 29 de julio de 2015.
<p>Transporte</p>	<p><u>Red vial primaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El proyecto contemplado para el mejoramiento de red vial primaria del departamento de Arauca a través de una concesión 4G en el trayecto Tame-Arauca, avaluado en mas de \$730.000 millones de pesos, no obtuvo viabilidad financiera por parte de la ANI. ✓ El proyecto para el Mejoramiento y Rehabilitación, Gestión Predial, Social y Ambiental Del Corredor Vial Tame-Arauca, en el departamento de Arauca para el Programa “Vías Para La Equidad”, se encuentra en ejecución por parte del INVIAS con una inversión cercana a los \$55.000 millones y un total de 27 kilómetros intervenidos y mejorados, lo que equivale a la fecha un avance superior al 80%. <p><u>Red vial secundaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se intervinieron un total de 46,67 kilómetros de red vial secundaria en todo el departamento, realizándose una inversión cercana a los \$113.935 millones. ✓ El día 30 de septiembre del año 2017 se terminó la pavimentación de 3 kilómetros de la vía Arauca – Caracol en el municipio de Arauca, proyecto ejecutado por la Gobernación de Arauca, con una inversión cercana a los \$11.000 millones de pesos. ✓ Se culminó la intervención de 8,5 Km de la vía Corocoro - Cravo Norte en el sector “Agua Linda” – “La Antena”, con una inversión superior a los \$30.600 millones. ✓ Fue construido el puente San Salvador sobre el río Tame. La inversión total asciende a \$20.363 millones (\$11.770 millones de la Nación y \$8.593 millones a cargo de la Gobernación de Arauca) <p><u>Red vial terciaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con una inversión superior a los \$20.000 millones, se está ejecutando el proyecto mediante el cual se busca la adecuación y pavimentación de 18 kilómetros, correspondientes a las vías Arauca – Caracol. El avance de la obra en la actualidad registra un 18%. ✓ Con una inversión de \$67.861 millones que incluyen la conformación del Banco de Maquinaria de Obra Pública, se está finalizando la intervención de aproximadamente 126,91 Km en todo el Departamento. <p><u>Malla vial urbana:</u></p>



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Sector	Avances
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con una inversión de \$47.315 millones se finalizó la ejecución de 25 proyectos de mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de vías urbanas, en el todo departamento de Arauca.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El proyecto Arauca Vive Digital, concebido para mejorar el nivel competitivo de la educación y la generación de nuevo conocimiento a través del uso y aplicación de las TIC's en la comunidad educativa del departamento de Arauca, ya finalizó su etapa de ejecución, registrando una inversión final cercana a los \$3.742 millones, beneficiando a más de 5.000 personas. ✓ El programa "Nativos Digitales", concebido para desarrollar capacidades, habilidades y competencias científicas y tecnológicas en la comunidad a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC en las Instituciones Educativas, se desarrolló con una inversión cercana a los \$9.000 millones y un total de 6.000 beneficiarios de todo el departamento.



Prioridad Estratégica 2

Desarrollo Social

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIAS

Indicador	Línea Base	2018					Acumulado (2013-2018)					Fecha de Corte	
		Meta	Avance	% avance			Meta	Avance	% avance				
Número de subsidios de vivienda asignados (Semestral)	0	0	0	-		Gris	647	723	100%		Verde	31-12-18	
Infraestructura Hospitalaria Construida y/o Dotada (Semestral)	0	1	0	0%		Rojo	5	0	0%		Rojo	31-12-18	
Nuevos cupos para niños menores de cinco años beneficiarios con la Estrategia de Cero A Siempre Atendidos por la Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil (Semestral)	0	0	0	-		Gris	39,58	0	0%		Rojo	31-12-18	
Centros de Desarrollo Integral infantil intervenidos (Semestral)	0	0	0	-		Gris	2	3	100%		Verde	31-12-18	
Porcentaje de instituciones indicativas en los niveles a+ y a en los resultados de las pruebas saber 11 para los municipios beneficiados por el contrato plan de Arauca (Semestral)	-	0,49	-	-		Sin avance 2018	Gris	0,50	0,30	60%		Verde	31-12-18
Sedes educativas intervenidas con mejoramiento o construcción de	-	3	0	0%		Rojo	6	1	16,67 %		Rojo	31-12-18	



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Indicador	Línea Base	2018				Acumulado (2013-2018)				Fecha de Corte			
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance					
infraestructura (Semestral)													
Estudiantes beneficiados con la intervención de las Instituciones Educativas (Semestral)	0	2.296	0	0%		Rojo	4.593	23.990	100%		Verde	31-12-18	
Personas beneficiadas con el servicio de alcantarillado CP Arauca (Anual)	-	3.000	-	-		Sin avance 2018	Gris	28.167	3.567	12,66 %		Rojo	31-12-18
Personas beneficiadas con proyectos de acueducto CP Arauca (Anual)	-	3.000	-	-		Sin avance 2018	Gris	101.952	0,0	0%		Rojo	31-12-18
Nuevos usuarios conectados al SIN (Semestral)	0	30.706	0	0%		Rojo	6.125	2.165	35,35 %		Rojo	31-12-18	
Viviendas con servicio de gas domiciliario (Trimestral)	0	1.384	0	0%		Rojo	9.277	0	0%		Rojo	31-12-18	

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS 2013-2018

Sector	Avances
Educación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con una inversión cercana a los \$1.700 millones, se elaboraron los Estudios y Diseños para la Nueva Sede del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial del Servicio Nacional de Aprendizaje Regional Arauca, Municipio De Arauca. ✓ Con una inversión de \$991 millones, el Departamento Nacional de Planeación apoyó la compra de menaje y utensilios esenciales para mejorar el Programa de Alimentación Escolar en Arauca, beneficiando de esta forma, a más de 9.800 estudiantes de todo el Departamento. ✓ Se contrataron los estudios y diseños para el mejoramiento, remodelación y ampliación de la infraestructura física de la Institución Educativa Técnica Industrial Rafael Pombo del municipio de Saravena, por valor de \$341 millones y de la Concentración Educativa El Delirio, centro poblado El Botalón en el municipio de Tame, por valor de \$243 millones. ✓ Del total de la inversión realizada en este sector, \$6.750 millones corresponden a la ejecución de 4 proyectos de infraestructura educativa en los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Arauca. ✓ En agosto de 2015, el Ministerio de Educación aprobó recursos para 14 proyectos de infraestructura educativa por valor de \$22.638 millones (\$15.847 millones de la Nación y \$6.791 millones de la Gobernación). De los recursos Nación, DNP aportó \$5.800 millones.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Sector	Avances
<p>Inclusión Social y Reconciliación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con una inversión cercana a los \$850 millones, se logró la ejecución del proyecto mediante el cual se brindó apoyo a 80 familias víctimas del conflicto de los municipios de Tame y Cravo Norte. ✓ Con una inversión de \$3.500 millones aportados por la Gobernación, se logró la construcción de tres Centros de Desarrollo Integral –CDI– en los municipios de Arauca, Fortul y Arauquita. ✓ Con una inversión de \$2.011 millones, en el marco del programa, Fondo Nacional de Departamentos e ICBF, avanza la construcción de 2 Centros de Desarrollo Integral en los municipios de Saravena y Arauquita.
<p>Minas y Energía</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con una inversión superior a los \$9.900 millones, se avanza en las obras para la ampliación de la red de electrificación rural en el Departamento de Arauca. ✓ Por un monto que supera los \$12.300 millones, se adelanta la construcción línea y subestaciones eléctricas a 34,5 kv Panamá de Arauca- Puerto Jordán; Fortul - Aguachica - El Oasis; y en la subestación El Oasis 2 MVA 34.4/13.8. ✓ Se realizaron inversiones por valor de \$23.595 millones, financiados por la Nación para electrificación urbana y rural en los municipios de Tame, Arauquita, Saravena y Fortul en 14 proyectos que beneficiarán a 2.062 usuarios. ✓ La Gobernación ha firmado convenios por valor de \$10.541 millones con ENELAR ESP y la Nación prepara firma de convenios por valor de \$16.800 millones, que cubren 22 proyectos de Electrificación Rural en los 7 Municipios del departamento. ✓ En 2015 a través del CAFAER, la Nación aprobó otros \$16.800 millones para electrificación rural en los municipios del departamento de Arauca. ✓ En el sector de Gas se firmó un convenio por valor de \$15.348 millones, para el proyecto de gasificación para el Departamento de Arauca que financiará subsidios a los derechos de conexión (acometida domiciliaria). A través de este proyecto se iniciará la primera fase de distribución del Gas Natural Virtual que beneficiará a 30.032 usuarios en el Departamento de Arauca y el municipio de Cubará en el Departamento de Boyacá.
<p>Salud y Protección Social</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con una inversión de \$10.066 millones, financiados por el DNP, se avanza en la construcción del Hospital de San José de Cravo Norte. ✓ La Nación efectuó transferencia al Departamento por valor de \$4.579 millones para el programa de saneamiento de cartera en los hospitales del Departamento de Arauca. A la fecha se han ejecutado y/o en proceso de ejecución \$1.086 millones. ✓ Se realizó la dotación de 10 Ambulancias para los 7 municipios del Departamento, con una inversión de \$1.860 millones. ✓ Por valor de \$1.300 millones se realizó la dotación de equipos biomédicos y camas hospitalarias de la Red Pública Hospitalaria de Salud del Departamento de Arauca. ✓ La Gobernación avanza en la gestión para financiar con recursos de las Regalías los proyectos de adecuación y dotación del nuevo Hospital San Lorenzo en el municipio de Arauquita, por



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Sector	Avances
	<p>valor de \$11.787 millones y el mejoramiento de la infraestructura del Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón, por valor de \$11.591 millones.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La Gobernación ejecuta el proyecto Fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia en las áreas de urgencias, hospitalización y quirófanos de la red pública del Departamento, ESE Hospital San Vicente y ESE Hospital del Sarare y ESE de baja complejidad del Departamento de Arauca, por valor de \$5.288 millones.
<p>Vivienda, Ciudad y Territorio – Agua Potable y Saneamiento Básico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con una inversión superior a los \$5.000 millones, financiada en su totalidad por el DNP, se adelantó la construcción de la cuarta etapa del sistema de tratamiento de aguas residuales del sector Itibana municipio de Tame, departamento de Arauca, proyecto que beneficia a más de 18.000 habitantes de este municipio. ✓ Se logró la construcción del alcantarillado pluvial del barrio Villa María del municipio de Arauca, proyecto cuya inversión ascendió a \$2.380 millones y que benefició directa e indirectamente a 88,481 personas que habitan este importante barrio de la capital del departamento. ✓ Con una inversión superior a los 2.232 millones de pesos, financiada en su totalidad por el DNP, adelantó la construcción de alcantarillado sanitario barrios Montebello y Real Santander en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, con un total de 1067 beneficiarios. ✓ Por un valor de \$4.799 millones, FINDETER adjudicó el contrato para la construcción y ampliación de la planta de tratamiento de agua potable y tanques de almacenamiento del sistema de acueducto del municipio de Araucita, inversión que será financiada en su totalidad por el DNP. ✓ Con una inversión superior a los 1.447 millones de pesos, financiada en su totalidad por el DNP, se llevó a cabo la construcción y rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en el sector de la Brigada XVIII -Terpel-Villa Maestro-Vía al cementerio en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca, obra que que beneficia a 2500 habitantes de este sector de la capital del departamento.
<p>Vivienda, Ciudad y Territorio – Vivienda</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por valor de \$28.281 millones financiados por la Nación, se logró la construcción de 732 viviendas en la "Urbanización-Playitas" (632) del municipio de Arauca, y en el municipio de Tame en la "Urbanización Guacamayas" (100). ✓ La Gobernación suscribió convenio, por valor de \$34.395 millones para adelantar la construcción de 1.070 soluciones de vivienda urbana en todo el Departamento de Arauca. ✓ La Gobernación suscribió convenio por valor de \$26.743 millones, asignando 752 subsidios para Soluciones de Vivienda Nueva Nucleada en los municipios de Arauca, Saravena y Fortul del departamento de Arauca – Primera Etapa. ✓ Por un valor aproximado de \$5.000 millones financiados por la Nación, fue suscrito contrato (Fidubogotá) para la construcción de 100 viviendas gratuitas en el municipio de Puerto Rondón, Urbanización Juan José Rondón.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA



Prioridad Estratégica 3

Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2018					Acumulado (2013-2018)					Fecha de Corte
		Meta	Avance	% avance		Meta	Avance	% avance				
Obras de protección y prevención del riesgo de desastres construidas (Semestral)	0	1	0	0%		Rojo	6	3	50%		Rojo	31-12-18

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS 2013-2018

Sector	Avances
Ambiente y Desarrollo Sostenible	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con una inversión de \$756 millones, se adelantó la primera fase del proyecto declaratoria de áreas protegidas de los humedales del Lipa y Cinaruco. El DNP transfirió \$1.300 millones para la segunda fase, el cual ya inicia el proceso de ejecución a través de Parques Nacionales de Colombia. ✓ La Gobernación firmó convenio con Corporinoquía para la ejecución del proyecto Formulación del POMCA del río Caranal en el departamento de Arauca, por valor de \$507 millones, el cual se encuentra en ejecución. ✓ Las obras de Protección sobre el río Casanare en los sitios denominados Caserío y Puente San Salvador en el municipio de Tame, departamento de Arauca, contratadas por valor de \$7.306 millones, ya se encuentran finalizadas, beneficiando a un total de 88.481 personas. ✓ Con financiación del 70% a cargo de la Nación – DNP, y el restante 30% de la Gobernación, se logró firma de convenios de los siguientes proyectos, cuyos convenios a firmar con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres se encuentra en proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Prevención de inundaciones en zonas críticas mediante la recuperación del cauce y mejoramiento del perfil hidráulico de la cuenca del río Caranal en el municipio de Arauquita por valor de \$8.000 millones. • Construcción de la defensa longitudinal del río Arauca y prevención en función de la ola invernal y del cambio climático, sector casco urbano Barrio San Martín Municipio de Arauquita, por valor \$19.543 millones. • Prevención de riesgos de inundación y erosión mediante obras de prevención del río Cravo Norte, departamento de Arauca. por valor de \$ 8.143 millones. ✓ Con Parques Nacionales de Colombia se ha estructurado e iniciado la ejecución del proyecto de Gestión integral de la biodiversidad a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje y el de Reforestación y fomento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de influencia en el Parque Nacional Natural - Nevado Cocuy en los municipios de Fortul y Tame, con un valor estimado de \$3.932 millones.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA INFORMATIVA CONTRATOS PLAN

Contratos Plan
Subdirección General Territorial
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA



Prioridad Estratégica 4

Soberanía y Territorio

INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA

Indicador	Línea Base	2018				Acumulado (2013-2018)				Fecha de Corte		
		Meta	Avance	% avance	Meta	Avance	% avance					
Obras de Infraestructura construidas para convivencia y la seguridad ciudadana Semestral)	0	1	0	0%	●	Rojo	13	4	30,77%	●	Rojo	31-12-18

SEMÁFORO



<80%

>90%

AVANCES ACUMULADOS 2013-2018

Sector	Avances
Defensa Justicia y del Derecho	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por un valor de \$18.000 millones de pesos se firmó el contrato específico entre el Fondo Regional Contratos Plan y la Alcaldía de Arauca, el cual tiene por objeto el fortalecimiento del batallón fluvial número 52. ✓ Se finalizó consultoría por valor de \$750 millones de los estudios y diseños para la construcción del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal GAULA y la seccional de Inteligencia Policial –SIPOL en el municipio de Arauca. El proyecto fue aprobado por parte de Fonseca en agosto de 2015 por valor de \$17.373 millones (\$13.772 millones, Min Interior y \$ 3.601 millones, Gobernación). En diciembre de 2015 se firmó el respectivo convenio entre Gobernación y Min. Interior. ✓ Con una inversión superior a los \$ 5.280 millones, se adelantó la construcción de los Centros de Integración Ciudadana de Fortul, Arauquita, Puerto Rondón, Tame y Saravena, los cuales benefician a más de 200.000 habitantes de estos municipios. ✓ Se finalizó la construcción del Centro de Convivencia de Fortul por valor de \$1.750 millones, beneficiando a 23.337 personas.
