



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
26/10/2021

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
30/09/2021

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular entre la Nación y los departamentos afines a la conmemoración del Bicentenario, las políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de los proyectos, conforme a las necesidades de los territorios, con el fin de promover la competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo social y económico de la región.

**Líneas Temáticas:**

- Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora.
- Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora.

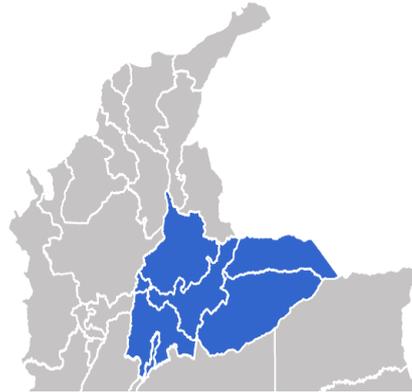
**TEMAS ESTRATEGICOS**

## ➤ Compromisos instancias administración:

- En la sesión No. 2 del Consejo Directivo se establecieron los siguientes compromisos, los cuales están siendo gestionados por el equipo del Pacto Bicentenario:
- Coordinar espacio de trabajo entre la Vicepresidencia de la República, el DNP y los gobernadores para la definición del esquema de cofinanciación de las entidades territoriales. A la fecha, desde la Vicepresidencia de la República se está realizando la gestión para el agendamiento de las mesas de trabajo, con el fin de dar cumplimiento al compromiso derivado del Consejo Directivo.
- Convocar a la sesión No. 3 del Consejo Directivo del Pacto Bicentenario en la modalidad presencial. La convocatoria a la sesión No. 3 está supeditada al resultado del ejercicio de definición del esquema de cofinanciación de las entidades territoriales, que se va a llevar a cabo en las mesas de trabajo mencionadas en el compromiso anterior.

## ➤ Impactos esperados

- Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Bicentenario generaría cerca de 52.089 empleos directos y 89.227 indirectos.
- Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 3.1 millones habitantes del área de influencia del Pacto Bicentenario.

**Área de Intervención: Pacto Bicentenario**

<b>Departamentos:</b>	Arauca Boyacá Casanare Cundinamarca Santander
<b>Fecha de Suscripción:</b>	26/06/2019
<b>Fecha de terminación:</b>	26/06/2029
<b>Plazo:</b>	10 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$3.720.651 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$2.447.927 (66%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$ 1.272.724 (34%)

**Avance financiero (Millones)**

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$2.267.077 (60,9%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$2.250.152
<b>Compromiso Territorio</b>	\$16.925

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$2.252.379 (12 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$14.750 (14 proyectos)



## PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO

**Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora: iniciativas transversales a cargo del Ministerio de Transporte**

### **Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena.**

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$600.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio Vías Colombia 063 conformado por Hidalgo e Hidalgo Colombia e Hidalgo e Hidalgo Sucursal Colombia, por un valor de \$362.134 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 47 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio Ecovision – 188, conformado por Triada México Colombia sucursal en Colombia de Triada Diseño, Gerencia Y Construcción S.A. de C.V, Grupo Tecmedic S.A.S., Ruth Elena Tabares Zuleta, ECG Ingeniería S.A.S. y Estructurador Colombia S.A.S. por valor de \$30.000 millones.

### **Duitama – Charalá - San Gil.**

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$500.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio PCT San Boy, conformado por Procopal y Castro Tcherassi, por un valor de \$310.625 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 41 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio Interventorías Colombia, conformado por 3B Proyectos S.A.S, Acinco Ingeniería S.A.S., Restrepo y Uribe S.A.S y Consultores en Ingeniería S.A.S. Por valor de \$27.400 millones.

### **Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo.**

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$520.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio Vías Nacionales, conformado por Sociedad KMA Constructores, Sicon SAS y Constructora Emma, por un valor de \$322.790 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 46 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio Reactivaciones 2021, conformado por Cemosá Colombia, Icoem Colombia S.A.S, Hace Ingenieros SAS y Brain Ingeniería Vial S.A.S. Por valor de \$27.600 millones.

### **Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá.**

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$620.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.



- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio Grosud, conformado por la Sociedad Grodco CI Ingenieros Civiles y Sudinco Sucursal Colombia, por un valor de \$358.872 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 43.7 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio Interventor Vial HVM-WSP 188, conformado por WSP Consultoría S.A.S., HVM Proyectos S.A.S y HVM Ingenieros LTDA. Por valor de \$28.800 millones.

### Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$230.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legadidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio Corredores Viales 063, conformado por la Sociedad Ingeniería de Vías, Explanan SAS e ICM Ingenieros SAS, por un valor de \$137.480 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 21 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio Saint, conformado por Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A., SAITEC S.A. Sucursal Colombia, Ingeniería y Consultoría INGECON S.A.S y Terra Ingenieros Civiles S.A.S. por valor de \$14.705 millones.

### Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$750.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legadidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.
- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-063-2020 fue adjudicado el 31 de marzo de 2021 al Consorcio Vial MHC 063, conformado por MHC Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles y Mario Alberto Huertas Cotes, por un valor de \$465.288 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 63.8 km en el corredor mencionado. Asimismo, el proceso CMA-DT-188-2020 que corresponde a la interventoría, fue adjudicado el 21 de abril de 2021 al Consorcio ICEACSA – TPF, conformado por TPF Getinsa Euroestudios SL e ICEACSA Consultores Sucursal Colombia. Por valor de \$33.500 millones.

### Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul).

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$100.000 millones en el marco del programa 'Concluir y concluir para la reactivación de las regiones'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso fue realizada el 22 de diciembre de 2020, y la firma del contrato el día 28 de diciembre de 2020.
- **Observaciones al proceso:** el proceso de la licitación pública (obra pública) LP-DT-056-2020 fue adjudicado el 29 de diciembre de 2020 al Consorcio Vial MHC 056, conformado por MHC Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles y Mario Alberto Huertas Cotes, por un valor de \$109.590 millones; con este proyecto se pretenden intervenir 125 km en el corredor mencionado. Por su parte, el proceso CMA-DT-176-2020 fue adjudicado el 29 de diciembre de 2020 al Consorcio Terra CGS, por un valor de \$6.200 millones.

### BTS: Tibasosa - Sogamoso

- **Estado:** En gestión
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$110.000 millones, el Ministerio de Transporte informó que este corredor será estructurado una vez la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI revierta el tramo Duitama – Tibasosa – Sogamoso al INVIAS, corredor que está incluido en la concesión Briceño – Tunja - Sogamoso.

### Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora



### Iniciativas del departamento de Arauca

#### **Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.**

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Arauca - 297 millones.
- **Avance:** el 31 de diciembre de 2018 se suscribió contrato de consultoría No. 713 de 2018 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Miradores, por valor de \$297 millones, financiados por el territorio con recursos propios, para el diseño de tres miradores, para Tame, Saravena y otro sobre el río Arauca en el municipio de Arauquita. Es importante destacar que la construcción de las obras se realizará con recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, en un ejercicio de articulación con el Contrato Plan Arauca. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### **Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena".**

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Arauca - 350 millones
- **Avance:** el 31 de diciembre de 2018 se suscribió contrato de consultoría No. 687 de 2018 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Diseños para la Paz por valor de \$350 millones, financiados por el territorio con recursos propios, para el diseño de tres miradores, para Tame, Saravena y otro sobre el río Arauca en el municipio de Arauquita. Es importante destacar que la construcción de las obras se realizará con recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, en un ejercicio de articulación con el Contrato Plan Arauca. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### **Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.**

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Arauca - 400 millones, MinTurismo - 1.247 millones
- **Avance:** acta inicio FNTC174-2017, Convenio 174 –2017, Informe de supervisión No. 13 Otro sí. No 1, por valor de \$1.647 millones, financiados por el Nación con recursos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para la construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.

#### **Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame**

- **Estado:** en gestión
- **Fuente:** Gobernación de Arauca - 1460 millones, MinTurismo 540 millones
- **Avance:** el proyecto se encuentra en estructuración por parte del territorio y se están realizando los ajustes a las observaciones emitidas por el FONTUR. El alcance de esta segunda fase corresponde a las obras con las que se planea terminar los senderos peatonales que se encuentran en sub-base correspondientes a 1.600 metros lineales y la inclusión de torre de avistamiento de aves. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2022.

#### **Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.**

- **Estado:** Terminado
- **Fuente:** Gobernación de Arauca - 7.928 millones
- **Avance:** el 14 de noviembre de 2018 se suscribió contrato de obra pública No. 008-03-2018 entre el municipio de Puerto Rondón y el Consorcio Malecón Rondón 2018, por valor de \$7.928 millones, financiados por el territorio a través del SGR, para las obras de construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.

### Iniciativas del departamento de Boyacá

#### **Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa.**

- **Estado:** En ejecución



- **Fuente:** Gobernación de Boyacá - 70 millones
- **Avance:** el 15 de enero de 2021 inició la ejecución del proyecto mediante el contrato FNTC-0308-2020 por valor de \$70 millones, financiado con recursos del MinCIT. A la fecha el contrato se reinició después de subsanar inconsistencias presentadas en la estructuración del proyecto. El proyecto cuenta con un avance físico del 100%. A la espera del acta de liquidación.

#### Iniciativas del departamento de Casanare

##### **Construcción parques temáticos de La Ruta Libertadora (Pore - Nunchía - Tamara - Paz de Ariporo - Hato Corozal).**

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** Gobernación de Casanare - \$3.675 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración con valor indicativo de \$3.675 millones, financiado con recursos SGR. Actualmente se está realizando revisión del tema predial y topografía. Actualmente se está realizando una articulación con el Ministerio de Cultura en el que se definió un plan de trabajo, con el fin de lograr la viabilidad técnica del proyecto. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

##### **Gestión para el fortalecimiento de las conexiones de conectividad terrestre a sitios de interés turístico y a atractivos (mejoramientos y construcción de infraestructura en miradores).**

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** Gobernación de Casanare - \$2.940 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración con valor indicativo de \$2.940 millones. Actualmente se está realizando revisión del componente predial y topografía. Se modificó el ingreso al Parque debido a problemas de gestión predial con el lote de ingreso del primer diseño, el ajuste prevé el ingreso por San Miguel de Farallones, por tal razón se está revisando el PMA y el POMCA (Río Cusiana) para identificar si se puede intervenir la zona y que permisos se deben tramitar. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### Iniciativas del departamento de Cundinamarca

##### **Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario.**

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Cundinamarca - \$500 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$500 millones para la conmemoración del 16 de julio, mediante la entrega de 14 constituciones de Cundinamarca con el fin de generar guiones turísticos interpretativos referentes al bicentenario. La ejecución de este proyecto fue la oportunidad para el departamento de conmemorar el hecho histórico, pero a su vez fomentar y generar una reflexión frente a la historia y la conciencia de patria, con el propósito de difundirla y promover el fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa y el sentido de pertenencia.

##### **Revitalización Puente del Común.**

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Cundinamarca - \$1.415 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$1.415 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Cundinamarca. Este puente es considerado una emblemática obra que dejó la ingeniería civil en el Virreinato, su construcción data de finales del siglo XVIII, característico por su ubicación estratégica, fue paso indispensable de comercio entre regiones.

##### **Fortalecimiento del producto turístico de biciturismo en municipios del bicentenario.**

- **Estado:** en gestión
- **Fuente:** Gobernación de Cundinamarca - \$100 millones, MinTurismo - \$100 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración con valor indicativo de \$200 millones, cofinanciado con recursos del territorio y el MinCIT. El proyecto está siendo estructurado por el Viceministerio de Turismo y la Gobernación de Cundinamarca. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2022.

#### Iniciativas del departamento de Santander



### **Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander.**

- **Estado:** en ejecución
- **Fuente:** Gobernación de Santander - \$5.540 millones
- **Avance:** proyecto en ejecución por valor de \$5.540 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Santander a través del SGR. Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 22.7% y un avance de obra del 20%.

### **Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander.**

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Santander - \$946 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$946 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Santander. Con este proyecto se logró mejorar y adecuar 2286 metros cuadrados del centro poblado de Guane, y con esto aumentar la afluencia de turistas hacia el municipio de Barichara. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

### **Casona de San Gil fase I.**

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** MinTurismo - \$10.425 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$10.425 millones, financiado con recursos del MinCIT. Se modificó el alcance de este proyecto y se propuso descartar la fase 2. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Construcción del parque temático lineal alusivo a la Batalla de Pienta.**

- **Estado:** en ejecución
- **Fuente:** MinTurismo - \$12.826 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$12.826 millones, financiado con recursos del MinCIT. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander.**

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** Gobernación de Santander - \$183 millones, MinTurismo - \$68 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración a cargo del territorio con un valor indicativo de \$251 millones, cofinanciado con recursos de la Gobernación de Santander y el MinCIT. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

### **Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander.**

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** MinTurismo - \$50 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$50 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

### **Iniciativas transversales a cargo del Viceministerio de Turismo**

#### **Becas para diplomado en Agroturismo.**

- **Estado:** ejecutado
- **Sector:** \$48 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$48 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

#### **Diplomado en turismo cultural asociado a la economía naranja en destinos con declaratoria de la UNESCO.**



- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** MinTurismo - \$167 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración por un valor indicativo de \$167 millones, financiado con recursos del MinCIT y se encuentra en proceso viabilidad por parte del Viceministerio de Turismo. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### **Diplomado en turismo cultural asociado a la economía naranja.**

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** MinTurismo - \$64 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración por un valor indicativo de \$64 millones, financiado con recursos del MinCIT y se encuentra en proceso viabilidad por parte del Viceministerio de Turismo. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### **Diseño de la ruta de avistamiento de aves para el corredor turístico de los Llanos Orientales.**

- **Estado:** en contratación
- **Fuente:** MinTurismo - \$800 millones
- **Avance:** Proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$800 millones, financiado con recursos del MinCIT, fue aprobado en Comité Directivo del Viceministerio de Turismo el 11 de marzo de 2021. Está en proceso de contratación, será contratación directa. La dirección de competitividad de FONTUR está avanzando para la firma del contratante. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### **Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario.**

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** MinTurismo - \$184 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$184 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

#### **Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.**

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** MinTurismo - \$141 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$141 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

#### **Fortalecimiento de la implementación de la Ruta de la Leyenda del Dorado.**

- **Estado:** en contratación
- **Fuente:** MinTurismo - \$100 millones
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa de \$100 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. El 01 de julio la Dirección de Competitividad del FONTUR remitió la solicitud de invitación abierta a la Dirección Legal del FONTUR. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### **Levantamiento de inventario de atractivos turísticos (30 inventarios).**

- **Estado:** en contratación
- **Fuente:** MinTurismo - \$307 millones
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa de \$307 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

#### **Piloto de cultura turística para un municipio incluido en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.**

- **Estado:** en contratación
- **Fuente:** MinTurismo - \$198 millones
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa de \$198 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

**Programa de formación en bilingüismo**

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** MinTurismo - \$500 millones
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa \$500 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación, se realizó una primera convocatoria que fue declarada desierta, dado lo anterior, se está realizando un ajuste a la estructuración. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

**Promoción del Bicentenario a través de la campaña nacional #yovoy.**

- **Estado:** en ejecución
- **Fuente:** MinTurismo - \$100 millones
- **Avance:** proyecto en ejecución por valor de \$100 millones, financiado con recursos del MinCIT. La campaña #yovoy irá hasta el 2022.

**Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional.**

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** MinTurismo - \$1.150 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$1.150 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

**SECTORES INVOLUCRADOS**

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Comercio Industria y Turismo	66	14	5	47
Transporte	8	-	7	1
<b>Total, general</b>	<b>74</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>48</b>

**2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL****2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)**

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Comercio Industria y Turismo	\$290.651	\$223.724	77%	\$66.927	23%
Transporte	\$3.430.000	\$1.049.000	31%	\$2.381.000	69%
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.720.651</b>	<b>\$1.272.724</b>	<b>34%</b>	<b>\$2.447.927</b>	<b>66%</b>

**2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2021**



60,9%

## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2019 – 2029  
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Comercio Industria y Turismo	\$290.651	\$0	0%	\$33.293	11%
Transporte	\$3.430.000	\$0	0%	\$2.233.784	65%
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.720.651</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	<b>\$2.267.077</b>	<b>60,9%</b>

## 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

## 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2021)

(2019-2029)

%Avance 43,92%



% Avance Acumulado 34,48%



Fecha de corte: 30 de septiembre de 2021

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

## 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

- Transporte % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%



Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bicentenario	510,93	510,93	556,93	0,00%		Rojo	886,93	510,93	0,00%		Rojo	30/09/2021

## SEMÁFORO



&lt;60%

≥80%

**Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora %****Avance: 52,71% % Avance Acumulado: 41,37%**

- Comercio, industria y turismo % Avance: 52,71% % Avance Acumulado: 41,37%

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Personas beneficiadas en procesos de asistencia, capacitación y formación en turismo en el marco del Pacto Bicentenario	0	497	1.060,00	46,88%		Rojo	1.060,00	497	46,88%		Rojo	30/06/2021
Infraestructura histórica, turística o cultural intervenida en el marco del Pacto Bicentenario	15	3	4	75,00%		Naranja	5	3	60,00%		Naranja	30/06/2021
Empresas beneficiadas con proyectos de fortalecimiento de la competitividad de la actividad turística en el marco del Pacto Bicentenario	0	0	103	0,00%		Rojo	103	0	0,00%		Rojo	30/09/2021



Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Proyectos para la planificación turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario		3	4	75,00%		Naranja	5	3	60,00%		Naranja	30/09/2021
Proyectos para la promoción turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario	15	2	3	66,66%		Naranja	5	2	40,00%		Rojo	30/09/2021

## SEMÁFORO



&lt;60%

≥80%

## 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

## Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bicentenario	A 30 de septiembre de 2021. Informe suministrado por Instituto Nacional de Vías INVIAS, Gobernación de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Casanare y Arauca. Se tiene previsto el inicio de la construcción de obra de las vías: Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena; Duitama - Charalá - San Gil; Ruta de los Libertadores: Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo; Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito - Aguazul); Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche - Chiquinquirá; Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal; Zipaquirá - Chiquinquirá - Barbosa.

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena	En Ejecución	\$390,93	El proyecto tiene una inversión indicativa de \$600.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021, la cual permitirá iniciar las actividades de obra.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Duitama – Charalá - San Gil	En Ejecución	\$349,80	los contratos de obra e interventoría están en etapa de legalización, sin orden de inicio selección de obra LP-DT-063-2020 – modulo 2 CONTRATO DE OBRA 987-2020 - CONSORCIO PCT SAN BOY valor: \$310.625.154.993 IVA incluido Plazo de ejecución de 114 meses, contados a partir de la orden de inicio. Selección de interventoría CMA-DT-188-2020- modulo 2 Contrato 1015 - 2021 consorcio REACTIVACIONES 2021 Valor de \$27.599.988.100.
Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo	En Ejecución	\$364,20	los contratos de obra e interventoría están en etapa de legalización, sin orden de inicio selección de obra LP-DT-063-2020 – modulo 2 Cto de obra 978-2021 - CONSORCIO VIAS NACIONALES Valor: \$322.790.128.920 IVA incluido Plazo de ejecución de 102 meses, contados a partir de la orden de inicio. Selección de interventoría CMA-DT-188-2020- modulo 4 Contrato 1038 - 2021 CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA Valor de \$ 27.399.730.108
Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul)	En Ejecución	\$115,79	El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca lograr la atención de los corredores viales dentro del Pacto Bicentenario incluidos en el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander y Arauca, para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones adecuadas, con una inversión de 150000 millones, de los cuales corresponde 100000 millones aportes de la Nación y 50000 millones al territorio. En este proyecto se benefician los habitantes de los municipios de Sogamoso(Boyacá), Aquitania (Boyacá), Pajarito(Boyacá), Aguazul(Casanare).
Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá	En Ejecución	\$402,80	El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca disminuir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conectividad vial entre el municipio de Puerto Boyacá (Dos y Medio) y el municipio de Otanche en el departamento de Boyacá, con una inversión de 620000 millones, de los cuales corresponde 434000 millones aportes de la Nación y 186000 millones al territorio. En este proyecto se benefician 37870 habitantes de los municipios de Puerto Boyacá y Chiquinquirá.
Vado Hondo - Labranza-grande - Yopal	En Ejecución	\$161,00	El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca disminuir los tiempos de desplazamiento en la vía Vado Hondo, Labranza-grande y Yopal, en los departamentos de Boyacá y Casanare, con una inversión de 230000 millones, de los cuales corresponde 161000 millones aportes de la Nación y 69000 millones al territorio. En este proyecto se benefician 8921 habitantes de los municipios de Labranzagrande y Aquitania (Boyacá), Yopal(Casanare).
Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa	En Ejecución	\$525,00	El proyecto se encuentra en ejecución, del sector transporte, busca lograr la atención de los corredores viales dentro del Pacto Bicentenario incluidos en el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander y Arauca, para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones adecuadas, con una inversión de 750000 millones, de los cuales corresponde 491500 millones aportes de la Nación y 225000 millones al territorio. En este proyecto se benefician 112,110 habitantes de los municipios de Zipaquirá, Nemocón, Cogua, Tausa, Sutatausa, Fúquene, Nemocón, Ubaté, Susa, Simijaca (Cundinamarca), Chiquinquirá, Saboyá (Boyacá), Barbosa(Santander).

(Millones de \$COP)

**Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora**

- Comercio, industria y turismo



Indicador	Avance Cualitativo
<b>Personas beneficiadas en procesos de asistencia, capacitación y formación en turismo en el marco del Pacto Bicentenario</b>	A septiembre 30 de 2021. Avance total: 497 personas. Descripción del avance: a la fecha se registra avance de las personas beneficiadas en el proyecto Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas bicentenario: 420 beneficiarios, Becas para diplomado en Agroturismo: 77 Beneficiarios. otros Los proyectos se encuentran en gestión: Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas bicentenario, otros. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
<b>Infraestructura histórica, turística o cultural intervenida en el marco del Pacto Bicentenario</b>	A septiembre 30 de 2021. Avance: 4 infraestructuras. Descripción del avance: Los proyectos ejecutados son: Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame. Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame. Revitalización Puente del Común. Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander. Los demás se encuentran en ejecución. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
<b>Empresas beneficiadas con proyectos de fortalecimiento de la competitividad de la actividad turística en el marco del Pacto Bicentenario</b>	A septiembre 30 de 2021. Se encuentran en gestión los proyectos: Capacitación práctica en estrategia de ventas, comercialización y estrategias digitales para los prestadores de servicios turísticos de destinos emergentes. Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas bicentenario, otros. Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas bicentenario, otros. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
<b>Proyectos para la planificación turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario</b>	A septiembre de 2021. Avance: 3 infraestructuras. Avance total: 3 proyectos ejecutados a través de la línea de competitividad del Manual para la Formulación de Proyectos del FONTUR para el desarrollo y fortalecimiento de la planificación turística territorial en los departamentos que conforman el Pacto Bicentenario (Arauca, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Santander). Descripción del avance: Se encuentran ejecutados los proyectos: Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario; el proyecto Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario y el proyecto de Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
<b>Proyectos para la promoción turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario</b>	A septiembre 30 de 2021. Avance: 2 infraestructuras. Proyectos ejecutados a través de la línea de promoción del Manual para la Formulación de Proyectos del FONTUR para el desarrollo y fortalecimiento de la promoción turística territorial a nivel nacional e internacional en los departamentos que conforman el Pacto Bicentenario (Arauca, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Santander). Descripción del avance: Se encuentran ejecutados los proyectos: Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional y el proyecto Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El	Ejecutado	\$199	El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo dar a conocer a Colombia y al mundo entero el Socorro como pueblo histórico de Colombia y en homenaje a todos los Socorranos que ofrendaron su vida por la libertad de Colombia, inversión 100% de la Nación por un valor de 199.383.394 millones. . En este proyecto se benefician 29997 en el municipio de Socorro.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Socorro, departamento de Santander.			
Becas para diplomado en Agroturismo.	Ejecutado	\$48	El proyecto está ejecutado, se realizó un diplomado en agroturismo sostenible, se beneficiaron 77 personas y tuvo una inversión de 48 millones de pesos de los municipios de Chía, Arauca, Tame, Charalá, Pinchote, Trinidad y Bogotá
Capacitación práctica en estrategia de ventas, comercialización y estrategias digitales para los prestadores de servicios turísticos de destinos emergentes.	Ejecutado	\$44	El proyecto se ejecutó el 15 de julio de 2021, se desarrolló a través del Programa de formación exportadora del MinCit, tiene una inversión total del sector por un valor de 44 millones de pesos.
Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas bicentenario, otros.	Ejecutado	\$600	Proyecto ejecutado el 15 de julio de 2021, con una inversión de 600 millones de pesos por parte del sector, consistió en la capacitación y formación de actores de la cadena de valor del sector turismo en legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas bicentenario, otros de los departamentos del Pacto Bicentenario, en el año 2020 se realizaron capacitación para más de 420 personas en los departamentos de los departamentos del Bicentenario.
Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario	Ejecutado	\$500	El proyecto se encuentra ejecutado, en el marco del Pacto Bicentenario y la conmemoración del 16 de julio se realizó el proceso de investigación de las constituciones expedidas en Cundinamarca y se hizo la publicación, con una inversión de 500 millones aportes del territorio. En este proyecto se benefician 116 municipios de Cundinamarca.
Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.	Ejecutado	\$1.646	El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo la construcción de senderos para el avistamiento de aves, con lo cual se pretende lograr la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame, departamento de Arauca, con una inversión de 1646 millones, de los cuales corresponde 1246 millones aportes de la Nación y 400 millones al territorio. Este proyecto benefició a las personas en el municipio de Tame.
Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca	Ejecutado	\$8.020	El proyecto se encuentra ejecutado, con el nuevo malecón se generaron espacios y áreas adecuadas para desarrollar actividades que integren las culturas, el esparcimiento y turismo, con una inversión 100% del territorio por un valor de 7.900 millones. En este proyecto se benefician a la población del municipio de Puerto Rondón.
Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander	En Ejecución	\$5.540	El proyecto se encuentra en ejecución, tiene como objetivo la construcción del parque principal del municipio de Vélez, Santander, con una inversión 100% del territorio por un valor de 5.540 millones. Tiene el 51% de avance de obra y 40% de financiero. En este proyecto se benefician 19,376 personas del municipio de Vélez.
Construcción del parque temático lineal	En Ejecución	\$12.826	Proyecto en ejecución, tiene el objetivo de recuperar espacio público y potencializar a la región en el sector turístico, con aportes indicativos del sector por un valor de 12.826 millones.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
alusivo a la Batalla de Pienta.			
Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario	Ejecutado	\$184	El proyecto se encuentra ejecutado, con una inversión 100% de la Nación por un valor de 185 millones.
Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.	En Ejecución	\$141	Este proyecto benefició a los habitantes de los destinos turísticos de los departamentos que conforman el pacto, dado que se conoce con certeza que atractivos potenciales tiene cada departamento para su explotación turística
Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.	Ejecutado	\$316	El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo de contar con espacios que generen una relación Urbano-Ambiental equilibrada y sostenible que dinamice el sector turismo y resaltando la ecología, la cultura y la historia, por ellos, generando servicios adicionales que coadyuven a crear permanencia y una prolongada y repetitiva visita por parte del turista o poblador, con una inversión 100% del territorio por un valor de 316 millones. En este proyecto se benefician la población de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita (Arauca)
Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena"	Ejecutado	\$350	El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo hacer los estudios y diseños de la primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena", con una inversión 100% del territorio por un valor de 350 millones. En este proyecto se benefició la población de los municipios de Saravena.
Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander	Ejecutado	\$946	El proyecto se encuentra ejecutado, tuvo como objetivo mejorar, organizar, adecuar el parque del centro poblado Guane del municipio de Barichara Departamento de Santander con una inversión 100% del territorio por un valor de 946.086.436 millones. En este proyecto se benefició 7,063 personas la población de los municipios de Barichera.
Plan de capacitación del talento humano (ABC del turismo en 32 municipios)	En Ejecución	\$390	Proyecto ejecutado por PROCOLOMBIA dentro de un plan de capacitación nacional, en el cual se han incluido 32 municipios del Pacto Bicentenario y se capacitaron integrantes del sector público y privado del turismo que manifestaron interés en participar en dicha capacitación y que actuarán como agentes multiplicadores
Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander.	En Ejecución	\$50	Se continúan ejecutando acciones para mantenimiento de la certificación y lograr óptimos resultados de las auditorias de calidad pendientes para la finalización del proyecto
Promoción del turismo gastronómico	Ejecutado	\$1.150	El proyecto se encuentra ejecutado, con una inversión 100% del territorio por un valor de 1.150.000.000 millones. La información



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional			del proyecto aún no ha sido enviada por el Viceministerio de Turismo.
Revitalización Puente del Común	Ejecutado	\$1.415	El proyecto se encuentra ejecutado, para la revitalización del Puente del Común, con una inversión 100% del territorio por un valor de 1415 millones.
Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa.	Ejecutado	\$70	El proyecto se encuentra en ejecución, tiene como objetivo implementar la señalización turística peatonal para el municipio de Paipa, con una inversión 100% de la Nación por un valor de 69 millones.

(Millones de \$COP)



#### 4. ANEXOS

**Proyectos de la matriz, financiados DNP:** Al corte de la presente ficha no hay proyectos reportados como cofinanciados por el DNP.
