



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
20/01/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/12/2021

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular entre la Nación y los departamentos afines a la conmemoración del Bicentenario, las políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de los proyectos, conforme a las necesidades de los territorios, con el fin de promover la competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo social y económico de la región.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora.
- Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora.

TEMAS ESTRATEGICOS

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue aprobado en la sesión No. 1 del Consejo Directivo del Pacto Bicentenario, realizado el 24 de noviembre de 2020 y ajustado en la sesión No. 3 del 16 de diciembre de 2021. En el ajuste del PEI se priorizaron un total de 71 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto Bicentenario con un valor indicativo de \$3.654.888.499.162, de los cuales \$2.446.679.535.660 son aportes de la Nación y \$1.208.208.963.502 aportes del territorio aproximadamente.


En la sesión No. 3 del Consejo Directivo se establecieron los siguientes compromisos, los cuales están siendo gestionados por el equipo del Pacto Bicentenario:

- Realizar mesas de trabajo con cada gobernación, cuyo objetivo sea la suscripción de un documento vinculante que defina las fuentes de financiación de cada entidad territorial, ratificando su compromiso frente al cierre financiero de los proyectos priorizados en la línea de conectividad vial.
- Convocar a la sesión No. 4 del Consejo Directivo del Pacto Bicentenario en la modalidad presencial.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Bicentenario generaría cerca de 52.089 empleos directos y 89.227 indirectos.

Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 3.1 millones habitantes del área de influencia del Pacto Bicentenario

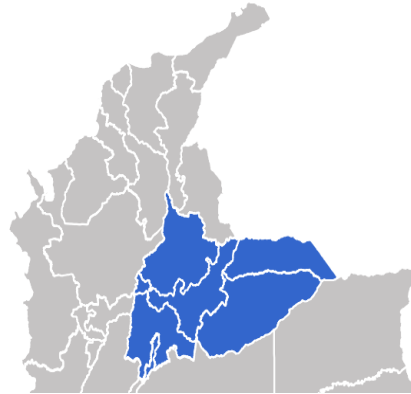Área de Intervención: Pacto Bicentenario**Departamentos:**Arauca
Boyacá
Casanare
Cundinamarca
Santander

Fecha de Suscripción: 26/06/2019

Fecha de terminación: 26/06/2029

Plazo: 10 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%) \$3.654.888 (100%)

Nación (%) \$2.446.680 (67%)

Territorio y otros (%) \$1.208.209 (33%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%) \$2.267.384 (62%)

Compromiso Nación \$2.250.459

Compromiso Territorio \$16.925

Proyectos en ejecución \$2.252.687 (13 proyectos)

Proyectos ejecutados \$14.698 (14 proyectos)



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO

Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora: iniciativas transversales a cargo del Ministerio de Transporte

Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$600.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue julio de 2021 y la fecha de terminación está pactada para el 30 de diciembre de 2030.

Se han atendido 4 emergencias en el corredor y se están realizando mantenimientos entre el PR105 y el PR114 y entre el PR84 y el PR88.

Duitama – Charalá - San Gil.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$500.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue 29 de junio de 2021 y la fecha de terminación está pactada para el 30 de diciembre de 2030.

Se está realizando el mantenimiento entre el PR22 al PR47 y parcheo técnico entre el PR0 y el PR7+900.

Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$520.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue julio de 2021 y su fecha de terminación está pactada para el 30 de diciembre de 2030.

Se está realizando la conformación de calzada desde el PR46 al PR79 y el parcheo técnico del PR0 al PR4.

Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$620.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue 25 de junio de 2021 y su fecha de terminación está pactada para el 31 de agosto de 2029.

Se está realizando la conformación y/o explanaciones en 44,72 km, el mantenimiento de zona en afirmado en 38 km y reparcho a 2 km.

Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$230.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue el 14 de julio de 2021 y su fecha de terminación está pactada para el 31 de agosto de 2030.



Se está realizando el mantenimiento a 52 km para dejarlo totalmente transitable y se están realizando explanaciones a 0,5 km en el tramo 2.

Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa.

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$750.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó el 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue el 21 de junio de 2021 y su fecha de terminación está pactada para el 30 de agosto de 2030.

Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul).

- **Estado:** contrato adjudicado
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$100.000 millones en el marco del programa 'Concluir y concluir para la reactivación de las regiones'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso fue realizada el 22 de diciembre de 2020, y la firma del contrato el día 28 de diciembre de 2020. la fecha de inicio fue el 21 de julio de 2021 y su fecha de terminación está pactada para el 30 de diciembre de 2030.

Se está realizando el mantenimiento a la totalidad del corredor.

BTS: Tibasosa - Sogamoso

- **Estado:** En gestión
- **Avance:** el proyecto tiene una inversión indicativa de \$110.000 millones, el Ministerio de Transporte informó que este corredor será estructurado una vez la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI revierta el tramo Duitama – Tibasosa – Sogamoso al INVIAS, corredor que está incluido en la concesión Briceño – Tunja - Sogamoso.

Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora

Iniciativas del departamento de Arauca

Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Arauca - 297 millones.
- **Avance:** el 31 de diciembre de 2018 se suscribió contrato de consultoría No. 713 de 2018 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Miradores, por valor de \$297 millones, financiados por el territorio con recursos propios, para el diseño de tres miradores, para Tame, Saravena y otro sobre el río Arauca en el municipio de Arauquita. Es importante destacar que la construcción de las obras se realizará con recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, en un ejercicio de articulación con el Contrato Plan Arauca. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena".

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Arauca - 350 millones
- **Avance:** el 31 de diciembre de 2018 se suscribió contrato de consultoría No. 687 de 2018 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Diseños para la Paz por valor de \$350 millones, financiados por el territorio con recursos propios, para el diseño de tres miradores, para Tame, Saravena y otro sobre el río Arauca en el municipio de Arauquita. Es importante destacar que la construcción de las obras se realizará con recursos del Fondo Regional de Pactos Territoriales, en un ejercicio de articulación con el Contrato Plan Arauca. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.



- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Arauca - 400 millones, MinTurismo - 1.247 millones
- **Avance:** acta inicio FNTC174-2017, Convenio 174 –2017, Informe de supervisión No. 13 Otro sí. No 1, por valor de \$1.647 millones, financiados por el Nación con recursos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para la construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.

Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame

- **Estado:** en gestión
- **Fuente:** Gobernación de Arauca - 1460 millones, MinTurismo 540 millones
- **Avance:** el proyecto se encuentra en estructuración por parte del territorio y se están realizando los ajustes a las observaciones emitidas por el FONTUR. El alcance de esta segunda fase corresponde a las obras con las que se planea terminar los senderos peatonales que se encuentran en sub-base correspondientes a 1.600 metros lineales y la inclusión de torre de avistamiento de aves. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2022.

Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.

- **Estado:** Terminado
- **Fuente:** Gobernación de Arauca - 7.928 millones
- **Avance:** el 14 de noviembre de 2018 se suscribió contrato de obra pública No. 008-03-2018 entre el municipio de Puerto Rondón y el Consorcio Malecón Rondón 2018, por valor de \$7.928 millones, financiados por el territorio a través del SGR, para las obras de construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.

Iniciativas del departamento de Boyacá

Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa.

- **Estado:** En ejecución
- **Fuente:** Gobernación de Boyacá - 70 millones
- **Avance:** el 15 de enero de 2021 inició la ejecución del proyecto mediante el contrato FNTC-0308-2020 por valor de \$70 millones, financiado con recursos del MinCIT. A la fecha el contrato se reinició después de subsanar inconsistencias presentadas en la estructuración del proyecto. El proyecto cuenta con un avance físico del 100%. A la espera del acta de liquidación. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Iniciativas del departamento de Casanare

Construcción parques temáticos de La Ruta Libertadora (Pore - Nunchía - Tamara - Paz de Ariporo - Hato Corozal).

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** Gobernación de Casanare - \$3.675 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración con valor indicativo de \$3.675 millones, financiado con recursos SGR. Actualmente se está realizando revisión del tema predial y topografía. Actualmente se está realizando una articulación con el Ministerio de Cultura en el que se definió un plan de trabajo, con el fin de lograr la viabilidad técnica del proyecto.

Gestión para el fortalecimiento de las conexiones de conectividad terrestre a sitios de interés turístico y a atractivos (mejoramientos y construcción de infraestructura en miradores).

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** Gobernación de Casanare - \$2.940 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración con valor indicativo de \$2.940 millones. Actualmente se está realizando revisión del componente predial y topografía. Se modificó el ingreso al Parque debido a problemas de gestión predial con el lote de ingreso del primer diseño, el ajuste prevé el ingreso por San Miguel de Farallones, por tal razón se está revisando el PMA y el POMCA (Río Cusiana) para identificar si se puede intervenir la zona y que permisos se deben tramitar.

Iniciativas del departamento de Cundinamarca



Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario.

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Cundinamarca - \$500 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$500 millones para la conmemoración del 16 de julio, mediante la entrega de 14 constituciones de Cundinamarca con el fin de generar guiones turísticos interpretativos referentes al bicentenario. La ejecución de este proyecto fue la oportunidad para el departamento de conmemorar el hecho histórico, pero a su vez fomentar y generar una reflexión frente a la historia y la conciencia de patria, con el propósito de difundirla y promover el fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa y el sentido de pertenencia. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Revitalización Puente del Común.

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Cundinamarca - \$1.415 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$1.415 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Cundinamarca. Este puente es considerado una emblemática obra que dejó la ingeniería civil en el Virreinato, su construcción data de finales del siglo XVIII, característico por su ubicación estratégica, fue paso indispensable de comercio entre regiones. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Fortalecimiento del producto turístico de biciturismo en municipios del bicentenario.

- **Estado:** en gestión
- **Fuente:** Gobernación de Cundinamarca - \$100 millones, MinTurismo - \$100 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración con valor indicativo de \$200 millones, cofinanciado con recursos del territorio y el MinCIT. El proyecto está siendo estructurado por el Viceministerio de Turismo y la Gobernación de Cundinamarca.

Iniciativas del departamento de Santander

Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander.

- **Estado:** en ejecución
- **Fuente:** Gobernación de Santander - \$5.540 millones
- **Avance:** proyecto en ejecución por valor de \$5.540 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Santander a través del SGR. Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 22.7% y un avance de obra del 20%.

Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander.

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** Gobernación de Santander - \$946 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$946 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Santander. Con este proyecto se logró mejorar y adecuar 2286 metros cuadrados del centro poblado de Guane, y con esto aumentar la afluencia de turistas hacia el municipio de Barichara. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Casona de San Gil fase I.

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** MinTurismo - \$10.425 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$10.425 millones, financiado con recursos del MinCIT. Se modificó el alcance de este proyecto y se propuso descartar la fase 2. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Construcción del parque temático lineal alusivo a la Batalla de Pienta.

- **Estado:** en ejecución
- **Fuente:** MinTurismo - \$12.826 millones



- **Avance:** proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$12.826 millones, financiado con recursos del MinCIT. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander.

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** Gobernación de Santander - \$183 millones, MinTurismo - \$68 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración a cargo del territorio con un valor indicativo de \$251 millones, cofinanciado con recursos de la Gobernación de Santander y el MinCIT.

Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander.

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** MinTurismo - \$50 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$50 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.

Iniciativas transversales a cargo del Viceministerio de Turismo

Becas para diplomado en Agroturismo.

- **Estado:** ejecutado
- **Sector:** \$48 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$48 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Diplomado en turismo cultural asociado a la economía naranja en destinos con declaratoria de la UNESCO.

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** MinTurismo - \$167 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración por un valor indicativo de \$167 millones, financiado con recursos del MinCIT y se encuentra en proceso de viabilidad por parte del Viceministerio de Turismo. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Diplomado en turismo cultural asociado a la economía naranja.

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** MinTurismo - \$64 millones
- **Avance:** proyecto en estructuración por un valor indicativo de \$64 millones, financiado con recursos del MinCIT y se encuentra en proceso de viabilidad por parte del Viceministerio de Turismo. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Diseño de la ruta de avistamiento de aves para el corredor turístico de los Llanos Orientales.

- **Estado:** en contratación
- **Fuente:** MinTurismo - \$800 millones
- **Avance:** Proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$800 millones, financiado con recursos del MinCIT, fue aprobado en Comité Directivo del Viceministerio de Turismo el 11 de marzo de 2021. Está en proceso de contratación, será contratación directa. La dirección de competitividad de FONTUR está avanzando para la firma del contratante. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario.

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** MinTurismo - \$184 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$184 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.



Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** MinTurismo - \$141 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$141 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Fortalecimiento de la implementación de la Ruta de la Leyenda del Dorado.

- **Estado:** en contratación
- **Fuente:** MinTurismo - \$100 millones
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa de \$100 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. El 01 de julio la Dirección de Competitividad del FONTUR remitió la solicitud de invitación abierta a la Dirección Legal del FONTUR. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Levantamiento de inventario de atractivos turísticos (30 inventarios).

- **Estado:** en contratación
- **Fuente:** MinTurismo - \$307 millones
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa de \$307 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Piloto de cultura turística para un municipio incluido en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.

- **Estado:** en contratación
- **Fuente:** MinTurismo - \$198 millones
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa de \$198 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Programa de formación en bilingüismo

- **Estado:** en estructuración
- **Fuente:** MinTurismo - \$500 millones
- **Avance:** proyecto con una inversión indicativa \$500 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto está en proceso de contratación, se realizó una primera convocatoria que fue declarada desierta, dado lo anterior, se está realizando un ajuste a la estructuración. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

Promoción del Bicentenario a través de la campaña nacional #yovoy.

- **Estado:** en ejecución
- **Fuente:** MinTurismo - \$100 millones
- **Avance:** proyecto en ejecución por valor de \$100 millones, financiado con recursos del MinCIT. La campaña #yovoy irá hasta el 2022.

Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional.

- **Estado:** ejecutado
- **Fuente:** MinTurismo - \$1.150 millones
- **Avance:** proyecto ejecutado por valor de \$1.150 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2021.

SECTORES INVOLUCRADOS



Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Comercio Industria y Turismo	63	14	6	43
Transporte	8		7	1
Total, general	71	14	13	44

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Comercio Industria y Turismo	\$224.888	\$159.209	71%	\$65.680	29%
Transporte	\$3.430.000	\$1.049.000	31%	\$2.381.000	69%
TOTAL	\$3.654.888	\$1.208.209	33%	\$2.446.680	67%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021



EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2019 – 2021 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Comercio Industria y Turismo	\$224.888	\$0	0%	\$33.601	15%
Transporte	\$3.430.000	\$0	0%	\$2.233.784	65%
TOTAL	\$3.654.888	\$0	0%	\$2.267.384	62%

3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL



3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2021)

(2019-2029)

%Avance 48,09%



% Avance Acumulado 37,81%



Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021


*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

- Transporte % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bicentenario	510,93	510,93	556,93	0,00%		Rojo	886,93	510,93	0,00%		Rojo	31/12/2021



Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora % Avance: 57,71% % Avance Acumulado: 45,37%

- Comercio, industria y turismo % Avance: 57,71% % Avance Acumulado: 45,37%



Indicador	Línea Base	Avance 2021	Meta 2021	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Personas beneficiadas en procesos de asistencia, capacitación y formación en turismo en el marco del Pacto Bicentenario	0	497	1.060,00	46,88%		Rojo	1.060,0	497	46,88%		Rojo	31/12/2021
Infraestructura histórica, turística o cultural intervenida en el marco del Pacto Bicentenario	15	4	4	100%		Verde	5	4	80,00%		Verde	31/12/2021
Empresas beneficiadas con proyectos de fortalecimiento de la competitividad de la actividad turística en el marco del Pacto Bicentenario	0	103	103	0,00%		Rojo	103	0	0,00%		Rojo	31/12/2021
Proyectos para la planificación turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario	3	4	4	75,00%		Naranja	5	3	60,00%		Naranja	31/12/2021
Proyectos para la promoción turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario	15	2	3	66,66%		Naranja	5	2	40,00%		Rojo	31/12/2021

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

**Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora**

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bicentenario	A 31 de diciembre de 2021. Informe suministrado por Instituto Nacional de Vías IN-VIAS, Gobernación de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Casanare y Arauca. Se tiene previsto el inicio de la construcción de obra de las vías : Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena; Duitama – Charalá - San Gil; Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo; Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul); Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá; Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal; Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa

Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora

- Comercio, industria y turismo

Indicador	Avance Cualitativo
Personas beneficiadas en procesos de asistencia, capacitación y formación en turismo en el marco del Pacto Bicentenario	A 31 de diciembre de 2021. Avance total: 497 personas. Descripción del avance: a la fecha se registra avance de las personas beneficiadas en el proyecto Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas bicentenario: 420 beneficiarios, Becas para diplomado en Agroturismo: 77 Beneficiarios. otros Los proyectos se encuentran en gestión: Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas bicentenario, otros. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
Infraestructura histórica, turística o cultural intervenida en el marco del Pacto Bicentenario	A diciembre 31 de 2021. Avance: 4 infraestructuras. Descripción del avance: Los proyectos ejecutados son: Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame. Revitalización Puente del Común. Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander. Los demás se encuentran en ejecución. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
Empresas beneficiadas con proyectos de fortalecimiento de la competitividad de la actividad turística en el marco del Pacto Bicentenario	A diciembre 31 de 2021. Se encuentran en gestión los proyectos: Capacitación práctica en estrategia de ventas, comercialización y estrategias digitales para los prestadores de servicios turísticos de destinos emergentes. Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas bicentenario, otros. Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas bicentenario, otros. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
Proyectos para la planificación turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario	A diciembre 31 de 2021. Avance: 3 infraestructuras. Avance total: 3 proyectos ejecutados a través de la línea de competitividad del Manual para la Formulación de Proyectos del FONTUR para el desarrollo y fortalecimiento de la planificación turística territorial en los departamentos que conforman el Pacto Bicentenario (Arauca, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Santander). Descripción del avance: Se encuentran ejecutados los proyectos: Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario; el proyecto Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario y el proyecto de Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
Proyectos para la promoción turística ejecutados	A diciembre 31 de 2021. Avance: 2 infraestructuras. Proyectos ejecutados a través de la línea de promoción del Manual para la Formulación de Proyectos del FONTUR



Indicador	Avance Cualitativo
en el marco del Pacto Bicentenario	para el desarrollo y fortalecimiento de la promoción turística territorial a nivel nacional e internacional en los departamentos que conforman el Pacto Bicentenario (Arauca, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Santander). Descripción del avance: Se encuentran ejecutados los proyectos: Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional y el proyecto Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de la presente ficha no hay proyectos reportados como cofinanciados por el DNP.
