



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
21/07/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
30/06/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular las políticas, planes y programas orientados a potencializar el corredor costero del Atlántico como un eje estratégico para la conectividad, el turismo y la productividad sostenible.

Líneas Temáticas:

- Desarrollo productivo y turístico sostenible.
- Conectividad e integración subregional.

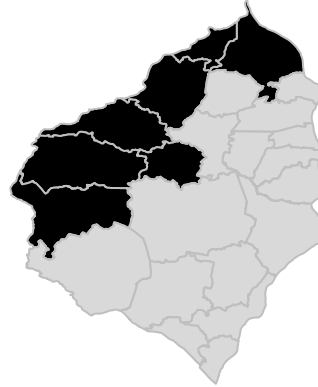
TEMAS ESTRATEGICOS

El 3 de agosto de 2021 se realizó el segundo Consejo Directivo, en el que se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Inversiones pasando de \$ 629.570 millones a \$662.821 millones con 11 iniciativas estratégicas.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas descritas anteriormente, se estima que el Pacto del Atlántico genere cerca de 9.279 empleos directos y 14.824 indirectos.

Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 1.470.627 habitantes del área de influencia del Pacto del Atlántico.

Área de Intervención: Atlántico

Departamento:	Atlántico: (Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, Usiacurí, Luruaco, Palmar de Varela y Polonuevo)
Fecha de suscripción:	17/03/2021
Fecha de terminación:	17/03/2024
Plazo:	3 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$662.821 (100%)
Nación (%)	\$465.750 (70%)
Territorio y otros (%)	\$197.071 (30%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$599.630 (90,5%)
Compromiso Nación	\$458.162
Compromiso Territorio	\$141.468

Proyectos en ejecución	\$597.180 (6 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$2.450 (1 proyecto)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****Proyectos en ejecución:**

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Distrito familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorca	El proyecto 4144-Distrito familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 121.408.845.503, con un aporte territorial de \$ 16.408.845.503 y un aporte nacional de \$ 105.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.000.000 personas ubicadas en Barranquilla (Atlántico), generar 1.620 empleos directos y 2.365 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recuperación integral del caño de La Auyama	El proyecto 4143-Recuperación integral del caño de La Auyama se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 104.746.148.119, con un aporte territorial de \$ 4.747.433.502 y un aporte nacional de \$ 99.998.714.617, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.000.000 personas ubicadas en Barranquilla (Atlántico), generar 1.400 empleos directos y 2.044 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Comercio Industria y Turismo	Complejo turístico Puerto Colombia	El proyecto 4140-Complejo turístico Puerto Colombia se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 15.974.851.976, con un aporte territorial de \$ 15.974.851.976 y un aporte nacional de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.334.810 personas ubicadas en Puerto Colombia (Atlántico), generar 1.400 empleos directos y 2.282 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Comercio Industria y Turismo	Plan de ordenamiento de playas Subregión Costera	El proyecto 4138-Plan de ordenamiento de playas Subregión Costera se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 43.214.203.540, con un aporte territorial de \$ 43.214.203.540 y un aporte nacional de \$ 0, cuenta con un avance físico del 4 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 48.637 personas ubicadas en Puerto Colombia (Atlántico), generar 280 empleos directos y 457 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Transporte	Construcción de la doble calzada metropolitana corredor vial Barranquilla-salgar-Pradomar - puerto Colombia,	El proyecto 4145-Construcción de la doble calzada metropolitana corredor vial Barranquilla-salgar-Pradomar - puerto Colombia, se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 113.521.178.367, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nacional de \$ 113.521.178.367, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.048.637 personas ubicadas en Barranquilla (Atlántico), Puerto Colombia (Atlántico), generar 1.400 empleos directos y 2.408 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Acueducto del Norte	El proyecto 4141-Acueducto del Norte se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 198.314.823.031, con un aporte territorial de \$ 58.673.024.565 y un aporte nacional de \$ 139.641.798.466, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.127.882 personas ubicadas en Barranquilla (Atlántico), Galapa (Atlántico), Juan de Acosta (Atlántico), Malambo (Atlántico), Piojó (Atlántico), Puerto Colombia (Atlántico), Soledad (Atlántico), Tubará (Atlántico), generar 2.772 empleos directos y 4.657 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Ambiente y Desarrollo Sostenible	5	-	2	3
Comercio Industria y Turismo	4	1	2	1
Transporte	1	-	1	-
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	1	-	1	-
Total, general	11	1	6	4

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Compromisos (Territorio y Otros)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$237.820,75	\$10.670,75	4%	\$227.150,00	96%
Comercio Industria y Turismo	\$127.000,00	\$127.000,00	100%	\$0,00	0%
Transporte	\$100.000,00	\$0,00	0%	\$100.000,00	100%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$198.000,00	\$59.400,00	30%	\$138.600,00	70%
TOTAL	\$662.821	\$197.071	30%	\$465.750	70%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A JUNIO DE 2022

90,5%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024
(Millones de \$ COP)

Sector	Inversiones Programadas	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$237.821	\$204.999	86%	\$226.155	95%
Comercio Industria y Turismo	\$127.000	\$0	0%	\$61.639	49%
Transporte	\$100.000	\$0	0%	\$113.521	114%
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	\$198.000	\$0	0%	\$198.315	100%
TOTAL	\$662.821	\$204.999	30,9%	\$599.630	90,5%

**3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL****3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.****(2022)****(2021-2024)**

%Avance 33,33%



% Avance Acumulado 33,33%

**Fecha de corte: 30 de junio de 2022**

*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Conectividad e integración subregional % Avance: - % Avance Acumulado: -
Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Atlántico	-	-	-	-		Gris	17,5	-	-		Gris	

SEMÁFORO

<60%

≥80%

Desarrollo productivo y turístico sostenible % Avance: 33,33 % Avance Acumulado: 33,33 %

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0 %

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Estructura ecológica recuperada en el marco del Pacto Atlántico.	0	0	3,30	0%		Rojo	183,3	0	0%		Rojo	30/06/2022



SEMÁFORO



<60%

≥80%

Comercio Industria y Turismo % Avance: 100% Avance Acumulado: 100%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Personas beneficiadas con la implementación de estrategias para el fortalecimiento del turismo en el marco del Pacto Atlántico	0	9.543	9.543	100%		Verde	9.543	9.543	100%		Verde	31/03/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

Comercio Industria y Turismo/ Vivienda, Ciudad y Territorio/ Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: 0 % Avance Acumulado: 0 %

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura intervenida en el marco del Pacto Atlántico	0	0	1	0%		Rojo	6	0	0%		Rojo	30/06/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Conectividad e integración subregional

Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Atlántico	Avanza la ejecución del contrato específico del sector transporte, así: 1. Corredor de impacto metropolitano de 13 kilómetros de longitud, que integra a Barranquilla con el corredor de universidades, clínicas y nuevos desarrollos habitacionales ubicados en el municipio de Puerto Colombia, pasando por los balnearios y sectores de playa que forman parte de la subregión costera del departamento. Se firmó convenio interadministrativo No.2018 de 2021 por \$102.205 millones entre Invias y la Gobernación del Atlántico. La secretaria de infra-estructura se encuentra adelantando proceso licitatorio con fecha de adjudicación 08 de julio de 2022.

**Desarrollo productivo y turístico sostenible**

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Estructura ecológica recuperada en el marco del Pacto Atlántico.	Avanza la ejecución de los proyectos de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así: 1. Distrito Familiar del Ecoparque Ciénaga de mallorquín: Con esta intervención se espera beneficiar a más de 1 millón de habitantes, generando condiciones ambientales óptimas, obteniendo un entorno de flora y fauna eficiente que beneficien a la ciudad de Barranquilla y el departamento. El 28 de octubre de 2021 se firmó el contrato específico N°2210698 por \$121.409 millones entre ENTerritorio y Edubar, donde el 86% fueron aportes de la Nación (\$105.000 millones) y el territorio participó con \$16.409 millones, que equivalen al 14 % del presupuesto. Se adjudicó el 17 de febrero del 2022 por medio de la SELECCIÓN ABIERTA No. SA-01-2022 al proponente TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A.- TI-COM S.A., por un valor \$113.014.745.304 con acta de inicio de obra el 16 de mayo de 2022. 2. Recuperación Integral del Caño de la Ahuyama: Con esta intervención se espera beneficiar a más de 1 millón de habitantes y recuperar el Caño de Ahuyama con un proceso de la ampliación y profundización de las secciones de este, dando como resultado un entorno ambientalmente sostenible de los caños de la ciudad de Barranquilla y sus afluentes. El 28 de octubre se firmó contrato específico N°2210681 entre ENTerritorio y Edubar por \$104.746 millones. Donde la Nación aportó \$99.999 millones que equivale al 95% y el distrito aportó \$4.747 millones que equivale al 5% del presupuesto. Se adjudicó este proyecto el 14 de febrero por medio de la SELECCIÓN ABIERTA No. SA-18-2021 al proponente CONSORCIO DRAGADOS DE COLOMBIA por un valor \$93,425,142,894 el 11 de mayo se dio acta de inicio de la obra.

Comercio Industria y Turismo

Indicador	Avance Cualitativo
Personas beneficiadas con la implementación de estrategias para el fortalecimiento del turismo en el marco del Pacto Atlántico	Intervención táctica del municipio de Usiacurí a través del color "Pueblo mágico ". La Gobernación del Atlántico ejecutó este proyecto con la comunidad y generó una transformación de entornos, a través del arte y el color. Obteniendo procesos de consolidación social y física de los territorios, esto como una estrategia de trabajo social y comunitario. Además, se implementaron diferentes líneas de formación y aprovechamiento de la vocación turística de la población y acciones de mejoramiento a partir de la cultura, propiciando el desarrollo local y la reactivación social y económica. Se beneficiaron 9.543 habitantes. Este Proyecto se ejecutó gracias al convenio suscrito con la fundación Pintuco por \$2.267 millones, de los cuales el departamento financió \$1.587 millones que es el 70% y la fundación Pintuco aportó \$680 millones que equivale al 30% del Proyecto, es de destacar que en el mes de diciembre se realizó una adición por el valor de \$182.300 con el objetivo de ampliar el alcance de viviendas con 13.440 M2 en intervención de fachadas, a la fecha el proyecto está terminado a satisfacción. Con una inversión total de \$2.449 millones.

Comercio Industria y Turismo/ Vivienda, Ciudad y Territorio/ Ambiente y Desarrollo Sostenible



Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura intervenida en el marco del Pacto Atlántico	<p>Avanza la ejecución de los proyectos de Comercio Industria y Turismo/ Vivienda, Ciudad y Territorio/ Ambiente y Desarrollo Sostenible, así: 1. Acueducto del Norte: Con esta intervención se espera beneficiar a más de 2 millones de habitantes, garantizando el agua potable para el desarrollo turístico y reduciendo el déficit de agua que se tiene para los municipios del área metropolitana y la zona costera. El 3 de noviembre de 2021 se firmó contrato N°202104397 entre el Departamento del Atlántico con EDUBAR por \$198.314.823.031 millones, de los cuales \$139.641.798.466 son financiados por la Nación (MVCT) y \$58.673.024.565 por la Gobernación del Atlántico. De acuerdo a información suministrada por EDUBAR el proceso de adjudicación que se estaba adelantando quedó fallido. En tal sentido se adelantará nuevo proceso de contratación para adjudicarlo en el cuarto trimestre del 2022. con esta intervención se generarán 1000 empleos directos y 4000 indirectos. 2. Complejo turístico Puerto Colombia. El proyecto tiene una inversión de \$100.000 millones, financiados por la Gobernación del Atlántico con recursos de regalías, para realizar la construcción y adecuación de 25.322 m2 de espacio público frente al mar. Se beneficiarán 1.334.810 habitantes del departamento. Esta iniciativa comprende cuatro proyectos de los cuales se encuentra en ejecución el Mercado de la Sazón y Artesanía del Atlántico por \$15.975 millones. EDUBAR adjudicó el 31 de enero del 2022 al consorcio Unión Temporal Mercado de la Sazón de Puerto Colombia 3. Plan de Ordenamiento de playas Subregión costera del Atlántico. Esta iniciativa se subdivide en dos proyectos, los cuales se financiarán uno por SGR y otro por recursos propios, ambos se licitaron y se adjudicaron y están en ejecución el primero comprenden las Playas de Sabanillas y el Country pertenecientes al municipio de Puerto Colombia donde se beneficiarán 17 caseteros y se definirán las zonas habilitadas para bañistas, práctica de deportes de playa, baños, zonas primeros auxilios, casetas salva vidas y sitios de estacionamiento vehicular por \$17.715 millones incluyendo interventoría, ejecutándolo el Consorcio obras especiales Puerto, este proyecto inicio obras el 7 de febrero, con un avance físico del 7%. El segundo proyecto es el Centro de Deportes Náutico Salinas del Rey en las playas de Juan de Acosta, el cual se adjudicó por \$25.498 millones incluyendo interventoría, ejecutándolo consorcio Salinas del Rey a la espera del acta de inicio. Ambos adjudicados por Indeportes Atlántico. Tiempo de ejecución de ambos proyectos 10 meses a partir del acta de inicio. Entrega de proyectos diciembre 2022.</p>



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 2 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 204.999 millones, equivalente al 31% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Comprometido
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Distrito familiar del Eco-parque Ciénaga de Mallorquín	En Ejecución	\$16.409	\$105.000	\$105.000	\$121.409
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Recuperación integral del caño de La Ahuyama	En Ejecución	\$4.747	\$99.999	\$99.999	\$104.746
Total, general			\$21.156	\$204.999	\$204.999	\$226.155
