



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
17/10/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
30/09/2022

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.

**Líneas Temáticas:**


- Infraestructura para la integración social
- Gestión ambiental y saneamiento básico

**TEMAS ESTRATÉGICOS**

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue modificado en la sesión No. 4 del Consejo Directivo del Pacto Cundinamarca, realizado el 19 de julio de 2022. En esta modificación se pasó de un valor indicativo de \$536.820.997.439 a \$493.920.668.269, de los cuales \$458.511.192.053 son aporte indicativo de la Nación y \$35.409.476.216 del territorio.

## ➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Cundinamarca generaría cerca de 6.913 empleos directos y 10.685 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 1.3 millones habitantes del área de influencia del Pacto Cundinamarca.

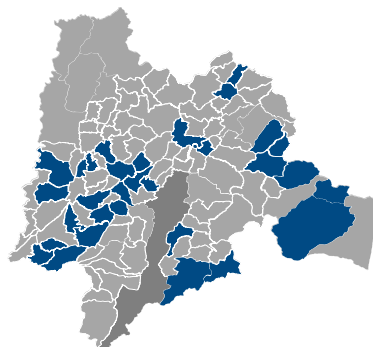**Área de Intervención: Cundinamarca****Departamento:**

**Cundinamarca** Municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Cajicá, Caquezá, Chía, Chipaque, Chocontá, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Fomeque, Funza, Fúquene, Gachetá, Girardot, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Paime, Pulí, Quetame, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Subachoque, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Viotá, Zipaquirá y Gachancipá.

<b>Fecha de suscripción:</b>	19/02/2021
<b>Fecha de terminación:</b>	19/02/2024
<b>Plazo:</b>	3 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$493.921 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$458.511 (93%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$35.409 (7%)

**Avance financiero (Millones)**

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$251.999 (51%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$ 219.968
<b>Compromiso Territorio</b>	\$32.031

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$ 251.999 (23 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.****Proyectos en ejecución:**

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá	El proyecto 4280-Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.885.377.358, con un aporte territorial de \$ 743.339.494 y un aporte nación de \$ 1.142.037.864, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 9.644 personas ubicadas en Ubalá (Cundinamarca), generar 26 empleos directos y 39 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación plaza de mercado - central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa	El proyecto 4266-Adecuación plaza de mercado - central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.167.000.000, con un aporte territorial de \$ 3.167.000.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 100 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.210 personas ubicadas en La Mesa (Cundinamarca), generar 44 empleos directos y 65 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá	El proyecto 4282-Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 851.120.000, con un aporte territorial de \$ 851.120.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 100 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 146.352 personas ubicadas en Zipaquirá (Cundinamarca), generar 12 empleos directos y 18 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	El proyecto 4261-Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.480.550.120, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 2.480.550.120, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 8.745 personas ubicadas en Gacheta (Cundinamarca), generar 35 empleos directos y 51 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la edificación de la mujer tejedora cabeza de hogar del municipio de Chipaque	El proyecto 4253-Construcción de la edificación de la mujer tejedora cabeza de hogar del municipio de Chipaque se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.463.836.860, con un aporte territorial de \$ 1.463.836.860 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 100 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 228 personas ubicadas en Chipaque (Cundinamarca), generar 20 empleos directos y 30 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Siquima	El proyecto 4262-Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Siquima se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.484.140.000, con un aporte territorial de \$ 1.484.140.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 100 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 4.584 personas ubicadas en Guayabal De Siquima (Cundinamarca), generar 21 empleos directos y 31 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	El proyecto 4254-Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.093.293.603, con un aporte territorial de \$ 211.689.182 y un aporte nación de \$ 881.604.421, cuenta con un avance físico del 13 % y financiero del 35 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.500 personas ubicadas en Chipaque (Cundinamarca), generar 15 empleos directos y 22 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutierrez, Cundinamarca	El proyecto 4264-Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutierrez, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.704.720.764, con un aporte territorial de \$ 568.072.985 y un aporte nación de \$ 1.136.647.779, cuenta con un avance físico del 29 % y financiero del 47 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 802 personas ubicadas en Gutiérrez (Cundinamarca), generar 24 empleos directos y 35 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal	El proyecto 4259-Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.046.426.377, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 1.046.426.377, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 25.757 personas ubicadas en El Rosal (Cundinamarca), generar 15 empleos directos y 22 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte	El proyecto 4275-Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.945.122.389, con un aporte territorial de \$ 2.605.759.622 y un aporte nación de \$ 2.339.362.767, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 14.367 personas ubicadas en Ricaurte (Cundinamarca), generar 69 empleos directos y 102 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	El proyecto 4251-Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.603.360.938, con un aporte territorial de \$ 361.786.287 y un aporte nación de \$ 1.241.574.651, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 38 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 1.013 personas ubicadas en Bituima (Cundinamarca), generar 22 empleos directos y 33 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación El proceso de contratación de obra se ha declarado desierto en tres ocasiones. . Responsable Municipio de Bituima. Avance El 15 de septiembre se adjudicó proceso de obra y avanza contratación de interventoría.. Alerta No se han iniciado obras, dado el tiempo que ha tomado al municipio lograr la contratación derivada porque los procesos se han ido desiertos.
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del casco urbano, municipio de San Antonio del Tequendama	El proyecto 4276-Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del casco urbano, municipio de San Antonio del Tequendama se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 536.773.000, con un aporte territorial de \$ 536.773.000 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 100 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 14.000 personas ubicadas en San Antonio De Tequendama (Cundinamarca), generar 8 empleos directos y 11 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca	El proyecto 4247-Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 28.593.102.330, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 28.593.102.330, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 1.854 personas ubicadas en Ubaque (Cundinamarca), generar 400 empleos directos y 584 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca	El proyecto 4244-Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.245.579.312, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 10.245.579.312, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 1.041 personas ubicadas en Caqueza (Cundinamarca), generar 143 empleos directos y 209 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paima, departamento de Cundinamarca	El proyecto 4246-Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paima, departamento de Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.802.828.143, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 3.802.828.143, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 400 personas ubicadas en Paima (Cundinamarca), generar 56 empleos directos y 81 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Adecuación y remodelación estadio municipal Ubate	El proyecto 4290-Adecuación y remodelación estadio municipal Ubate se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.455.490.394, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 7.455.490.394, cuenta con un avance físico del 10 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 22.558 personas ubicadas en Ubate (Cundinamarca), generar 104 empleos directos y 161 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	El proyecto 4291-Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 25.722.032.639, con un aporte territorial de \$ 10.722.032.639 y un aporte nación de \$ 15.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 7 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 146.352 personas ubicadas en Zipaquirá (Cundinamarca), generar 360 empleos directos y 555 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca	El proyecto 4285-Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 38.692.432.704, con un aporte territorial de \$ 4.692.432.704 y un aporte nación de \$ 34.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 18 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 107.459 personas ubicadas en Funza (Cundinamarca), generar 542 empleos directos y 834 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.
Deporte y Recreación	Mejoramiento de los polideportivos de los barrios La Magnolia, Escallón y San Luis de la zona urbana del municipio de Madrid, Cundinamarca	El proyecto 4353-Mejoramiento de los polideportivos de los barrios La Magnolia, Escallón y San Luis de la zona urbana del municipio de Madrid, Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.868.727.572, con un aporte territorial de \$ 3.868.727.572 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 100 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 4.000 personas ubicadas en Madrid (Cundinamarca), generar 54 empleos directos y 83 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Deporte y Recreación	Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	<p>El proyecto 4289-Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 20.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 20.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 11.014 personas ubicadas en Tocancipá (Cundinamarca), generar 280 empleos directos y 431 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.</p>
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	<p>El proyecto 4294-Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 6.109.892.265, con un aporte territorial de \$ 387.296.102 y un aporte nación de \$ 5.722.596.163, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 21.515 personas ubicadas en Cajicá (Cundinamarca), generar 86 empleos directos y 135 empleos indirectos. El proyecto se encuentra retrasado de acuerdo con lo programado. Observación Se suscribió otrosí modificatorio del contrato específico para adición de recursos. Responsable Municipio de Cajicá. Avance Pliegos de contratación de obra publicados el 23 de agosto. Alerta La modificación por adición de recursos generó retrasos en el inicio de obra</p>
Transporte	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	<p>El proyecto 4296-Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 83.380.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 83.380.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 770.855 personas ubicadas en Cajicá (Cundinamarca), Chía (Cundinamarca), Cota (Cundinamarca), El Rosal (Cundinamarca), Facatativá (Cundinamarca), Funza (Cundinamarca), Madrid (Cundinamarca), Mosquera (Cundinamarca), Tabio (Cundinamarca), Tenjo (Cundinamarca), generar 1.167 empleos directos y 2.008 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.</p>
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocotá	<p>El proyecto 4295-Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocotá se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.867.430.423, con un aporte territorial de \$ 367.430.423 y un aporte nación de \$ 1.500.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 8 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.638 personas ubicadas en Chocotá (Cundinamarca), generar 26 empleos directos y 45 empleos indirectos. El proyecto se encuentra en tiempo de acuerdo con lo programado.</p>





## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	32	-	12	20
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3	-	3	-
Cultura	4	-	-	4
Deporte y Recreación	7	-	5	2
Inclusión Social y Reconciliación	1	-	1	-
Planeación	2	-	-	2
Transporte	2	-	2	-
<b>Total, general</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>28</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

## 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$142.309	\$15.372	11%	\$126.938	89%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$42.817	\$0	0%	\$42.817	100%
Cultura	\$105.851	\$0	0%	\$105.851	100%
Deporte y Recreación	\$101.316	\$19.283	19%	\$82.033	81%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.110	\$387	6%	\$5.723	94%
Planeación	\$10.270	\$0	0%	\$10.270	100%
Transporte	\$85.247	\$367	0%	\$84.880	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$493.921</b>	<b>\$35.409</b>	<b>7%</b>	<b>\$458.511</b>	<b>93%</b>

## 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2022



## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024  
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$142.309	\$10.268	7%	\$22.262	16%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$42.817	\$42.642	100%	\$42.642	100%
Cultura	\$105.851	\$0	0%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$101.316	\$76.455	75%	\$95.739	94%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.110	\$5.723	94%	\$6.110	100%
Planeación	\$10.270	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$85.247	\$84.880	100%	\$85.247	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$493.921</b>	<b>\$219.968</b>	<b>45%</b>	<b>\$251.999</b>	<b>51%</b>

## 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

## 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2021-2024)

%Avance 0%



% Avance Acumulado 0%



Fecha de corte: 30 de septiembre de 2022

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

## 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Gestión ambiental y saneamiento básico % Avance: - % Avance Acumulado: --

Ambiente y Desarrollo Sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
Obras de mitigación de riesgo realizadas en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-	Gris	5	-	-	Gris	





SEMÁFORO



<60%


≥80%

**Infraestructura Para la Integración Social % Avance: -0% % Avance Acumulado: 0%**

Transporte % Avance: 0% % Avance Acumulado: 0%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías y cicloinfraestructura intervenidas en el marco del Pacto Cundinamarca	32,67	32,67	33,23	0%		Rojo	77,10	32,67	0%		Rojo	30/09/2022

SEMÁFORO



<60%

≥80%

**Agricultura y Desarrollo Rural % Avance: - % Avance Acumulado: -**

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Productores beneficiados con proyectos dirigidos al sector agropecuario en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	3.010	-	-		Gris	

SEMÁFORO



<60%

≥80%



Deporte y Recreación % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura deportiva y recreativa intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	8	-	-		Gris	

SEMÁFORO



&lt;60%

≥80%

Planeación/ Inclusión Social y Reconciliación/ Cultura % Avance: - % Avance Acumulado: -

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura pública intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca	0	-	-	-		Gris	4	-	-		Gris	

SEMÁFORO



&lt;60%

≥80%

### 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

#### Gestión ambiental y saneamiento básico

##### Ambiente y Desarrollo Sostenible

Indicador	Avance Cualitativo
Obras de mitigación de riesgo realizadas en el marco del Pacto Cundinamarca	Se tienen los siguientes avances: Intervención ambiental para mitigación del riesgo, Cáqueza: Se suscribió el contrato específico N°2210766 entre ENTerritorio y Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, el 4 de agosto de 2022, por valor de \$10.245 millones. Se encuentra en trámite de legalización. Intervención ambiental para mitigación del riesgo, Ubaque: Se suscribió el contrato específico N°2221015 entre ENTerritorio y el municipio de Ubaque el 8 de



septiembre de 2022, por valor de \$28.593 millones. Se encuentra en trámite de legalización. Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paima: Se suscribió el contrato específico N°2210813 entre ENTerritorio y el municipio de Paima el 12 de agosto de 2022, por valor de \$3.803 millones. El 8 de septiembre de 2022 se aprobaron las garantías del contrato.

## Infraestructura Para la Integración Social

### Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Vías y cicloinfraestructura intervenidas en el marco del Pacto Cundinamarca</b>	Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá. Se suscribió el contrato específico N°2210751 entre ENTerritorio y el municipio de Chocontá, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$1.867 millones. El 16 de febrero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El 17 de agosto el municipio adjudicó el proceso de obra al CONSORCIO FEQUEZ, por valor de \$1.512.645.812,22 y el 5 de agosto adjudicó el concurso de méritos al proponente SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S, por valor de \$287.717.010. El 14 de septiembre se suscribió acta de inicio de obra. Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente. Se suscribió el contrato específico N°2210754 entre ENTerritorio y el ICCU, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$83.380 millones. El 27 de abril se aprobó la garantía por parte de ENTerritorio, quedando legalizado el contrato. Se suscribió modificatorio al contrato específico el 19 de agosto. El ICCU avanzó con proceso de contratación del grupo de gestión predial y está en elaboración de pliegos para publicación de procesos de contratación derivada de avalúos, obra e interventoría.

### Agricultura y Desarrollo Rural

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Productores beneficiados con proyectos dirigidos al sector agropecuario en el marco del Pacto Cundinamarca</b>	Avanza la ejecución de los siguientes proyectos: 1) CE N°2210753 Plaza de mercado de la Sierra, Bituima: se ha declarado desierto el proceso de contratación de obra en tres ocasiones y se publicó nuevamente proceso de licitación el 15 de septiembre adjudicó obra al Consorcio BP por valor de \$1.490.019.029. Municipio avanza con el proceso CM 004-2022 para la adjudicación de la interventoría 2) CE N°2210746 Centro de acopio Cerezos Grandes, Chipaque: tiene contrato de obra e interventoría suscrito, con acta de inicio del 21 de junio. Se reporta avance de ejecución del 23% con corte a julio. 3) CE N°2210748 Plaza de mercado Gachetá: tiene contrato de obra e interventoría suscrito, con acta de inicio del 27 de julio. 4) CE N°2210728 Centro de acopio Gutiérrez: tiene contrato de obra e interventoría suscrito, con acta de inicio del 3 de marzo; presenta avance del 29%. 6) convenio 906 Edificación mujer tejedora Chipaque: tiene contrato de obra e interventoría suscrito, con acta de inicio del 16 de mayo. 7) convenio 660 Plaza de mercado Guayabal de Siquima: tiene contrato de obra e interventoría suscrito, con acta de inicio del 2 de mayo. 8) convenio 742 Plaza de mercado de La Mesa: tiene contrato de obra e interventoría suscrito, con acta de inicio 9) convenio 731 Plaza de mercado San Antonio del Tequendama: tiene contrato de obra e interventoría suscrito, con acta de inicio 9) convenio 754 Plaza de mercado de Zipaquirá: tiene contrato de obra e interventoría suscrito, con acta de inicio 10) CE 2220798 Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal. Se suscribió el 5 de agosto de 2022, por valor de \$1.046 millones. Se encuentra en trámite de legalización. 11) CE 2220951 Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte. Se suscribió el 23 de agosto de 2022, por valor de \$4.945 millones. El 6 de septiembre de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. Se encuentra en trámite de legalización. 12)CE



Indicador	Avance Cualitativo
	220968 Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá. Se suscribió el 23 de agosto de 2022, por valor de \$1.885 millones. Se encuentra en trámite de legalización. 13) Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá. Se suscribió el convenio interadministrativo N°754 entre ICCU y municipio de Zipaquirá, por valor de \$851 millones. El municipio adjudicó el proceso de obra LP-003-2022 al CONSORCIO LA PLAZA, por valor de \$791.596.047,34 y adjudicó el concurso de méritos CM-003-2022 al CONSORCIO CONSULTORES ASMC, por valor de \$37.536.426. Se encuentra en ejecución la obra..

## Deporte y Recreación

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura deportiva y recreativa intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca</b>	Avanza la ejecución de los proyectos de estadios, coliseos, escenarios deportivos, así: Adecuación y remodelación estadio municipal Ubaté. Se suscribió el contrato específico N°2210729 entre ENTerritorio y el municipio de Ubaté, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$7.455 millones. El 7 de marzo se aprobaron las garantías del contrato. El municipio adjudicó el proceso de contratación LP-005-2022, el 13 de abril, al consorcio CONSORCIO BMC 2022, por valor de \$6.929.060.346 y el concurso de méritos CM-002-2022, el 2 de junio, al CONSORCIO INTER CANCHA 2022, por valor de \$520.908.419. Se suscribió acta de inicio el 8 de julio. Se reporta avance de ejecución del 10% con corte a julio. Estadio Zipaquirá. Se suscribió el contrato específico N°2210732 entre ENTerritorio, ICCU y el municipio de Zipaquirá, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$21.407 millones. El 16 de febrero se aprobaron las garantías del contrato. El municipio presentó a ENTerritorio solicitud de ajuste de presupuesto el cual fue aprobado en el comité operativo realizado el 2 de junio. El 31 de agosto se adjudicó el proceso LP 020-2021 al Consorcio Estadio Municipal Zipa 2022, por valor de \$24.122.315.188 y el 19 de agosto se adjudicó el concurso de méritos N°005 de 2022 al Consorcio Inter González por valor de \$1.581.208.513,50. Coliseo municipio de Funza. Se suscribió el contrato específico N°2210731 entre ENTerritorio, ICCU y el municipio de Funza, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$38.692 millones. El 28 de junio se aprobaron las garantías del contrato. El 17 de agosto se suscribió modificatorio del contrato específico. El municipio adjudicó el proceso de contratación de obra LP002 de 2022, el 17 de agosto, al CONSORCIO COLISEO 2022, por valor de \$41.070.430.107. y el 19 de septiembre adjudicó el concurso de méritos N°005 de 2022 al Consorcio Construir 2022 por valor de \$2.180.954.776. Villa olímpica de Jerusalén: El contrato específico N°2210956 suscrito entre ENTerritorio y el municipio de Jerusalén para el mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca fue liquidado en atención a la sentencia de Ley de Garantías. Por lo anterior el proyecto pasó a estado 'en gestión' y se realizó verificación de requisitos nuevamente por parte de ENTerritorio para firma de orden de gasto por DNP. Parque recreo deportivo Los Patos de Tocancipá. Se suscribió el contrato específico N°2210741 entre ENTerritorio y el municipio de Tocancipá, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$20.000 millones. El 12 de enero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El 1 de junio el municipio adjudicó el proceso de licitación 006 MT 2022 al Consorcio Los Patos por valor de \$18.518.517.963 millones y el 22 de junio adjudicó el concurso de méritos CM-001-MT-2022 para la contratación de la interventoría al Consorcio CANARDS por valor de \$1.481.481.471. Se suscribió acta de inicio el 2 de agosto y se encuentra en ejecución.

Planeación/ Inclusión Social y Reconciliación/ Cultura



Indicador	Avance Cualitativo
<b>Infraestructura pública intervenida en el marco del Pacto Cundinamarca</b>	Avanza la ejecución de los proyectos de infraestructura pública intervenida, así: Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá. Se suscribió el contrato específico N°2210738 entre ENTerritorio y el municipio de Cajicá, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$5.722 millones. El 2 de marzo de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El comité operativo y de seguimiento aprobó modificación del contrato específico el cual quedó suscrito el 12 de agosto. El 23 de agosto el municipio publicó el proceso LP-006-2022 para contratación de obra. y el 1 de septiembre publicó concurso de méritos CM-006-2022 para contratación de interventoría.



## 4. ANEXOS

## Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 17 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor financiado DNP de \$ 219.968 millones, equivalente al 45% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá	En Ejecución	\$743	\$1.142	\$1.142	\$1.885
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$2.481	\$2.481	\$2.481
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$212	\$882	\$882	\$1.093
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutierrez, Cundinamarca	En Ejecución	\$568	\$1.137	\$1.137	\$1.705
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte	En Ejecución	\$2.606	\$2.339	\$2.339	\$4.945
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	En Ejecución	\$362	\$1.242	\$1.242	\$1.603
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción del centro de acopio en el Municipio de El Rosal	En Ejecución	\$0	\$1.046	\$1.046	\$1.046
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras biomecánicas para la mitigación de las condiciones de riesgo, desastres por movimientos en masa en la cuenca del río Palmar, municipio Ubaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$28.593	\$28.593	\$28.593
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras estructurales para la mitigación del riesgo asociado a movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Cáqueza, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$10.246	\$10.246	\$10.246
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción obras de mitigación de inundaciones mediante la canalización de la quebrada La Mira, obras de manejo de aguas superficiales y pluviosidad en el casco urbano, de la inspección Tudela, municipio de Paima, departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$3.803	\$3.803	\$3.803
Deporte y Recreación	Adecuación y remodelación estadio municipal Ubate	En Ejecución	\$0	\$7.455	\$7.455	\$7.455
Deporte y Recreación	Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	En Ejecución	\$10.722	\$15.000	\$15.000	\$25.722





El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**FICHA TRIMESTRAL  
PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA**

PÁGINA: 15 de 15

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Deporte y Recreación	Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca	En Ejecución	\$4.692	\$34.000	\$34.000	\$38.692
Deporte y Recreación	Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	En Ejecución	\$0	\$20.000	\$20.000	\$20.000
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	En Ejecución	\$387	\$5.723	\$5.723	\$6.110
Transporte	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$83.380	\$83.380	\$83.380
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	En Ejecución	\$367	\$1.500	\$1.500	\$1.867
<b>Total, general</b>			<b>\$20.660</b>	<b>\$219.968</b>	<b>\$219.968</b>	<b>\$240.628</b>

Millones de \$ COP
