



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
22/04/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/03/2022

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.

**Líneas Temáticas:**

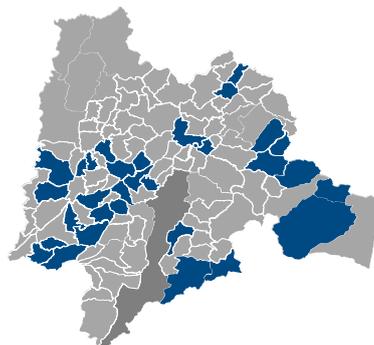
- Infraestructura para la integración social
- Gestión ambiental y saneamiento básico

**TEMAS ESTRATÉGICOS**

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue aprobado en la sesión No. 1 del Consejo Directivo del Pacto Cundinamarca, realizado el 30 de julio de 2021. En este PEI se priorizaron un total de 53 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto con un valor indicativo de \$536.820.997.439, de los cuales \$518.598.380.421 son aporte indicativo de la Nación y \$18.222.617.017 del territorio.

## ➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Cundinamarca generaría cerca de 7.515 empleos directos y 11.771 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 1.3 millones habitantes del área de influencia del Pacto Cundinamarca.

**Área de Intervención: Cundinamarca****Departamento:**

**Cundinamarca** Municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Cajicá, Caquezá, Chía, Chipaque, Chocontá, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Fomeque, Funza, Fúquene, Gachetá, Girardot, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Paime, Pulí, Quetame, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Subachoque, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Viotá y Zipaquirá.

<b>Fecha de suscripción:</b>	19/02/2021
<b>Fecha de terminación:</b>	19/02/2024
<b>Plazo:</b>	3 años

**Valor indicativo (Millones)**

<b>Total (%)</b>	\$536.821 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$518.598 (97%)
<b>Territorio y otros (%)</b>	\$18.223 (3%)

**Avance financiero (Millones)**

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$ 197.096 (36,7%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$ 176.984
<b>Compromiso Territorio</b>	\$20.112

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$ 197.096 (17 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$ 0 (0 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Ubalá	En Gestión	\$0	A la fecha no cuenta con viabilidad técnica del DPS. Municipio presentó subsanaciones al DPS el 17 de marzo y se encuentran en revisión.
Adecuación de la plaza de mercado del casco urbano del municipio de Viotá, Cundinamarca	En Gestión	\$0	A la fecha no cuenta con viabilidad técnica del DPS. Municipio presentó subsanaciones al DPS el 17 de marzo y se encuentran en revisión.
Adecuación del centro agroempresarial del municipio de San Juan de Rioseco, Cundinamarca	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$1.217 millones y cuenta con viabilidad condicionada del DPS. Municipio avanza con los ajustes al componente técnico del proyecto, que se espera sea entregado antes del 31 de marzo al DPS.
Adecuación plaza de mercado - central de abastos de Tequendama, Fase 1, del municipio de La Mesa	En Ejecución	\$3.167	se suscribió el convenio interadministrativo N°742 entre ICCU y municipio de La Mesa, por valor de \$3.167 millones. Proyecto financiado 100% con recursos de la Gobernación de Cundinamarca
Adecuación plaza de mercado Villa de la Sal del municipio de Zipaquirá	En Ejecución	\$851	se suscribió el convenio interadministrativo N°754 entre ICCU y municipio de Zipaquirá, por valor de \$851 millones. Proyecto financiado 100% con recursos de la Gobernación de Cundinamarca
Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$2.481	se suscribió el contrato específico N°2210748 entre ENTerritorio y el municipio de Gachetá, el 2 de febrero de 2022, por valor de \$2.480 millones. El 30 de diciembre de 2021 se aprobaron las garantías del contrato. El municipio avanza con la elaboración de estudios previos para iniciar proceso de contratación derivada. El 28 de febrero se realizó el primer comité operativo y de seguimiento del contrato.
Adecuación y mejoramiento plaza de mercado municipio de Choconta	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$2.000 millones. El MADR emitió pronunciamiento técnico el 2 de marzo y fue socializado al municipio el 4 de marzo. Se establece como compromiso por parte de la entidad territorial subsanar las observaciones antes del 25 de marzo.
Construcción centro de recibo y alistamiento de productos agropecuarios en el municipio de Sasaima	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$1.673 millones. A la fecha no cuenta con viabilidad técnica del DPS. Municipio presentó ajustes al proyecto y en la revisión se evidenció que persisten observaciones que están siendo atendidas por el municipio y se espera que las mismas sean presentadas antes del 31 de marzo a DPS.
Construcción de equipamiento urbano plaza de mercado municipio de Medina	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$1.530 millones, actualmente está en revisión y ajuste debido a que, de acuerdo con lo informado por el DPS, este proyecto no cuenta con la pertinencia social requerida



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			para emitir la viabilidad técnica. DPS realizará nueva visita al municipio el 24 y 25 de marzo.
Construcción de la edificación de la mujer tejedora cabeza de hogar del municipio de Chipaque	En Ejecución	\$1.464	se suscribió el convenio interadministrativo N°906 entre ICCU y municipio de Chipaque, por valor de \$1.463 millones. Proyecto financiado 100% con recursos de la Gobernación de Cundinamarca.
Construcción de la planta procesadora de Sagú en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$2.352 millones. No se cumplió el compromiso del municipio de enviar las subsanaciones a las observaciones realizadas por MADR. Se espera municipio culmine ajustes antes del 31 de marzo.
Construcción de la plaza de ferias ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$1.368 millones y cuenta con viabilidad del DPS. Se verificaron requisitos del FRPT y está pendiente la firma del contrato específico con ENTerritorio una vez se culmine el periodo de ley de garantías.
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabal de Siquima	En Ejecución	\$1.484	se suscribió el convenio interadministrativo N°660 entre ICCU y el municipio de Guayabal de Siquima, por valor de \$1.484 millones. Proyecto financiado 100% con recursos de la Gobernación de Cundinamarca
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guayabeta, Cundinamarca	En Gestión	\$0	: el proyecto tiene una inversión de \$3.759 millones. Proyecto alcanzó viabilidad del DPS en el mes de marzo. Municipio avanza con la consolidación de requisitos del FRPT para presentar proyecto antes del 31 de marzo.
Construcción de la plaza de mercado ubicada en la zona urbana del municipio de Manta	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$1.411 millones y cuenta con viabilidad condicionada del DPS. Municipio avanza con las subsanaciones solicitadas por DPS. Se espera que sean entregadas antes del 31 de marzo.
Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$1.093	se suscribió el contrato específico N°2210746 entre ENTerritorio y el municipio de Chipaque, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$1.093 millones. El 30 de diciembre de 2021 se aprobaron las garantías del contrato. El municipio adjudicó el proceso de obra LP-2021-016 quedando adjudicado el 22 de marzo y avanza con el proceso de contratación de interventoría con fecha estimada de adjudicación 8 de abril
Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca	En Ejecución	\$1.705	se suscribió el contrato específico N°2210728 entre ENTerritorio y el municipio de Gutiérrez, el 10 de noviembre de 2021, por valor de \$1.704 millones. El 30 de diciembre de 2021 se aprobaron las garantías del contrato. El municipio suscribió contrato de obra e interventoría, dando inicio a las obras programadas



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Construcción plaza comercial municipio de Nilo, sector vía Panamericana	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$3.723 millones. A la fecha no cuenta con viabilidad técnica del DPS. Municipio presentó a DPS ajustes al proyecto y en la revisión se evidenció que persisten observaciones que están siendo atendidas por el municipio y se espera que las mismas sean presentadas antes del 31 de marzo a DPS.
Construcción plaza de mercado municipio de Madrid	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$6.320 millones. A la fecha no cuenta con viabilidad técnica del DPS. Municipio no ha presentado los ajustes al DPS, que se había comprometido para el 21 de marzo.
Construcción plaza de mercado municipio de Ricaurte	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$4.945 millones y cuenta con viabilidad del DPS. Se verificaron requisitos del FRPT y está pendiente por parte de la Gobernación de Cundinamarca el certificado de compromiso de cofinanciación por \$2.500 millones, para culminar cumplimiento de requisitos del FRPT.
Construcción plaza de mercado y centro de acopio agroindustrial en el municipio de Machetá	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$6.082 millones y cuenta con viabilidad del DPS. Se verificaron requisitos del FRPT y está pendiente por parte de la Gobernación de Cundinamarca el certificado de compromiso de cofinanciación por \$2.500 millones, para culminar cumplimiento de requisitos del FRPT.
Construcción plaza de mercado y plazoleta gastronómica de la cocina campesina del municipio de Bojacá, Cundinamarca	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$6.584 millones y cuenta con viabilidad condicionada del DPS. Municipio e ICCU avanzan con ajustes al componente arquitectónico del proyecto, que se espera sea entregado antes del 25 de marzo al DPS.
Construcción y dotación de la plaza de mercado en el Municipio de El Rosal	En Gestión	\$0	: el proyecto tiene una inversión estimada de \$3.212 millones. Dado que no había certeza de la financiación del DPS a este proyecto, la Gobernación de Cundinamarca, en reunión del 17 de febrero con ENTerritorio, se comprometió a garantizar el cierre financiero necesario para la ejecución del proyecto.
Construcción y dotación del centro de acopio en el Municipio de El Rosal	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$1.046 millones y cuenta con viabilidad del DPS. Se verificaron requisitos del FRPT y está pendiente la firma del contrato específico con ENTerritorio una vez se culmine el periodo de ley de garantías.
Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - centro funcional Quetame	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$25.847 millones. No se cumplió el compromiso del municipio de enviar las subsanaiones a las observaciones realizadas por MADR. Se espera municipio culmine ajustes antes del 31 de marzo.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial - Fόμεque	En Gestión	\$0	: el proyecto tiene una inversión estimada de \$13.761 millones. No se cumplió el compromiso del municipio de enviar las subsanaciones a las observaciones realizadas por MADR. Se espera municipio culmine ajustes antes del 31 de marzo
Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial Subachoque	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$10.601 millones. A la fecha no cuenta con viabilidad técnica del DPS. Municipio presentó ajustes al proyecto y en la revisión se evidenció que persisten observaciones del componente arquitectónico que están siendo atendidas por el municipio. Se han realizado mesas de trabajo para concertar la planta arquitectónica y se espera que esta sea validada antes del 31 de marzo.
Construcción y mejoramiento de centros de acopio Agroindustrial; II etapa, Chipaque	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$2.195 millones. No se cumplió el compromiso del municipio de enviar las subsanaciones a las observaciones realizadas por MADR. Se espera municipio culmine ajustes antes del 31 de marzo.
Construcción, rehabilitación y mantenimiento plaza de mercado municipio de Apulo, Cundinamarca	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$3.255 millones. A la fecha no cuenta con viabilidad técnica del DPS. Municipio presentó subsanaciones al DPS el 18 de marzo y fue devuelto porque persisten observaciones. Se espera la entrega del proyecto antes del 25 de marzo al DPS.
Mejoramiento de infraestructura de la plaza de mercado del municipio de El Colegio, Cundinamarca	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$10.198 millones y cuenta con viabilidad condicionada del DPS. En reunión con DPS se validó el ajuste al componente arquitectónico y el municipio se comprometió a entregar al DPS los ajustes de los demás componentes técnicos antes del 31 de marzo.
Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	En Ejecución	\$1.603	se suscribió el contrato específico N°2210753 entre ENTerritorio y el municipio de Bituima, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$1.603 millones. El 1 de diciembre de 2021 se aprobaron las garantías del contrato. El municipio avanza con el proceso de contratación LP-001-2022 con fecha estimada de adjudicación el 9 de abril de 2022.
Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado del casco urbano, municipio de San Antonio del Tequendama	En Ejecución	\$537	se suscribió el convenio interadministrativo N°731 entre ICCU y municipio de San Antoni, por valor de \$536 millones. Proyecto financiado 100% con recursos de la Gobernación de Cundinamarca
Reconstrucción de la plaza de mercado del municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca	En Gestión	\$0	: el proyecto tiene una inversión estimada de \$10.210 millones. A la fecha no cuenta con viabilidad técnica del DPS. Municipio presentó subsanaciones al DPS el 17 de marzo y se encuentran en revisión.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Reestructuración plaza de mercado del el Paisaje, centro multifuncional de comercialización de productos y servicios del municipio de Pulí	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$2.949 millones, a la fecha no cuenta con viabilidad técnica del DPS. Municipio presentó subsanaciones al DPS el 16 de marzo y se encuentran en revisión.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras biomecánicas Ubaque	En Gestión	\$0	Proyecto viabilizado por parte de la UNGRD por un valor de \$28.593 millones. Se verificaron requisitos del FRPT y está pendiente la firma del contrato específico con ENTerritorio una vez se culmine el periodo de ley de garantías.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación de riesgo Paimé	En Gestión	\$0	proyecto con viabilidad de la UNGRD por \$3.978 millones. Está pendiente por parte del municipio presentar las subsanaciones a la ficha de verificación del FRPT emitida en el mes de diciembre 2021.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras mitigación riesgo Cáqueza	En Gestión	\$0	: Proyecto viabilizado por parte de la UNGRD por un valor de \$10.245 millones. Se verificaron requisitos del FRPT y está pendiente la firma del contrato específico con ENTerritorio una vez se culmine el periodo de ley de garantías.
Construcción de la primera etapa del auditorio cultural, Gachetá	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$5.736 millones. En espera respuesta de CODENSA sobre el certificado de disponibilidad del servicio de energía al proyecto para subsanar los requisitos de la fase 1 del proceso de viabilidad ante Mincultura.
Adecuación y remodelación estadio municipal Ubaté	En Ejecución	\$7.455	se suscribió el contrato específico N°2210729 entre ENTerritorio y el municipio de Ubaté, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$7.455 millones. El 7 de marzo se aprobaron las garantías del contrato. El municipio avanza con el proceso de contratación LP-005-2022 con fecha estimada de adjudicación el 19 de abril de 2022.
Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	En Ejecución	\$21.408	Se suscribió el contrato específico N°2210732 entre ENTerritorio, ICCU y el municipio de Zipaquirá, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$21.407 millones. El 16 de febrero se aprobaron las garantías del contrato. El municipio presentó a ENTerritorio solicitud de ajuste de presupuesto dado que existen ítems con precios que deben ser ajustados
Construcción del centro de práctica deportiva BMX en la vereda La Balsa, sector Delicias Sur del municipio de Chía, Cundinamarca	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$12.811 millones. El proyecto fue devuelto con observaciones por parte del Ministerio y se encuentra en proceso de ajuste por la entidad territorial
Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca	En Ejecución	\$38.692	se suscribió el contrato específico N°2210731 entre ENTerritorio, ICCU y el municipio de Funza, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$38.692 millones. En febrero de 2022 el municipio inició un proceso de mínima cuantía para la selección



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			de la entidad aseguradora, sin embargo, el 18 de marzo de 2022 se declaró desierto el proceso. Por tanto, el municipio avanza con la elaboración de estudios previos para la publicación de un proceso de selección abreviada que tiene un plazo estimado de 30 días.
Construcción, mejoramiento y adecuación del polideportivo con cubierta en estructura metálica en la cancha del barrio La Esmeralda II, municipio de Girardot, Cundinamarca	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$2.206 millones. El proyecto fue devuelto con observaciones por parte del Ministerio y se encuentra en proceso de ajuste por la entidad territorial
Mejoramiento de los polideportivos de los barrios La Magnolia, Escallón, Villa María y San Luis de la zona urbana del municipio de Madrid, Cundinamarca	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$4.418 millones. Se informa por parte de la Gobernación que los polideportivos La Magnolia, Escallón y San Luis fueron financiados en noviembre de 2021. Por parte del municipio, el 21 de marzo, se radicó el proyecto del polideportivo del barrio Villa María para viabilidad ante Mindeporte.
Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jersusalén, Cundinamarca	En Ejecución	\$4.185	se suscribió el contrato específico N°2210956 entre ENTerritorio y el municipio de Tocancipá, el 29 de diciembre de 2021, por valor de \$4.185 millones. El 23 de febrero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El municipio avanza con el proceso de contratación AJ- LP – N°002 de 2022 con fecha estimada de adjudicación el 19 de abril de 2022.
Mejoramiento del parque recreo-deportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	En Ejecución	\$20.000	se suscribió el contrato específico N°2210741 entre ENTerritorio y el municipio de Tocancipá, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$20.000 millones. El 12 de enero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato.
Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	En Ejecución	\$5.723	Se suscribió el contrato específico N°2210738 entre ENTerritorio y el municipio de Cajicá, el 11 de noviembre de 2021, por valor de \$5.722 millones. El 2 de marzo de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El 9 de marzo de 2022 se realizó el primer comité operativo y de seguimiento del contrato específico entre Alcaldía, ENTerritorio y DNP. El 24 de marzo la Alcaldía presentó a ENTerritorio solicitud de ajuste de precios del presupuesto del proyecto la cual está en revisión por el área técnica de esta entidad,
Construcción del centro de desarrollo local municipio de Madrid	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$8.270 millones. Se encuentra en proceso de estructuración por parte del municipio y está pendiente la presentación al sector para obtener concepto de viabilidad sectorial.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Remodelación parque principal municipio de Chocontá	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión estimada de \$2.000 millones. El Municipio presentó el 9 de marzo proyecto subsanado al MinVivienda y se encuentra en revisión.
Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$83.380	se suscribió el contrato específico N°2210754 entre ENTerritorio y el ICCU, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$83.380 millones. El 23 de marzo a través del proceso de selección abreviada de menor cuantía N°ICCU-MC-004 de 2022, se adjudicó el proceso a la aseguradora Solidaria para expedir las garantías que permitan dar perfeccionamiento al contrato específico
Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	En Ejecución	\$1.867	se suscribió el contrato específico N°2210751 entre ENTerritorio y el municipio de Chocontá, el 12 de noviembre de 2021, por valor de \$1.867 millones. El 16 de febrero de 2022 se aprobaron las garantías del contrato. El municipio avanza con el proceso de contratación LP-07-2021 con fecha estimada de adjudicación el 23 de mayo de 2022.
Optimización planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR sector Santa Marta, municipio de Facatativá	En Gestión	\$0	el FRPT generó ficha de revisión del proyecto en la cual no se logra cumplimiento de ningún requisito, debido a que se requiere que la actualización de diseños sea realizada por un equipo de consultores que cumplan con los requisitos de normatividad exigidos por el Sector y NTC. El Gobernador de Cundinamarca en reunión con ENTerritorio el 17 de febrero, solicitó que este proyecto sea retirado del Pacto, dadas las dificultades en su estructuración. Esta solicitud será expuesta en sesión de Consejo Directivo.

## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Agricultura y Desarrollo Rural	34	-	9	25
Ambiente y Desarrollo Sostenible	4	-	-	4
Cultura	1	-	-	1
Deporte y Recreación	8	-	5	3
Inclusión Social y Reconciliación	1	-	1	-
Planeación	2	-	-	2
Transporte	2	-	2	-
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	1	-	-	1
<b>Total, general</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>36</b>



## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

## 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$147.951	\$7.123	5%	\$140.829	95%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$69.600	\$0	0%	\$69.600	100%
Cultura	\$5.736	\$0	0%	\$5.736	100%
Deporte y Recreación	\$111.363	\$11.100	10%	\$100.263	90%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.352	\$0	0%	\$6.352	100%
planeación	\$10.270	\$0	0%	\$10.270	100%
Transporte	\$84.880	\$0	0%	\$84.880	100%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$100.668	\$0	0%	\$100.668	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$536.821</b>	<b>\$18.223</b>	<b>3%</b>	<b>\$518.598</b>	<b>97%</b>

## 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2022

36,7%

## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2021 – 2024  
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Agricultura y Desarrollo Rural	\$147.951	\$5.740	4%	\$14.385	10%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$69.600	\$0	0%	\$0	0%
Cultura	\$5.736	\$0	0%	\$0	0%
Deporte y Recreación	\$111.363	\$80.641	72%	\$91.741	82%
Inclusión Social y Reconciliación	\$6.352	\$5.723	90%	\$5.723	90%
Planeación	\$10.270	\$0	0%	\$0	0%
Transporte	\$84.880	\$84.880	100%	\$85.248	100%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$100.668	\$0	0%	\$0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$536.821</b>	<b>\$176.984</b>	<b>33%</b>	<b>\$197.096</b>	<b>36,7%</b>



### 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

#### 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP

N/A\*

#### 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

N/A\*

#### 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

N/A\*

\*Nota: A la fecha la batería de indicadores para el presente Pacto Territorial se encuentra en construcción, la cual una vez sea avalada y aprobada por parte del Grupo Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, se procederá a cargar en el aplicativo SINERGIA del DNP.



## 4. ANEXOS

## Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 12 proyectos cofinanciados en estado en ejecución, por valor de \$ 176.984 millones, equivalente al 33% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Agricultura y Desarrollo Rural	Adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martínez del municipio de Gachetá, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$2.481	\$2.481	\$2.481
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio en la vereda Cerezos Grandes municipio de Chipaque, Cundinamarca	En Ejecución	\$212	\$882	\$882	\$1.093
Agricultura y Desarrollo Rural	Construcción de un centro de acopio para el sector campesino del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca	En Ejecución	\$568	\$1.137	\$1.137	\$1.705
Agricultura y Desarrollo Rural	Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada en el centro poblado de la Sierra del municipio de Bituima, Cundinamarca	En Ejecución	\$362	\$1.242	\$1.242	\$1.603
Deporte y Recreación	Adecuación y remodelación estadio municipal Ubate	En Ejecución	\$0	\$7.455	\$7.455	\$7.455
Deporte y Recreación	Construcción de la 2 etapa del estadio municipal Héctor "El Zipa" González en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca	En Ejecución	\$6.408	\$15.000	\$15.000	\$21.408
Deporte y Recreación	Construcción del nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio de Funza, Cundinamarca	En Ejecución	\$4.692	\$34.000	\$34.000	\$38.692
Deporte y Recreación	Mejoramiento del escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del municipio de Jerusalén, Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$4.185	\$4.185	\$4.185
Deporte y Recreación	Mejoramiento del parque recreodeportivo Los Patos del municipio de Tocancipá	En Ejecución	\$0	\$20.000	\$20.000	\$20.000
Inclusión Social y Reconciliación	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la vereda Chuntame, sector Los Pinos del municipio de Cajicá	En Ejecución	\$0	\$5.723	\$5.723	\$5.723
Transporte	Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca	En Ejecución	\$0	\$83.380	\$83.380	\$83.380
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación vías Urbanas Chocontá	En Ejecución	\$367	\$1.500	\$1.500	\$1.867
<b>Total, general</b>			<b>\$12.609</b>	<b>\$176.984</b>	<b>\$176.984</b>	<b>\$189.593</b>

Millones de \$ COP
