



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año
18/04/2022

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año
31/03/2022

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto: Articular entre la Nación y los departamentos afines a la conmemoración del Bicentenario, las políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de los proyectos, conforme a las necesidades de los territorios, con el fin de promover la competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo social y económico de la región.

Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora.
- Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora.


TEMAS ESTRATEGICOS

El Plan Estratégico de Inversiones – PEI fue aprobado en la sesión No. 1 del Consejo Directivo del Pacto Bicentenario, realizado el 24 de noviembre de 2020 y ajustado en la sesión No. 3 del 16 de diciembre de 2021. En el ajuste del PEI se priorizaron un total de 71 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto Bicentenario con un valor indicativo de \$3.654.888.499.162, de los cuales \$2.446.679.535.660 son aportes de la Nación y \$1.208.208.963.502 aportes del territorio aproximadamente.

➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Bicentenario generaría cerca de 52.089 empleos directos y 89.227 indirectos.

Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 3.1 millones habitantes del área de influencia del Pacto Bicentenario

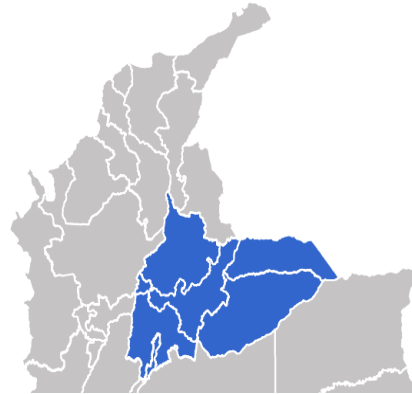Área de Intervención: Pacto Bicentenario**Departamentos:**

Arauca
Boyacá
Casanare
Cundinamarca
Santander

Fecha de Suscripción:	26/06/2019
Fecha de terminación:	26/06/2029
Plazo:	10 años

Valor indicativo (Millones)

Total (%)	\$3.654.888 (100%)
Nación (%)	\$2.446.680 (67%)
Territorio y otros (%)	\$1.208.209 (33%)

Avance financiero (Millones)

Compromiso recursos al cierre (%)	\$2.268.583 (62,1%)
Compromiso Nación	\$2.251.658
Compromiso Territorio	\$16.925

Proyectos en ejecución	\$2.253.355 (11 proyectos)
Proyectos ejecutados	\$15.228 (16 proyectos)

**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO**

Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Becas para diplomado en Agroturismo.	Ejecutado	\$48	proyecto ejecutado por valor de \$48 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%. Este proyecto se encuentra terminado.
Casona de San Gil fase I	En Gestión	\$0	proyecto en estructuración por parte del Viceministerio de Turismo con un valor indicativo de \$10.425 millones, financiado con recursos del MinCIT. Se modificó el alcance de este proyecto y se propuso descartar la fase 2. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2022
Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario	Ejecutado	\$500	proyecto ejecutado por valor de \$500 millones para la conmemoración del 16 de julio, mediante la entrega de 14 constituciones de Cundinamarca con el fin de generar guiones turísticos interpretativos referentes al bicentenario. La ejecución de este proyecto fue la oportunidad para el departamento de conmemorar el hecho histórico, pero a su vez fomentar y generar una reflexión frente a la historia y la conciencia de patria, con el propósito de difundirla y promover el fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa y el sentido de pertenencia. Este proyecto se encuentra terminado.
Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.	Ejecutado	\$1.646	acta inicio FNTC174-2017, Convenio 174 –2017, Informe de supervisión No. 13 Otro sí. No 1, por valor de \$1.647 millones, financiados por el Nación con recursos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para la construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame. El proyecto se encuentra terminado.
Construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca	Ejecutado	\$8.020	el 14 de noviembre de 2018 se suscribió contrato de obra pública No. 008-03-2018 entre el municipio de Puerto Rondón y el Consorcio Malecón Rondón 2018, por valor de \$7.928 millones, financiados por el territorio a través del SGR, para las obras de construcción del malecón del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca. El proyecto se encuentra terminado.
Construcción del parque principal y emblemático del municipio de Vélez, Santander	En Ejecución	\$5.540	proyecto en ejecución por valor de \$5.540 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Santander a través del SGR. Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 22.7% y un avance de obra del 20%.
Construcción del parque temático lineal alusivo a la Batalla de Pienta.	En Ejecución	\$12.826	proyecto en ejecución. Se realizó adición al contrato a finales de 2021, adición de \$616.413 millones, sin embargo quedó aprobado por acta \$594.612 millones.
Construcción parques temáticos de La Ruta Libertadora (Pore - Nunchía - Tamara - Paz de Ariporo - Hato Corozal)	En Gestión	\$0	proyecto en estructuración con valor indicativo de \$3.675 millones, financiado con recursos SGR. Actualmente se está realizando revisión del tema predial y topografía. Así mismo, se está realizando una articulación con el Ministerio de Cultura en el que se definió un plan de trabajo, con el fin de lograr la viabilidad técnica del proyecto. Esta iniciativa estará incluida en el Plan de Acción 2022.
Desarrollo de aplicativo TIC para la promoción turística de las rutas de Santander	En Gestión	\$0	proyecto en estructuración a cargo del territorio con un valor indicativo de \$251 millones, cofinanciado con recursos de la Gobernación de Santander y el MinCIT. Esta iniciativa estará incluida en el Plan de Acción 2022.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Elaboración del inventario turístico de los 30 municipios que hacen parte del Pacto Bicentenario	En Ejecución	\$307	proyecto con una inversión indicativa de \$307 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance de ejecución del 80%.
Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario	Ejecutado	\$184	proyecto ejecutado por valor de \$184 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%. El proyecto se encuentra terminado.
Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos.	Ejecutado	\$141	proyecto ejecutado por valor de \$141 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%. Este proyecto se encuentra terminado.
Estudios y diseños para la construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca.	Ejecutado	\$316	el 31 de diciembre de 2018 se suscribió contrato de consultoría No. 713 de 2018 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Miradores, por valor de \$297 millones, financiados por el territorio con recursos propios, para el diseño de tres miradores, para Tame, Saravena y otro sobre el río Arauca en el municipio de Arauquita. El proyecto se encuentra terminado.
Estudios y diseños primera fase del complejo educativo, patrimonial y turístico "Parque de la vida para construir la paz en el municipio de Saravena"	Ejecutado	\$350	el 31 de diciembre de 2018 se suscribió contrato de consultoría No. 687 de 2018 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Diseños para la Paz por valor de \$350 millones, financiados por el territorio con recursos propios, para el diseño de tres miradores, para Tame, Saravena y otro sobre el río Arauca en el municipio de Arauquita. El proyecto se encuentra terminado.
Fortalecimiento del producto turístico de biciturismo en municipios del bicentenario	En Gestión	\$0	proyecto en estructuración con valor indicativo de \$200 millones, cofinanciado con recursos del territorio y el MinCIT. El proyecto está siendo estructurado por el Viceministerio de Turismo y la Gobernación de Cundinamarca. Esta iniciativa estará incluida en el Plan de Acción 2022.
Gestión para el fortalecimiento de las conexiones de conectividad terrestre a sitios de interés turístico y a atractivos (mejoramientos y construcción de infraestructura en miradores)	En Gestión	\$0	: proyecto en estructuración con valor indicativo de \$2.940 millones. Actualmente se está realizando revisión la armonización entre el Plan de Manejo Ambiental del área a intervenir y el componente ambiental del proyecto. Se modificó el ingreso al Parque debido a problemas de gestión predial con el lote de ingreso del primer diseño, el ajuste prevé el ingreso por San Miguel de Farallones, por tal razón se está revisando el PMA y el POMCA (Rio Cusiana) para identificar si se puede intervenir la zona y que permisos se deben tramitar. Esta iniciativa estará incluida en el Plan de Acción 2022.



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander	Ejecutado	\$946	proyecto ejecutado por valor de \$946 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Santander. Con este proyecto se logró mejorar y adecuar 2286 metros cuadrados del centro poblado de Guane, y con esto aumentar la afluencia de turistas hacia el municipio de Barichara. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%.
Proceso para la certificación y mantenimiento de la certificación como destino turístico sostenible bajo la NTS TS 001-1, del municipio de Socorro, Santander.	En Ejecución	\$50	proyecto ejecutado por valor de \$50 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100%. En la actualidad el proyecto se encuentra en subsanación de observaciones del informe final.
Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional	Ejecutado	\$1.150	proyecto ejecutado por valor de \$1.150 millones, financiado con recursos del MinCIT. Actualmente el proyecto presenta un avance físico y financiero del 100. Esta iniciativa se encuentra terminada.
Revitalización Puente del Común	Ejecutado	\$1.415	proyecto ejecutado por valor de \$1.415 millones, financiado con recursos de la Gobernación de Cundinamarca. Este puente es considerado una emblemática obra que dejó la ingeniería civil en el Virreinato, su construcción data de finales del siglo XVIII, característico por su ubicación estratégica, fue paso indispensable de comercio entre regiones. Este proyecto se encuentra terminado.
Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame.	En Gestión	\$0	el proyecto se encuentra en estructuración por parte del territorio y se están realizando los ajustes a las observaciones emitidas por el FONTUR. El alcance de esta segunda fase corresponde a las obras con las que se planea terminar los senderos peatonales que se encuentran en sub-base correspondientes a 1.600 metros lineales y la inclusión de torre de avistamiento de aves. Este proyecto será incluido en el Plan de Acción 2022.
Señalización turística peatonal para el municipio de Paipa.	Ejecutado	\$70	el 15 de enero de 2021 inició la ejecución del proyecto mediante el contrato FNTC-0308-2020 por valor de \$70 millones, financiado con recursos del MinCIT. A la fecha el contrato se reinició después de subsanar inconsistencias presentadas en la estructuración del proyecto. El proyecto se encuentra terminado.
BTS: Tibasosa - Sogamoso	En Gestión	\$0	el proyecto tiene una inversión indicativa de \$110.000 millones, el Ministerio de Transporte informó que este corredor será estructurado una vez la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI revierta el tramo Duitama – Tibasosa – Sogamoso al INVÍAS, corredor que está incluido en la concesión Briceño – Tunja - Sogamoso.
Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena	En Ejecución	\$390.934	el proyecto tiene una inversión indicativa de \$600.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVÍAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue julio de 2021 y la fecha de terminación está pactada para el 30 de diciembre de 2030. Se han atendido 4 emergencias en el corredor y se están



Proyecto	Estado Proyecto	Valor Total Proyecto	Bullet
			realizando mantenimientos entre el PR105 y el PR114 y entre el PR84 y el PR88.
Duitama – Charalá - San Gil	En Ejecución	\$349.800	el proyecto tiene una inversión indicativa de \$500.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue 29 de junio de 2021 y la fecha de terminación está pactada para el 30 de diciembre de 2030. Se está realizando el mantenimiento entre el PR22 al PR47 y parcheo técnico entre el PR0 y el PR7+900.
Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo	En Ejecución	\$364.200	: el proyecto tiene una inversión indicativa de \$520.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue julio de 2021 y su fecha de terminación está pactada para el 30 de diciembre de 2030. Se está realizado la conformación de calzada desde el PR46 al PR79 y el parcheo técnico del PR0 al PR4.
Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul)	En Ejecución	\$115.790	el proyecto tiene una inversión indicativa de \$100.000 millones en el marco del programa 'Concluir y concluir para la reactivación de las regiones'. La contratación de la obra está a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso fue realizada el 22 de diciembre de 2020, y la firma del contrato el día 28 de diciembre de 2020. la fecha de inicio fue el 21 de julio de 2021 y su fecha de terminación está pactada para el 30 de diciembre de 2030. Se está realizando el mantenimiento a la totalidad del corredor.
Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá	En Ejecución	\$434.000	el proyecto tiene una inversión indicativa de \$620.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue 25 de junio de 2021 y su fecha de terminación está pactada para el 31 de agosto de 2029. Se está realizando la conformación y/o explicaciones en 44,72 km, el mantenimiento de zona en afirmado en 38 km y reparcho a 2 km.
Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal	En Ejecución	\$161.000	el proyecto tiene una inversión indicativa de \$230.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue el 14 de julio de 2021 y su fecha de terminación está pactada para el 31 de agosto de 2030. Se está realizando el mantenimiento a 52 km para dejarlo totalmente transitable y se están realizando explanaciones a 0,5 km en el tramo 2.
Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa	En Ejecución	\$525.000	el proyecto tiene una inversión indicativa de \$750.000 millones en el marco del programa 'Vías para la Legalidad'. La contratación de la obra estuvo a cargo del INVIAS y la adjudicación del proceso de licitación se realizó 31 de marzo de 2021, la fecha de inicio fue el 21 de junio de 2021 y su fecha de terminación está pactada para el 30 de agosto de 2030.

Millones de \$COP



SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos Gestión
Comercio Industria y Turismo	63	16	4	43
Transporte	8	-	7	1
Total, general	71	16	11	44

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO TERRITORIAL

2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Aporte (Territorio y Otros)	%	Aporte (Nación)	%
Comercio Industria y Turismo	\$224.888	\$159.209	71%	\$65.680	29%
Transporte	\$3.430.000	\$1.049.000	31%	\$2.381.000	69%
TOTAL	\$3.654.888	\$1.208.209	33%	\$2.446.680	67%

2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A MARZO DE 2022

62,1%

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Total, Ejecución 2019 – 2029
(Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Comercio Industria y Turismo	\$224.888	\$0	0%	\$33.601	15%
Transporte	\$3.430.000	\$0	0%	\$2.234.982	65%
TOTAL	\$3.654.888	\$0	0%	\$2.268.583	62,1%



3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2019-2029)

%Avance 0,00%



% Avance Acumulado 55,39%



Fecha de corte: 31 de marzo de 2022


*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora % Avance: 0,00% % Avance Acumulado: 0,00%

- Transporte % Avance: - % % Avance Acumulado: 0,00%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo	Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo	Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bicentenario	510,93	-	665,93	-	Gris	886,93	510,93	0,00%	Rojo	



Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora % Avance: 00,00% % Avance Acumulado: 66,47%

- Comercio, industria y turismo % Avance: 00,00% % Avance Acumulado: 66,47%



Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acum-lada	Avance Acu-mulado	% Avance Acu-mulado	Semáforo		Fecha Corte
Personas beneficiadas en procesos de asistencia, capacitación y formación en turismo en el marco del Pacto Bicentenario	0	58	-	-		Gris	1.060,0	555	52,35%		Rojo	31/03/2022
Infraestructura histórica, turística o cultural intervenida en el marco del Pacto Bicentenario	15	-	1	-		Gris	5	4	80,00%		Amari- llo	
Empresas beneficiadas con proyectos de fortalecimiento de la competitividad de la actividad turística en el marco del Pacto Bicentenario		547	-	-		Gris	103	547	100%		Verde	31/03/2022
Proyectos para la planificación turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario		0	1	00,00%		Rojo	5	3	60,00%		Na- ranja	31/03/2022
Proyectos para la promoción turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario	15	0	2	00,00%		Rojo	5	2	40,00%		Rojo	31/03/2022



SEMÁFORO



<60%

≥80%

3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
Vías intervenidas en el marco del Pacto Bicentenario	A 31 de marzo de 2022. Informe suministrado por Instituto Nacional de Vías INVIAS, Gobernación de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Casanare y Arauca. Se encuentran en ejecución: Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena: contrato de obra No. 988 - 2021 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063 del 1 de julio de 2021 por valor de \$362.133 millones, contrato de interventoría No. 1013-2021 CONSORCIO HMV-WSP 188 del 1 de julio por valor \$28.800 millones; Duitama – Charalá - San Gil; Contrato de obra No. 987-2020 - CONSORCIO PCT SAN BOY del 29 de junio por valor de \$310.625 millones, interventoría Contrato 1015 - 2021 consorcio REACTIVACIONES 2021 por \$27.600 millones. Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo; Cto de obra 978-2021 - CONSORCIO VIAS por \$ del 23 de junio por \$322.790 millones, interventoría 962-2021 CONSORCIO ECOVISION 188 por \$30.000 millones, Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul): contrato de obra No. 1858-2020 CONSORCIO MHC 056 del 19 de marzo por valor de \$109.590 millones, interventoría: 1860-2020 CONSORCIO TERRA CGS del 19 de marzo por valor de \$6.200 millones; Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá; Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal; Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa contrato de obra 973-2021 CONSORCIO GROSUD del 25 de junio por valor \$35.887 millones e interventoría Contrato 1015 - 2021 consorcio REACTIVACIONES 2021 del 29 de junio por \$27.600 millones . Se encuentra en gestión: BTS: Tibasosa - Sogamoso

Fortalecimiento de la competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora

- Comercio, industria y turismo

Indicador	Avance Cualitativo
Personas beneficiadas en procesos de asistencia, capacitación y formación en turismo en el marco del Pacto Bicentenario	A 31 de marzo de 2022. Avance total: 555 personas. Descripción del avance: a la fecha se registra avance de las personas beneficiadas en el proyecto Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento empresarial, temáticas, este proyecto modificado por el proyecto Programa de formación exportadora el cual se encuentra ejecutado un total de : 478 beneficiarios, el proyecto Becas para diplomado en Agroturismo, ejecutado total: 77 Beneficiarios. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
Infraestructura histórica, turística o cultural intervenida en el marco del Pacto Bicentenario	A marzo 31 de 2022. Avance: 4 infraestructuras. Descripción del avance: Los proyectos ejecutados son: Construcción de senderos para el avistamiento de aves, para la implementación del turismo en el Bioparque del municipio de Tame. Construcción del Malecón del municipio de Puerto Rondón Revitalización Puente del Común. Mejoramiento, adecuación y mantenimiento del parque principal en el centro poblado Guane del municipio de Barichara, Santander. Los demás se encuentran en ejecución. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
Empresas beneficiadas con proyectos de	A marzo 31 de 2022. Avance: 547 Se encuentra ejecutado el proyecto: Capacitación y formación: legislación, sostenibilidad, desarrollo de experiencias, fortalecimiento



Indicador	Avance Cualitativo
fortalecimiento de la competitividad de la actividad turística en el marco del Pacto Bicentenario	empresarial, temáticas bicentenario, otros, cuyo nombre fue modificado en el PEI por el CD No. 2 del 16 de diciembre de 2021 por: Proyecto Programa de Formación Exportadora, ejecutado y el número de beneficiarios: 360 empresas beneficiadas. El proyecto: Capacitación práctica en estrategia de ventas, comercialización y estrategias digitales para los prestadores de servicios turísticos de destinos emergentes cuyo nombre fue modificado en CD No. 2 del 16 de diciembre de 2021 por programa de formación exportadora capsulas de formación en ventas, comercialización y estrategias digitales, dirigidas a actores de la cadena de valor del sector, exportación en ventas, el cual se encuentra ejecutado, Numero de empresas beneficiadas capacitadas: 187. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo.
Proyectos para la planificación turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario	A marzo 31 de 2022. Avance: 0 infraestructuras. Avance total: 3 proyectos ejecutados a través de la línea de competitividad del Manual para la Formulación de Proyectos del FONTUR para el desarrollo y fortalecimiento de la planificación turística territorial en los departamentos que conforman el Pacto Bicentenario (Arauca, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Santander). Descripción del avance: Se encuentran ejecutados los proyectos: Conmemoración 16 de julio - entrega 14 constituciones de Cundinamarca en el Museo Nacional - insumo para la generación de guiones turísticos interpretativos del bicentenario; el proyecto Encuentro Nacional de Estudiantes de Colegios Amigos del Turismo en el marco del Bicentenario y el proyecto de Entrega de los inventarios turísticos de los municipios incluidos en el Pacto Bicentenario y en la estrategia de corredores turísticos. El proyecto Fortalecimiento de la implementación de la Ruta de la leyenda del Dorado se descartó del PEI, en el CD No. 2 del 16 de diciembre de 2021. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo
Proyectos para la promoción turística ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario	A marzo 31 de 2022. Avance: 0. Proyectos ejecutados a través de la línea de promoción del Manual para la Formulación de Proyectos del FONTUR para el desarrollo y fortalecimiento de la promoción turística territorial a nivel nacional e internacional en los departamentos que conforman el Pacto Bicentenario los proyectos son: Promoción del turismo gastronómico colombiano en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá u otro evento de carácter internacional y el proyecto Apoyo al proyecto para la promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander. Avance total: 17 proyectos. Informe suministrado por Viceministerio de Turismo



4. ANEXOS

Proyectos de la matriz, financiados DNP: Al corte de la presente ficha no hay proyectos reportados como cofinanciados por el DNP.
