



Fecha de actualización:

Día / Mes / Año  
19/02/2023

Fecha de corte de la información:

Día / Mes / Año  
31/12/2022

## 1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

**Objeto:** Articular entre la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre y los municipios signatarios, las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de la región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país.

### Líneas Temáticas:

- Fortalecimiento y ordenamiento institucional.
- Infraestructura para la disminución de las NBI.
- Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.


### TEMAS ESTRATEGICOS

El 28 de abril de 2022 se realizó el sexto Consejo Directivo, en el que se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Inversiones pasando de \$1.412.523 millones a \$1.510.518 millones con 80 iniciativas estratégicas.

#### ➤ Impactos esperados

Con relación a las iniciativas, se estima que el Pacto Golfo de Morrosquillo generará cerca de 21.149 empleos directos y 35.015 indirectos. Así mismo es importante destacar que la ejecución de los proyectos estratégicos beneficiará aproximadamente a 415.000 habitantes del área de influencia del Pacto Golfo de Morrosquillo.

### Área de Intervención: Pacto Golfo de Morrosquillo

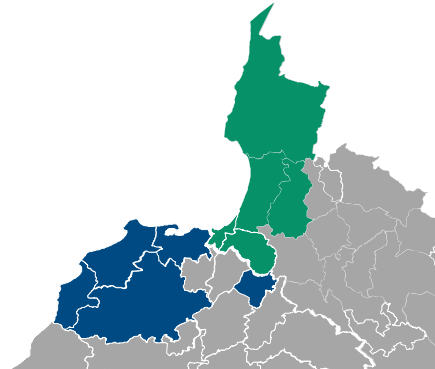

<b>Departamentos:</b>	<b>Córdoba y Sucre</b>
<b>No. de Municipios en el Pacto Territorial:</b>	Departamento de Córdoba: (5) Departamento de Sucre (5)
<b>Fecha de suscripción:</b>	07/02/2020
<b>Fecha de terminación:</b>	07/02/2025
<b>Plazo:</b>	5 años

#### Valor indicativo (Millones)

<b>Total (%)</b>	\$1.510.518 (100%)
<b>Nación (%)</b>	\$1.279.710 (85%)
<b>Territorio (%)</b>	\$230.808 (15%)

#### Avance financiero (Millones)

<b>Compromiso recursos al cierre (%)</b>	\$893.306 (59,1%)
<b>Compromiso Nación</b>	\$ 721.999
<b>Compromiso Territorio y otros</b>	\$171.306

<b>Proyectos en ejecución</b>	\$819.829 (49 proyectos)
<b>Proyectos ejecutados</b>	\$73.477 (14 proyectos)



**PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO.**

**Proyectos en ejecución:**

Sector	Proyecto	Descripción Avance
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lórica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba	El proyecto 4199-Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lórica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 24.298.023.536, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 24.298.023.536, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 157.726 personas ubicadas en San Bernardo del Viento (Córdoba), Santa Cruz de Lórica (Córdoba), generar 350 empleos directos y 510 empleos indirectos.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lórica, Córdoba.	El proyecto 4310-Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lórica, Córdoba. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 20.482.388.000, con un aporte territorial de \$ 1.000.000.000 y un aporte nación de \$ 19.482.388.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 121.214 personas ubicadas en Santa Cruz de Lórica (Córdoba), generar 287 empleos directos y 419 empleos indirectos.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera	El proyecto 4002-Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 17.618.699.992, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 17.618.699.992, cuenta con un avance físico del 84 % y financiero del 33 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 194.296 personas ubicadas en Coveñas (Sucre), Moñitos (Córdoba), San Antero (Córdoba), San Bernardo del Viento (Córdoba), San Onofre (Sucre), Santiago de Tolú (Sucre), generar 142 empleos directos y 207 empleos indirectos.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín	El proyecto 4200-Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.015.131.895, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 7.015.131.895, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 37.716 personas ubicadas en Tuchín (Córdoba), generar 104 empleos directos y 151 empleos indirectos.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre	El proyecto 4312-Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 41.468.174.541, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 41.468.174.541, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 33.296 personas ubicadas en Santiago de Tolú (Sucre), generar 581 empleos directos y 848 empleos indirectos.
Comercio Industria y Turismo	Construcción bulevar Jesús María Lugo, en el municipio de Santa Cruz de Lórica - Córdoba	El proyecto 4305-Construcción bulevar Jesús María Lugo, en el municipio de Santa Cruz de Lórica - Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.777.920.060, con un aporte territorial de \$ 555.584.012 y un aporte nación de \$ 2.222.336.048, cuenta con un avance físico del 91 % y financiero del 51 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 121.214 personas ubicadas en Santa Cruz de Lórica (Córdoba), generar 39 empleos directos y 63 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Comercio Industria y Turismo	Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero	El proyecto 4146-Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.898.541.035, con un aporte territorial de \$ 1.579.708.207 y un aporte nación de \$ 6.318.832.828, cuenta con un avance físico del 42 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 34.196 personas ubicadas en San Antero (Córdoba), generar 111 empleos directos y 181 empleos indirectos.
Comercio Industria y Turismo	Construcción de parador turístico, en el municipio de San Antero, Departamento de Córdoba	El proyecto 4302-Construcción de parador turístico, en el municipio de San Antero, Departamento de Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.771.308.022, con un aporte territorial de \$ 1.954.261.605 y un aporte nación de \$ 7.817.046.417, cuenta con un avance físico del 13 % y financiero del 5 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 34.196 personas ubicadas en San Antero (Córdoba), generar 137 empleos directos y 223 empleos indirectos.
Comercio Industria y Turismo	Construcción del centro de comercio rural zenú, en el municipio de Tuchín Córdoba	El proyecto 4195-Construcción del centro de comercio rural zenú, en el municipio de Tuchín Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.803.458.765, con un aporte territorial de \$ 2.803.458.765 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 21 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 37.716 personas ubicadas en Tuchín (Córdoba), generar 42 empleos directos y 68 empleos indirectos.
Comercio Industria y Turismo	Culminación del mercado público del municipio de San Antero, departamento de Córdoba	El proyecto 4194-Culminación del mercado público del municipio de San Antero, departamento de Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 6.999.962.590, con un aporte territorial de \$ 6.999.962.590 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 34.196 personas ubicadas en San Antero (Córdoba), generar 98 empleos directos y 160 empleos indirectos.
Comercio Industria y Turismo	Malecón de Coveñas (Segunda Ensenada)	El proyecto 3919-Malecón de Coveñas (Segunda Ensenada) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 29.997.510.980, con un aporte territorial de \$ 570.364.947 y un aporte nación de \$ 29.427.146.033, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 17.000 personas ubicadas en Coveñas (Sucre), generar 419 empleos directos y 683 empleos indirectos.
Comercio Industria y Turismo	Recuperación ambiental y paisajística de la cuenca del río Sinú y obras para la mitigación de inundaciones y control de procesos erosivos en el municipio de San Bernardo del Viento	El proyecto 4192-Recuperación ambiental y paisajística de la cuenca del río Sinú y obras para la mitigación de inundaciones y control de procesos erosivos en el municipio de San Bernardo del Viento se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 22.603.240.498, con un aporte territorial de \$ 22.603.240.498 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 10 % y financiero del 5 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 36.512 personas ubicadas en San Bernardo del Viento (Córdoba), generar 334 empleos directos y 544 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Comercio Industria y Turismo	Remodelación plaza monumento - Santa Cruz de Lórica	El proyecto 4306-Remodelación plaza monumento - Santa Cruz de Lórica se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.896.318.237, con un aporte territorial de \$ 380.779.600 y un aporte nación de \$ 1.515.538.637, cuenta con un avance físico del 91 % y financiero del 57 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 121.214 personas ubicadas en Santa Cruz de Lórica (Córdoba), generar 27 empleos directos y 43 empleos indirectos.
Deporte y Recreación	Construcción de Unidad Recreo deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba	El proyecto 4149-Construcción de Unidad Recreo deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.585.399.374, con un aporte territorial de \$ 1.585.399.374 y un aporte nación de \$ 8.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 25.095 personas ubicadas en Moñitos (Córdoba), generar 134 empleos directos y 207 empleos indirectos.
Deporte y Recreación	Construcción del complejo deportivo en el municipio de Santa Cruz de Lórica, Departamento de Córdoba	El proyecto 4188-Construcción del complejo deportivo en el municipio de Santa Cruz de Lórica, Departamento de Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 20.978.901.112, con un aporte territorial de \$ 20.978.901.112 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 29 % y financiero del 28 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 121.214 personas ubicadas en Santa Cruz de Lórica (Córdoba), generar 294 empleos directos y 453 empleos indirectos.
Interior	CAM Santiago de Tolú	El proyecto 4151-CAM Santiago de Tolú se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.323.522.912, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.323.522.912, cuenta con un avance físico del 15 % y financiero del 10 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 33.296 personas ubicadas en Santiago de Tolú (Sucre), generar 85 empleos directos y 135 empleos indirectos.
Interior	Centro Sacúdete (1) en San Antero.	El proyecto 4329-Centro Sacúdete (1) en San Antero. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.250.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 1.250.000.000, cuenta con un avance físico del 26 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 34.196 personas ubicadas en San Antero (Córdoba), generar 18 empleos directos y 28 empleos indirectos.
Interior	Centro Sacúdete (1) en Tolviejo.	El proyecto 4336-Centro Sacúdete (1) en Tolviejo. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.250.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 1.250.000.000, cuenta con un avance físico del 5 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 20.033 personas ubicadas en Tolviejo (Sucre), generar 18 empleos directos y 28 empleos indirectos.
Interior	Centro Sacúdete (1) en Tuchín.	El proyecto 4330-Centro Sacúdete (1) en Tuchín. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.300.000.000, con un aporte territorial de \$ 460.000.000 y un aporte nación de \$ 1.840.000.000, cuenta con un avance físico del 5 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 55.418 personas ubicadas en Tuchín (Córdoba), generar 47 empleos directos y 73 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Antonio de palmito Departamento de Sucre del programa Colombia rural – nacional. Vía que conduce del municipio de San Antonio de Palmito al corregimiento Algodoncillo ruta del sombrero vueltaio	El proyecto 4300-Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de San Antonio de palmito Departamento de Sucre del programa Colombia rural – nacional. Vía que conduce del municipio de San Antonio de Palmito al corregimiento Algodoncillo ruta del sombrero vueltaio se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 18.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 18.000.000.000, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 13.682 personas ubicadas en San Antonio de Palmito (Sucre), generar 252 empleos directos y 433 empleos indirectos.
Transporte	Construcción de pavimento rígido en la vía Vereda Nuevo Mundo y Corregimiento Caño Grande en el municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba	El proyecto 4191-Construcción de pavimento rígido en la vía Vereda Nuevo Mundo y Corregimiento Caño Grande en el municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.494.190.073, con un aporte territorial de \$ 5.494.190.073 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 87 % y financiero del 74 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 36.512 personas ubicadas en San Bernardo del Viento (Córdoba), generar 84 empleos directos y 144 empleos indirectos.
Transporte	Construcción de pavimento rígido en los barrios: Getsemaní, San Pedro, Barrio Nuevo, Las Palmeras y los olivos de la zona urbana del municipio de Tuchin	El proyecto 4190-Construcción de pavimento rígido en los barrios: Getsemaní, San Pedro, Barrio Nuevo, Las Palmeras y los olivos de la zona urbana del municipio de Tuchin se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.995.390.481, con un aporte territorial de \$ 4.995.390.481 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 34 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 37.716 personas ubicadas en Tuchin (Córdoba), generar 60 empleos directos y 104 empleos indirectos.
Transporte	Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento	"El proyecto 4303-Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.523.607.941, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 7.523.607.941, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 36.512 personas ubicadas en San Bernardo del Viento (Córdoba), generar 105 empleos directos y 181 empleos indirectos.
Transporte	Corredor Santa Lucía - Moñitos	El proyecto 3914-Corredor Santa Lucía - Moñitos se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 183.472.666.029, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 183.472.666.029, cuenta con un avance físico del 20 % y financiero del 16 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 25.100 personas ubicadas en Moñitos (Córdoba), generar 2.660 empleos directos y 4.575 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento corredor departamental Aguas Negras – Berlín (90CS01)	El proyecto 4152-Mejoramiento corredor departamental Aguas Negras – Berlín (90CS01) se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 13.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 13.000.000.000, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 6.000 personas ubicadas en San Onofre (Sucre), generar 182 empleos directos y 313 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento corredor departamental Guayabal - Parcelas de Algarrobo y desvío hacia el sector represa de Villeros	El proyecto 4183-Mejoramiento corredor departamental Guayabal - Parcelas de Algarrobo y desvío hacia el sector represa de Villeros se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.392.234.201, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 4.392.234.201, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 17.091 personas ubicadas en Coveñas (Sucre), generar 61 empleos directos y 106 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento corredor terciario Aserradero - Coveñas	El proyecto 4181-Mejoramiento corredor terciario Aserradero - Coveñas se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.693.421.595, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 2.693.421.595, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 17.091 personas ubicadas en Coveñas (Sucre), generar 38 empleos directos y 65 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento corredor terciario Palmira - Gualon	El proyecto 4178-Mejoramiento corredor terciario Palmira - Gualon se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.265.549.461, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 1.265.549.461, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 20.033 personas ubicadas en Toluviéjo (Sucre), generar 18 empleos directos y 31 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento corredor terciario Corregimiento los Gomez	El proyecto 4185-Mejoramiento corredor terciario Corregimiento los Gomez se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.657.426.556, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 8.657.426.556, cuenta con un avance físico del 10 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 121.214 personas ubicadas en Santa Cruz de Lorica (Córdoba), generar 121 empleos directos y 208 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento corredor terciario Murcielagal - El Tigre- San Patricio- Mangle**	El proyecto 4179-Mejoramiento corredor terciario Murcielagal - El Tigre- San Patricio- Mangle** se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 1.603.227.140, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 1.603.227.140, cuenta con un avance físico del 99 % y financiero del 70 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 25.095 personas ubicadas en Moñitos (Córdoba), generar 22 empleos directos y 39 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento corredor terciario Porvenir - Peñón- Cerro- Petrona- Aserradero	El proyecto 4182-Mejoramiento corredor terciario Porvenir - Peñón- Cerro- Petrona- Aserradero se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 3.023.686.386, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 3.023.686.386, cuenta con un avance físico del 10 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 17.091 personas ubicadas en Coveñas (Sucre), generar 42 empleos directos y 73 empleos indirectos.





Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento corredor terciario Tolú - El francés - Guacamayas	El proyecto 4186-Mejoramiento corredor terciario Tolú - El francés - Guacamayas se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 10.000.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 10.000.000.000, cuenta con un avance físico del 1 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 33.296 personas ubicadas en Santiago de Tolú (Sucre), generar 140 empleos directos y 241 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento corredor terciario Villa Fátima - Perpetuo Socorro	El proyecto 4180-Mejoramiento corredor terciario Villa Fátima - Perpetuo Socorro se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 2.468.969.796, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 2.468.969.796, cuenta con un avance físico del 10 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 36.512 personas ubicadas en San Bernardo del Viento (Córdoba), generar 35 empleos directos y 59 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento de la vía que comunica la transversal del caribe sector Moñitos San Bernardo del Viento en el sector La Rada municipio de Moñitos Departamento de Córdoba	El proyecto 4189-Mejoramiento de la vía que comunica la transversal del caribe sector Moñitos San Bernardo del Viento en el sector La Rada municipio de Moñitos Departamento de Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 4.000.001.658, con un aporte territorial de \$ 4.000.001.658 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 90 % y financiero del 50 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 25.095 personas ubicadas en Moñitos (Córdoba), generar 56 empleos directos y 96 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y tolú en el departamento de Sucre.	El proyecto 3909-Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y tolú en el departamento de Sucre. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 40.649.667.498, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 40.649.667.498, cuenta con un avance físico del 53 % y financiero del 34 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2020. Se espera beneficiar a 39.653 personas ubicadas en Santiago de Tolú (Sucre), generar 588 empleos directos y 1.011 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento en pavimento flexible de la vía Tolviejo - San Antonio de Palmito, departamento de Sucre. OCAD PAZ	El proyecto 4201-Mejoramiento en pavimento flexible de la vía Tolviejo - San Antonio de Palmito, departamento de Sucre. OCAD PAZ se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 37.408.019.447, con un aporte territorial de \$ 37.408.019.447 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 36 % y financiero del 30 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 13.682 personas ubicadas en San Antonio de Palmito (Sucre), generar 524 empleos directos y 901 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	El proyecto 4196-Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 14.549.409.897, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 14.549.409.897, cuenta con un avance físico del 13 % y financiero del 15 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 34.196 personas ubicadas en San Antero (Córdoba), generar 204 empleos directos y 351 empleos indirectos.



Sector	Proyecto	Descripción Avance
Transporte	Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	El proyecto 4193-Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.792.315.443, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 8.792.315.443, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 34.196 personas ubicadas en San Antero (Córdoba), generar 148 empleos directos y 255 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Sabaneta – Coveñas	El proyecto 4301-Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Sabaneta – Coveñas se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 9.622.782.703, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 9.622.782.703, cuenta con un avance físico del 8 % y financiero del 2 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 17.091 personas ubicadas en Coveñas (Sucre), generar 140 empleos directos y 241 empleos indirectos. E
Transporte	Mejoramiento y mantenimiento de la vía que conduce del municipio de Tuchín hasta el límite del municipio de Palmito (Sucre) en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.	El proyecto 4202-Mejoramiento y mantenimiento de la vía que conduce del municipio de Tuchín hasta el límite del municipio de Palmito (Sucre) en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 22.224.000.000, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 22.224.000.000, cuenta con un avance físico del 34 % y financiero del 25 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 37.716 personas ubicadas en Tuchín (Córdoba), generar 311 empleos directos y 535 empleos indirectos.
Transporte	Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento del puente la Doctrina, departamento de Córdoba.	El proyecto 4328-Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento del puente la Doctrina, departamento de Córdoba. se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 48.071.776.324, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 48.071.776.324, cuenta con un avance físico del 6 % y financiero del 3 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 61.607 personas ubicadas en Moñitos (Córdoba), San Bernardo del Viento (Córdoba), generar 631 empleos directos y 1.085 empleos indirectos.
Transporte	Vía Moñitos - San Bernardo del viento y Lórica – Chinú	El proyecto 4155-Vía Moñitos - San Bernardo del viento y Lórica – Chinú se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 43.198.476.188, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 43.198.476.188, cuenta con un avance físico del 70 % y financiero del 47 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021, 2022. Se espera beneficiar a 220.821 personas ubicadas en Moñitos (Córdoba), San Bernardo del Viento (Córdoba), Santa Cruz de Lórica (Córdoba), Tuchín (Córdoba), generar 605 empleos directos y 1.040 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción de obras de recolección y manejo de aguas residuales y optimización del sistema de abastecimiento de agua, construcción de obras para las conexiones hidrosanitarias intradomiciliarias, en las localidades de la Libertad y Sabanetica del municipio de San Onofre, Sucre	El proyecto 4331-Construcción de obras de recolección y manejo de aguas residuales y optimización del sistema de abastecimiento de agua, construcción de obras para las conexiones hidrosanitarias intradomiciliarias, en las localidades de la Libertad y Sabanetica del municipio de San Onofre, Sucre se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 20.760.960.633, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 20.760.960.633, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2022. Se espera beneficiar a 10.000 personas ubicadas en San Onofre (Sucre), generar 292 empleos directos y 490 empleos indirectos.





Sector	Proyecto	Descripción Avance
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Construcción Sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre	El proyecto 4187-Construcción Sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 7.814.757.300, con un aporte territorial de \$ 7.814.757.300 y un aporte nación de \$ 0, cuenta con un avance físico del 26 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 2.551 personas ubicadas en San Onofre (Sucre), generar 109 empleos directos y 184 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo	El proyecto 4005-Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 14.621.691.926, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 14.621.691.926, cuenta con un avance físico del 72 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 267.559 personas ubicadas en Coveñas (Sucre), Moñitos (Córdoba), San Antero (Córdoba), San Antonio de Palmito (Sucre), San Bernardo del Viento (Córdoba), San Onofre (Sucre), Santa Cruz de Lorica (Córdoba), Santiago de Tolú (Sucre), Tolviejo (Sucre), Tuchín (Córdoba), generar 198 empleos directos y 333 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas	El proyecto 4311-Estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 5.303.544.331, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 5.303.544.331, cuenta con un avance físico del 60 % y financiero del 20 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 17.091 personas ubicadas en Coveñas (Sucre), generar 74 empleos directos y 125 empleos indirectos..
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Optimización hidráulica y operativa del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de San Bernardo del Viento	El proyecto 4340-Optimización hidráulica y operativa del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de San Bernardo del Viento se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 14.592.337.519, con un aporte territorial de \$ 0 y un aporte nación de \$ 14.592.337.519, cuenta con un avance físico del 0 % y financiero del 0 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 36.512 personas ubicadas en San Bernardo del Viento (Córdoba), generar 204 empleos directos y 343 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta el corregimiento del Porvenir, San Antero, Córdoba	El proyecto 4168-Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta el corregimiento del Porvenir, San Antero, Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 17.834.051.257, con un aporte territorial de \$ 9.908.830.305 y un aporte nación de \$ 7.925.220.952, cuenta con un avance físico del 21 % y financiero del 16 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2020. Se espera beneficiar a 34.196 personas ubicadas en San Antero (Córdoba), generar 252 empleos directos y 423 empleos indirectos.
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba.	El proyecto 4339-Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba se encuentra en ejecución, con una inversión de \$ 8.475.853.403, con un aporte territorial de \$ 2.542.756.021 y un aporte nación de \$ 5.933.097.382, cuenta con un avance físico del 10 % y financiero del 25 %, se incluyó en Plan de Acción Anual 2021. Se espera beneficiar a 25.095 personas ubicadas en Moñitos (Córdoba), generar 119 empleos directos y 199 empleos indirectos.



## SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. Proyectos Totales	No. Proyectos Ejecutados	No. Proyectos en Ejecución	No. Proyectos No iniciados
Ambiente y Desarrollo Sostenible	7	-	5	2
Comercio Industria y Turismo	15	2	8	5
Deporte y Recreación	3	-	2	1
Educación	1	1	-	-
Interior	8	2	4	2
Salud y Protección Social	3	2		1
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	1	-	-
Trabajo	2	1		1
Transporte	28	4	23	1
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	11	-	7	4
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	1	1	-	-
<b>Total, general</b>	<b>80</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>17</b>

## 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PACTO FUNCIONAL

### 2.1 PRESUPUESTO INDICATIVO POR SECTORES – INICIAL (Millones de \$COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Compromisos (Territorio)	%	Compromisos (Entidades Nacionales)	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$194.471	\$1.000	1%	\$193.471	99%
Comercio Industria y Turismo	\$187.939	\$90.909	48%	\$97.030	52%
Deporte y Recreación	\$38.252	\$25.052	65%	\$13.200	35%
Educación	\$29.230	\$8.230	28%	\$21.000	72%
Interior	\$23.759	\$1.581	7%	\$22.178	93%
Salud y Protección Social	\$50.628	\$5.072	10%	\$45.555	90%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$0	0%	\$5.361	100%
Trabajo	\$20.000	\$18.417	92%	\$1.583	8%
Transporte	\$717.388	\$56.642	8%	\$660.746	92%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$239.949	\$20.363	8%	\$219.586	92%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$3.542	100%	\$0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.510.518</b>	<b>\$230.808</b>	<b>15%</b>	<b>\$1.279.710</b>	<b>85%</b>

### 2.2 AVANCE EN EJECUCIÓN – ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2022

59,1%



## EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

### Total, Ejecución 2020 – 2025 (Millones de \$ COP)

Sector	Valor Total Indicativo	Comprometido DNP	%	Comprometido Total	%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$194.471	\$109.882	57%	\$110.882	57%
Comercio Industria y Turismo	\$187.939	\$35.746	19%	\$85.981	46%
Deporte y Recreación	\$38.252	\$8.000	21%	\$30.564	80%
Educación	\$29.230	\$5.000	17%	\$28.411	97%
Interior	\$23.759	\$813	3%	\$11.808	50%
Salud y Protección Social	\$50.628	\$2.555	5%	\$7.564	15%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$5.361	\$0	0%	\$5.361	100%
Trabajo	\$20.000	\$0	0%	\$1.583	8%
Transporte	\$717.388	\$71.515	10%	\$518.209	72%
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	\$239.949	\$30.812	13%	\$89.403	37%
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$3.542	\$0	0%	\$3.538	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.510.518</b>	<b>\$264.323</b>	<b>17%</b>	<b>\$893.306</b>	<b>59,1%</b>

### 3. BALANCE DE LOS INDICADORES DEL PACTO TERRITORIAL

#### 3.1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PACTO TERRITORIAL -INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.

(2022)

(2020-2025)

% Avance 42,02%



% Avance Acumulado 48,88%



Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

\*Nota: El avance se calcula con base en la información reportada por la Coordinación Territorial sobre los indicadores de resultado y de producto incluidos en la plataforma de Sinergia para los cuales: (1) se programaron metas, y (2) se dispone de información por su periodicidad de reporte.

#### 3.2 AVANCE CUANTITATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN SINERGIA DEL DNP.




**Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas % Avance: 38,04% % Avance Acumulado: 54,86%**

- Vivienda Ciudad y Territorio % Avance: 0% % Avance Acumulado: 50%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	-	0	2	0%		Rojo	2	0	0%		Rojo	31/12/2022
Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	-	-	-	-		Gris	174	174	100%		verde	

SEMÁFORO




- Transporte % Avance: 76,08% % Avance Acumulado: 19,44%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Vías intervenidas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo	0	35	46	76,08%		Naranja	180	35	19,44		Rojo	31/12/2022




SEMÁFORO



- TIC % Avance: -% % Avance Acumulado: 100 %

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Zonas digitales instaladas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo	0	11	-	-		Gris	11	11	100%		Verde	

SEMÁFORO




**Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas/ Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible % Avance: 50% % Avance Acumulado: 25%**

- Educación/ Salud y Protección Social/ Interior/ Trabajo % Avance: 50% % Avance Acumulado: 25%

Indicador	Línea Base	Avance 2022	Meta 2022	% Avance	Semáforo		Meta Acumulada	Avance Acumulado	% Avance Acumulado	Semáforo		Fecha Corte
Infraestructura educativa, hospitalaria, pública y para el trabajo construida y mejorada en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.	-	1	2	50%		Rojo	4	1	25%		Rojo	31/12/2022

SEMÁFORO



### 3.3 AVANCE CUALITATIVO DE LOS PROYECTOS

**Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas**

- Vivienda Ciudad y Territorio

Indicador

Avance Cualitativo





<p>Acueductos y sistemas de saneamiento básico construidos, optimizados y mejorados en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.</p>	<p>Avanza la ejecución de los contratos específicos de proyectos del sector Vivienda Ciudad y Territorio, así: 1. Optimización del acueducto de San Antero y corregimiento El Porvenir (Córdoba): El 10 de octubre de 2020 se firmó el convenio por \$18.002 millones para la optimización del acueducto de San Antero. El 12 de abril de 2021 se adjudicó por parte del PDA de Córdoba este proyecto a AQUALIA y el inicio de obra fue el 25 de mayo de 2021, el cual preveía ejecución por 12 meses. A la fecha el avance es del 21,23%, debido a que el proyecto se encuentra suspendido, toda vez que, las actividades a ejecutar son objeto de reformulación, la cual se radicó al MVCT el día 11 de julio de 2022. El 28 de julio 2022, el MVCT remitió por correo electrónico observaciones al componente hidráulico para ajuste y complementación. A la espera de ajuste y complementación de la información. Avance por componente: Construcción del tanque de almacenamiento Patagonia---87,1% Optimización de la planta de tratamiento----34,62% Línea de conducción PTAP-Patagonia-----25,82%2. El proyecto aún no cuenta con el permiso vial de INVIAS, se están subsanando observaciones realizadas para obtener permiso de ocupación de vía. 2. Construcción Sistema de acueducto en el corregimiento de Rincón del Mar, Municipio de San Onofre: Proyecto en ejecución con recursos del territorio por \$7.814 millones. La obra fue adjudicada al consorcio Acueducto Rincón 2020 y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. A la fecha presenta un avance de 26%, debido a que el proyecto se encuentra suspendido.</p>
<p>Viviendas con servicio de energía eléctrica instalado en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.</p>	<p>Para el periodo se encuentra ejecutado el contrato LP .002-2020 de obra pública "Construcción de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de San Onofre, Sucre</p>

- Transporte

Indicador	Avance Cualitativo
<p><b>Vías intervenidas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo</b></p>	<p>Avanza la ejecución de los contratos específicos de proyectos del sector Transporte, así: 1. Corredor Santa Lucia- Moñitos Córdoba 49 kilómetros: Vía adjudicada por el INVÍAS el 9 de abril de 2021 por \$183.473 millones, incluyendo la interventoría. La obra inició su ejecución en julio de 2021, con un plazo de ejecución de 54 meses. A la fecha el proyecto presenta avance real del 20,38%. Este proyecto hace parte del Programa de "Vías para la Legalidad". 2. Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía el Delirio - Puerto Viejo: convenio suscrito el 6 de octubre de 2020 por \$41.972 (incluida interventoría) millones con recursos del DNP, la interventoría fue contratada y es ejecutada por INVIAS por \$4.182 millones. La obra fue adjudicada el 25 de agosto de 2021 por FINDETER (en el marco del convenio suscrito entre la Gobernación de Sucre y FINDETER) y el 15 de octubre de 2021 se firmó el Acta de inicio de obras, tiempo de ejecución 12 meses. El inicio de obras se protocolizó el 26 de noviembre de 2021 y se inició el 1 de diciembre de 2021. A la fecha presenta un avance en su ejecución del 51%, se realizó prórroga del contrato de obra hasta 31 de diciembre de 2022. 3. Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Moñitos - San Bernardo del Viento - Lorica - Chinú en el departamento de Córdoba: Proyecto en ejecución por INVIAS, con avance de obra del 69%, hace parte del Programa "Concluir - Concluir". El proyecto fue adjudicado en diciembre del 2020 por \$28.927 millones incluyendo interventoría, contados a partir del 2 de marzo del 2021. El 21 de diciembre de 2021 se realizó adición por \$14.270 millones. Se tiene programado para septiembre de 2022, la entrega de la obra. 4. Mejoramiento del corredor departamental Aguas Negras – Berlín en Sucre y Vías terciarias: En el marco de la visita del Señor Presidente, el 27 de abril de 2021 se firmaron los convenios para las intervenciones en vías terciarias, el departamento de Sucre adjudicó contrato el 23 de marzo de 2022 para la intervención de las cinco vías terciarias y se firmó acta de inicio de obras el 01 de junio de 2022, y se estima que la entrega de obras se realice en diciembre de 2022. El departamento de Córdoba suscribió el acta de Inicio de obras del contrato para la intervención de las tres vías terciarias de los municipios del Golfo el 16 de marzo de</p>



Indicador	Avance Cualitativo
	2022, y se estima que la entrega de obras se realice en noviembre de 2022. La vía terciaria de Murcielagal - El Tigre- San Patricio- Mangle en el municipio de Moñitos, Córdoba, es una obra ejecutada por el municipio, a la fecha tiene ejecución del 99%, se concedió prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022.

- TIC

Indicador	Avance Cualitativo
<b>Zonas digitales instaladas en el marco del Pacto Golfo de Morrosquillo.</b>	Para el periodo se encuentra ejecutadas las 11 zonas digitales instaladas cuya finalidad es ampliar la cobertura de conectividad y con ello impulsar la productividad y competitividad de las zonas rurales y urbanas en los departamentos que conforman el Pacto Golfo de Morrosquillo.

#### Infraestructura para la disminución de necesidades básicas insatisfechas/ Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.

- Educación/ Salud y Protección Social/ Interior/ Trabajo

Indicador	Avance Cualitativo
Infraestructura educativa, hospitalaria, pública y para el trabajo construida y mejorada en el marco del pacto Golfo de Morrosquillo.	Avanza la ejecución de los contratos específicos de los proyectos del sector Educación/Salud y Protección Social/Interior/Trabajo, así: 1. Megacolegio Heriberto García Garrido en Santiago de Tolú, Sucre: El 24 de julio de 2022 en el marco de la visita del Señor Presidente a Tolú se realizó acta de entrega de esta obra a la Rectora de la institución con la presencia de la comunidad. El Megacolegio Heriberto García Garrido en Tolú, Sucre, atenderá 2.160 estudiantes con una inversión total de \$29.365 millones. 2. Ampliación de la sede del SENA en Tolú, Sucre: Para la ampliación de la sede del SENA en Tolú, esta institución adquirió los lotes necesarios con un área de 2.200 m2 por \$1.354 millones. El acta de inicio se suscribió el 11 de agosto de 2021, los estudios y diseños fueron entregados en el mes de octubre, se exoneró el pago de licencia de construcción de la obra. La construcción estará a cargo del departamento de Sucre, la cual iniciará en el segundo semestre de 2022. 3. CAM (Centro Administrativo Municipal) Santiago de Tolú: El Ministerio del Interior financiará los \$1.200 millones faltantes para el cierre financiero del proyecto, el cual tiene aprobados estudios y diseños con el Min Interior por \$4.353 millones



#### 4. ANEXOS

#### Proyectos de la matriz, financiados DNP:

En total son 19 proyectos cofinanciados, 16 proyectos ejecución y 3 ejecutados, por valor financiado DNP de \$ 264.323 millones equivalente al 17% del valor total indicativo.

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Estructuración proyectos de prevención y mitigación de erosión costera	En Ejecución	\$0	\$17.619	\$17.619	\$17.619
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de las Obras de Mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba	En Ejecución	\$0	\$24.298	\$24.298	\$24.298
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Recuperación cuenca hidrográfica Tuchín	En Ejecución	\$0	\$7.015	\$7.015	\$7.015
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la rivera del Caño Chimalito municipio de Lorica, Córdoba.	En Ejecución	\$1.000	\$19.482	\$19.482	\$20.482
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Rehabilitación hidráulica del canal el edén y canalización en concreto rígido desde el k0+00 hasta el k1+540, municipio de Santiago de Tolú - Sucre	En Ejecución	\$0	\$41.468	\$41.468	\$41.468
Comercio Industria y Turismo	Construcción de mirador turístico en el sector de playa blanca municipio de San Antero	En Ejecución	\$1.580	\$6.319	\$6.319	\$7.899
Comercio Industria y Turismo	Malecón de Coveñas ( Segunda Ensenada)	En Ejecución	\$570	\$29.427	\$29.427	\$29.998
Deporte y Recreación	Construcción de Unidad Recreo deportiva en la Cabecera Municipal de Moñitos, Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$1.585	\$8.000	\$8.000	\$9.585
Educación	Megacolegio Heriberto García Garrido en Tolviejo, Sucre	Ejecutado	\$6.667	\$21.745	\$5.000	\$28.411
Interior	Estructuración y compra de lote Estación de Bomberos	Ejecutado	\$622	\$813	\$813	\$1.435
Salud y Protección Social	Estructuración y compra de lote Hospital Coveñas	Ejecutado	\$1.884	\$2.555	\$2.555	\$4.440

Sector	Proyecto	Estado	Aporte Territorio	Aporte Nación	Aporte DNP	Valor Total Contratos
Transporte	Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía El Delirio - Puerto Viejo en los municipios de San Antonio de Palmito y tolú en el departamento de Sucre.	En Ejecución	\$0	\$40.650	\$40.650	\$40.650
Transporte	Mejoramiento y construcción de la vía coliseo el cangrejo – Playa Blanca, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$0	\$14.549	\$14.549	\$14.549
Transporte	Mejoramiento y construcción de la vía paralela al mar, desde el sector Bucaneros hasta el sector La Viuda, en la zona turística de Playa Blanca, municipio de San Antero – Departamento de Córdoba	En Ejecución	\$0	\$8.792	\$8.792	\$8.792
Transporte	Construcción en pavimento rígido en la vía de acceso entre zona urbana y sector Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del viento	En Ejecución	\$0	\$7.524	\$7.524	\$7.524
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Estructuración Acueducto Regional del Golfo de Morrosquillo	En Ejecución	\$0	\$14.622	\$14.622	\$14.622
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Proyecto de optimización del acueducto urbano y rural hasta el corregimiento del Porvenir, San Antero, Córdoba	En Ejecución	\$9.909	\$7.925	\$4.953	\$17.834
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Estructuración de soluciones de acueducto y saneamiento básico en el Municipio de Coveñas	En Ejecución	\$0	\$5.304	\$5.304	\$5.304
Vivienda Ciudad y Territorio 0 Agua	Segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos departamento de Córdoba.	En Ejecución	\$2.543	\$5.933	\$5.933	\$8.476
<b>Total, general</b>			<b>\$26.360</b>	<b>\$284.040</b>	<b>\$264.323</b>	<b>\$310.400</b>

Millones de \$ COP
