



Departamento
Nacional de Planeación



Informe semestral I-2024

PACTO MAGDALENA

GRUPO GERENCIA NACIONAL DE PACTOS TERRITORIALES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

JUNIO 2024



CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL	3
1.1	¿Qué son los Pactos Territoriales?	3
1.2	¿Para qué sirve un Pacto Territorial?	3
1.3	Evolución normativa	4
1.4	Pactos territoriales suscritos.....	8
2.	INFORME PACTO TERRITORIAL MAGDALENA.....	14

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 ¿Qué son los Pactos Territoriales?

En el marco del artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, los Pactos Territoriales se definen como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total, promoviendo para ello la adopción de metodologías con enfoque de género a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.

Esta herramienta tomada del modelo francés al amparo de las buenas prácticas de la OCDE, a través de la cual se logra la articulación de los diferentes niveles de gobierno y el sector privado para el logro de proyectos estratégicos. Los Pactos Territoriales, basados en experiencias internacionales exitosas en países como Francia, Italia y Chile contribuye a los procesos de articulación y concurrencia de fuentes para la financiación de proyectos estratégicos orientados a atender las necesidades en infraestructura, soluciones de agua potable y saneamiento básico, entre otras necesidades.

1.2 ¿Para qué sirve un Pacto Territorial?

Los Pactos Territoriales, basados en experiencias internacionales exitosas en países como Francia e Italia, contribuyen a los procesos de articulación y financiación de iniciativas de proyectos de desarrollo territorial orientados a atender las necesidades en infraestructura y conectividad vial, cobertura de servicios de educación y salud, soluciones de agua potable y saneamiento básico, entre otras necesidades.

A través de la financiación de estos proyectos se promueve el desarrollo económico y social en los territorios en los que tienen incidencia los Pactos Territoriales, dado que se aportaría a la atención de las necesidades identificadas y a impulsar los diferentes sectores, especialmente los más estratégicos, con inversiones que contribuyen al desarrollo local. En resumen, los pactos territoriales sirven para:

- Para integrar las visiones de desarrollo y esfuerzos de largo plazo de las entidades del orden nacional y local.
- Para conectar al gobierno nacional con los gobiernos territoriales y las poblaciones y aprovechar las potencialidades regionales como motor de crecimiento y equidad.
- Para articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación para promover armónicamente el desarrollo de las regiones.
- Para enfocar las inversiones en proyectos estratégicos y de alto impacto económico y social, para consolidar y promover el desarrollo de los territorios.
- Para generar la transformación de las condiciones de vida de millones de colombianos, mediante impactos significativos en la productividad, empleo, generación de ingresos y en la economía nacional.
- Para determinar las líneas estratégicas de alto impacto que tienen incidencia en la convergencia regional buscando reducir las brechas sociales inter e intra municipal y departamental.
- Para promover la concurrencia de esfuerzos entre el nivel nacional y territorial, aunado a la participación de las comunidades y organizaciones sociales.

1.3 Evolución normativa

La figura de los Pactos Territoriales, de acuerdo con el actual Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), es un *“instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total”*¹. Dicha figura es una actualización de los anteriores Contratos Plan constituidos mediante las leyes 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) y 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), dado que mediante el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, se incorporó al ordenamiento jurídico los Contratos Plan como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno.

Así las cosas, con esta figura se pretende incentivar el proceso de descentralización en el país y construir un entorno favorable y simplificado para

¹ Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, artículo 279.

la inversión pública en el territorio. En resumen, los Pactos Territoriales impulsan proyectos estratégicos que, por su importancia en la economía nacional, alto uso de mano de obra y generación de empleo formal, buscan generar, en el corto y mediano plazo, beneficios para el bienestar social y económico del país.

Desde su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, esta herramienta de política pública se ha utilizado para impulsar el desarrollo territorial dentro de un esquema de concurrencia de esfuerzos, donde participan los municipios, los departamentos, esquemas asociativos territoriales y la Nación, con una guía técnica por parte de la entidad cabeza de cada sector, cuya participación estará determinada por la finalidad de cada proyecto. En términos del Documento CONPES 3822 de 2014, *“Estos instrumentos, conocidos genéricamente como acuerdos de desempeño o de resultados, implican tanto negociación como cooperación entre autoridades con diferentes márgenes de autonomía, competencia y capacidades”*.

Con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822, se expidió la Ley 1753 de 2015, cuyos artículos 198 y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una parte, el alcance jurídico de la herramienta, y de otra, crean el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan.

El artículo 198 de la Ley 1753 de 2015 modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contratos Plan como

“(...) un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial”.

De igual forma, este artículo señaló que:

“En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y



Departamento
Nacional de Planeación

eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región".

Aunque los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio, para impulsar determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, tratándose de la ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean estas del orden nacional (Ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del orden territorial (Departamentos, municipios y corporaciones autónomas, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas prestadoras de servicios públicos, entre otras). Es claro que la Entidad Ejecutora conserva su competencia en la contratación, seguimiento, vigilancia y supervisión de los contratos celebrados, bien sea contratos de obra, consultoría y su interventoría, tal como lo establece el marco normativo.

Por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos Plan, como una cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podría ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose en un mecanismo de gestión que permite facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los Contratos Plan / Pactos Territoriales, y de lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles.

Con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de esta herramienta para ser utilizado por los aportantes en estos contratos, bien se trate de las partes o de terceros para la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, "*Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan*", el cual especifica las condiciones generales de operación y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el

administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados los recursos que ingresen a este.

Así mismo y siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo "*Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad*", para el cuatrienio 2018-2022 se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

De acuerdo con lo anterior, cada Ley del Plan que se ha venido expidiendo ha hecho modificaciones a la figura original (por ejemplo, en cuanto a su enfoque, con la incorporación de los Contratos Plan para la Paz), de manera que hoy podría hablarse de tres estadios o generaciones de esta figura, a saber: (i) los Contratos Plan (2011); (ii) los Contratos Plan para la Paz (2016); y, (iii) los Pactos Territoriales (2019).


El fondo vigente y en ejecución para los pactos territoriales es el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, anteriormente denominado Fondo Regional para los Contratos Plan, teniendo en cuenta, en todo caso, que con lo establecido en el artículo 250² de la Ley 1955 de 2019 se pasa de los Contratos Plan al modelo de Pactos Territoriales. Ahora bien, dicho artículo fue modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023 (Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "*Colombia potencia mundial de la vida*"), actual Plan Nacional de Desarrollo.

Es importante precisar que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de fecha 21 de junio de 2022, "*Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*", el cual señala con relación a lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 que las referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo Regional para los Contratos Plan" se entenderán efectuadas a los "Pactos Territoriales" y al "Fondo Regional para los Pactos Territoriales", respectivamente.

² [\[2\]](#) Ley 1955 de 2019, artículo 250: "*El Departamento Nacional de Planeación coordinará el proceso de **transición y articulación de los Contratos Plan hacia el modelo de Pactos Territoriales** y definirá los aspectos operativos correspondientes. En adelante la Nación, las entidades territoriales y los esquemas asociativos de entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011, solo podrán suscribir pactos territoriales. Se mantendrán como mecanismos para la ejecución de esta nueva herramienta los Contratos Específicos y el Fondo Regional para los Contratos Plan, en adelante Fondo Regional para los Pactos Territoriales, cuya operación se orientará a facilitar la ejecución de los Pactos Territoriales y de los Contratos Plan vigentes. Los Contratos Plan suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1454 de 2011, se mantendrán vigentes por el término de duración pactado entre las partes, que en todo caso, no podrá superar el 31 de diciembre de 2023.*" (Negrilla fuera de texto).

A su vez, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023 modifica el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, para señalar que los departamentos, los municipios, los Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación podrán suscribir **Pactos Territoriales, definidos como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional** definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total. Se promueve para ello la adopción de metodologías con enfoque de género, a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.

Ilustración 1 Evolución normativa de los pactos territoriales

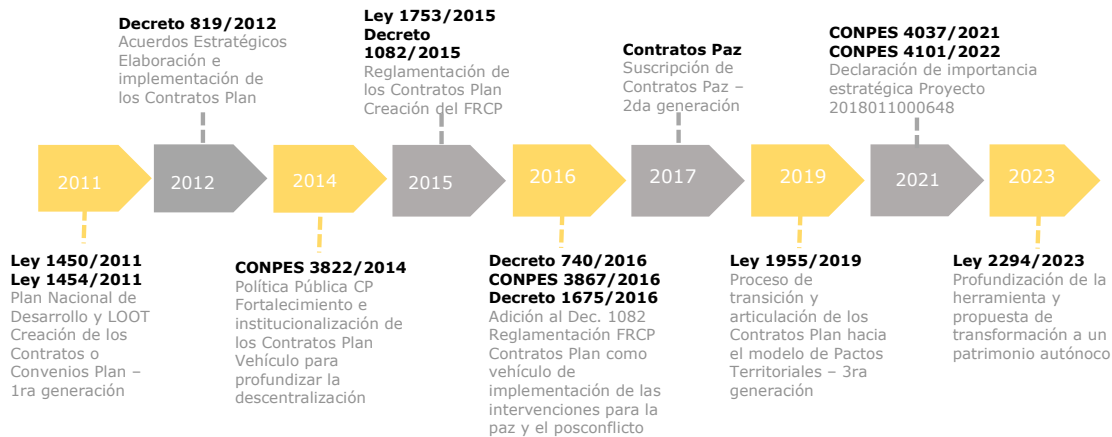

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, DNP.

1.4 Pactos territoriales suscritos

La concertación y suscripción de Pactos territoriales para la ejecución de proyectos estratégicos ha sido una prioridad para el Gobierno nacional, a través del DNP, dando como resultado la suscripción de 11 Pactos Territoriales, que se describen a continuación:

Tabla 1. Pactos Territoriales suscritos

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
Bicentenario	26 de junio de 2019 Duración 10 años, hasta 26 de junio de 2029	<ul style="list-style-type: none"> • Vicepresidencia de la República. • DNP. • Ministerio de Transporte. • Ministerio de Comercio Industria y Turismo. • Departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander. 	<p>Articular entre la Nación y los departamentos afines a la conmemoración del Bicentenario, las políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de los proyectos conforme a las necesidades de los territorios con el fin de promover la competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo social y económico de la Región.</p> <p>Líneas temáticas:</p> <p>(i) Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la campaña libertadora.</p> <p>(ii) Fortalecimiento de la competitividad turística de la campaña libertadora.</p>
Golfo de Morrosquillo	7 de febrero de 2020, Duración 5 años, hasta 7 de febrero de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • DNP. • Gobernaciones de Sucre y Córdoba. • Municipios de Coveñas, Tolú, Tolviejo, San Onofre, Palmito, Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero y Tuchín. 	<p>Articular las políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de la región, y así consolidar el Golfo de Morrosquillo como un destino turístico de primer nivel en el país.</p> <p>Líneas temáticas:</p> <p>(i) Fortalecimiento y ordenamiento institucional.</p> <p>(ii) Infraestructura para la disminución de las necesidades básicas insatisfechas.</p>

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
Santander	31 de octubre de 2020 Duración 5 años, hasta 31 de octubre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • DNP. • Gobernación de Santander. • Provincias de Guantán, Comunera, Vélez, Yariguíes, García Rovira, Soto Norte y Metropolitana. 	<p>(iii) Infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible.</p> <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para su desarrollo económico y social.</p> <p>Líneas temáticas:</p> <p>(i) Conectividad subregional.</p> <p>(ii) Infraestructura para el desarrollo económico y social.</p>
Cesar – La Guajira	14 de enero de 2021 Duración 5 años, hasta 14 de enero de 2026	<ul style="list-style-type: none"> • DNP. • Gobernación de Cesar. • Gobernación de la Guajira. • Alcaldía de Valledupar. • Municipios delegados de las subregiones de Norte, Noroccidental, Centro y Sur del departamento del Cesar y los municipios delegados de las subregiones Alta, Media y Sur del departamento de La Guajira 	<p>Articular entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira las políticas, planes y programas orientados a promover el potencial del territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.</p> <p>Líneas temáticas:</p> <p>(i) Fortalecimiento institucional.</p> <p>(ii) Infraestructura y progreso.</p> <p>(iii) Desarrollo económico, ambiental, social y cultural.</p>

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
Cundinamarca	19 de febrero de 2021 Duración 3 años, hasta 19 de febrero de 2024	<ul style="list-style-type: none"> • DNP. • Gobernación de Cundinamarca. • Municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Chipaque, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Funza, Fúquene, Gachetá, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Pulí, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Tocancipá, Ubalá, Ubaté, Viotá y Zipaquirá. 	<p>(iv) Seguridad y convivencia.</p> <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.</p> <p>Líneas temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Infraestructura para la integración social. (ii) Gestión ambiental y saneamiento básico.
Casanare	27 de febrero de 2021 Duración 5 años, hasta 27 de febrero de 2026	<ul style="list-style-type: none"> • DNP. • Gobernación de Casanare. • Municipio de Yopal como capital del departamento, el municipio de Paz de Ariporo en representación de la zona Norte, el municipio de Orocué en representación de la zona Centro y el municipio de Tauramena en representación de la zona Sur. 	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de consolidar al departamento de Casanare como un eje dinamizador de crecimiento y productividad a través de la identificación y ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la conectividad, la equidad y al desarrollo económico y social.</p> <p>Líneas temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Desarrollo económico y social. (ii) Vías para la equidad. (iii) Infraestructura social.

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
Atlántico	17 de marzo de 2021 Duración 3 años, hasta 17 de marzo de 2024	<ul style="list-style-type: none"> • DNP. • Gobernación del Atlántico. • Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. • Municipios de Juan de Acosta, Luruaco, Puerto Colombia, Piojó, Tubará y Usiacurí. 	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio.</p> <p>Líneas temáticas:</p> <p>(i) Desarrollo productivo y turístico sostenible.</p> <p>(ii) Conectividad e integración subregional.</p>
Bolívar	5 de abril de 2021 Duración 3 años, hasta 5 de abril de 2024	<ul style="list-style-type: none"> • DNP. • Gobernación de Bolívar. • Distrito de Santa Cruz de Mompós. • Municipios de Arjona, Arenal del Sur, Córdoba, Magangué, María La Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, Simití, San Juan de Nepomuceno, Turbana y Villanueva. 	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse el desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar.</p> <p>Líneas temáticas:</p> <p>(i) Infraestructura para el desarrollo social.</p> <p>(ii) Infraestructura para la integración social.</p>
Arte, la cultura y la vida - Bello	26 de abril de 2021 Duración 5 años, hasta 26 de abril de 2026	<ul style="list-style-type: none"> • DNP. • Área metropolitana del Valle de Aburrá. • Municipio de Bello. 	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de intervenciones urbano-integrales, que contribuyan a consolidar el arte, la cultura y la vida, como eje de desarrollo en el municipio de Bello y aporten al desarrollo urbano de la Centralidad Norte del Valle de Aburrá como nodo de integración</p>

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
Río Bogotá	30 de junio de 2021 Duración 5 años, hasta 30 de junio de 2026	<ul style="list-style-type: none"> • DNP. • Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. • Gobernación de Cundinamarca. • Municipios de Zipaquirá, Viotá y Chipaque. 	<p>regional en el departamento de Antioquia.</p> <p>Líneas temáticas:</p> <p>(i) Manejo y protección del patrimonio cultural.</p> <p>(ii) Revitalización urbana para el arte y la cultura.</p>
Magdalena	22 de diciembre de 2021 Duración 5 años, hasta 22 de diciembre de 2026	<ul style="list-style-type: none"> • DNP. • Todos los municipios del departamento del Magdalena, con excepción del Distrito de Santa Marta. 	<p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos priorizados del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (POMCA) y del Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios ecosistémicos de la cuenca hidrográfica del río Bogotá.</p> <p>Línea temática:</p> <p>(i) Ordenamiento y gobernanza ambiental.</p> <p>Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y social del departamento del Magdalena, a partir del aprovechamiento de sus dinámicas económicas, sociales y ambientales.</p> <p>Líneas temáticas:</p> <p>(i) Productividad y desarrollo económico.</p> <p>(ii) Infraestructura para la integración y el desarrollo social.</p>

Nombre del pacto	Fecha suscripción y duración	Participantes	Objetivos y líneas temáticas
			(iii) Saneamiento ambiental y adaptación al cambio climático. (iv) Fortalecimiento institucional.

Fuente: Gerencia de Pactos Territoriales, DNP.

2. INFORME PACTO TERRITORIAL MAGDALENA

El Pacto Territorial Magdalena se suscribió el 22 de diciembre de 2021, con la firma de un acuerdo de voluntades entre el Departamento Nacional de Planeación y los municipios de Ciénaga (delegado Subregión Norte), Sitionuevo (delegado Subregión Río), Plato (delegado Subregión Centro) y Santa Bárbara de Pinto (delegado Subregión Sur), los cuales representan todos los municipios del departamento agrupados en cada zona.


Su objetivo es articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y social del departamento de Magdalena, a partir del aprovechamiento de sus dinámicas económicas, sociales y ambientales.

A continuación, se presentan el informe del pacto.

Pacto MAGDALENA

\$ 970 Mil millones

Recursos aportados



72 Proyectos financiados



Proyectos no iniciados (en proceso de estructuración o viabilidad sectorial)

77%
Avance consolidado


Pacto Territorial Magdalena

22/12/2021 Fecha suscripción	5 Plazo en años	22/12/2026 Fecha de Terminación	29 Meses para vencimiento	51% % Tiempo Transcurrido
97 Total Proyectos		\$1,267,722 Valor Indicativo (Millones)		
\$1,133,021 Aporte indicativo nación (Millones)		\$134,702 Aporte indicativo territorio (Millones)	\$0 Aporte indicativo otros (Millones)	

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	\$77,592	\$3,204	\$74,389	\$0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$47,420	\$47,420	\$0	\$0
Defensa y Policía	\$24,627	\$24,627	\$0	\$0
Deporte y Recreación	\$47,874	\$47,874	\$0	\$0
Interior	\$9,792	\$9,026	\$765	\$0
Minas y Energía	\$30,759	\$5,568	\$25,191	\$0
Transporte	\$943,321	\$918,964	\$24,357	\$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	\$86,338	\$76,338	\$10,000	\$0
Total	\$1,267,722	\$1,133,021	\$134,702	\$0

Número de Proyectos por Estado

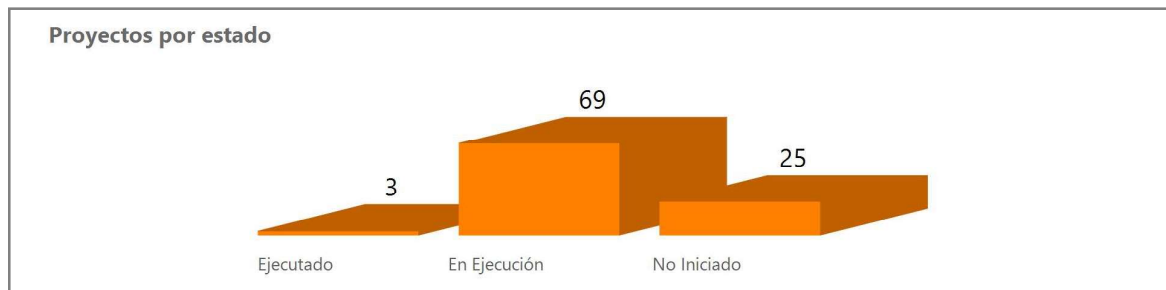


Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)


Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ejecutado	Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	\$5,800	\$5,800	\$0	\$0
Ejecutado	Mejoramiento de la vía Piñuelas Chinoblas en el municipio de Pivijay, Magdalena	\$1,600	\$1,400	\$200	\$0
Ejecutado	Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal del Caribe Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de Algarrobo departamento del Magdalena.	\$1,473	\$1,473	\$0	\$0
En Ejecución	Conexión puente Pumarejo - Ciénaga	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0
En Ejecución	Proyecto de construcción de alcantarillado en el municipio de Ariguani	\$43,000	\$33,000	\$10,000	\$0
En Ejecución	Construcción de canales como estrategia para la mitigación del riesgo por inundación en la zona urbana del municipio de Nueva Granada, departamento del Magdalena.	\$14,226	\$14,226	\$0	\$0
En Ejecución	Control de inundaciones en el municipio de San Zenón	\$13,300	\$13,300	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Real del Obispo - Santa Ines en el municipio de Tenerife, Departamento del Magdalena	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Concordia – Bálsamo del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	\$10,800	\$10,800	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bahiahonda del municipio de Pedraza	\$10,464	\$10,464	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Ariguani - Buenavista en el municipio de Ariguani departamento del Magdalena	\$9,000	\$9,000	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Pivijay - San José en el municipio de Pivijay	\$8,999	\$8,999	\$0	\$0

En Ejecución	Mejoramiento de la vía San Basilio - Sabanas, municipio de El Piñón - Magdalena	\$8,733	\$8,733	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Yee de Vainillal - Aserradero, municipio de Salamina - Magdalena	\$7,005	\$7,005	\$0	\$0
En Ejecución	La Montaña- San Antonio - Santa Ines- Limite Chibolo en el municipio de Tenerife	\$6,900	\$6,900	\$0	\$0
En Ejecución	Adecuación de cancha recreo deportiva de fútbol Finel de los Ríos, ubicada en el municipio de El Reten - Magdalena	\$6,370	\$6,370	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de la cancha de fútbol sector antigua feria del municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena	\$5,700	\$5,700	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Angostura - Janeiro, jurisdicción del municipio de San Zenón – Magdalena	\$5,586	\$5,586	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento De La Calidad De Las Viviendas Rurales A Través De La Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Aracataca, Magdalena	\$5,568	\$5,568	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía desde la Y hasta la loma los mangos sector quebrada seca en el municipio de Aracataca	\$5,547	\$5,547	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción del estadio municipal de Pivijay, Departamento de Magdalena	\$5,056	\$5,056	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la Vía Estación Villa – Sabanas de San Ángel, municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena.	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la Vía Ciénaga Zapayán - corregimiento Piedra Moler - Límites con Chibolo, municipio de Zapayán, departamento del Magdalena	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0

En Ejecución	Vía Pedracero - Argelia en el municipio de Ariguaní	\$4,999	\$4,999	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento Vía K21 Los Morones-Cuatro Bocas, Municipio de Guamal - Magdalena	\$4,950	\$4,950	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía El Bajo - Los Mangos en el municipio de Nueva Granada	\$4,623	\$4,623	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Plato - Cerro Grande en la zona rural del municipio de Plato	\$4,532	\$4,532	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Loma del Bálsamo - Bellavista en el municipio de Algarrobo	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0
En Ejecución	Vía la Estrella- Pueblo Nuevo en el municipio de Chibolo	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0
En Ejecución	Vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de La Estrella y Canoas en el municipio de Chibolo	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Reten- Las Flores en El Retén en el municipio de El Retén	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0
En Ejecución	Plato - Cerro Grande en el municipio del Plato	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Julepe - Puente El Chivo - la Y de Vainillal - Aserradero en el municipio de Salamina	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0
En Ejecución	Vía el Reten - Corregimiento el Bongo en el municipio de el Retén.	\$4,485	\$4,485	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Palomar - Bermejil en el municipio de San Zenón	\$4,463	\$4,463	\$0	\$0
En Ejecución	Vía corregimiento Santa Rosa de Lima km 25 de la vía el copey en el municipio de Fundación	\$4,460	\$4,460	\$0	\$0
En Ejecución	Vía que comunica al Corregimiento de Tío Goyo con Sabanas en el municipio de El Piñón	\$4,186	\$4,186	\$0	\$0
En Ejecución	Vía corregimiento Las Palmitas - vía acceso Santa Ana en el municipio de Santa Ana	\$4,157	\$4,157	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Palmor- Mekenkal en el municipio de Ciénaga	\$4,050	\$4,050	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Pinto Nuevo - Veladero en el municipio de Santa Barbara de Pinto	\$3,850	\$3,850	\$0	\$0

 Departamento Nacional de Planeación		INFORME SEMESTRAL PACTOS TERRITORIALES			Página 5 De 14	
En Ejecución	Vía San Sebastián - Los Galvis en el municipio de San Sebastián de Buena Vista	\$3,813	\$3,813	\$0	\$0	
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Prevención - Pijiño del Carmen, municipio de Pijiño del Carmen - Magdalena	\$3,812	\$3,812	\$0	\$0	
En Ejecución	Vía corregimiento La Colombia - vereda La Bogotana en el municipio de El Retén	\$3,810	\$3,810	\$0	\$0	
En Ejecución	Construcción de graderías cancha de fútbol, cerramiento perimetral en el corregimiento de Guaquirí del municipio de Pedraza, Magdalena	\$3,747	\$3,747	\$0	\$0	
En Ejecución	corredor vial Tamarindo - Nueva idea en el municipio de Algarrobo	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	
En Ejecución	Vía entre los Corregimientos de Caño de Palma y Menchiquejo en el municipio de El Banco	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	
En Ejecución	Mejoramiento Vía Campo Amor - San Francisco, Municipio de Guamal - Magdalena	\$2,897	\$2,897	\$0	\$0	
En Ejecución	Vía Garrapata en el municipio de Pivijay	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	
En Ejecución	Vía La María en el municipio de Remolino	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	
En Ejecución	Mejoramiento de la vía palo prieto – soplador en el municipio de pueblo viejo - departamento de Magdalena	\$2,502	\$2,502	\$0	\$0	
En Ejecución	Vías Sevillano a la vereda Mira y Ciénaga - La Aguja en el municipio de Ciénaga	\$2,500	\$2,500	\$0	\$0	
En Ejecución	Vía Sitio Nuevo - Rodeo - Sarcita en el municipio de Sitionuevo	\$2,322	\$2,322	\$0	\$0	
En Ejecución	Proyecto Sacúdete al parque Tipo 2 en el municipio de Ariguaní	\$2,300	\$1,840	\$460	\$0	
En Ejecución	Remodelación y adecuación del parque paraíso en el municipio de Ariguaní- Magdalena	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0	
En Ejecución	Vía Guaimaro - Aserradero en el municipio de Salamina	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	


En Ejecución	Vía Loma de Vitaria - Las Marías en el municipio de Santa Ana	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Santa Barbara de Pinto - Cienegueta en el municipio de Santa Barbara de Pinto	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía Punta de Piedras - corregimiento Piedras de Moler – Municipio de Zapayán en el departamento del Magdalena	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0
En Ejecución	Construcción de un sacúdete en el municipio de Sabanas de San Ángel	\$1,250	\$1,250	\$0	\$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía San Angel - Algarrobo, Municipio de Sabanas de San Angel, departamento de Magdalena	\$1,050	\$1,050	\$0	\$0
En Ejecución	Vía la Flecha - Salao - Julepe – Retirada en el municipio de Salamina	\$851	\$851	\$0	\$0
En Ejecución	Vía el difícil - Buenaventura en el municipio de Ariguani	\$850	\$850	\$0	\$0
En Ejecución	Corregimiento las planadas en el municipio de Plato	\$850	\$850	\$0	\$0
En Ejecución	Vía desde la Y de la vereda crucero azul hasta el puente del río Aracataca en el municipio de Aracataca	\$840	\$840	\$0	\$0
En Ejecución	Vía vereda Oceanía del municipio de Sabanas de San Ángel	\$800	\$800	\$0	\$0
En Ejecución	Vía El Brillante - San Jose de prevención en el municipio del Pijiño del Carmen	\$760	\$760	\$0	\$0
En Ejecución	Vía las Américas - Las tinas en el municipio de Nueva Granada	\$710	\$710	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Pedraza- Concordia en el municipio de Pedraza	\$690	\$690	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Concordia- Pedraza en el municipio de Concordia	\$686	\$686	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Pivijay-Corregimiento de Canoas en el municipio de Pivijay	\$650	\$650	\$0	\$0
En Ejecución	Vía Puente aguas negras - Las Balsas en el municipio de Sitionuevo	\$640	\$640	\$0	\$0

 Departamento Nacional de Planeación		INFORME SEMESTRAL PACTOS TERRITORIALES			Página 7 De 14	
En Ejecución	Intersección vía nacional 80 con vereda Aguas Vivas municipio de Plato Magdalena	\$590	\$590	\$0	\$0	
No Iniciado	Fortalecimiento de las capacidades productivas y generación de ingresos de la Subregión Río del departamento del Magdalena a través del establecimiento de un sistema de ganadería doble propósito sostenible	\$32,716	\$0	\$32,716	\$0	
No Iniciado	Proyecto fotovoltaico para los municipios de Plato, Nueva Granada, Ariguani y Sabanas de San Ángel	\$25,191	\$0	\$25,191	\$0	
No Iniciado	Mejoramiento de vías mediante la construcción de placa huella para los municipios de la Subregión Centro: Sábanas de San Ángel, Ariguani, Nueva granada, Chibolo, Plato y Tenerife	\$24,157	\$0	\$24,157	\$0	
No Iniciado	Construcción del comando distrito de policía Zona Bananera, departamento del Magdalena	\$22,627	\$22,627	\$0	\$0	
No Iniciado	Construcción de obras para la recuperación hidráulica y mitigación del riesgo del río Sevilla en el corregimiento de Guacamaya del municipio de Zona Bananera	\$19,895	\$19,895	\$0	\$0	
No Iniciado	Fortalecimiento de la cadena ovina en los municipios de la Subregión Centro: Sábanas de San Ángel, Ariguani, Nueva granada, Chibolo, Plato y Tenerife	\$19,326	\$0	\$19,326	\$0	
No Iniciado	Mejoramiento de las capacidades productivas, socio empresariales y organizacionales a familias campesinas, mediante la implementación de 205 unidades productivas dedicadas a la explotación de ovinos, en el municipio de Aracataca, Magdalena	\$12,018	\$0	\$12,018	\$0	

No Iniciado	Apoyo a la reconversión ambiental productiva de la ganadería en los municipios de Sabanas de San Ángel, Nueva Granada, Chibolo, El Reten, Tenerife, Pijiño del Carmen en el departamento del Magdalena	\$10,330	\$0	\$10,330	\$0
No Iniciado	Gestión de la demanda Fundación 24 horas de continuidad servicio de acueducto, municipio de Fundación, Magdalena	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y módulo de estación de bombeo de aguas residuales EBAR, municipio de El Banco, departamento del Magdalena	\$8,201	\$8,201	\$0	\$0
No Iniciado	Implementación de estrategias para la formalización de la propiedad en el suelo urbano del municipio de Aracataca y los corregimientos de Buenos Aires y Sampués departamento del Magdalena	\$5,500	\$5,500	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de estadio de futbol municipal de la cabecera de San Sebastián de Buenavista Magdalena	\$5,167	\$5,167	\$0	\$0
No Iniciado	Optimización del sistema de alcantarillado del sector La Alborada municipio de Ciénaga - Magdalena	\$4,952	\$4,952	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción del polideportivo municipal Tirso Armella Zambrano en el municipio de Chibolo magdalena	\$4,700	\$4,700	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de cancha sintética y parque recreacional "El mundo de las Maravillas" municipio de Santa Ana , Magdalena	\$4,390	\$4,390	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de 130 sistemas sépticos integrados para las familias de la vereda San Antonio del municipio de Sitionuevo	\$4,221	\$4,221	\$0	\$0

No Iniciado	Construcción de una cancha deportiva y zona recreativa Gilberto el Alcatraz García en el barrio La Unión en el casco urbano del municipio de Pueblo Viejo - Magdalena	\$3,907	\$3,907	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción plaza de mercado público del municipio de Plato - Magdalena	\$3,204	\$3,204	\$0	\$0
No Iniciado	Palacio municipal en el municipio de Nueva Granada	\$3,190	\$3,190	\$0	\$0
No Iniciado	Instalación sistema integrado de CCTV del municipio de Sabanas de San Ángel	\$3,051	\$2,746	\$305	\$0
No Iniciado	Construcción de cancha múltiple cubierta en el corregimiento de Concepción, municipio del Cerro de San Antonio	\$2,950	\$2,950	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de canchas deportivas y zonas recreativas - biosaludables en el municipio de Santa Barbara de Pinto - departamento del Magdalena	\$2,862	\$2,862	\$0	\$0
No Iniciado	Estación de Policía El Retén	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de pavimento en concreto rígido en diferentes calles y carreras del municipio de Ariguaní	\$1,241	\$1,241	\$0	\$0
No Iniciado	Construcción de cancha multifuncional en el corregimiento de Corralviejo en el municipio de Remolino	\$1,024	\$1,024	\$0	\$0
Total		\$1,267,722	\$1,133,021	\$134,702	\$0

Avance Consolidado (Comprometido + En Ejecución + Ejecutado) (Millones)



Estado de proyectos	Número de proyectos	Valor Indicativo
Ejecutado	3	\$8,722
En Ejecución	69	\$961,209
Total		\$969,931

Estado de proyectos	Número de proyectos	Valor Indicativo
---------------------	---------------------	------------------

No Iniciado	25	\$236,819
Total		\$236,819


Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)


36 Total Proyectos	\$223,465 Valor Indicativo (Millones)
------------------------------	---


\$223,265 Aporte indicativo DNP FRPT	\$200 Aporte indicativo territorio	\$0 Aporte indicativo Sector	\$0 Aporte indicativo Otros
--	--	--	---------------------------------------

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte Indicativo Otros
Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal del Caribe Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de Algarrobo departamento del Magdalena.	Ejecutado	\$1,473	\$1,473	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento De La Calidad De Las Viviendas Rurales A Través De La Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Aracataca, Magdalena	En Ejecución	\$5,568	\$5,568	\$0	\$0	\$0
Implementación de estrategias para la formalización de la propiedad en el suelo urbano del municipio de Aracataca y los corregimientos de Buenos Aires y Sampués departamento del Magdalena	No Iniciado	\$5,500	\$5,500	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Ariguani - Buenavista en el municipio de Ariguani departamento del Magdalena	En Ejecución	\$9,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0

Construcción de cancha múltiple cubierta en el corregimiento de Concepción, municipio del Cerro de San Antonio	No Iniciado	\$2,950	\$2,950	\$0	\$0	\$0
Construcción del polideportivo municipal Tirso Armella Zambrano en el municipio de Chibolo magdalena	No Iniciado	\$4,700	\$4,700	\$0	\$0	\$0
Optimización del sistema de alcantarillado del sector La Alborada municipio de Ciénaga - Magdalena	No Iniciado	\$4,952	\$4,952	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Concordia – Bálsamo del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	En Ejecución	\$10,800	\$10,800	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, departamento del Magdalena	Ejecutado	\$5,800	\$5,800	\$0	\$0	\$0
Construcción de módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y módulo de estación de bombeo de aguas residuales EBAR, municipio de El Banco, departamento del Magdalena	No Iniciado	\$8,201	\$8,201	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía San Basilio - Sabanas, municipio de El Piñón - Magdalena	En Ejecución	\$8,733	\$8,733	\$0	\$0	\$0
Estación de Policía El Retén	No Iniciado	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0	\$0

 Departamento Nacional de Planeación	INFORME SEMESTRAL PACTOS TERRITORIALES					Página 1 De 14 2	
Adecuación de cancha recreo deportiva de fútbol Finel de los Ríos, ubicada en el municipio de El Reten - Magdalena	En Ejecución	\$6,370	\$6,370	\$0	\$0	\$0	
Gestión de la demanda Fundación 24 horas de continuidad servicio de acueducto, municipio de Fundación, Magdalena	No Iniciado	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento Vía K21 Los Morones- Cuatro Bocas, Municipio de Guamal - Magdalena	En Ejecución	\$4,950	\$4,950	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento Vía Campo Amor - San Francisco, Municipio de Guamal - Magdalena	En Ejecución	\$2,897	\$2,897	\$0	\$0	\$0	
Construcción de la cancha de fútbol sector antigua feria del municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena	En Ejecución	\$5,700	\$5,700	\$0	\$0	\$0	
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bahiahonda del municipio de Pedraza	En Ejecución	\$10,464	\$10,464	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento de la vía Prevención - Pijiño del Carmen, municipio de Pijiño del Carmen - Magdalena	En Ejecución	\$3,812	\$3,812	\$0	\$0	\$0	
Construcción del estadio municipal de Pivijay, Departamento de Magdalena	En Ejecución	\$5,056	\$5,056	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento de la vía Piñuelas Chinoblas en el municipio de Pivijay, Magdalena	Ejecutado	\$1,600	\$1,400	\$200	\$0	\$0	
Construcción plaza de mercado público del municipio de Plato - Magdalena	No Iniciado	\$3,204	\$3,204	\$0	\$0	\$0	

 Departamento Nacional de Planeación	INFORME SEMESTRAL PACTOS TERRITORIALES					Página 1 De 14 3
Construcción de una cancha deportiva y zona recreativa Gilberto el Alcatraz García en el barrio La Unión en el casco urbano del municipio de Pueblo Viejo - Magdalena	No Iniciado	\$3,907	\$3,907	\$0	\$0	\$0
Construcción de cancha multifuncional en el corregimiento de Corralviejo en el municipio de Remolino	No Iniciado	\$1,024	\$1,024	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la Vía Estación Villa – Sabanas de San Ángel, municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena.	En Ejecución	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía San Angel - Algarrobo, Municipio de Sabanas de San Angel, departamento de Magdalena	En Ejecución	\$1,050	\$1,050	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Yee de Vainillal - Aserradero, municipio de Salamina - Magdalena	En Ejecución	\$7,005	\$7,005	\$0	\$0	\$0
Construcción de estadio de fútbol municipal de la cabecera de San Sebastián de Buenavista Magdalena	No Iniciado	\$5,167	\$5,167	\$0	\$0	\$0
Mejoramiento de la vía Angostura - Janeiro, jurisdicción del municipio de San Zenón – Magdalena	En Ejecución	\$5,586	\$5,586	\$0	\$0	\$0
Construcción de cancha sintética y parque recreacional "El mundo de las Maravillas" municipio de Santa Ana , Magdalena	No Iniciado	\$4,390	\$4,390	\$0	\$0	\$0

 Departamento Nacional de Planeación		INFORME SEMESTRAL PACTOS TERRITORIALES				Página 1 De 14 4	
Construcción de canchas deportivas y zonas recreativas - biosaludables en el municipio de Santa Barbara de Pinto - departamento del Magdalena	No Iniciado	\$2,862	\$2,862	\$0	\$0	\$0	
Construcción de 130 sistemas sépticos integrados para las familias de la vereda San Antonio del municipio de Sitionuevo	No Iniciado	\$4,221	\$4,221	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento de la vía Real del Obispo - Santa Ines en el municipio de Tenerife, Departamento del Magdalena	En Ejecución	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	
Mejoramiento de la Vía Ciénaga Zapayán - corregimiento Piedra Moler - Límites con Chibolo, municipio de Zapayán, departamento del Magdalena	En Ejecución	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	
Construcción de obras para la recuperación hidráulica y mitigación del riesgo del rio Sevilla en el corregimiento de Guacamayal del municipio de Zona Bananera	No Iniciado	\$19,895	\$19,895	\$0	\$0	\$0	
Construcción del comando distrito de policía Zona Bananera, departamento del Magdalena	No Iniciado	\$22,627	\$22,627	\$0	\$0	\$0	
Total		\$223,465	\$223,265	\$200	\$0	\$0	

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

<https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Magdalena.aspx>

Anexo

Fondo Regional para los Pactos Territoriales

Proyectos en ejecución y ejecutados

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de pavimento rígido del tramo I de la vía Troncal del Caribe Poblado Loma del Bálsamo en el municipio de Algarrobo departamento del Magdalena.

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$1,473 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Terminado Estado Detallado	
\$1,473 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Algarrobo
BPIN	2020470300002	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	162-2221186	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	110	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	3/16/2022


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejoramiento de 460.22 metros con pavimento hidráulico y la intervención de puntos críticos para mejorar las condiciones de drenaje superficial, en la vía comprendida entre la Troncal del Caribe iniciando en el corregimiento Loma del Bálsamo hacia el corregimiento de Bellavista	Vía terciaria mejorada	0.46 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

22/12/2022 Fecha de Suscripción	28/02/2023 Fecha de Inicio	10 Plazo en Meses	28/12/2023 Fecha Terminación	3,135 Número de Beneficiarios
\$1,471 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$1,471 Presupuesto Comprometido Total (millones)		

Avance físico del proyecto

28/11/2023 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	100% % Ejecutado
--	-----------------------------	----------------------------

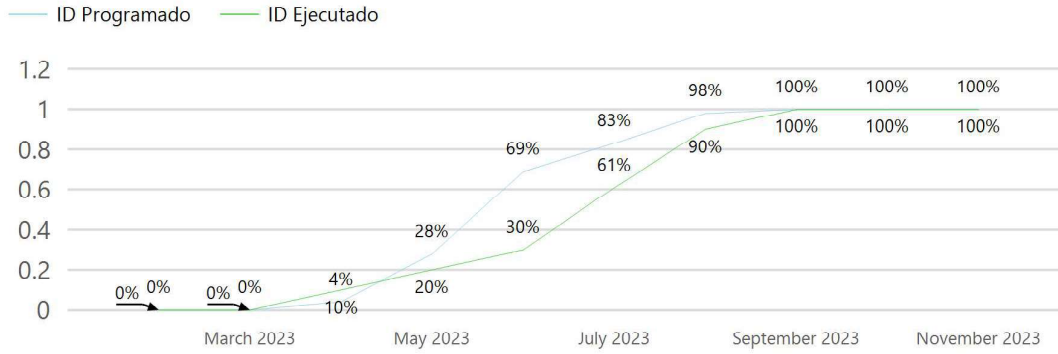

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera del municipio de Concordia al corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia, departamento del Magdalena

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$5,800 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Terminado Estado Detallado	
\$5,800 Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)	\$0 Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)	\$0 Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Concordia
BPIN	2022472050024	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	169-2230013	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	118	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/21/2022


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 1.6 km de vías en pavimento rígido. Adicionalmente, se construirá 1 alcantarilla y 5 box coulvert	Vía terciaria mejorada	1.6 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

17/02/2023 Fecha de Suscripción	3/03/2023 Fecha de Inicio	11 Plazo en Meses	3/02/2024 Fecha Terminación	0 Número de Beneficiarios
\$5,651 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector	\$0 Presupuesto Comprometido Territorio		
\$5,651 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

3/01/2024 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	100% % Ejecutado
---	-----------------------------	----------------------------

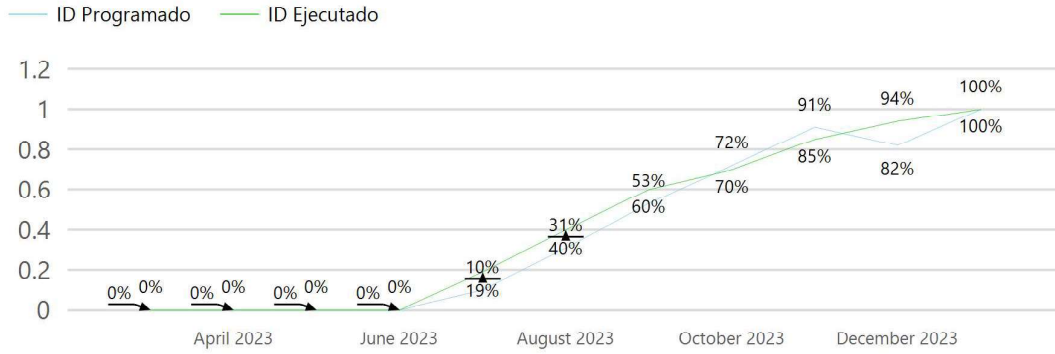

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la vía Concordia – Bálamo del municipio de Concordia, departamento del Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$10,800

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$10,800

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Concordia
BPIN	2022472050023	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	170-2230021	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	117	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/21/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 2.98 km de vías en pavimento rígido. Adicionalmente, se construirá 4 alcantarillas y 5 box coulvert	Vía terciaria mejorada	2.98
		Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

17/02/2023

Fecha de Suscripción

3/03/2023

Fecha de Inicio

18

Plazo en Meses

18/09/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$10,785

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$10,785

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

3/04/2024


Fecha de Corte Avance

69%

% Programado

81%

% Ejecutado

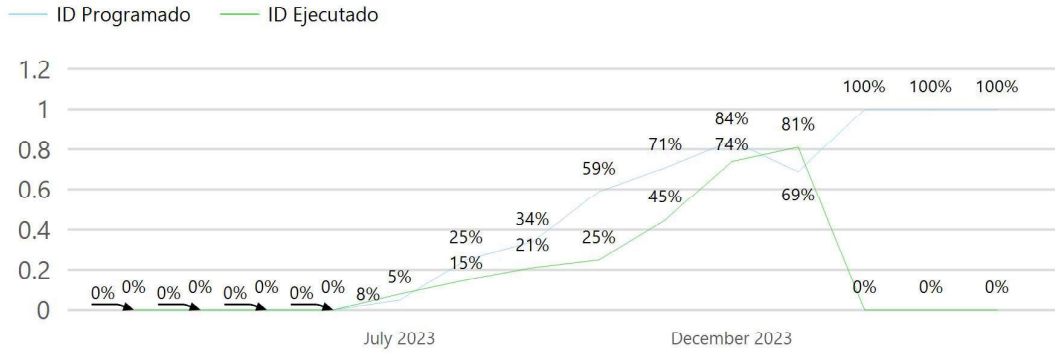

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$10,785
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$6,800
Valor Ejecutado (mill)

63%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la vía Real del Obispo - Santa Ines en el municipio de Tenerife, Departamento del Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$12,000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$12,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Tenerife
BPIN	2022477980002	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	171-2230022	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	142	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/23/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 4.4 km de vía en pavimento rígido. Adicionalmente, se construirán 7 obras de drenaje.	Vía terciaria mejorada	4.4000000000000004
		Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

22/02/2023

Fecha de Suscripción

5/04/2023

Fecha de Inicio

16

Plazo en Meses

5/08/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$11,909

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$11,909

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

5/07/2024


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

87%

% Ejecutado

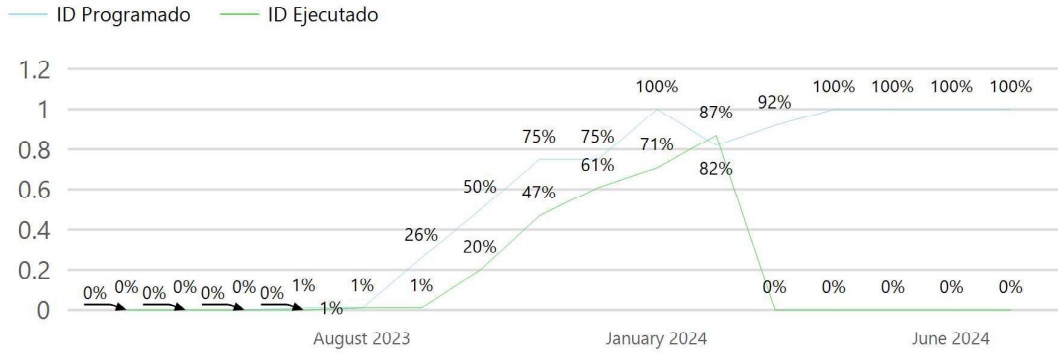

Avance Financiero del proyecto

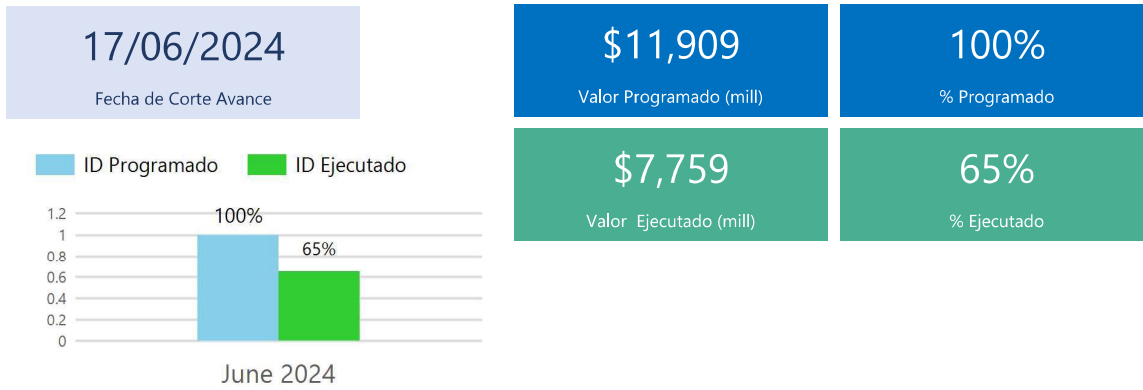

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

**Mejoramiento de la vía Piñuelas Chinoblas en el municipio de Pivijay,
Magdalena**

Estado Proyecto

Ejecutado

Información general del contrato específico

\$1,600

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Terminado

Estado Detallado

\$1,400

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$200

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Pivijay
BPIN	2022475510036	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	172-2230109	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	129	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	12/19/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
0	Vía terciaria mejorada	0.6510000000000002

Información específica de ejecución contrato específico

8/05/2023

Fecha de Suscripción

6/06/2023

Fecha de Inicio

8

Plazo en Meses

6/02/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$1,400

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$200

Presupuesto Comprometido Territorio

\$1,600

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/12/2023


Fecha de Corte Avance

100%

% Programado

100%

% Ejecutado

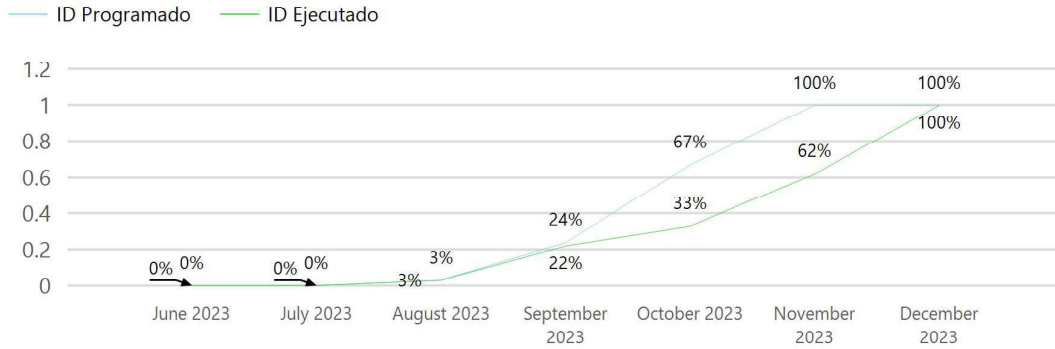

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la vía Yee de Vainilla - Aserradero, municipio de Salamina - Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$7,005

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$7,005

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Salamina
BPIN	2022476750101	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	173-2230143	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	136	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/16/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 2.4 km de vía en pavimento rígido. Adicionalmente, se construirán 5 obras de drenaje.	Vía terciaria mejorada	2.4
		Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

15/06/2023

Fecha de Suscripción

13/07/2023

Fecha de Inicio

14

Plazo en Meses

13/09/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$7,005

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$7,005

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

13/08/2024


Fecha de Corte Avance

82%

% Programado

64%

% Ejecutado

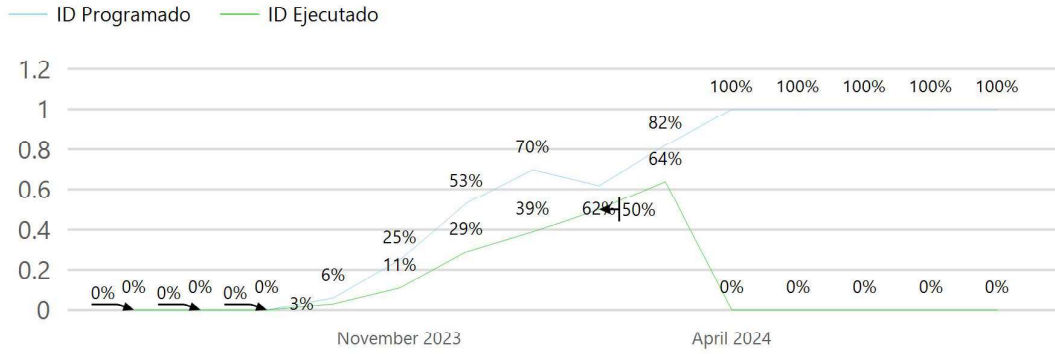

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la vía Ariguani - Buenavista en el municipio de Ariguani departamento del Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$9,000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$9,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Ariguani
BPIN	2022470580032	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	174-2230145	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	113	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	3/16/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 6.2 km de vías en placa huella. Adicionalmente se construirán 10 alcantarillas de 36".	Vía terciaria mejorada	6.2
		Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

16/06/2023

Fecha de Suscripción

13/07/2023

Fecha de Inicio

13

Plazo en Meses

13/08/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$9,000

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$9,000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

13/07/2024


Fecha de Corte Avance

89%


% Programado

71%

% Ejecutado

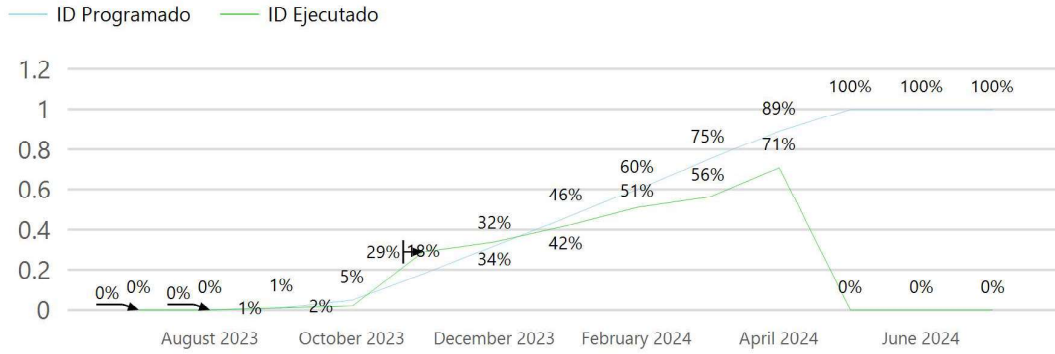

Avance Financiero del proyecto

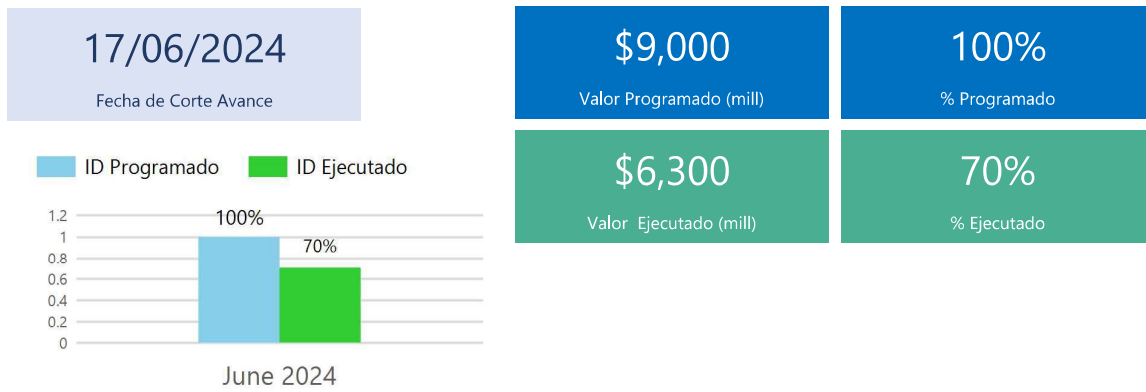

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bahiahonda del municipio de Pedraza

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$10,464

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

Suspendido

Estado Detallado

\$10,464

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Municipio Intervención	Pedraza
BPIN	2023475410003	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	175-2230146	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	127	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	3/30/2023


Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de la red principal de alcantarillado sanitario en el corregimiento de Bahiahonda con las siguientes actividades principales: Instalación de red principal con un diámetro de 8" con longitud de 6,684 m; Conexiones domiciliarias en tubería PVC de 6" con longitud de 4.673,50 m; Construcción de 102 pozos de inspecciones; Estación de bombeo, desarenador, estructura reactor UASB, sedimentador secundario, espesadores, lechos de secado y Planta de tratamiento de aguas residuales, incluye sistema hidráulico y eléctrico.		

Información específica de ejecución contrato específico

15/06/2023	10/07/2023	12	10/07/2024	0
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios
\$10,458	\$0	\$0		
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio		
\$10,458				
Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

10/06/2024	0%	0%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

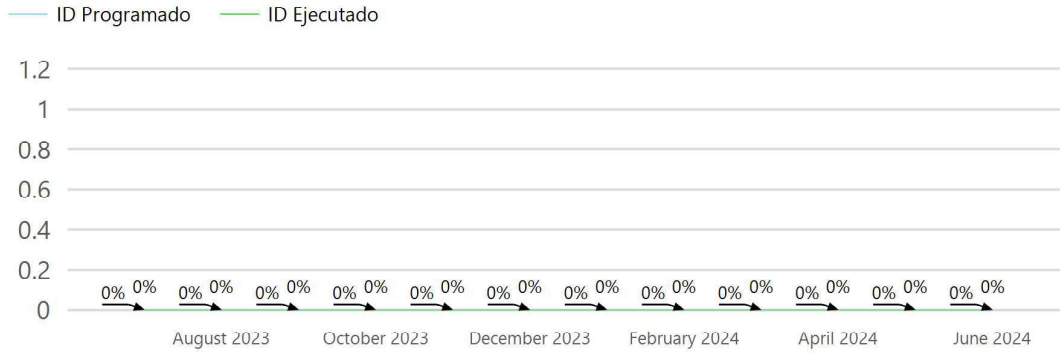

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$10,458
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$3,139
Valor Ejecutado (mill)

30%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la Vía Estación Villa – Sabanas de San Ángel, municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena.

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$5,000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$5,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Sabanas de San Ángel
BPIN	2022476600012	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	176-2230147	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	135	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/1/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
0		

Información específica de ejecución contrato específico

16/06/2023

Fecha de Suscripción

4/07/2023

Fecha de Inicio

12

Plazo en Meses

4/07/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$5,000

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$5,000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

4/06/2024


Fecha de Corte Avance

83%


% Programado

88%

% Ejecutado

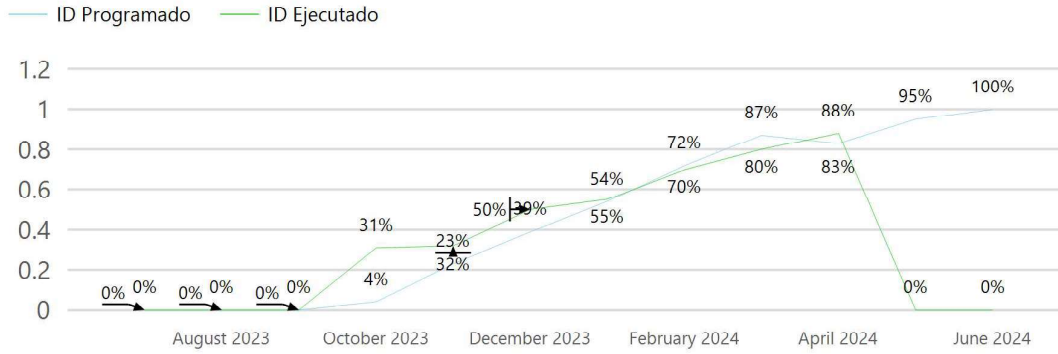

Avance Financiero del proyecto

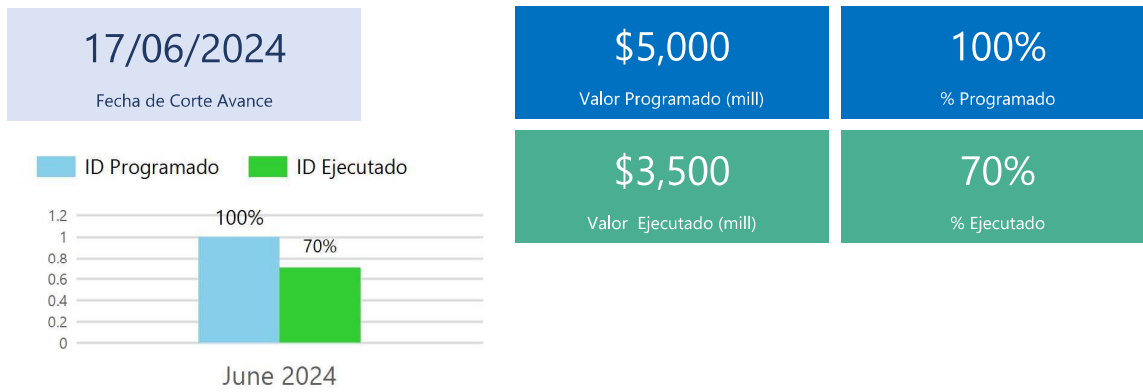

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción del estadio municipal de Pivijay, Departamento de Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$5,056

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$5,056

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreación	Municipio Intervención	Pivijay
BPIN	2021745510056	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	177-2230149	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	130	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	4/26/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 6.354,3 m2 del estadio municipal de Pivijay ubicado en el corregimiento de Media Luna, el cual incluye 4.512 m2 de cancha sintética de 94 x 48 m marcada y porterías en hierro, zona de circulación en adoquín peatonal de 1.166,9 m2 y bordillo perimetral, graderías con zona de discapacitados, cubierta metálica, cobertura vegetal con especies menores y césped y baños.	Cancha construida	1
		Número de canchas

Información específica de ejecución contrato específico

16/06/2023	17/08/2023	14	17/10/2024	0
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios


\$5,056	\$0	\$0
Presupuesto Comprometido DNP FRPT	Presupuesto Comprometido Sector	Presupuesto Comprometido Territorio

\$5,056

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/09/2024	51%	7%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

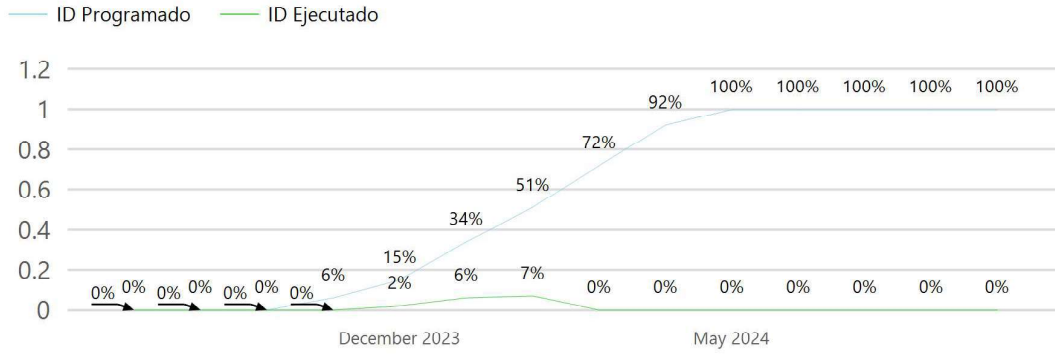

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$5,056
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$1,517
Valor Ejecutado (mill)

30%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la vía Angostura - Janeiro, jurisdicción del municipio de San Zenón – Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$5,586

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$5,586

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	San Zenón
BPIN	2022477030055	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	180-2230144	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	138	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	10/24/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 3 km de vía en pavimento rígido. Adicionalmente, se construirán 8 obras de drenaje.	Vía terciaria mejorada	3
		Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

22/06/2023

Fecha de Suscripción

13/07/2023

Fecha de Inicio

12

Plazo en Meses

13/07/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$5,586

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$5,586

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

13/06/2024


Fecha de Corte Avance

12%

% Programado

26%

% Ejecutado

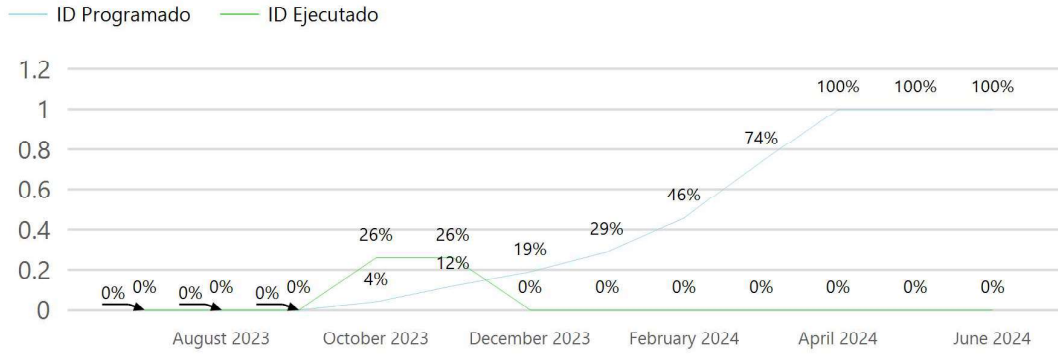

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la vía San Angel - Algarrobo, Municipio de Sabanas de San Angel, departamento de Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$1,050

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$1,050

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Sabanas de San Ángel
BPIN	2022476600014	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	181-2230151	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	134	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/1/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto consiste en el mejoramiento de la Vía Sabanas de San Ángel – Algarrobo Municipio de Sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, el cual consta de el mejoramiento de 0,64 kilómetros de vía		

Información específica de ejecución contrato específico

21/06/2023

Fecha de Suscripción

24/07/2023

Fecha de Inicio

11

Plazo en Meses

24/06/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$1,050

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$530

Presupuesto Comprometido Territorio

\$1,580

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

24/04/2024


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

100%

% Ejecutado

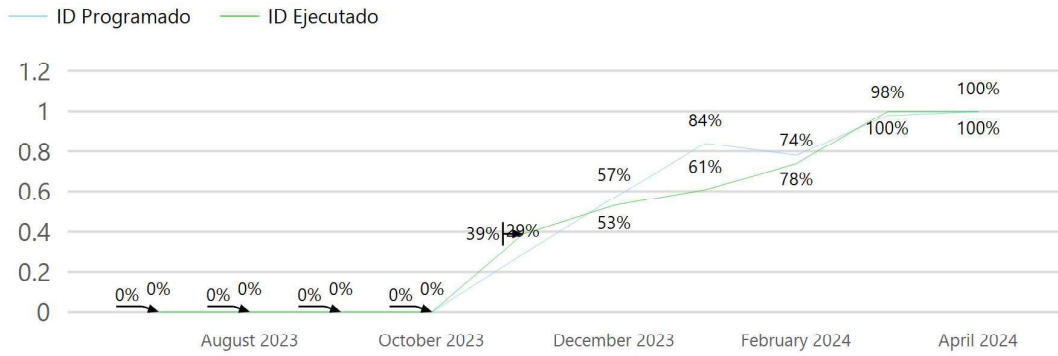

Avance Financiero del proyecto

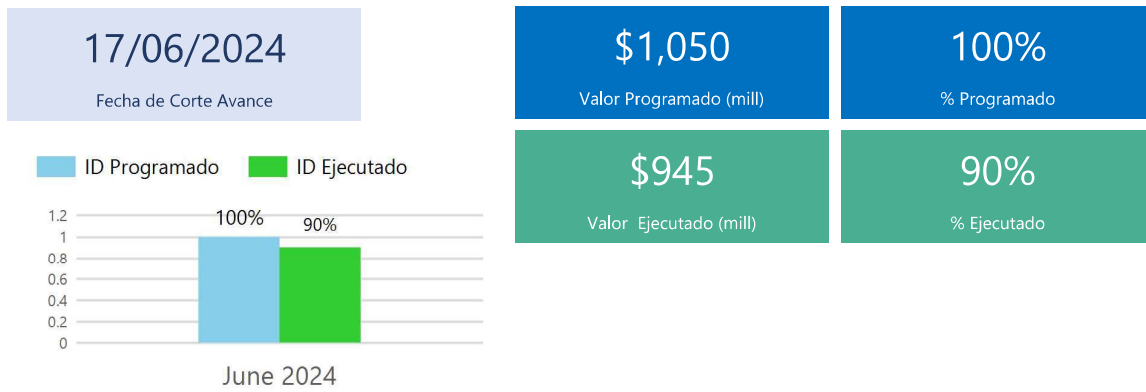

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la vía San Basilio - Sabanas, municipio de El Piñón - Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$8,733

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$8,733

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	El Piñón
BPIN	2023472580007	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	184-2230162	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	120	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	1/11/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 2.84 km de vía en pavimento rígido.	Vía terciaria mejorada	2.84
		Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

17/08/2023

Fecha de Inicio

12

Plazo en Meses

17/08/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$8,733

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$8,733

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/07/2024


Fecha de Corte Avance

46%

% Programado

42%

% Ejecutado

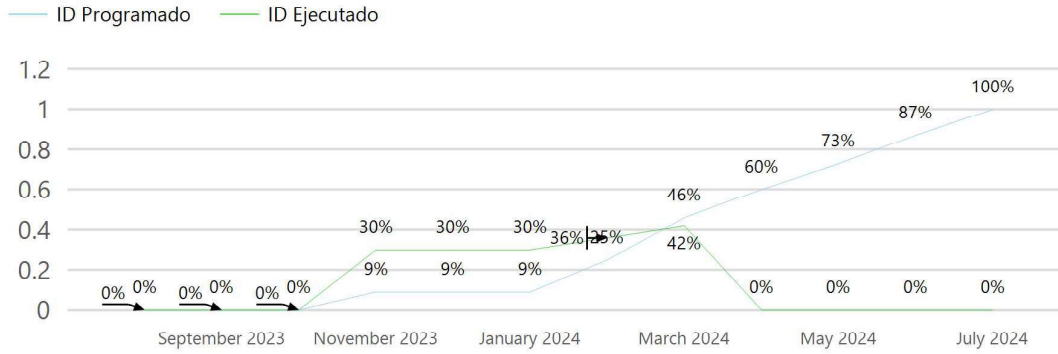

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la Vía Ciénaga Zapayán - corregimiento Piedra Moler - Límites con Chibolo, municipio de Zapayán, departamento del Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$5,000

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$5,000

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Zapayán
BPIN	2023479600001	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	185-2230163	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	143	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	3/2/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
0	Vía terciaria mejorada	1.56

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

1/08/2023

Fecha de Inicio

11

Plazo en Meses

1/07/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$5,000

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$5,000

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

1/06/2024


Fecha de Corte Avance

88%


% Programado

86%

% Ejecutado

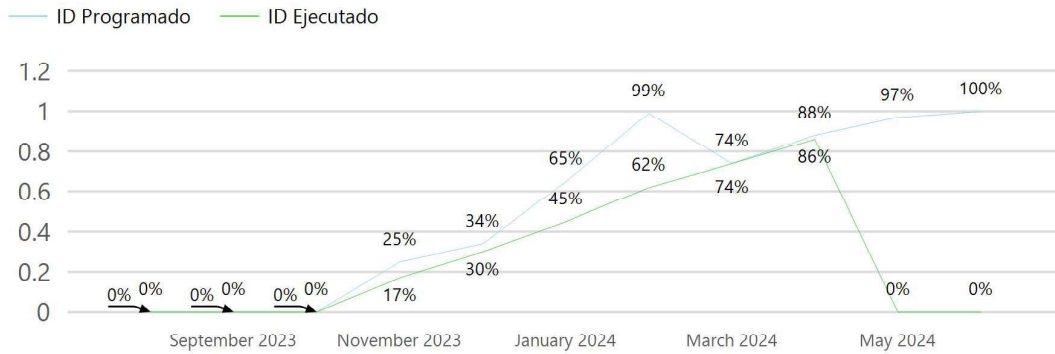

Avance Financiero del proyecto

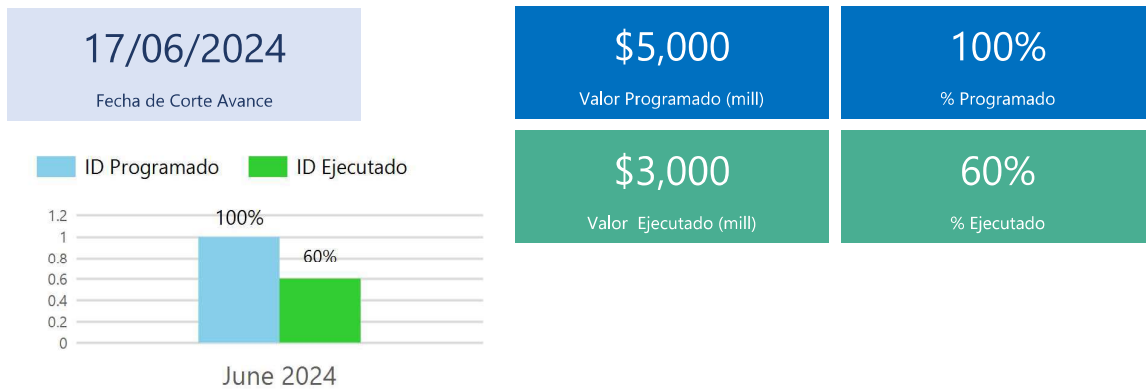

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Adecuación de cancha recreo deportiva de fútbol Finel de los Ríos, ubicada en el municipio de El Reten - Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$6,370

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$6,370

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	El Retén
BPIN	2022472680077	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	186-2230164	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	121	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	4/26/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de cancha para gramdo natural con normal para competencias nacionales e internacionales con un área 5.376 m2, con graderías, baños, camerinos, entre otros que cubren un área de intervención total de 10216 m2	Cancha adecuada	1
		Número de canchas

Información específica de ejecución contrato específico

27/06/2023

Fecha de Suscripción

28/07/2023

Fecha de Inicio

22

Plazo en Meses

28/05/2025

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$6,370

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$6,370

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

28/04/2025


Fecha de Corte Avance

16%

% Programado

22%

% Ejecutado

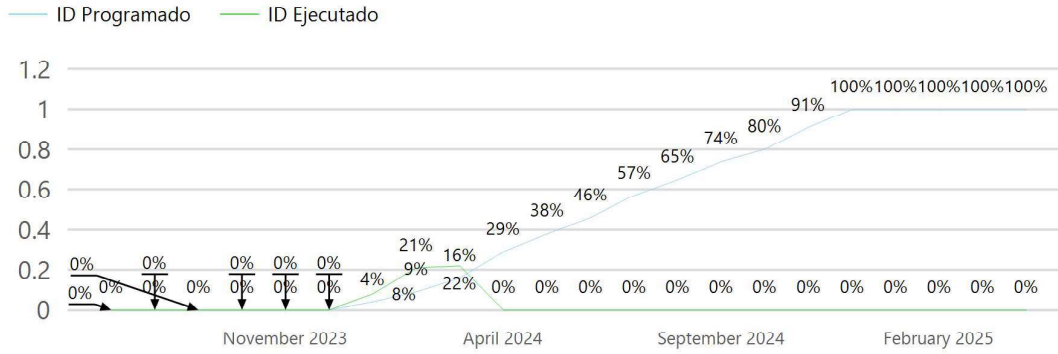

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$6,370
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$1,911
Valor Ejecutado (mill)

30%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento Vía K21 Los Morones-Cuatro Bocas, Municipio de Guamal - Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$4,950

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$4,950

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Guamal
BPIN	2023473180005	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	187-2230168	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	124	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	1/11/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
	Vía terciaria mejorada	1.72

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

17/08/2023

Fecha de Inicio

11

Plazo en Meses

17/07/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$4,950

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$4,950

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/06/2024


Fecha de Corte Avance

89%

% Programado

90%

% Ejecutado

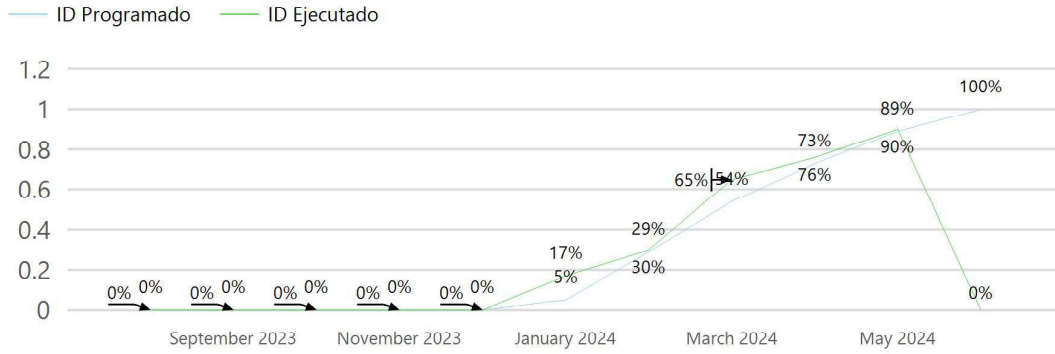

Avance Financiero del proyecto



* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento De La Calidad De Las Viviendas Rurales A Través De La Instalación De Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales En Zonas No Interconectadas Del Municipio De Aracataca, Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$5,568

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En ejecución de obra

Estado Detallado

\$5,568

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Minas y Energía	Municipio Intervención	Aracataca
BPIN	20201301010531	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	188-2230169	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	112	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	12/5/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	222
		Numero de unidades

Construcción de Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en la zona rural del Municipio de Aracataca, Las metas del proyecto, consiste en la instalación de 222 soluciones de energía solar fotovoltaica autónomas distribuidas así en las veredas Agua Bendita 10, Arenosa 8, Bocatoma 3, Cauca 7, Cerro Azul 25, Dwanawimaku 6, El Torito 7, El Volante 7, Fuente Alta 8, Fuente Baja 12, La Arenosa 7, La Divisa 2, La Fuente 32, Macaraquilla 19, Marimonda 6, Palestina 1, Punto Blanco 8, Quebrada Seca 5, Rio De Piedras 11, Tehobromina 11 Y Tranquilandia 27.

Estas soluciones estarán conformadas por 2 módulos solares de 400 wp, capacidad total de 800 vatios pico. Los módulos fotovoltaicos estarán soportados en una estructura metálica, elevadas 3 metros del suelo por un poste metálico de 4" sobre una base en concreto de 3000 p.s.i. la estructura estará a una distancia de aprox 2 metros de la vivienda.

El sistema cuenta con un controlador MMPT de 40 amperios, haciéndolos trabajar siempre en el punto de máxima potencia; este se encargará de regular la energía que los paneles solares envían al banco de baterías y que controla la carga y la descarga de forma eficiente.

Se utilizará una batería de Ion-litio de ciclo profundo con capacidad de 120 Ah \pm 25.6 VDC \pm mínimo 3650 ciclos al 80% DOD.

La corriente que sale del banco de baterías pasa por el inversor de 1000 watt, de onda completa sinusoidal, el cual transforma la corriente continua que le llega del banco de baterías a 24v en corriente alterna a 120v para poder alimentar los electrodomésticos y luminarias que se conecten. Puesta a Tierra: una varilla de cobre desnuda de mínimo 2,4 m de longitud.

Todos los equipos estarán en unos gabinetes y se contempla una etapa de formación y socialización para el buen uso del sistema.


Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023 Fecha de Suscripción	14/09/2023 Fecha de Inicio	14 Plazo en Meses	14/11/2024 Fecha Terminación	0 Número de Beneficiarios
\$5,568 Presupuesto Comprometido DNP FRPT	\$0 Presupuesto Comprometido Sector		\$25 Presupuesto Comprometido Territorio	
\$5,593 Presupuesto Comprometido Total (millones)				

Avance físico del proyecto

14/10/2024	37%	3%
------------	-----	----

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado
-----------------------	--------------	-------------

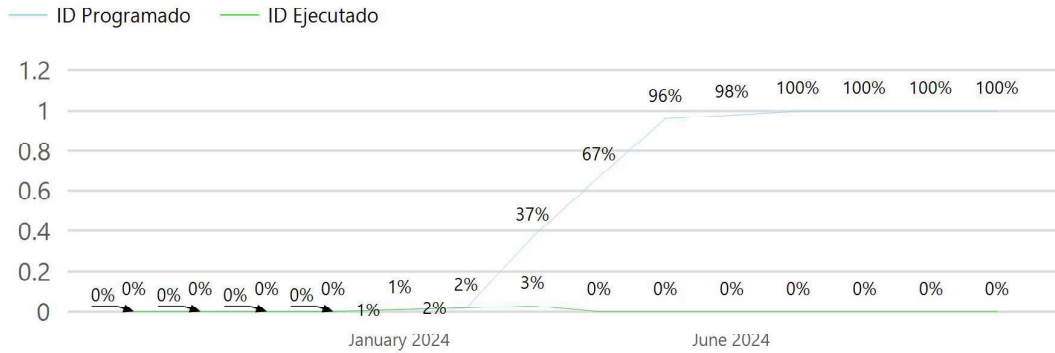

Avance Financiero del proyecto

17/06/2024
Fecha de Corte Avance

\$5,568
Valor Programado (mill)

100%
% Programado



\$1,670
Valor Ejecutado (mill)

30%
% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento de la vía Prevención - Pijiño del Carmen, municipio de Pijiño del Carmen - Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$3,812

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$3,812

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Pijiño del Carmen
BPIN	2022475450148	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	190-2230171	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	128	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	11/1/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
	Vía terciaria mejorada	1.1779999999999999

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

31/07/2023

Fecha de Inicio

14

Plazo en Meses

30/09/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$3,812

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$3,812

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

31/08/2024

Fecha de Corte Avance

36%

% Programado

36%

% Ejecutado

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Mejoramiento Vía Campo Amor - San Francisco, Municipio de Guamal - Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$2,897

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En contratación derivada

Estado Detallado

\$2,897

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Transporte	Municipio Intervención	Guamal
BPIN	2023473180022	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	192-2230173	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	125	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	1/11/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
	Vía terciaria mejorada	0.9569999999999999

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023

Fecha de Suscripción

17/08/2023

Fecha de Inicio

9

Plazo en Meses

17/05/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$2,897

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$0

Presupuesto Comprometido Territorio

\$2,897

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

17/04/2024


Fecha de Corte Avance

100%


% Programado

100%

% Ejecutado

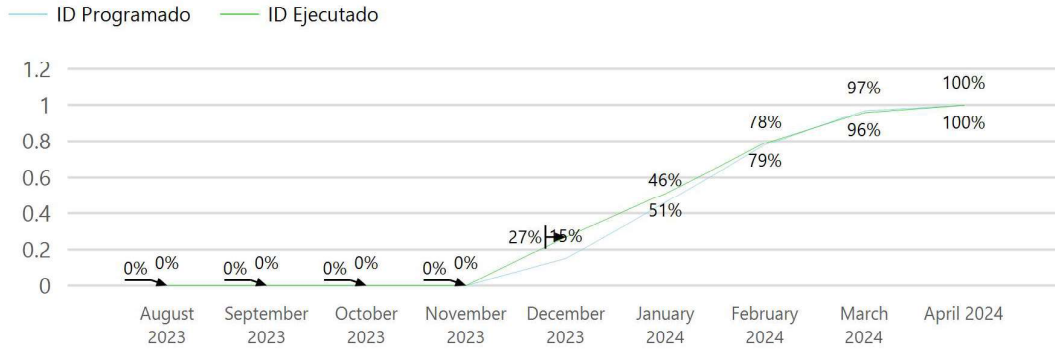

Avance Financiero del proyecto

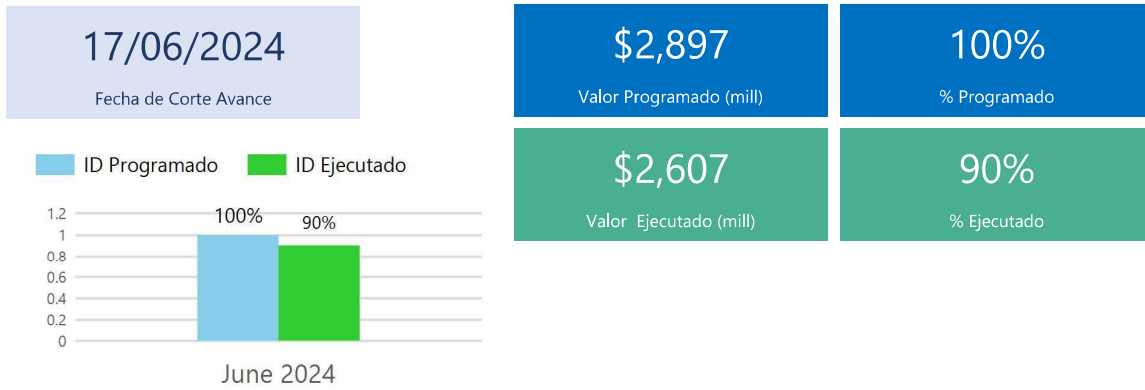

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.

Pacto Territorial Magdalena

Fecha de Corte

17/06/2024

Construcción de la cancha de fútbol sector antigua feria del municipio de Nueva Granada departamento del Magdalena

Estado Proyecto

En Ejecución

Información general del contrato específico

\$5,700

Valor Indicativo del Proyecto (millones)

En legalización de permisos,

Estado Detallado

obra
\$5,700

Aporte Indicativo DNP FRPT (millones)

\$0

Aporte Indicativo Nación - Sector (millones)

\$0

Aporte indicativo Entidades Territoriales (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	Municipio Intervención	Nueva Granada
BPIN	2021474600047	Área de influencia	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	196-2230388	Es Inversión climática?	No
No. CONPES Anexo B	126	Tiene viabilidad?	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	Fecha viabilidad	5/15/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una cancha de futbol 11 en grama sintética en el sector Antigua Feria, con dimensiones de 90x 45m con su respectiva área de seguridad, además se plantea graderías cubiertas en concreto y acero, servicios complementarios como unidades sanitarias, camerinos, rampas de acceso, taquillas, parqueaderos, cerramiento perimetral, instalaciones eléctricas e iluminación para una área de intervención total de 8630,51 M2	Cancha construida y dotada	1
		Número de canchas

Información específica de ejecución contrato específico

29/12/2023

Fecha de Suscripción

12/01/2024

Fecha de Inicio

9

Plazo en Meses

12/10/2024

Fecha Terminación

0

Número de Beneficiarios

\$5,699

Presupuesto Comprometido DNP FRPT

\$0

Presupuesto Comprometido Sector

\$295

Presupuesto Comprometido Territorio

\$5,994

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

12/09/2024


Fecha de Corte Avance

88%


% Programado

0%

% Ejecutado

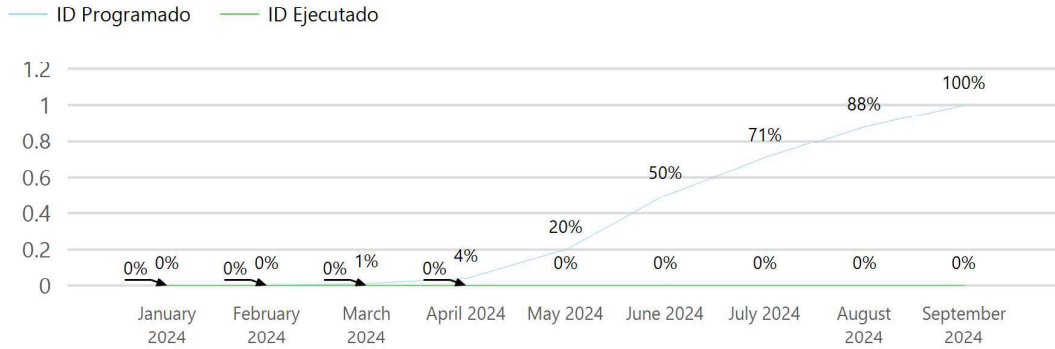

Avance Financiero del proyecto

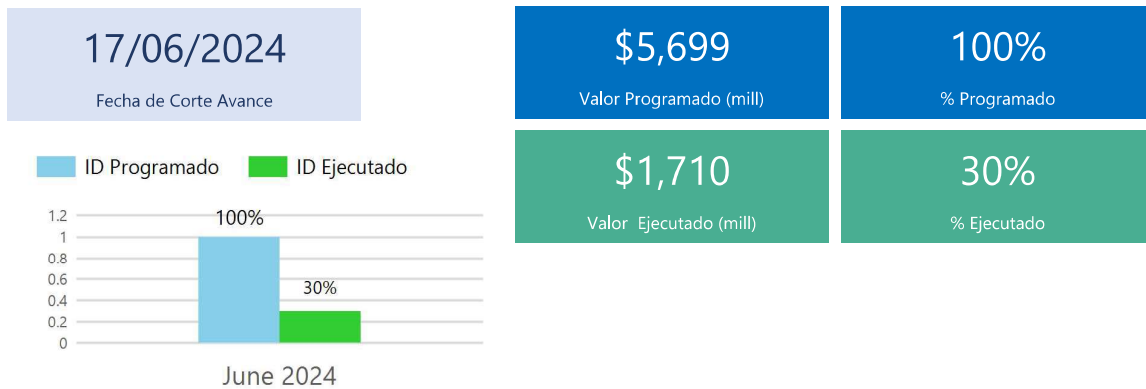

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de legalización de contratos específicos o de contratación de obra e inventoría.
