Pacto Territorial Casanare

27/02/2021	10	27/02/2031	55	54%
Fecha suscripción	Plazo en años	Fecha de Terminación	Meses para vencimiento	% Tiempo Transcurrido

19	4	15	$903.054
Total Proyectos	Proyectos DNP - FRPT	Proyectos Nación territorio	Valor Indicativo (Millones)

$490.425	$412.629	$0
Aporte indicativo nación (Millones)	Aporte indicativo territorio (Millones)	Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$85.212	$78.345	$6.867	$0
Comercio, Industria y Turismo	$125.653	$0	$125.653	$0
Deporte y Recreacion	$43.000	$19.068	$23.932	$0
Salud y Protección Social	$225.573	$106.700	$118.873	
Transporte	$419.200	$284.629	$134.571	$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	$4.416	$1.683	$2.733	$0
Total	**$903.054**	**$490.425**	**$412.629**	**$0**

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Comprometido Total	Comprometido Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$83.919	$77.195	$6.724	$0
Comercio, Industria y Turismo	$11.355	$0	$11.355	$0
Deporte y Recreacion	$0	$0	$0	$0
Salud y Protección Social				
Transporte	$231.037	$176.738	$54.299	$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	$4.416	$0	$4.416	$0
Total	**$330.727**	**$253.933**	**$76.794**	**$0**

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nación y Otros

Pacto Territorial	Entidad Nación aportante	Entidad Otros aportante	Presupuesto Comprometido Nación	Presupuesto Comprometido Aporte Otros
Pacto Territorial Casanare			$0	$0
	DNP		$18.497	$0
	DNP-FRPT		$44.591	$0
	INVIAS		$144.423	$0
	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)		$46.422	$0

Compromisos de Recursos por Parte de la Nación y el Territorio

Pacto Territorial	Aporte Indicativo Nación	Presupuesto Comprometido Nación	% Avance Nación
Pacto Territorial Casanare	$490.425	$253.933	51,78%

Pacto Territorial	Aporte Indicativo Territorio	Presupuesto Comprometido Territorio	% Avance Territorio
Pacto Territorial Casanare	$412.629	$76.794	18,61%

Avance Consolidado (En Ejecución + Terminados) (Millones)

36,62%

$330.727

Valor Comprometido = En Ejecución + Terminados

Número de Proyectos por Estado

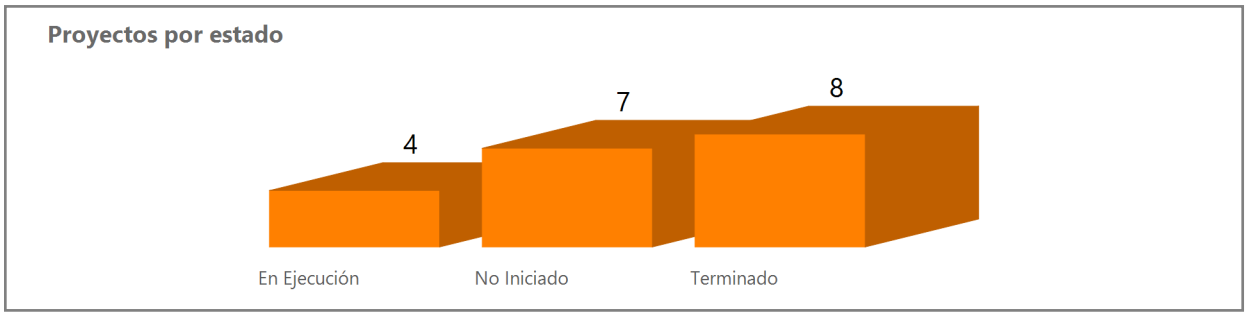

Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

Año	Trimestre	Trimestre	Presupuesto Comprometido Total	% Avance Consolidado	Proyectos En Ejecución	Proyectos Terminados
2024	1. Trim. 04	1. Trim. 04 - 2024	$325.661	56,41%	9	3
2025	2. Trim. 01	2. Trim. 01 - 2025	$325.661	56,41%	8	4
	3. Trim. 02	3. Trim. 02 - 2025	$329.149	57,01%	6	6

Año	Trimestre	Trimestre	Presupuesto Comprometido Total	% Avance Consolidado	Proyectos En Ejecución	Proyectos Terminados
2025	4. Trim. 03	4. Trim. 03 - 2025	$330.727	57,29%	6	6
	5. Trim. 04	5. Trim. 04 - 2025	$330.727	57,29%	5	7
2026	6. Trim. 01	6. Trim. 01 - 2026	$330.727	36,62%	4	8
	6. Trim. 02	6. Trim. 02 - 2026	$330.727	36,62%	4	8

Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)

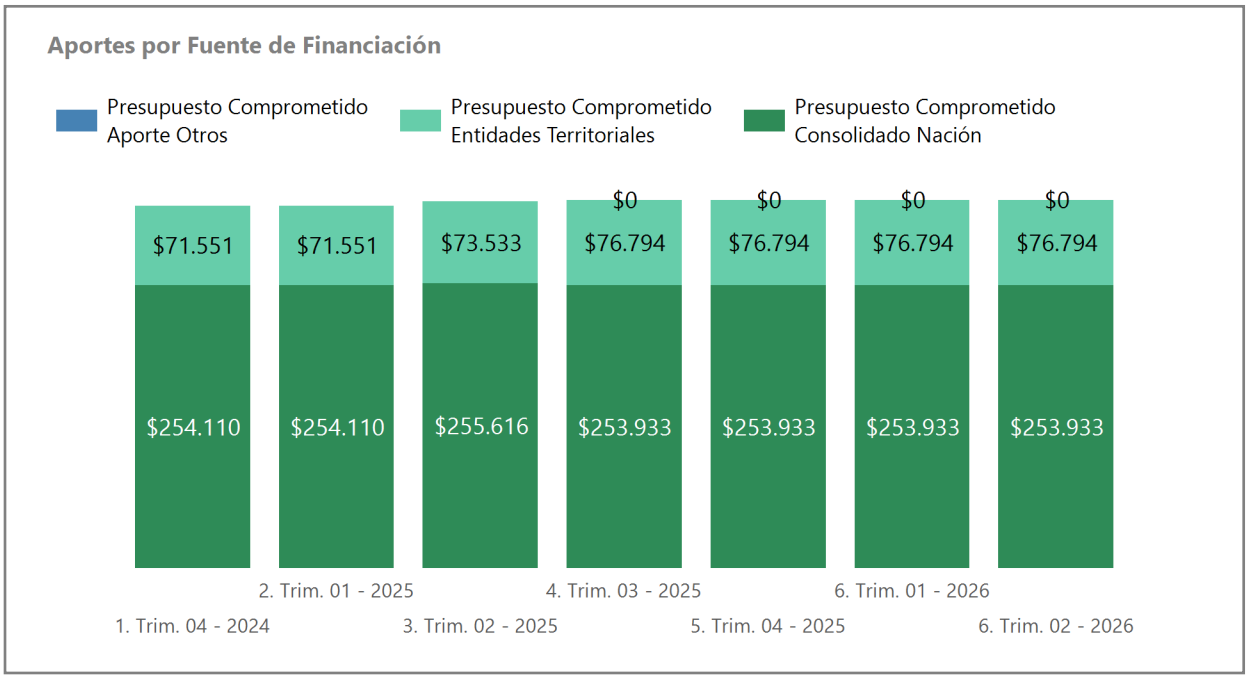

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Mejoramiento a nivel de pavimento en mezcla asfáltica de la vía secundaria Marginal (La Nevera) - Orocué (sector San Rafael de Guanapalo - Orocué) municipio de Orocué departamento de Casanare.	$149.068	$100.653	$48.415	$0

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Mejoramiento y adecuación de la vía que comunica el casco urbano del municipio de Trinidad con el corregimiento de Bocas del Pauto a orillas del Río Meta - fase I	$47.240	$0	$47.240	$0
En Ejecución	Construcción parador y obras de urbanismo en El Parque del Arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare	$11.355	$0	$11.355	$0
En Ejecución	Construcción de la planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario centro poblado de Villa Carola municipio de Monterrey departamento de Casanare	$4.416	$1.683	$2.733	$0
No Iniciado	Construcción de la Torre II de Alta Complejidad – Hospital Regional de la Orinoquía	$225.573	$106.700	$118.873	
No Iniciado	Construcción parque lineal ecoturístico y malecón del municipio de Yopal en el departamento de Casanare	$100.000	$0	$100.000	$0
No Iniciado	Mejoramiento de la vía a nivel de capa de Rodadura Vía Orocue, Casanare.	$83.000	$71.584	$11.416	
No Iniciado	Mejoramiento de la vía entre los municipios de Aguazul - Mani y la vereda La Poyata en el municipio de Maní, departamento de Casanare	$60.000	$35.000	$25.000	$0
No Iniciado	Construcción del coliseo departamental en el Polideportivo Pier Lora Muñoz del municipio de Yopal	$43.000	$19.068	$23.932	$0
No Iniciado	Construcción parque lineal y mirador 360° en la vereda Cuarto Unete del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare	$14.298	$0	$14.298	$0

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
No Iniciado	Mejoramiento a nivel de capa de rodadura de la vía que conduce de Monterralo - Los Lirios en el municipio de Aguazul - a Visinaca municipio de Tauramena , departamento de Casanare	$2.500	$0	$2.500	$0
Terminado	Mejoramiento a nivel de pavimento de un tramo de vía y construcción de obras de drenaje del corredor vial entre el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo y el corregimiento de Montañas del Totumo, - departamento de Casanare	$45.078	$45.078	$0	$0
Terminado	Construcción de obras de control estructural para la estabilización y protección del Rio Cravo sur margen derecha sector parque La Iguana y sector calle octava hasta la urbanización El Paraiso del municipio de Yopal - departamento de Casanare	$41.518	$36.933	$4.586	$0
Terminado	Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.	$23.307	$21.325	$1.982	$0
Terminado	Mejoramiento a nivel de afirmado y mejoramiento de la capa de rodadura de la Vía Central de Llano que conecta al municipio de Maní, departamento de Casanare	$18.497	$18.497	$0	$0

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Terminado	Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.	$13.817	$13.817	$0	$0
Terminado	Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.	$9.747	$9.448	$299	$0
Terminado	Construcción de obras de protección sobre la rivera del rio meta o el casco urbano del municipio de Orocue del departamento del Casanare.	$9.500	$9.500	$0	$0
Terminado	Construcción de obras de mitigación y protección para control de fenómeno de remoción en masa en el sector de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Sabanalarga Casanare.	$1.140	$1.140	$0	$0
Total		**$903.054**	**$490.425**	**$412.629**	**$0**

Proyectos DNP -Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

4 **Total Proyectos**	$272.445 **Valor Indicativo (Millones)**

$151.290 **Aporte indicativo DNP FRPT**	$121.155 **Aporte indicativo territorio**	$0 **Aporte indicativo Sector**	$0 **Aporte indicativo Otros**

3 **Proyectos En Ejecución /Terminados**	$46.872 **Presupuesto Comprometido (Millones)**

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción de la Torre II de Alta Complejidad – Hospital Regional de la Orinoquía	No Iniciado	$225.573	$106.700	$118.873		

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.	Terminado	$9.747	$9.448	$299	$0	$0
Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.	Terminado	$23.307	$21.325	$1.982		$0
Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.	Terminado	$13.817	$13.817	$0	$0	$0
Total		**$272.445**	**$151.290**	**$121.155**	**$0**	**$0**

Nota Aclaratoria Proyectos DNP - FRPT: Los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del DNP–FRPT se reportan en estado "En ejecución" por la suscripción del contrato específico con la entidad territorial ejecutora. No obstante, la ejecución física del proyecto depende de la contratación derivada que adelante dicha entidad.

Notas Aclaratorias

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Casanare.aspx

ANEXO

DNP-Fondo Regional para los Pactos Territoriales*
Proyectos en ejecución y terminados

* Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro. 877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Casanare

Fecha de Corte
26/06/2026

Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía El Milagro - Yopitos en el municipio de Yopal Departamento de Casanare.

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$13.817 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Ejecutado Estado Detallado

$13.817 Aporte DNP FRPT (millones)	$0 Aporte Nación - Sector (millones)	$0 Aporte Territorio (millones)	$0 Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	**Municipio Intervención**	YOPAL
BPIN	2021000070026	**Área de influencia**	Rural
No. Contrato Específico	179-2230153	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	101	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	4	**Fecha viabilidad**	27/03/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Se intervendrán 6 km de vías en pavimento flexible. Adicionalmente se construirán 14 alcantarillas de 36´.	Vía terciaria mejorada	6 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

16/06/2023 Fecha de Suscripción	11/09/2023 Fecha de Inicio	17 Plazo en Meses	11/02/2025 Fecha Terminación	12.393 Número de Beneficiarios

$13.818 Pto Comprometido DNP FRPT	$0 Pto Comprometido Sector	$0 Pto Comprometido Territorio	$0 Pto Comprometido Otros

$13.818
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

11/03/2025 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	100% % Ejecutado

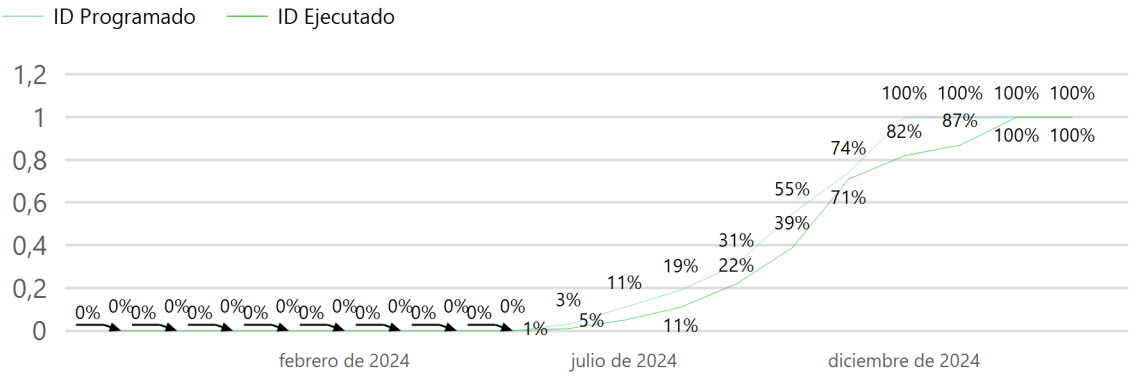

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 Fecha de Corte Avance	
$13.818 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$12.436 Valor Ejecutado (mill)	90% % Ejecutado

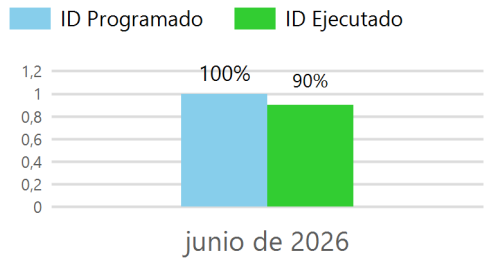

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Casanare

Fecha de Corte
26/06/2026

Revestimiento canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón, para los sectores: Marginal de La Selva - Parque del Arroz, Granja del adulto mayor - Intersección caño Cimarrón, urbanización El Remanso, para la mitigación del riesgo por inundación en el área urbana del municipio de Aguazul, departamento de Casanare.

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$23.307	Obra terminada
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$21.325		$1.982	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	**Municipio Intervención**	Aguazul
BPIN	2022850100003	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	129-2220844	**Es Inversión climática?**	Si
No. CONPES Anexo B	37	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	03/08/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Canalización de 1800 mts de los caños Aguazulero y Cimarrón mediante revestimiento en concreto reforzado al talud, con zona de transitabilidad.	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1
		Numero de obras de infraestructura

Información específica de ejecución contrato específico

12/08/2022	21/11/2022	34	6/09/2025	5.637
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$21.325	$0	$1.982	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$23.307
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

21/08/2025	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

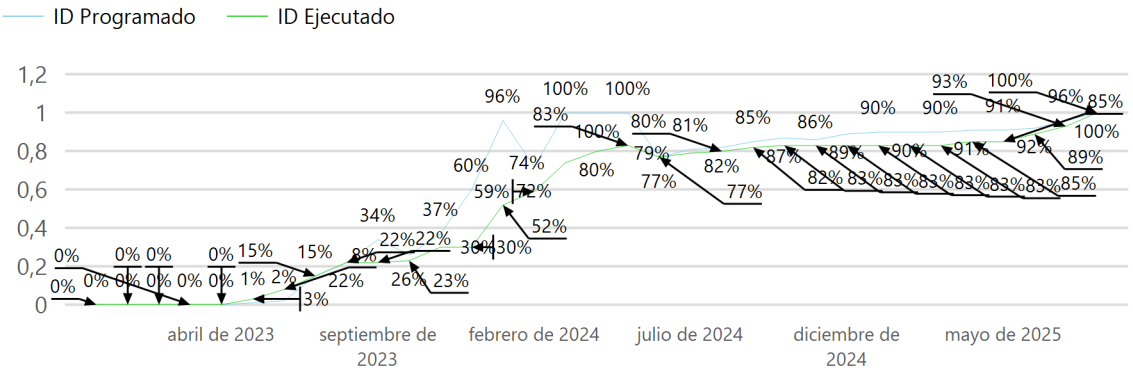

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 Fecha de Corte Avance	
$21.325 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$19.192 Valor Ejecutado (mill)	90% % Ejecutado

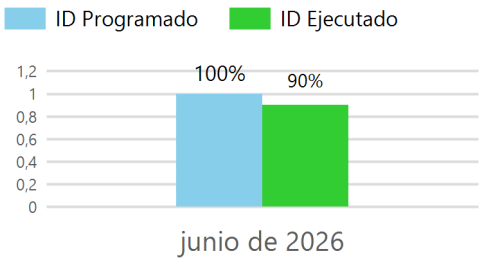

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Casanare

Fecha de Corte
26/06/2026

Construcción de obras de protección sobre el Rio Cravo Sur en el centro poblado del Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare.

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$9.747 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Obra terminada Estado Detallado

$9.448 Aporte DNP FRPT (millones)	$0 Aporte Nación - Sector (millones)	$299 Aporte Territorio (millones)	$0 Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	**Municipio Intervención**	Orocué
BPIN	2021852300012	**Área de influencia**	Rural
No. Contrato Específico	124-2220768	**Es Inversión climática?**	Si
No. CONPES Anexo B	38	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	18/08/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto	
Construcción de una obra de infraestructura en geotubos, adecuación de cauce con dragados y conformación de banca, como obra principal para el desarrollo del proyecto, para la mitigación y la atención de desastres en el centro poblado El Algarrobo del municipio de Orocué.	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	1	Numero de obras de infraestructura

Información específica de ejecución contrato específico

2/08/2022 Fecha de Suscripción	30/08/2022 Fecha de Inicio	43 Plazo en Meses	12/03/2026 Fecha Terminación	600 Número de Beneficiarios

$9.448 Pto Comprometido DNP FRPT	$0 Pto Comprometido Sector	$299 Pto Comprometido Territorio	$0 Pto Comprometido Otros

$9.747
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

30/06/2024 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	54% % Ejecutado

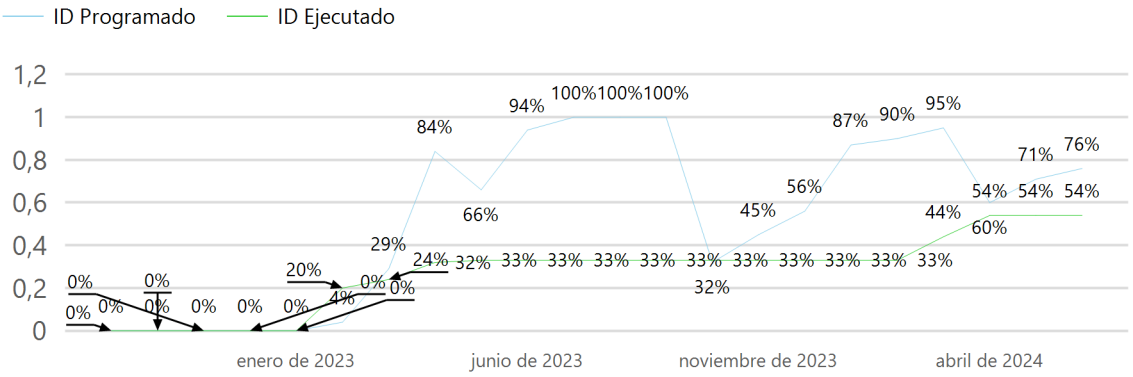

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026 Fecha de Corte Avance	
$9.448 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$8.503 Valor Ejecutado (mill)	90% % Ejecutado

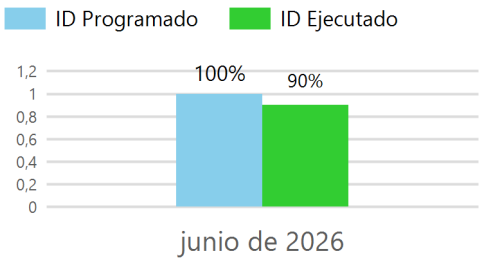

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
