Pacto Territorial Catatumbo

12/08/2025	10	12/08/2035	109	9%
Fecha suscripción	Plazo en años	Fecha de Terminación	Meses para vencimiento	% Tiempo Transcurrido

95	1	94	$3.603.422
Total Proyectos	Proyectos DNP - FRPT	Proyectos Nación territorio	Valor Indicativo (Millones)

$3.522.952	$80.470	
Aporte indicativo nación (Millones)	Aporte indicativo territorio (Millones)	Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	$162.483	$143.617	$18.865	
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$198.469	$198.469		
Cultura	$2.943	$2.943		
Educación	$334.862	$334.862		
Igualdad y Equidad	$44.254	$44.254		
Inclusión Social y Reconciliación	$64.457	$64.457		
Minas y Energía	$127.209	$127.209		
Presidencia	$511.270	$511.270		
Salud y Protección Social	$361.653	$361.549	$105	
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	$103.269	$103.269		
Transporte	$1.527.331	$1.465.831	$61.500	
Vivienda, Ciudad y Territorio	$165.224	$165.224		
Total	**$3.603.422**	**$3.522.952**	**$80.470**	

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Comprometido Total	Comprometido Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	$22.257	$22.257	$0	
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$0		$0	
Cultura	$2.943	$293	$0	$2.650
Educación	$157.293	$157.293	$0	

Igualdad y Equidad	$43.847	$43.847	$0	
Inclusión Social y Reconciliación	$61.799	$61.799	$0	
Minas y Energía	$121.589	$121.589	$0	
Presidencia	$352.246	$300.805	$51.442	
Salud y Protección Social	$13.956	$13.956	$0	
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	$34.282	$34.282	$0	
Transporte	$125.340	$125.340	$0	
Vivienda, Ciudad y Territorio	$95.799	$86.129	$9.669	
Total	**$1.031.349**	**$967.589**	**$61.111**	**$2.650**

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nación y Otros

Pacto Territorial	Entidad Nación aportante	Entidad Otros aportante	Presupuesto Comprometido Nación	Presupuesto Comprometido Aporte Otros
Pacto Territorial Catatumbo			$84.657	
	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		$5.272	
			$180.614	
	ADR		$4.154	
	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL		$6.104	
	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO		$5.203	
	ART -DSCI -DAPRE		$257.089	
	Departamento de Prosperidad Social		$42.093	
	Dirección de Energía Eléctrica / Ministerio de Minas y Energía	FENOGE	$121.589	

Pacto Territorial	Entidad Nación aportante	Entidad Otros aportante	Presupuesto Comprometido Nación	Presupuesto Comprometido Aporte Otros
Pacto Territorial Catatumbo	Fideicomiso Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial - Ministerio de Igualdad y Equidad		$11.000	
	Fondo Colombia en Paz		$39.073	
	Fondo de Programas Especiales para la Paz - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República		$10.642	
	FONIGUALDAD		$5.545	
	FONVIVIENDA		$80.858	
	INVIAS		$20.133	
	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) / Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	$12.000	
	MINISTERIO DE CULTURA; AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	Asociación de autoridades tradicionales indígenas Npatubaiyibari	$293	$2.650

Pacto Territorial	Entidad Nación aportante	Entidad Otros aportante	Presupuesto Comprometido Nación	Presupuesto Comprometido Aporte Otros
Pacto Territorial Catatumbo	Ministerio de Educación Nacional		$36.877	
	Ministerio de Tecnologías de la informacion y las comunicaciones		$34.282	
	PGN		$7.302	
	UBPD -Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas		$2.810	

Compromisos de Recursos por Parte de la Nación y el Territorio

Pacto Territorial	Aporte Indicativo Nación	Presupuesto Comprometido Nación	% Avance Nación
Pacto Territorial Catatumbo	$3.522.952	$967.589	27,47%

Pacto Territorial	Aporte Indicativo Territorio	Presupuesto Comprometido Territorio	% Avance Territorio
Pacto Territorial Catatumbo	$80.470	$61.111	75,94%

Avance Consolidado (En Ejecución + Terminados) (Millones)

28,62%

$1.031.349

Valor Comprometido = En Ejecución + Terminados

Número de Proyectos por Estado

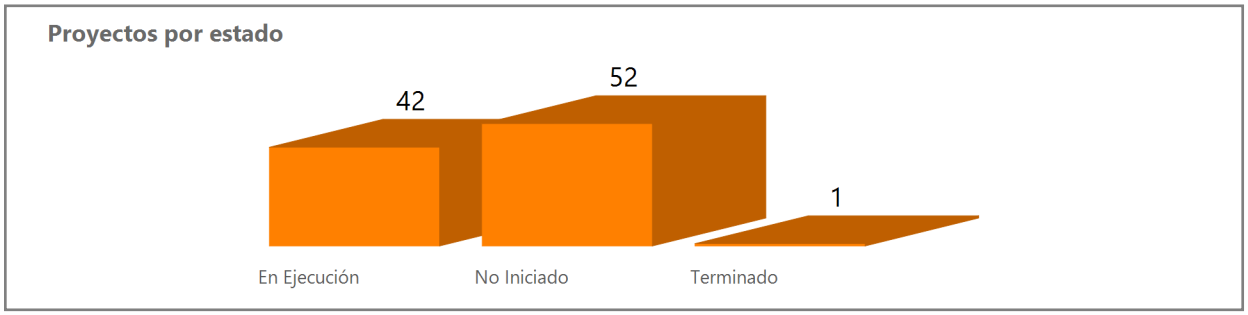

Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

Año	Trimestre	Trimestre	Presupuesto Comprometido Total	% Avance Consolidado	Proyectos En Ejecución	Proyectos Terminados
2025	4. Trim. 03	4. Trim. 03 - 2025		0,00%	0	0
	5. Trim. 04	5. Trim. 04 - 2025	$824.032	22,87%	28	1
2026	6. Trim. 01	6. Trim. 01 - 2026	$909.647	25,24%	36	1
	6. Trim. 02	6. Trim. 02 - 2026	$1.031.349	28,62%	42	1

Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)

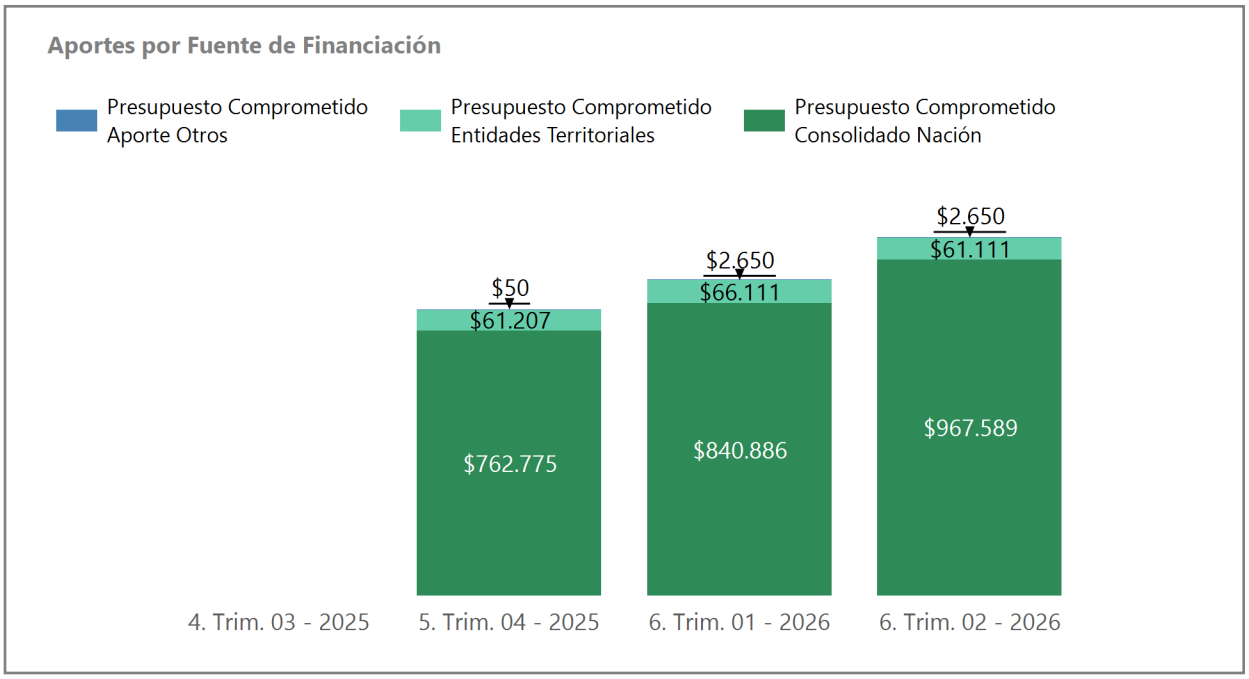

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Transversal del Catatumbo (Tibú.- Convención 123 km)	$965.712	$965.712		
En Ejecución	Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	$325.788	$325.788		
En Ejecución	Mejorar las condiciones para el acceso a la Educación Preescolar. Básica y Media del Catatumbo por medio del mejoramiento de 66 sedes educativas en la región del Catatumbo	$199.345	$199.345		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Mejoramiento de vivienda urbanos y rurales (4.063 urbanos y 2.188 rurales)	$146.250	$146.250		
En Ejecución	Troncal del Catatumbo (Astilleros - El Tablazo - Santa Rosa - Petrolea - Campo Dos - Tibú - La Gabarra)	$144.130	$84.130	$60.000	
En Ejecución	Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total (CCPT) en la región del Catatumbo	$78.319	$78.319		
En Ejecución	IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL (CENTROS DIGITALES)	$44.089	$44.089		
En Ejecución	Implementación de un esquema especial de acompañamiento dirigido a los hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados en condiciones de vulnerabilidad. a nivel nacional-FIP NACIONAL.	$42.129	$42.129		
En Ejecución	Construcción de la Universidad Nacional del Catatumbo (Fase I)	$39.073	$39.073		
En Ejecución	Implementación de comunidades energéticas en los resguardos Motilón Barí y Catalaura 32 comunidades energéticas en los resguardos Motilón Barí y Catalaura (2024 - 2026) - 43 comunidades energéticas en los resguardos Motilón Barí y Catalaura (2026 - 2028)	$38.100	$38.100		
En Ejecución	Comunidades de Conectividad en municipios priorizados de la región del Catatumbo	$34.564	$34.564		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Dotar de mobiliario pedagógico y construcción de ambientes educativas con enfoque étnico de las sedes educativas en el territorio del Pueblo Bari	$29.390	$29.390		
En Ejecución	Impulso a la estrategia de consolidación de los ETCR	$26.212	$26.212		
En Ejecución	Fortalecimiento el sector cacaotero en los municipios pdet de la zona de catatumbo en el departamento de Norte de Santander	$24.978	$24.978		
En Ejecución	Zonas comunitarias para la paz (soluciones de internet comunitario Wifi que carecen de conectividad. en municipios cobijados por los PDET)	$24.616	$24.616		
En Ejecución	Mejoramiento de la vía principal que comunica Río de Oro on El Carmen departamento de Norte de Santander	$23.270	$23.270		
En Ejecución	PIDAR PAZ - Fortalecimiento de las capacidades técnicas. Organizacionales y comerciales de los productores de cebolla de 8 municipios de la región del Catatumbo.	$20.594	$10.840	$9.754	
En Ejecución	CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO	$20.000	$20.000		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMERCIALES DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO, CON MIRAS A LA INCURSIÓN EN LOS DIFERENTES MERCADOS	$18.498	$18.498		
En Ejecución	Sistemas agroforestales sostenibles. resilientes y justos	$12.000	$12.000		
En Ejecución	Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo de la Infraestructura Social y Hábitat para la PAZ total a nivel Nacional . - Puntos de Abastecimiento Solidario	$10.400	$10.400		
En Ejecución	Implementación de Jóvenes en Paz	$8.850	$8.850		
En Ejecución	PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS - PAPSIVI	$8.205	$8.205		
En Ejecución	Construcción del Centro Regional de Abastecimiento en el marco del programa Hambre Cero (agrologística)	$8.000	$8.000		
En Ejecución	Mejoramiento de la via terciaria entre Pinzon Castilla casco urbano del municipio de Hacarí corregimiento San Jose del Tarra en el marco de la implementacion de los acuerdos de paz en el municipio de Hacarí - Norte de Santander	$7.637	$7.637		
En Ejecución	Caminos ancestrales priorizados con el Pueblo Barí	$7.500	$6.000	$1.500	

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Implementación de la estrategia "Hambre Cero para apoyar la accesibilidad a los alimentos de la población en situación de pobreza. extrema pobreza y vulnerabilidad -FIP-NACIONAL.	$6.928	$6.928		
En Ejecución	Construcción Del Centro De Adulto Mayor El Tarra. Norte De Santander	$6.199	$6.199		
En Ejecución	Mejoramiento en la vía terciaria a la vereda caño victoria. municipio de Tibú. departamento de Norte de Santander	$6.090	$6.090		
En Ejecución	Construcción Centro De Desarrollo Integral (CDI) El Tarra. Norte De Santander	$5.799	$5.799		
En Ejecución	Implementación del programa generación de ingresos y oportunidades sostenibles para las personas. familias y micronegocios de la economía popular. comunitaria y solidaria-Genios de la economía popular.	$5.000	$5.000		
En Ejecución	Hogares con provisión directa de alimentos en el marco del Programa Hambre Cero	$4.784	$4.784		
En Ejecución	Implementación de 350 conexiones intradomiciliarias para el municipio de ocaña norte santander	$3.249	$3.249		
En Ejecución	Construcción de 13 Bohíos Ancestrales del Pueblo Barí presente en los municipios de Convención. El Carmen. El Tarra. Tibú y Teorama: 11 pertenecen al Resguardo Motilón Barí y 2 al Resguardo Catalaura Barí.	$2.943	$2.943		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Construcción de pavimento rígido en la carrera 8 entre calles 03 y 04s y la calle 04s intercepción con carrera 8 y carrera 11. del barrio Villa Esperanza. municipio El Tarra. departamento Norte de Santander El Tarra	$2.692	$2.692		
En Ejecución	Fomentar el arraigo territorial de la población del Catatumbo mediante la formalización de la tenencia de la tierra. a través del fortalecimiento de la Oficina Municipal de Tierras (OMT) de Teorama como instancia de articulación interinstitucional. orientada a consolidar la seguridad jurídica sobre la propiedad rural.	$2.621	$2.621		
En Ejecución	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL MANEJO POSTCOSECHA DEL CULTIVO DE FRIJOL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN. DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	$2.151	$2.151		
En Ejecución	Plan Regional de búsqueda de personas dadas por desaparecidas	$1.836	$1.836		
En Ejecución	Diseñar e implementar los planes integrales de gestion y manejo de residuos sólidos para los resguardos del territorio Barí. con el objetivo de garantizar un ambiente sano a todas las familias Barí. resguardo Catalaura.	$1.796	$1.796		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BAJO UN MODELO AGROECOLÓGICO. DIRIGIDO A LAS MUJERES PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO LA VICTORIA Y ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA. NORTE DE SANTANDER	$1.256	$1.256		
En Ejecución	Apoyo asistencia técnica / Extensión agropecuaria	$684	$684		
En Ejecución	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO PARA LA LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - RLCPD	$105		$105	
No Iniciado	Corredor Convención - La Mata	$250.049	$250.049		
No Iniciado	Ampliar la ESE Emiro Quintero Cañizares que se encuentra en nivel II para llegar a ser una ESE de tercer nivel	$90.000	$90.000		
No Iniciado	Mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria de Tibú	$81.621	$81.621		
No Iniciado	Implementación de comunidades energéticas en la región del Catatumbo - 61 comunidades energéticas (2024 - 2026) -	$77.216	$77.216		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
No Iniciado	PIDAR PAZ - Aunar esfuerzos para la implementación de proyectos en la Subregión del Catatumbo. mediante la estructuración de estudios y diseños e implementación de Infraestructura Productiva como alternativa de reconversión hacia las economías lícitas (Plantas de Transformación)	$73.337	$73.337		
No Iniciado	Disminuir la degradación de los ecosistemas de la Ecorregión Catatumbo: 1. Servicio de restauración de ecosistemas - de áreas continentales 2. Servicio de restauración multifuncional productiva 3. Infraestructura funcional para la Bioeconomía construida y dotada	$72.171	$72.171		
No Iniciado	Bio Catatumbo: Por la conservación. la construcción colectiva y sostenible del territorio	$56.139	$56.139		
No Iniciado	EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD. MUNICIPIOS REGION DE CATATUMBO	$46.787	$46.787		
No Iniciado	Construcción de la Universidad Nacional del Catatumbo segunda etapa y dotación de la infraestructura de educación superior en la Subregión del Catatumbo	$37.000	$37.000		
No Iniciado	Implementación de Zonificaciones Ambientales Participativas para la gobernanza territorial y el fortalecimiento de los derechos territoriales de las comunidades campesinas de 11 municipios del Catatumbo	$35.281	$35.281		
No Iniciado	Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral nacional.	$35.000	$35.000		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
No Iniciado	Fomento de Prácticas Productivas Sostenibles para la Restauración en la Cuenca del Catatumbo	$34.878	$34.878		
No Iniciado	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD DE EL TARRA	$22.916	$22.916		
No Iniciado	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN. PARA LA IPS ABREGO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL	$22.403	$22.403		
No Iniciado	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN. PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CONVENCIÓN	$21.602	$21.602		
No Iniciado	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IPS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER	$21.000	$21.000		
No Iniciado	Instalación del Hospital móvil en El Tarra	$16.608	$16.608		
No Iniciado	PIDAR PAZ - Proyecto productivos de fortalecimiento de la línea de café en los municipios de la subregión del Catatumbo.	$16.250	$13.000	$3.250	
No Iniciado	PIDAR PAZ - Proyecto productivos de fortalecimiento de la línea de cacao en los municipios de la subregión del Catatumbo.	$16.250	$13.000	$3.250	
No Iniciado	Optimización de alcantarillado del corregimiento La Gabarra. Municipio de Tibú	$15.725	$15.725		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
No Iniciado	Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional.	$15.000	$15.000		
No Iniciado	Incremento de la formalización de predios privados rurales y procesos agrarios a nivel nacional	$15.000	$15.000		
No Iniciado	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN y DOTACIÓN. PARA LA NUEVA IPS CORREGIMIENTO DE SAN PABLO. MUNICIPIO DE TEORAMA	$13.111	$13.111		
No Iniciado	Estudios. Diseños. Construcción Y Dotación. Para La Ampliacion Y Reordenamiento Para La E.S.E. Norte San Jose De Tibu	$13.050	$13.050		
No Iniciado	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN. PARA EL CENTRO DE SALUD CAMPO DOS. MUNICIPIO DE TIBÚ	$12.632	$12.632		
No Iniciado	Estudios. diseños y construcción y Dotación del centro de atención primaria en salud. intercultural. de baja complejidad hospitalaria. en el poblado rural indígena de Brubucanina (municipio de teorama)	$12.424	$12.424		
No Iniciado	Estudios. Diseños. Construcción Y Dotación Para El Puesto De Salud Carikachaboquira	$12.000	$12.000		
No Iniciado	Construcción para la electrificación rural por medio de redes eléctricas en la zona rural del municipio de Abrego. Norte de Santander	$11.893	$11.893		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
No Iniciado	Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas y comerciales a mujeres rurales víctimas del conflicto armado en el municipio de El Carmen Norte de Santander	$8.943	$8.943		
No Iniciado	PIDAR PAZ - Fortalecimiento de las capacidades productivas del Pueblo Barí alrededor de la línea de cacao y la implementación de granjas integrales con la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí – ÑATUBAIYIBAR-. en el Resguardo Indígena Motilón -Barí. departamento de Norte de Santander.	$8.424	$6.936	$1.488	
No Iniciado	ESTUDIOS. DISEÑOS. CONTRUCCION Y DOTACIÓN PARA CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES. MUNICIPIO DE SARDINATA	$8.000	$8.000		
No Iniciado	Estudios. Diseños. Construcción Y Dotación. Para El Centro De Salud De El Paso	$7.000	$7.000		
No Iniciado	ESTRATÉGICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL. LA CONVIVENCIA SOCIAL. LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA POBLACIÓN - CAMAD	$6.982	$6.982		
No Iniciado	5 Vehículos De Transporte Asistencial Básico Y 1 Vehículo De Transporte Extramural (Ábrego;González)	$4.535	$4.535		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
No Iniciado	Adquisición De Ambulancias (Tab) De Transporte De Pacientes A Ips De La Red Publica Con Iniciativas En Municipios Pdet Ante Urgencias Emergencias Y Desastres Beneficiando La Poblacion De La Region Del Catatumbo Del Departamento Norte De Santander	$4.530	$4.530		
No Iniciado	PIDAR PAZ - Fortalecimiento de los sistemas productivos de cacao y granjas integrales como estrategia de generación de ingresos y soberanía alimentaria del pueblo Barí. con enfoque de género y juventud. en el Resguardo Indígena Catalaura La Gabarra. municipio de Tibú (Norte de Santander).	$3.763	$2.640	$1.123	
No Iniciado	Estructuración y construcción del puente peatonal y mular sobre el río de oro en la comunidad indigena pathuina en Norte de Santander	$3.160	$3.160		
No Iniciado	9 EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD (COMUNIDAD INDIGENA BRUBUCANINA Y SHUBABARINA DEL PUEBLO BARÍ. ÁREA URBANA VEREDAS ALEDAÑA AL CASCO URBANO JURISDICCIONES Y RAMIREZ. CORREGIMIENTOS DE SAN PABLO. ASERRIO. LA CECILIA. SAN JUANCITO. COMUNIDAD INDIGENA DE NOROCCIDENTAL DE: SACAKDU. YERA. SUERERA. OCBABUDA. ASGBARINGCAYRA)	$2.398	$2.398		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
No Iniciado	Construcción de centro multipropósito casa de la familia y la juventud en el casco urbano del municipio de el Tarra Norte de Santander	$2.126	$2.126		
No Iniciado	COFINANCIACIÓN DE LAS ATENCIONES DE URGENCIAS Y PARTOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN MIGRANTE NO ASEGURADA O EN CONDICIÓN IRREGULAR	$2.087	$2.087		
No Iniciado	EQUIPOS DE ESPECIALISTAS	$1.768	$1.768		
No Iniciado	DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IPS DEL CORREGIMIENTO DE GUAMALITO.MUNICIPIO DE EL CARMEN	$1.200	$1.200		
No Iniciado	Construcción de sistema de riego comunitario para impactar 42 familias	$1.020	$1.020		
No Iniciado	MODELO PROPIO SALUD INDÍGENA PUEBLO MOTILÓN-BARÍ	$600	$600		
No Iniciado	ADECUACION MENOR. PUESTO DE SALUD DE OTARÉ. MUNICIPIO DE OCAÑA Y DOTACIÓN	$580	$580		
No Iniciado	ADECUACION MENOR. PUESTO DE SALUD DE LA VEGA DE SAN ANTONIO Y DOTACIÓN	$561	$561		
No Iniciado	ADECUACION MENOR. PUESTO DE SALUD DE PETROLEA. MUNICIPIO DE TIBÚ Y DOTACIÓN	$485	$485		
No Iniciado	1 EQUIPO SALUD MENTAL	$420	$420		
No Iniciado	ADECUACION MENOR. PUESTO DE SALUD DE PUEBLO NUEVO. MUNICIPIO DE OCAÑA Y DOTACIÓN	$411	$411		

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
No Iniciado	ADECUACION MENOR. PUESTO DE SALUD DE CAPITANLARGO. MUNICIPIO DE ABREGO Y DOTACIÓN	$411	$411		
No Iniciado	ADECUACION MENOR. PUESTO DE SALUD DE ASPASICA Y DOTACIÓN	$401	$401		
No Iniciado	ADECUACION MENOR. PUESTO DE SALUD DE HIGUERÓN. MUNICIPIO DE ABREGO Y DOTACIÓN	$241	$241		
Terminado	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR OPERADO POR LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	$24.254	$24.254		
Total		**$3.603.422**	**$3.522.952**	**$80.470**	

Proyectos DNP -Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

1	$965.712
Total Proyectos	**Valor Indicativo (Millones)**

$20.299		$945.413	
Aporte indicativo DNP FRPT	**Aporte indicativo territorio**	**Aporte indicativo Sector**	**Aporte indicativo Otros**

1	$20.299
Proyectos En Ejecución /Terminados	**Presupuesto Comprometido (Millones)**

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Transversal del Catatumbo (Tibú.-Convención 123 km)	En Ejecución	$965.712	$20.299		$945.413	
Total		**$965.712**	**$20.299**		**$945.413**	

Nota Aclaratoria Proyectos DNP - FRPT: Los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del DNP–FRPT se reportan en estado "En ejecución" por la suscripción del contrato específico con la entidad territorial ejecutora. No obstante, la ejecución física del proyecto depende de la contratación derivada que adelante dicha entidad.

Notas Aclaratorias

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Catatumbo.aspx

ANEXO

DNP-Fondo Regional para los Pactos Territoriales*
Proyectos en ejecución y terminados

* Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro. 877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos DNP - Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Catatumbo

Fecha de Corte
26/06/2026

Transversal del Catatumbo (Tibú.- Convención 123 km)

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$965.712 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En contratación derivada Estado Detallado

$20.299 Aporte DNP FRPT (millones)	$945.413 Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	**Municipio Intervención**	Tibú; Convención
BPIN		**Área de influencia**	
No. Contrato Específico	210-2250270	**Es Inversión climática?**	
No. CONPES Anexo B		**Tiene viabilidad?**	
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto

Información específica de ejecución contrato específico

7/11/2025 Fecha de Suscripción	24/11/2025 Fecha de Inicio	9 Plazo en Meses	24/08/2026 Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$20.299 Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	$0 Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$20.299
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

26/06/2026

Fecha de Corte Avance

$20.299

Valor Programado (mill)

100%

% Programado

$0

Valor Ejecutado (mill)

0%

% Ejecutado

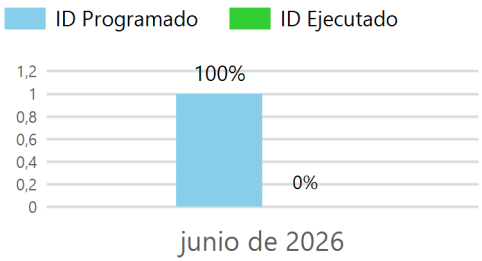

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
